



---

**Secretaría de Comunicaciones y Transportes  
Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI)**

Octubre 2012

*[Handwritten signature]*

---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# Hoja sin texto

9

~~114~~  
2

11/13






## Índice

I. Presentación.	.....5
II. Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria Documental.	.....7
III. Antecedentes.	.....7
IV. Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).	.....9
V. Vinculación del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales.	.....10
VI. Síntesis ejecutiva del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).	.....15
VII. Acciones realizadas.	.....15
a) Programa de Trabajo	
b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado	
c) Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos	
d) Documentación soporte	
VIII. Seguimiento y control.	.....17
IX. Resultados y beneficios alcanzados.	.....21
X. Informe final del servidor público de la Entidad responsable de la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).	.....26
XI. Glosario	.....27
XII. Anexos	.....29



# Hoja sin texto

  
  
4  


**I.- Presentación**

Concepto	Descripción
Nombre:	Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).
Objetivo del Programa:	Asegurar la óptima asignación y ejecución de los recursos presupuestales que posibiliten la conclusión de las obras y otorgar un nivel de servicio satisfactorio a los usuarios que transitan por los caminos y puentes a cargo de CAPUFE.

**Características Generales**

Periodo de vigencia que se documenta:	Del 1° de enero de 2007 al 15 de octubre de 2012.
Ubicación Geográfica:	Oficinas Centrales (Cuernavaca, Mor.), Delegación I (Zona Noroeste en Tijuana, B.C.), Delegación III (Zona Centro-Norte en Querétaro, Qro.), Delegación IV (Zona Centro-Sur en Cuernavaca, Mor.), Delegación V (Zona Centro-Oriente en Puebla, Pue.), Delegación VI (Zona Sureste en Coatzacoalcos, Ver.), Delegación VII (Zona Golfo en Veracruz, Ver.), Delegación VIII (Zona Noreste en Reynosa, Tamps.), Delegación X (Zona Norte en Monterrey, N.L.), Gerencia de Tramo Pacífico (Culiacán, Sin.), Gerencia de Tramo Tizayuca, Gerencia de Oaxaca y Gerencia de Tramo Chiapas.
Principales características técnicas:	Realizar trabajos de Mantenimiento Mayor y Mantenimiento Menor, los cuales incluyen todas las actividades tendientes a mantener las autopistas y/o puentes de la Red FNI en buenas condiciones estructurales y de servicio.
Unidades Administrativas participantes:	Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (BANOBRAS), Dirección de Infraestructura Carretera, Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo de CAPUFE.



**carreteras y puentes  
federales**

**Responsables de su elaboración**

Elaborado por:	Ing. Erasmo Hernández Marquina, Jefe de Departamento.	
Validado por:	Ing. Ciro Marbán Malpica, Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos.	
Autorizado por:	Ing. Omar Ortiz Ramírez, Director de Infraestructura Carretera.	



## II.- Fundamento Legal y Objetivo de la Memoria Documental

- Decreto por el que se aprueba el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012 de fecha 11 de diciembre de 2008.
- Decreto por el que se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 de fecha 31 de mayo de 2007.
- Decreto por el que se aprueba el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 de fecha 18 de enero de 2008.
- Programa Nacional de Infraestructura 2007-2012 de fecha Julio 2007.
- Acuerdo para la Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Publicado en el DOF el 19 de diciembre de 2011.
- Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales. Publicado en el DOF el 10 de octubre de 2011.
- Lineamientos para la formulación del Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012. Publicado en el DOF el 18 de enero de 2012.

El objetivo de la presente memoria es informar sobre la aplicación de los recursos asignados para la ejecución de los trabajos relacionados con la obra pública, contemplados en el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) durante el periodo comprendido del 1° de enero de 2007 al 15 de octubre de 2012.

## III.- Antecedentes

Se han realizado grandes esfuerzos para abatir los rezagos en el mantenimiento y modernización de la infraestructura carretera a cargo del Organismo. No obstante lo anterior, la magnitud de las cargas que se transportan, el incremento de su volumen en número de vehículos y frecuencia, es muy superior a las capacidades de cargas de la infraestructura, lo anterior se ve reflejado en un mayor y muy acelerado deterioro de las estructuras del pavimento de las autopistas y puentes a cargo del Organismo.

En la actualidad, la velocidad de operación rebasa la máxima autorizada en las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en más del doble la velocidad de diseño en las carreteras construidas antes de 1990, lo que constituye una de las causas del incremento en el índice de siniestralidad. Otro de los factores lo constituye la antigüedad de algunas autopistas construidas durante las décadas de los 50's y 60's cuyo diseño geométrico no resulta compatible con las características (velocidad, peso y dimensiones) de los vehículos que actualmente circulan en la Red Nacional Carretera, en donde la adecuación de su geometría implicaría la modificación de su trazo, lo cual requeriría de una inversión de miles de millones de pesos. Otro aspecto lo constituye el crecimiento de la mancha urbana, la cual se ha integrado a la infraestructura carretera como parte de su vialidad, con los problemas que esto conlleva. Por lo anterior, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) constituyó el 29 de agosto de 1997 el Fideicomiso número 1936 (antes FARAC), cuyos fines, entre otros es contratar la operación, conservación y mantenimiento de caminos y puentes materia de las concesiones rescatadas. Para tal fin celebró un contrato de prestación de servicios con Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), a efecto de que este último actuase como Organismo operador de la Red, contando con los recursos que para tal fin le aprobara el Comité Técnico de dicho Fideicomiso.

Como Organismo operador, CAPUFE realizó la programación de las acciones de conservación y el diagnóstico de las necesidades de la red carretera, a través de la adjudicación de contratos de obra pública, con los cuales se ha efectuado la auscultación de los pavimentos y de las estructuras con equipo de alto rendimiento y tecnología de punta, a efecto de conocer sus condiciones, las cuales se reflejan en indicadores reconocidos internacionalmente. En el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), el presupuesto se asigna de acuerdo a las prioridades que imponen las condiciones físicas del camino, con el fin de racionalizar la aplicación de los recursos, obtener al máximo su aprovechamiento y con ello, que exista una transparencia en el accionar de CAPUFE y como resultado se tenga una Red Carretera en óptimas condiciones para beneficio y seguridad de los usuarios. Para poder lograr lo anterior, se ha implementado la aplicación del Sistema HDM-4 (Highway Development and Management System), que es un modelo de simulación del comportamiento del ciclo de vida de las carreteras considerando todas las relaciones entre ésta, el ambiente y el tráfico dentro de una economía nacional o regional que determina la composición y la estructura de costos de las variables. El modelo realiza un análisis detallado con base en los datos suministrados por el usuario. La implementación del HDM-4 se da principalmente por las siguientes razones:



- La aparición de nuevas condiciones tanto en materia económica como técnica y la necesidad de incluir más factores que antes no se tomaban en cuenta (factores climáticos, medioambientales, seguridad vial, efectos de la congestión de tráfico, etc.).
- La necesidad de jerarquizar las inversiones en proyectos carreteros, realizando una optimización de los recursos disponibles y previendo la influencia de condiciones futuras en su estado.
- Desarrollar una visión más amplia de la Gestión de Carreteras.

En una primera etapa se implantó el Sistema de Gestión de Pavimentos basado en el modelo HDM-4, con el propósito de crear una base de datos que tenga información del estado físico de las autopistas (IRI, profundidad de roderas, deterioros y sobreelevaciones), lo que ha permitido llevar a cabo simulaciones del estado de las autopistas que fueron utilizados para justificar los Programas de Mantenimiento y de esta forma asegurar la asignación racional y programada de los recursos presupuestales por año de la Red FNI.

#### **IV.- Marco normativo aplicable a las acciones realizadas durante la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).**

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de fecha 5 de febrero de 1917, última reforma 15 de octubre de 2012.
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF el 29 de diciembre de 1976. Última reforma el 14 de junio 2012.
- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el DOF el 30 de marzo de 2006, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de fecha 11 de junio 2002, última reforma el 8 de junio de 2012.
- Ley Federal de Entidades Paraestatales, publicada en el DOF el 14 de mayo de 1986, última reforma el 9 de abril de 2012.
- Ley Federal de Archivos del 23 de enero de 2012.
- Ley Federal del Trabajo publicada en el DOF el 1° de abril de 1970, última reforma 9 de abril de 2012.

- Ley de Expropiación de fecha 25 de noviembre de 1936, última reforma 27 de enero de 2012.
- Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público de fecha 4 de enero de 2000, última reforma 16 de enero de 2012.
- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de fecha 4 de enero de 2000, última reforma 9 de abril de 2012.
- Ley de Vías Generales de Comunicación de fecha 19 de febrero de 1940, última reforma 9 de abril de 2012.
- Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1993, última reforma el 18 de mayo de 2012.

#### **V. Vinculación del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) con el Plan Nacional de Desarrollo y programas sectoriales, institucionales, regionales y/o especiales**

El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las bases para el Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional. Es, en este precepto constitucional, en donde se determina como instrumento fundamental el Plan Nacional de Desarrollo y se ordenan sistemáticamente las acciones a cargo del gobierno.

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) establece los objetivos y las estrategias nacionales son la base para los programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan del gobierno. El PND está estructurado en cinco ejes de política pública: 1) Estado de derecho y seguridad; 2) Economía competitiva y generadora de empleos; 3) Igualdad de oportunidades; 4) Sustentabilidad ambiental; y 5) Democracia efectiva y política exterior responsable.

Consecuente con las directrices contempladas en el PND, las actividades y funciones de CAPUFE se sustentan y articulan en el eje de política 2, "Economía Competitiva y Generadora de Empleos", que específicamente establece en los siguientes objetivos:

J

MM

EA





Eje de Política Pública:  
2. Economía Competitiva y Generadora  
de Empleos

2.1 Política Hacendaria para la  
Competitividad

#### Objetivo 1

» Contar con una hacienda pública responsable, eficiente y equitativa que promueva el desarrollo en un entorno de estabilidad económica.

#### Estrategias

1.3 Garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas del gasto público para asegurar que los recursos se utilicen de forma eficiente, así como para destinar más recursos al desarrollo social y económico.

#### Línea

- » Mejorar la calidad del gasto público mediante un Presupuesto Basado en Resultados y un permanente Sistema de Evaluación del Desempeño en toda la Administración Pública Federal, incorporando paulatinamente el gasto federalizado.
- » Incrementar el gasto social y en infraestructura.
- » Fortalecer la planeación, coordinación y asignación de recursos en proyectos de inversión de alta rentabilidad social y económica.
- » Reforzar la rendición de cuentas y la transparencia, promoviendo que la cuenta pública y la correspondiente fiscalización se realicen de forma más oportuna y con mayor eficiencia y eficacia.



Eje de Política Pública:  
2. Economía Competitiva y Generadora de Empleos

2.9 Desarrollo Regional Integral

**Objetivo 13**

» Superar los desequilibrios regionales aprovechando las ventajas competitivas de cada región, en coordinación y colaboración con actores políticos, económicos y sociales al interior de cada región, entre regiones y a nivel nacional.

**Estrategias**

13.3 Fomentar la competitividad de todas las regiones, con un énfasis particular en las regiones más desfavorecidas, las pequeñas y medianas empresas y en sectores con alto impacto regional como el agropecuario y el turismo.

13.4 Asegurar que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos puedan tener acceso adecuado a la energía, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.

**Infraestructura para el Desarrollo**

Incrementar la cobertura, calidad y competitividad de la infraestructura, de modo que al final de la presente administración, México se ubique entre los treinta países líderes en infraestructura de acuerdo a la evaluación del Foro Económico Mundial.

**Acciones**

- » Elaborar un Programa Especial de infraestructura, en donde se establezca una visión estratégica de largo plazo, así como las prioridades y los proyectos estratégicos que impulsará la presente administración en los sectores de comunicaciones y transportes, energía, agua y turismo, logrando un mayor acceso de estos servicios a la población, sobre todo en regiones de menor desarrollo.
- » Promover que la infraestructura y los servicios que se ofrezcan sean más eficientes y satisfagan de mejor forma las demandas sociales.
- » Fortalecer las áreas de planeación de las dependencias y entidades gubernamentales, así como la capacidad institucional para identificar, formular y preparar proyectos de inversión.
- » Asignar más recursos e incorporar las mejores prácticas en los procesos de preparación, administración y gestión de los proyectos de infraestructura.
- » Impulsar un mayor uso de las metodologías de evaluación, para asegurar la factibilidad técnica, económica y ambiental de los proyectos.
- » Facilitar los procedimientos para la adquisición de derechos de vía y simplificar los trámites para la obtención de autorizaciones en materia ambiental, respetando siempre los derechos y el patrimonio de las comunidades locales y la ecología.
- » Brindar mayor certidumbre jurídica para promover una mayor participación del sector privado en el desarrollo de la infraestructura y perfeccionar los esquemas de financiamiento para potenciar la inversión en el sector.
- » Simplificar los procedimientos de contratación para la realización de las obras de infraestructura, incluyendo, en su caso, la homologación de los requisitos de participación y las bases de licitación.



## Eje de Política Pública:

2. Economía Competitiva y Generadora  
de Empleos

## 2.10 Telecomunicaciones y Transportes

## Objetivo 14

- » Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta México.

## Estrategia

- 14.7 Ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población.
- 14.8 Abatir el costo económico del transporte, aumentar la seguridad y la comodidad de los usuarios, así como fomentar la competitividad y la eficiencia en la prestación del servicio de transporte.
- 14.9 Modernizar la gestión del sistema de transporte, fortaleciendo el ejercicio normativo, rector y promotor del Estado, a fin de garantizar el desarrollo y uso de la infraestructura de transporte.
- 14.10 Proponer esquemas de financiamiento y mejorar los ya existentes para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura e impulsar su papel como generador de oportunidades y empleos.

## Líneas de Política

- » Modernizar la red carretera, así como mejorar su conectividad brindando continuidad a la circulación a través de la construcción de obras que permitan mejorar los accesos a regiones, ciudades, puertos y fronteras.
- » Asignar recursos de manera más eficiente en materia de conservación de carreteras, para que éstas operen en mejores condiciones y conforme a estándares internacionales, logrando con ello reducir el índice de accidentes en la red carretera y los costos de operación de los usuarios.
- » Ampliar la gama de fuentes de financiamiento y de formas de participación público-privada. Con estos modelos de asociación público-privada, se busca alentar el desarrollo de infraestructura carretera, tanto de cuota como libre, elevar la calidad del servicio ofrecido a los usuarios, mejorar las condiciones físicas de las carreteras, así como generar un importante número de empleos directos e indirectos.



Vinculación con el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012 y el Programa Institucional de Desarrollo PID 2007-2012

<p><b>Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2007-2012</b> (Objetivo)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Construir y modernizar la red carretera federal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población y así contribuir a la integración de las distintas regiones del país.</li> <li>2. Abatir el costo económico, social y ambiental del transporte asociado con el estado físico de la infraestructura carretera, en beneficio de toda la población y la seguridad del tránsito vehicular.</li> <li>3. Modernizar la gestión del sistema carretero, con objeto de lograr una operación más eficiente e incrementar la calidad de los servicios que se ofrecen en las carreteras del país.</li> </ol>
<p><b>Programa Institucional de Desarrollo 2007-2012</b> (Objetivo Institucional)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Asegurar la calidad en la prestación de los servicios y la satisfacción a nuestros clientes y usuarios.</li> </ol>
<p>Estrategias</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.3 Implantar acciones específicas que promuevan la fluidez y seguridad de los usuarios en su recorrido por la infraestructura a cargo del Organismo.</li> </ol>
<p>Línea de Acción</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1.3.3. Mantener y modernizar la infraestructura carretera a cargo del Organismo.</li> </ol>

En razón de lo contemplado en el cuadro anterior y con el fin de cumplir con lo especificado en las directrices señaladas, CAPUFE consideró en su PID 2007-2012 en el apartado de Programas y Proyectos Estratégicos, el correspondiente al Programa de Mantenimiento y Modernización de la Infraestructura Carretera a cargo del Organismo, el cual plantea garantizar la seguridad y un nivel de servicio satisfactorio a los usuarios que transitan por los caminos y puentes de la Red FNI que opera CAPUFE. Es así, que la presente memoria documental se encuentra alineada a las estrategias y líneas de acción contenidas en los instrumentos de planeación nacional.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## VI. Síntesis ejecutiva del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).

Con el objetivo primordial de ofrecer a los usuarios una infraestructura carretera segura y confiable, se implementó el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), con el cual, mediante la adjudicación de contratos de obra pública se ejercieron a flujo de efectivo 18,785.3 millones de pesos en el periodo 2007-2012, realizando de manera permanente las actividades relativas a trabajos de Mantenimiento Mayor y Menor, los cuales incluyen todas las actividades tendientes a mantener las autopistas y puentes de la Red FNI en buenas condiciones estructurales y de servicio. Con ello se pudo prever cualquier labor que debiera realizarse antes del surgimiento de algún problema, buscando minimizar tanto los costos del usuario como los inherentes a la autopista. Típicamente, las acciones realizadas como resultado de la aplicación de este programa incluyeron a título enunciativo: sellos, reencarpetados, reparación de puentes, reconstrucciones y correcciones para eliminar defectos de construcción o por exceso de deterioros, Inspección del derecho de vía, de los pavimentos, de las estructuras y obras de drenaje, barrido de la superficie de rodamiento, calafateo de grietas, ejecución de parches, renivelaciones aisladas de hundimientos diferenciales, reposición de sello de juntas, reposición y retoque de señalamientos, reparaciones y limpieza de cunetas y contracunetas, lavaderos, retiro de caídos eventuales, desazolves, mallas, cercado, deshierbe y limpieza del derecho de vía, etc.

## VII. Acciones realizadas

### a) Programa de Trabajo

El proceso de programación-presupuestación se lleva a cabo a través de la interacción entre el Gobierno Federal, por conducto de la SCT, el Comité Técnico del Fideicomiso, BANOBRAS y el Organismo. En la elaboración del programa de trabajo y proyecto de presupuesto se consideran los requerimientos de las Gerencias de Tramo, las Delegaciones Regionales y de la Dirección de Infraestructura Carretera, con las cuales se formula el programa de obras a realizar en un ejercicio. Para la elaboración de los programas anuales, se toman en consideración los lineamientos emitidos por BANOBRAS. En estricto apego al Programa de Trabajo Institucional, se realizó la ejecución del programa de trabajo en cada uno de los ejercicios comprendidos en el periodo, según se describe en el anexo 7.



**b) Presupuesto y calendario de gasto autorizado**

BANOBRAS, a través de la Subdirección de Planeación, Operación Técnica y Desarrollo emite los Oficios de Autorización de Inversión, con los cuales se da inicio al desarrollo de las licitaciones para la contratación de las obras públicas y servicios determinados en el Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI). De dichos documentos se desprende lo siguiente:

**Importe ejercido a flujo de efectivo en Obra Pública Red FNI**

Periodo 2007-2012

(Cifras en millones de pesos)

Año	Importe Ejercido
2007	4,249.7
2008	2,972.4
2009	2,871.2
2010	2,844.4
2011	3,904.48 <sup>1</sup>
2012	1,943.12 <sup>2</sup>
<b>Total</b>	<b>18,785.3<sup>3</sup></b>

**c) Integración de expedientes y/o de proyectos ejecutivos:**

La integración y resguardo de los expedientes incluyendo los proyectos ejecutivos, está a cargo de cada una de las Delegaciones Regionales y Gerencias de Tramo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y los artículos 114 y 115 de su Reglamento.

**d) Documentación soporte de la aplicación de los recursos**

<sup>1</sup> Cifras al día 15 del mes de octubre de 2012.

<sup>2</sup> Al día 15 del mes de octubre de 2012, se ejercieron 1,727.4 mdp de los 4,007 mdp autorizados para este año.

<sup>3</sup> Fuente: Programas de Obra Pública de la Red del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI) con corte al 30 de septiembre de 2012, emitidos por la Subdirección de Información y Evaluación de Obra, según oficio SIEO/0455/2012.

Con la finalidad de brindar a los usuarios una infraestructura carretera segura y confiable, se ejercieron 18,785.3 mdp en el periodo 2007-2012, según se detalla en la relación por año para la ejecución de Obra Pública por Delegación Regional, en la cual se muestra el monto de los contratos, los anticipos otorgados, lo ejercido a flujo de efectivo, las retenciones/devoluciones, el ajuste en costos, así como el porcentaje de avance financiero, según se muestra en los anexos 1 al 6.

### VIII. Seguimiento y control

En el ejercicio 2007<sup>4</sup> con el presupuesto aprobado en materia de Obra Pública por el Comité Técnico, se llevaron a cabo entre otras, las siguientes acciones: se rehabilitó el pavimento de 519 kilómetros y se proporcionó mantenimiento rutinario a 3,832 kilómetros; obras principalmente realizadas en las autopistas: Estación Don-Nogales; México-Querétaro; Querétaro-Irapuato; Mazatlán-Culiacán; Cuernavaca-Acapulco; La Pera-Cuatla; Puente de Ixtla-Iguala; Zacapalco-Rancho Viejo; México-Puebla; Puebla-Acatzingo; Acayucan-Cosoleacaque; Córdoba-Veracruz; Guadalajara-Tepic; Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla y Cuacnopalan-Oaxaca, además de elevar la rasante en el tramo carretero Cadereyta-Reynosa; se atendieron las emergencias técnicas originadas por la tormenta tropical "Lane" en la autopista Mazatlán-Culiacán; además se proporcionó tratamiento de espera a las autopistas México-Puebla, Puebla-Acatzingo y al Libramiento Cuernavaca, y se llevó a cabo la protección de cortes y estabilización de taludes en la autopista Cuernavaca-Acapulco. En lo que respecta a los puentes: Reponer los dispositivos de soporte superior de los anclajes de los tirantes del Puente "Papaloapan" ubicado en la autopista La Tinaja-Isla, a fin de restituirle la seguridad en su operación y prever daños estructurales irreversibles; Reparación de los puentes: Río Grande, El Marqués II, Coyquilla e Ignacio Chávez del tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas.

En materia de obra pública, para el ejercicio 2008, se rehabilitaron 670 kilómetros-cuerpo de pavimento y se proporcionó mantenimiento rutinario a 6,928 kilómetros-cuerpo; entre las obras realizadas destacan las autopistas: Tijuana-Ensenada, Libramiento Los Cabos, Estación Don-Nogales, Mazatlán-Culiacán, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Cuernavaca-Acapulco, La Pera-Cuatla. Puente de Ixtla-Iguala, Zacapalco-Rancho Viejo y México-Puebla, entre otras. Adicionalmente se realizó la ampliación y reparación de estructuras de puentes siendo las principales obras: la protección anticorrosiva del Puente Zacatal, la reposición de dispositivos (botellas) del Puente Papaloapan, la modernización del Distribuidor Vial

<sup>4</sup> Fuente: Informes de Labores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Cuautlixco, la adecuación de la vialidad del Entronque Caracha, la ampliación de estructuras en la autopista México-Puebla, la reparación de los puentes Río Grande, El Marqués, Coahuila, Ignacio Chavez y La Misión.

Con el propósito de optimizar la asignación de recursos en materia de conservación de pavimentos, se continuó con la implementación del Sistema de Gestión de Pavimentos basado en el modelo HDM-4 para las autopistas operadas de la Red FNI, celebrándose durante 2008 un contrato entre BANOBRAS, Instituto Mexicano del Transporte y CAPUFE para la Asistencia Técnica del Desarrollo del Sistema de Gestión de Pavimentos para la Red del FNI, con un periodo de ejecución de febrero de 2008 a enero de 2009. Además, se contrataron los servicios de Recopilación y Procesamiento de Información para dicho Sistema.

En 2009, se realizaron trabajos entre los que destacan: la rehabilitación del pavimento por un total de 1,805.7 kilómetros-cuerpo, divididos en: rehabilitación estructural del pavimento de 395.2 kilómetros-cuerpo,; terceros carriles 11.3 kilómetros-cuerpo, y tratamientos superficiales 1,399.2 kilómetros-cuerpo, trabajos realizados principalmente en las autopistas: Tijuana-Ensenada, La Rumorosa-Tecate, Estación Don-Nogales, Mazatlán-Culiacán, Uruapan-Nueva-Italia, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, México-Puebla, Puebla-Acatzingo, La Tinaja-Isla, Isla-Acayucan, Cd. Mendoza-Córdoba, Córdoba-Veracruz, Matamoros-Reynosa, Guadalajara-Tepic, Monterrey-Nuevo Laredo, Cadereyta-Reynosa, Gómez Palacio-Corralitos, Las Choapas-Raudales-Ocozacoautla. Adicionalmente se proporcionó mantenimiento rutinario a 6,819.8 kilómetros-cuerpo. Se atendieron las emergencias técnicas en las autopistas: Estación Don-Nogales, México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, Puente de Ixtla-Iguala, Cd. Mendoza-Córdoba y Las Choapas-Raudales-Ocozacoautla. En materia de puentes de los trabajos realizados sobresalen: la conclusión del distribuidor vial "Cuautlixco", del C.D. La Pera-Cuautla; la reposición de dispositivos de soporte superior (botellas) de los anclajes de los tirantes y trabajos complementarios en el puente "Río Papaloapan", de la autopista La Tinaja-Isla; la sustitución de la superestructura del puente "La Misión", en la autopista Tijuana-Ensenada.

En 2010, destacan por su importancia los siguientes trabajos: la realización de mantenimiento mayor en 501.5 kilómetros-cuerpo; obras realizadas principalmente en las autopistas: Tijuana-Ensenada, Estación Don-Nogales, Chamapa-Lechería, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, Libramiento de Cuernavaca, Puente de Ixtla-Iguala, México-Puebla, La Tinaja-Isla, Entronque Agua Dulce-Cárdenas, Gutiérrez Zamora-Tehuacán, Cuacnopalan-Oaxaca, Las Choapas-Raudales-Ocozacoautla y el ramal "Huachichil", sobresaliendo la construcción de losas de concreto hidráulico en las autopistas Cuernavaca-Acapulco (52.2 kilómetros-cuerpo) y México-Querétaro (16.5



kilómetros-cuerpo). Adicionalmente se proporcionó mantenimiento rutinario a 7,256.6 kilómetros-cuerpo de la red.

En materia de puentes se llevó a cabo la conclusión del entronque la Luz, ubicado en el kilómetro 291+750 de la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba; se realizó la reparación del puente "Amacuzac", ubicado en el kilómetro 11+200, así como del puente "Río Tembembe", ubicado en el kilómetro 3+800, ambos del Camino Directo Puente de Ixtla-Iguala; la rehabilitación de las losas de concreto del puente "Apepecho", ubicado en el kilómetro 21+300 de la autopista Acayucan-Cosoleacaque; la sustitución del sistema de piso del puente "Arroyo Grande", ubicado en el kilómetro 72+040 del Camino Directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla. Se realizaron trabajos de conservación menor en 3,375 estructuras; se llevo a cabo la inspección visual de 2,236 puentes tradicionales y 50 puentes especiales, 51 inspecciones detalladas de puentes carreteros, incluidos cuatro túneles en el tramo Cuernavaca-Acapulco.

En 2011, destacan las siguientes: mantenimiento mayor a 982.8 kilómetros-cuerpo en las autopistas: Tijuana-Ensenada, La Rumorosa-Tecate, Chamapa-Lechería, Cuernavaca-Acapulco, Cuacnopalan-Oaxaca, Libramiento Los Cabos, Estación Don-Nogales, México-Querétaro, México-Cuernavaca, México-Puebla, Puebla-Acatzingo, Entronque Agua Dulce-Cárdenas, Córdoba-Veracruz, La Tinaja-Isla, Saltillo-Torreón, Carbonera-Ojo Caliente, Gómez Palacio-Corralitos, Cadereyta-Reynosa, Puerto México-carbonera y Libramiento Cuernavaca. Asimismo se realizaron: trabajos de mantenimiento menor a 6,902.6 kilómetros-cuerpo de autopistas; instalación de 74.6 kilómetros de defensa metálica de tres crestas; Modernizar el alumbrado de la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza; Aplicación de siete millones de m<sup>2</sup> de riego sellador; la reparación del puente Zaragoza; 4,679 inspecciones a estructuras tradicionales; construcción de 787 kilómetros-cuerpo de bandas de alerta vibratoria; mantenimiento menor a 3,375 estructuras y 52 inspecciones a estructuras especiales. Además, se atendieron las emergencias técnicas en las autopistas Cuernavaca-Acapulco, México-Puebla, Acatzingo-Ciudad Mendoza, Salina Cruz-La Ventosa, Guadalajara-Tepic, Cuacnopalan-Oaxaca y Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla.


En 2012, el Comité Técnico del FNI autorizó un presupuesto para realizar los trabajos relativos a: 395 kilómetros-cuerpo de rehabilitación y tratamiento superficial de pavimentos en las autopistas: Acatzingo-Ciudad Mendoza, Agua Dulce-Cárdenas, Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla, Ciudad Mendoza-Córdoba, Córdoba-Veracruz, Cuacnopalan-Oaxaca, Cuernavaca-Acapulco, Champotón-Campeche, Durango-Mazatlán, Gutiérrez Zamora-Tihuatlán, México-Querétaro, Reynosa-Matamoros, La Rumorosa-Tecate, Tijuana-Ensenada, La Tinaja-Isla, Salina Cruz-La Ventosa y Saltillo-Torreón. Asimismo, se realizan obras en siete

entronques de la autopista Chamapa-Lechería y la reparación de concreto hidráulico en el Libramiento Noreste de Querétaro y la estabilización de taludes en las Choapas-raudales-Ocozacoautla. Destaca también la conclusión de los trabajos de estabilización de seis taludes o cortes en la autopista Cuernavaca-Acapulco y el mantenimiento rutinario de 3,092 kilómetros-cuerpo en las autopistas.

En cuanto a las auditorías realizadas, en el siguiente cuadro, se adjunta un reporte de las observaciones en materia de obra pública:

OBSERVACIONES DETERMINADAS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA  
2008-2012  
(Trimestralmente)

Unidad Administrativa	2008				2009				2010				2011				2012	
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II
DIC	12	4	5	3	9	10	17	16	9	3	3	3	19	17	11	2	11	19
Tijuana	1				6	6	3	13	22	10	4	1		1				2
Culiacán			8	3	13	5	8	6	25	11	7	3	3	2	1			
Querétaro	13	1	1		1	5	4	4	7	2	6	10	5				4	4
Cuernavaca	49	21	17	14	44	21	13	6	8	4	9	9	16	11	1		2	1
Puebla	8	2		4	22	19	17	10	5	1	2		8	5	2		6	5
Coahuila	3	1	1		15	12	5	3	6	2	1			1			2	1
Veracruz	6	3	3	7	6	5		1			1		5	5	2	4	4	7
Reynosa								1	4	1	1			2				
Guadalajara	2				13	2	5	5	5	5	3	3				1		
Monterrey	6	12	10	3				1	1		1							2
Chiapas	7	5	3		8	3	3	4	14	9	8	6	6	2			5	4
Oaxaca					1	1	1	1	1								2	
OIC		35	12	2	3	3	4	5	4	2		2	7	4	3	5		1
<b>Total</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	<b>60</b>	<b>36</b>	<b>141</b>	<b>92</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>111</b>	<b>50</b>	<b>46</b>	<b>35</b>	<b>69</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>36</b>	<b>46</b>

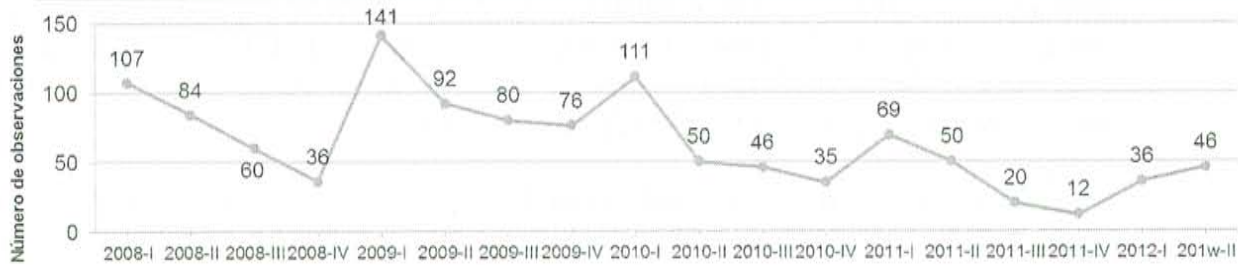



Así mismo, de manera bimestral y/o trimestral se reporto al cuerpo directivo de CAPUFE el seguimiento de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo Institucional del año 2007 al 2012 (ver anexo 7).

## IX. Resultados y beneficios alcanzados

Como resultado de la implementación del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI), durante el periodo comprendido del año 2007 al mes de junio de 2011 se logró aumentar a nivel global la Calificación Promedio Ponderada, la cual varió de 391.05 puntos en el primer semestre de 2007 a 395.40 puntos en el segundo semestre de 2011, lo que representa un aumento de 4.35 puntos en su estado físico, lo que da como resultado caminos en mejores condiciones físicas que repercuten en un recorrido más confortable y seguro para los usuarios de la red carretera.

Calificaciones de las Autopistas de la Red FNI<sup>5</sup>

Autopista	Longitud (Km)	Semestre									
		2007-I	2007-II	2008-I	2008-II	2009-I	2009-II	2010-I	2010-II	2011-I	2011-II
Acatzingo-Cd. Mendoza	95.6	379.88	381.74	322.00	359.99	366.25	397.01	402.17	429.04	408.05	404.51
Cadereyta-Reynosa	132		340.37	362.33	377.12	249.33	388.51	355.42	351.48	379.50	355.04
Cárdenas-Agua Dulce	57.4	481.99		459.77	423.93	454.71		424.22	428.61	432.07	406.10
Cd. Mendoza-Córdoba	39.3	409.13	404.16	354.26	322.27	305.32	316.21	362.63	377.89	393.95	378.54
Chamapa-Lechería	36.1	463.69	398.61	384.79	388.69	431.53	401.97	434.82	412.98	425.33	424.98
Champotón-Campeche	39.5	434.47	423.81	445.49	438.32	417.32	360.55	450.09	415.36	391.11	365.85
Córdoba-Veracruz	98	420.97	431.45	429.08	403.61	391.52	416.87	410.42	398.37	411.76	410.78
Cuacnopalan-Oaxaca	243	422.26	420.63	397.67	435.84	444.64	432.00	417.99	406.90	430.05	427.54
Cuernavaca-Acapulco	262.6	421.06	366.34	415.85	427.00	420.99	420.11	410.04	416.57	429.77	419.29
Durango - El Salto	92.6					426.33	467.24	460.53	440.80	424.43	400.30
Estación Don-Nogales	459	314.42	297.01	323.76	357.75	346.51	376.01	378.95	373.76	356.89	359.25
Gómez Palacio-Limite Durango	151.3	441.14	455.91	444.67	422.91	400.50	422.19	372.17	405.22	408.69	414.44
Gutiérrez Zamora-Tehuacán	37.2		454.42	448.70	444.73	436.38	428.16	431.57	418.88	417.69	404.56
La Pera-Cuautla	34.2	409.28	436.1	453.77	468.48	455.31	426.35	444.87	408.27	428.52	419.81
La Tinaja-Cosoleacaque	228	388.35	380.24	377.52	367.89	370.28	377.98	385.59	323.83	352.03	350.25
Las Choapas-Ocozacoautla	198	330.7	327.98	316.37	356.35	392.81	368.00	377.98	347.34	402.37	373.80
Libramiento Cuernavaca	14.5	438.52	439.93	421.57	424.85	393.27	402.45	373.91		401.20	399.28
Lib. Nororiental de Querétaro	37.5	401.39	392.30	393.67	391.41	355.84	392.67	380.16	367.04	338.03	345.79
Libramiento Oriente de Saltillo	21	407.63	432.53	421.18	430.19	419.22	390.26	350.78	326.08	320.74	428.63
Libramiento Poniente de Tampico	14.5		380.56	346.38	335.88	314.52	250.42	336.55	369.61	337.08	338.14
Libramiento San José del Cabo	20.2		442.18	438.27	442.95	479.37	475.53	472.43	480.28	477.09	484.99
México-Cuernavaca	61.5	471.34	470.50	465.37	455.17	449.67	425.86	443.09	443.52	441.91	432.97
México-Puebla	110.9	414.66	413.64	381.25	392.38	422.98	413.23	428.46	407.19	426.78	436.67

<sup>5</sup> Fuente: SCT

México-Querétaro	174.5		417.87	430	419.71	431.01	411.95	402.22	396.02	406.16	432.00
Monterrey-Nuevo Laredo	123.1	424.5	403.1	402.11	408.73	411.81	429.98	367.43	383.17	407.50	404.67
Nueva Italia-Lázaro Cárdenas	155	348.38	349.6	360.57	345.91	416.88	398.41	369.8	346.48	371.30	387.86
Pátzcuaro-Uruapan	56.1	392.38	387.59	385.27	379.32	410.43	402.04	362.33	364	374.0	389.12
Puebla-Acatzingo	38.5	379.88	373.23	329.92	361.23	350.14	378.34	381.37	414.22	389.32	458.16
Puente de Ixtla-Iguala	63.6	368.42	337.82	371.03	393.73	421.2	408.51	411.88	395.65	397.98	404.30
Puerto México-Carbonera	35.1	391.3	410.83	416.41	407.8	406.62	390.17		279	276.18	410.51
Querétaro-Irapuato	104.8	415.59	415.38	385.23	395.06	412.62	397.72	420.34	422.88	378.88	399.87
Rancho Viejo-Taxco	8.3	405.04	356.86	373.42	336.68	376.76	386.45	377.41	387.93	403.31	392.33
Reynosa-Matamoros	44	343.96	353.23	345.53	361.53	343.8	340.93	351.96	335.21	357.64	356.86
Salina Cruz-La Ventosa	75.4	404.07		415.65	433.47	433.47	420.64	417.69	394.54	411.64	441.01
Tecate-La Rumorosa	55.5	399.53	392.9	392.25	372.55	377.77	380.04	377.51	363.08	377.69	416.06
Tijuana-Ensenada	89.5	366.28	348.35	378.29	331.33	394.6	397.85	372.26	375.72	379.5	396.74
Torreón-Saltito	115	425.47	402.92	420.3	405.1	400.86	387.74	311.55	313.41	308.35	351.04
Uruapan-Nueva Italia	59.4		424.79	415.89	407.62	426.57	420.37	402.17	413.97	416.69	402.38
Zacapalco-Rancho Viejo	17.3	359.59	310	457	458.83	439.52	434.14	439.01	402.93	431.8	431.30
<b>Calificación Promedio Ponderada:</b>		391.05	380.48	385.65	392.32	394.35	398.24	391.74	382.86	391.33	395.40

Menor a 350.00  
Deficiente

De 350.00 a 400.00  
Regular

Mayor a 400  
Óptimo




Asimismo, después de la implementación del programa, en relación con la seguridad en el camino se pudieron disminuir significativamente los siguientes indicadores: el número de accidentes, el número de lesionados, el número de muertos, el número de víctimas y el índice de siniestralidad (Número de accidentes por Millón de Vehículo-Kilómetro Recorrido).

**Índice de Siniestralidad 2007-2012**  
**Accidentes por Millón de Vehículos-Kilómetro Recorrido**  
**(ACC/MVKR)**

AÑO	ACCIDENTES	LESIONADOS	DECESOS	VICTIMAS	Acc/MVKR
2007	19,558	9,544	702	10,246	1.258
2008	18,150	8,913	615	9,528	1.230
2009	17,038	8,909	652	9,561	1.167
2010	16,667	9,188	707	9,895	1.196
2011	16,619	9,085	670	9,755	1.112
2012*	12,011	6,644	441	7,085	1.109
<b>DIFERENCIA 2012-2007</b>	<b>7,547</b>	<b>2,900</b>	<b>261</b>	<b>3,161</b>	<b>0.149</b>

\*Resultado obtenido al mes de septiembre de 2012.

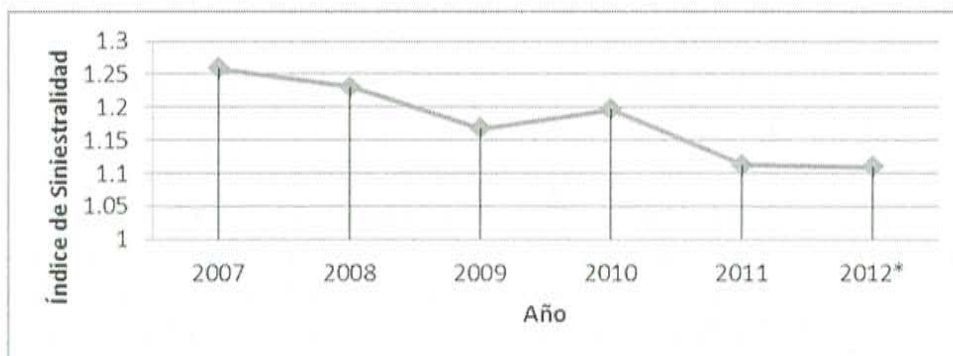



A fin de ofrecer a los usuarios una infraestructura carretera segura y confiable, se ejercieron a flujo de efectivo 18,785.3 millones de pesos en el periodo 2007-2012, destacando los siguientes trabajos:

- Rehabilitación de pavimento en 20 autopistas, destacando la rehabilitación con concreto hidráulico en la Cuernavaca-Acapulco (112.2 km-cuerpo), México-Querétaro (67.0 km-cuerpo) y México-Puebla (6.0 km-cuerpo); asimismo, se realizaron tratamiento superficiales en 37 autopistas de la red.
- Ampliación a terceros carriles del km. 119+300 al km. 125+250 cuerpo "B" de la autopista México-Puebla.
- Construcción de distribuidores viales: "José María Morelos", en la autopista La Pera-Cuautla, entronque "La Luz" en la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, y el "Entronque Huachichil", en la autopista Puerto México-Carbonera, y uno ubicado en el km. 158+600 de la autopista México-Querétaro.
- Reparación del puente Amacuzac, así como del puente "Río Tembembe" ambos del Camino Directo Puente de Ixtla-Iguala.
- Rehabilitación de las losas de concreto del puente "Apepecho" de la autopista Acayucan-Cosoleacaque.
- Sustitución del sistema de piso del puente "Arroyo Grande" del Camino Directo Las Choapas-Raudales-Ocozocoautla.
- Sustitución y ampliación de superestructura del puente "El Polvorín I", ubicado en el Libramiento Cuernavaca.
- Modernización del alumbrado de los túneles y exteriores de la autopista Acatzingo-Ciudad Mendoza.
- Atención expedita de las emergencias técnicas originadas por fenómenos meteorológicos, en las autopistas: México-Puebla, Reynosa-Matamoros, Estación Don-Nogales, México-Cuernavaca, Cuernavaca-Acapulco, Ciudad Mendoza-Córdoba, Las Choapas-Ocozocoautla, Tijuana-Ensenada, Matamoros-Reynosa, Monterrey-Nuevo Laredo, Saltillo-Torreón, Puerto México-La Carbonera, Acatzingo-Ciudad Mendoza, La Tinaja-Cosoleacaque, Salina Cruz-La Ventosa, Córdoba-Veracruz, entre otras.

Adicionalmente, se realizaron trabajos de Mantenimiento Menor en todos los tramos y puentes carreteros de la Red.

Con el propósito de atender oportunamente las quejas de la Ciudadanía relacionadas con la Obra Pública, se mejoraron los mecanismos de atención y seguimiento, lo que permitió



disminuir la recurrencia de quejas ciudadanas relacionadas con la obra pública, se dio un seguimiento más puntual apegándose a las políticas establecidas, a través de las siguientes acciones:

- Se estableció una política para la atención oportuna de las quejas ciudadanas.
- La política establecida instruye que la atención debe darse a la brevedad, indicando tiempos máximos para atención, siempre que por la naturaleza de la queja éstos sean posibles.
- Actualmente, todas las quejas han sido atendidas:
  - ✓ A la brevedad (entre un plazo que va de horas hasta un máximo de 10 días dependiendo de la complejidad de los trabajos) cuando la reparación es factible.
  - ✓ Con una comunicación informando sobre las acciones que se habrán de tomar, cuando la queja no es factible que se atienda en el corto plazo. (por ejemplo, abrir un nuevo cuerpo, construir un puente o un retorno, etc.).





**X. Informe final del servidor público de la Entidad responsable de la ejecución del Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de Infraestructura (FNI).**

La presencia institucional de Capufe en la operación, mantenimiento y administración de caminos y puentes de cuota representó aproximadamente el 50 por ciento de la Red Federal de Autopistas de Cuota y el 75 por ciento de la Red Nacional de Puentes de Cuota, manteniendo a la Entidad como uno de los operadores más grandes del mundo, el primero a nivel nacional.

Dentro de las principales actividades realizadas, adicionalmente a las rutinarias de mantenimiento menor, destacan por su importancia las relativas a:

- Rehabilitación de pavimentos mediante losas de concreto hidráulico.
- Atención a puntos negros (sitios de alta siniestralidad)
- Construcción de bandas de alerta vibratoria.

Colocación de señalamiento horizontal y vertical.

- Estabilización de cortes.
- Colocación de malla antideslumbrante.
- Mejoramiento de entronques.
- Colocación de barrera central.
- Adecuación y construcción de rampas de emergencia.
- Suministro y colocación de defensa metálica.
- Suministro y colocación de riego sellador.
- Señalamiento específico en zonas de obra.
- Suministro e instalación de barreras de cables.
- Colocación de indicadores, vialetas y botones.

La implementación de este programa ha permitido ampliar la cobertura de los transportes en todas sus modalidades, modernizar la infraestructura y proporcionar servicios confiables y de calidad para toda la población asegurando que exista la infraestructura necesaria para que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios básicos, a los mercados regionales, nacionales e internacionales y a las comunicaciones.



## XI. Glosario

- **SCT.-** Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- **CAPUFE.-** Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión otorgada en términos de las disposiciones legales aplicables, los caminos y puentes federales que ha venido operando, así como los que en el futuro se construyan con cargo a su patrimonio o le sean entregados para tal objeto.
- **Red Propia.-** Conjunto de carreteras y puentes que forman parte del patrimonio propio del Organismo.
- **Trabajos de Mantenimiento Mayor y Menor.-** Actividades que se realizan en los caminos y/o puentes, como resultado de la celebración de un contrato de obra pública, que permite mantener un nivel de servicio satisfactorio a los usuarios que transitan por los caminos y puentes a cargo de CAPUFE.
- **HDM-4.-** Highway Development and Management System). Programa informático que contiene los modelos para crear escenarios (pronóstico) para cada una de las alternativas tipo de conservación de carreteras que se especifique, incluyendo la opción de dejar el pavimento sin conservación.
- **IRI.-** Índice de rugosidad internacional, consiste en medir la regularidad superficial de un camino.
- **Indicadores de Calidad.-** Son valores numéricos obtenidos de auscultaciones o inspecciones, a la red de autopistas, los cuales permiten evaluar de forma objetiva los trabajos de conservación de la red carretera.
- **Obra Pública.-** Trabajos que tienen por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles.
- **Servicios relacionados con las mismas.-** Los servicios que tiene por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra, las investigaciones estudios, asesorías y consultorías, la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones.



- **Parámetro de regular a buen estado.**- Calificación predeterminada en la escala de 400 a 450 puntos que se le asigna a un camino, conforme a la importancia del daño o deficiencia determinada según la escala de calificaciones editada por la SCT.
- **Programa de Mantenimiento y Modernización de la Red:** Se integra por los Programas de Mantenimiento Mayor, Mantenimiento Menor de las autopistas y de los puentes, a contrato, y el de modernización.
- **Sistema de Gestión de Pavimentos.**- Los Sistemas de Administración de Pavimentos son un conjunto de herramientas, cuyo objetivo principal es la racionalización de la inversión en la conservación de pavimentos para beneficio de la sociedad.
- **Siniestralidad.**- Frecuencia o índice de accidentalidad y sus consecuencias que se producen en un lugar determinado.
- **Mdp.**- Millones de pesos.
- **FNI.**- Fondo Nacional de Infraestructura



## XII. Anexos

No.	Tema	Denominación
1	Relación de Contratos adjudicados para la ejecución de Obra Pública en el ejercicio 2007.	Anexo 1
2	Relación de Contratos adjudicados para la ejecución de Obra Pública en el ejercicio 2008.	Anexo 2
3	Relación de Contratos adjudicados para la ejecución de Obra Pública en el ejercicio 2009.	Anexo 3
4	Relación de Contratos adjudicados para la ejecución de Obra Pública en el ejercicio 2010.	Anexo 4
5	Relación de Contratos adjudicados para la ejecución de Obra Pública en el ejercicio 2011.	Anexo 5
6	Relación de Contratos adjudicados para la ejecución de Obra Pública en el ejercicio 2012.	Anexo 6
7	Seguimiento del Programa de Trabajo Institucional del año 2007 al 2012	Anexo 7



---

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de  
Infraestructura (FNI)**

**Tomo I  
Anexos 1 al 2**

---



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 1**

---

A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page.


RESUMEN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance Financiero (%)		
	Anticipos		Programario Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en término D	Saldo Ejecutado E	Diferencia B - C - D - E	Ejecutado a Flujos de Efectivo		Retenciones - Devoluciones	Ajuste de Costos Propuestos
	Clorobios	Anticipos									
Tijuana	\$ 56,656,168.41	\$ 10,062,834.34	\$ 56,656,168.41	\$ 55,537,327.69		\$ 1,098,840.72		\$ 55,950,656.86	\$ 2,651.51	\$ 293,329.17	
Culiacán	\$ 349,413,384.82	\$ 79,595,173.15	\$ 349,413,384.82	\$ 331,899,645.33		\$ 17,513,749.49		\$ 335,405,841.12	\$ 2,361,814.53	\$ 2,070,405.59	
Querétaro	\$ 272,151,704.94	\$ 60,788,883.03	\$ 272,151,704.94	\$ 266,591,409.37		\$ 5,610,295.57		\$ 267,105,107.11	\$ 285,249.20	\$ 523,697.74	
Cuernavaca	\$ 935,470,113.44	\$ 105,432,319.93	\$ 935,470,113.44	\$ 680,199,244.73		\$ 75,270,868.71		\$ 947,066,505.60	\$ 1,923,156.53	\$ 72,140,912.04	
Puebla	\$ 750,046,170.44	\$ 145,869,082.69	\$ 750,046,170.44	\$ 560,610,938.28		\$ 190,235,234.16		\$ 666,972,573.47	\$ 1,702,170.75	\$ 70,486,684.91	
Coahuila de Zaragoza	\$ 211,536,366.35	\$ 54,005,000.02	\$ 211,536,366.35	\$ 209,026,258.36		\$ 2,510,110.99		\$ 211,595,180.09	\$ 3,103,276.98	\$ 2,632,924.72	
Veracruz	\$ 410,255,571.18	\$ 90,278,351.43	\$ 410,255,571.18	\$ 390,863,762.03		\$ 19,391,809.15		\$ 537,222,937.26	\$ 538,740.91	\$ 142,053,007.73	
Reynosa	\$ 11,843,683.21	\$ 1,248,190.37	\$ 11,843,683.21	\$ 11,843,392.14		\$ 291.07		\$ 11,843,392.14			
Guadalajara	\$ 311,753,713.88	\$ 53,766,603.69	\$ 311,753,713.88	\$ 251,022,766.42		\$ 60,730,947.46		\$ 290,779,543.44	\$ 1,859,831.49	\$ 943,533.22	
Monterrey	\$ 161,528,320.98	\$ 18,714,699.71	\$ 161,528,320.98	\$ 179,725,447.49		\$ 1,803,473.49		\$ 180,669,866.20	\$ 168,301.85	\$ 415,522.45	
Chiapas	\$ 555,224,791.10	\$ 106,950,876.06	\$ 555,224,791.10	\$ 474,580,219.95		\$ 80,644,571.25		\$ 504,678,007.49	\$ 11,409,606.04	\$ 15,174,627.57	
Oaxaca	\$ 262,498,583.23	\$ 43,352,664.36	\$ 262,498,583.23	\$ 255,418,688.76		\$ 7,079,896.47		\$ 256,387,612.13	\$ 371,350.53	\$ 1,260,925.37	
<b>TOTALES</b>	\$ 4,309,219,181.98	\$ 783,791,027.61	\$ 4,309,219,181.98	\$ 3,847,329,093.45		\$ 461,890,088.53		\$ 4,235,940,242.90	\$ 23,726,150.22	\$ 308,003,570.51	
Otros Pagos 2007						\$		\$		\$ 13,738,581.35	
<b>Total General</b>						\$		\$		\$ 4,249,678,824.25	

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

■ <60% ■ 60% < ■ <80% ■ 80% < ■ <100% ■ = 100%



00032

001



Colificación / Tramo	Mantenimiento Mayor Puentes		Mantenimiento Menor Puentes		Modernización		Emergencias Técnicas		Total
	Supervisión	Mantenimiento Mayor Puentes	Supervisión	Mantenimiento Menor Puentes	Supervisión	Modernización	Supervisión	Emergencias Técnicas	
<b>TJUJANA</b>									
Tijuana - Ensenada	\$ 26,972,669.33	\$ 580,109.34	\$ 4,627,982.07	\$ 962,737.87	\$ 221,629.38	\$ 528,464.98	\$	\$	\$ 34,389,996.26
La Rumorosa - Tecate	\$	\$	\$ 3,420,269.70	\$ 845,032.06	\$ 152,143.99	\$ 474,848.75	\$	\$	\$ 5,892,394.26
Libramiento Los Cabos	\$ 11,877,268.00	\$ 679,186.52	\$ 1,737,841.87	\$ 548,986.46	\$ 112,241.01	\$ 68,339.95	\$	\$	\$ 15,473,914.77
<b>Total Tijuana</b>	\$ 38,849,427.00	\$ 1,259,376.86	\$ 9,812,094.74	\$ 2,054,039.44	\$ 485,970.32	\$ 1,054,447.68	\$	\$	\$ 55,357,327.00
<b>CULIACÁN</b>									
Estación Don. Nogales	\$ 67,241,291.00	\$ 3,126,873.78	\$ 11,287,166.07	\$ 1,971,711.79	\$ 1,682,615.92	\$ 709,444.33	\$ 1,091,020.14	\$	\$ 109,589,127.20
Mazatlán - Culiacán	\$ 264,974,976.00	\$ 4,769,039.07	\$ 11,892,769.06	\$ 1,019,229.27	\$ 900,119.10	\$ 530,803.44	\$ 1,320,233.00	\$ 1,249,110.00	\$ 226,240,516.13
<b>Total Culiacán</b>	\$ 332,216,267.00	\$ 8,895,912.85	\$ 23,180,935.13	\$ 2,990,941.06	\$ 2,684,731.82	\$ 1,240,247.77	\$ 2,411,253.14	\$ 2,498,220.00	\$ 331,999,643.23
<b>QUERÉTARO</b>									
León - Lagos de Moreno - Aguascalientes	\$	\$	\$ 5,651,059.91	\$ 476,620.81	\$	\$	\$	\$	\$ 7,724,680.03
Libramiento Noroeste de Querétaro	\$ 6,090,072.15	\$ 577,323.14	\$ 3,143,299.90	\$ 410,209.46	\$	\$ 201,179.20	\$	\$	\$ 10,551,795.49
Chamapa - Lechería	\$	\$	\$ 3,928,462.23	\$ 486,450.02	\$	\$ 2,403,148.20	\$	\$	\$ 6,818,062.47
Páezcaro - Uruapan	\$ 14,029,023.37	\$ 2,817,741.92	\$ 4,973,389.40	\$ 527,142.93	\$ 935,339.50	\$ 441,729.48	\$	\$	\$ 23,228,478.20
Uruapan - Nueva Italia	\$ 11,569,698.27	\$ 1,242,469.87	\$ 4,600,467.00	\$ 911,205.29	\$	\$ 266,301.22	\$	\$	\$ 19,210,471.77
Nueva Italia - Lázaro Cárdenas	\$ 35,337,592.31	\$ 779,000.10	\$ 6,690,205.49	\$ 597,020.14	\$ 1,273,024.05	\$ 526,703.47	\$	\$ 33,493,916.83	
México - Querétaro (Tonalcapa - Páimillas)	\$ 20,109,205.06	\$ 2,659,462.47	\$ 9,994,201.02	\$ 910,037.69	\$	\$ 1,178,206.20	\$	\$	\$ 45,417,998.86
México - Querétaro (Páimillas - Querétaro)	\$ 64,005,027.52	\$ 3,500,041.19	\$ 5,891,197.75	\$ 450,183.05	\$	\$ 3,896,159.52	\$	\$	\$ 74,997,132.00
Querétaro - Irapuato	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Varios Tramos	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>Total Querétaro</b>	\$ 161,129,420.10	\$ 10,185,504.48	\$ 50,891,255.11	\$ 4,370,152.26	\$ 10,402,704.75	\$ 6,753,621.59	\$ 2,224,449.70	\$ 8,004,795.23	\$ 206,561,403.77
<b>GUERRAVACA</b>									
México - Cuernavaca	\$ 4,749,325.74	\$	\$ 2,979,199.99	\$	\$	\$ 1,798,569.40	\$ 223,334.87	\$	\$ 9,697,729.22
Libramiento Cuernavaca	\$ 263,965.52	\$	\$ 991,231.32	\$	\$	\$ 51,294.55	\$	\$ 26,827,221.44	\$ 28,334,609.06
Cuernavaca - Acapulco	\$ 309,006,320.64	\$ 5,737,499.60	\$ 11,981,069.08	\$ 7,856,829.00	\$ 2,156,727.91	\$ 4,915,656.52	\$ 19,916,237.94	\$	\$ 358,266,680.57
Puerto de Ixtá - Iguala	\$ 216,007,047.17	\$ 8,429,221.05	\$ 2,179,245.01	\$	\$	\$ 219,309.00	\$	\$	\$ 227,616,027.93
La Para - Cuauila	\$ 122,437,995.00	\$ 4,095,349.50	\$ 2,480,329.83	\$ 44,023,257.95	\$	\$ 110,872.07	\$	\$	\$ 176,732,509.35
Zacapanal - Rancho Viejo	\$ 41,497,047.00	\$ 3,100,376.00	\$ 3,180,529.02	\$	\$	\$ 9,332,952.77	\$	\$	\$ 54,144,219.00
Rancho Viejo - Taxco	\$ 809,000.00	\$	\$ 1,932,403.18	\$	\$ 47,774.04	\$ 28,499.30	\$	\$	\$ 2,896,676.15
Varios Tramos	\$ 94,435,199.21	\$ 23,266,427.72	\$ 74,625,495.84	\$ 4,975,432.24	\$ 45,397,814.12	\$ 1,181,816.74	\$ 2,223,487.37	\$ 46,442,600.28	\$ 189,190,244.73
<b>Total Cuernavaca</b>	\$ 944,325,199.21	\$ 33,266,427.72	\$ 94,625,495.84	\$ 11,875,121.24	\$ 69,270,214.12	\$ 14,765,797.79	\$ 2,223,487.37	\$ 46,442,600.28	\$ 209,079,255.36
<b>PUEBLA</b>									
México - Puebla	\$ 60,136,507.64	\$ 3,297,020.00	\$ 13,904,111.05	\$ 1,970,041.04	\$ 759,002.30	\$ 4,843,421.02	\$ 315,745.20	\$	\$ 151,282,048.19
Puebla - Atlix	\$ 347,326,899.43	\$ 12,497,293.90	\$ 10,819,699.52	\$ 605,402.69	\$ 2,543,568.74	\$ 899,052.43	\$ 825,897.49	\$	\$ 374,857,887.47
Acetzilingo - CD. Mendoza	\$ 20,307,475.00	\$ 941,317.07	\$ 3,519,463.20	\$ 750,877.64	\$ 1,450,003.00	\$ 991,177.10	\$ 175,005.72	\$	\$ 34,690,120.71
<b>Total Puebla</b>	\$ 433,829,727.00	\$ 16,736,212.77	\$ 27,643,183.57	\$ 3,331,325.34	\$ 60,799,259.15	\$ 2,278,511.32	\$ 6,044,074.53	\$ 315,745.20	\$ 506,910,930.26
<b>CD. ATZACOLCO</b>									
Champón - Campeche	\$ 31,202,723.54	\$ 520,952.07	\$ 2,945,247.19	\$ 555,940.87	\$ 622,607.23	\$ 322,749.00	\$ 100,407.00	\$	\$ 38,416,821.82
La Tinaja - Cochochoque (Tramo Isla-Acyruca)	\$ 2,684,094.26	\$	\$ 4,932,691.57	\$ 644,085.69	\$ 1,674,277.77	\$ 302,429.01	\$	\$	\$ 10,240,179.24
Acyruca - Cochochoque	\$ 28,997,174.49	\$ 1,659,493.42	\$ 3,169,132.14	\$ 590,559.74	\$ 1,204,015.21	\$ 353,359.01	\$ 2,036,294.44	\$ 6,829,210.70	\$ 45,249,016.15
Agua Dulce - Cárdenas	\$ 15,809,000.64	\$ 1,307,418.03	\$ 5,890,847.15	\$ 562,170.86	\$ 1,131,734.79	\$ 330,357.94	\$ 885,447.62	\$	\$ 25,343,893.27
Salina Cruz - La Ventosa	\$ 17,093,794.35	\$ 2,809,252.10	\$ 3,649,225.90	\$ 987,420.30	\$ 1,966,879.12	\$ 519,252.70	\$ 1,199,929.68	\$	\$ 28,642,688.47
Puerto El Zecolal	\$ 96,626,857.56	\$ 6,519,213.62	\$ 21,451,051.24	\$ 3,959,790.45	\$ 55,522,355.49	\$ 4,645,184.95	\$ 300,877.25	\$ 609,520.20	\$ 122,229,032.20
<b>Total Coahuila</b>	\$ 165,829,973.19	\$ 11,146,841.56	\$ 43,929,295.95	\$ 7,497,987.05	\$ 67,279,018.11	\$ 10,462,811.12	\$ 2,002,079.37	\$ 6,839,020.90	\$ 203,917,938.34

Delegación / Tramo	Manejo Mayor	Supervisión	Manejo Menor	Supervisor	Manejo Mayor Puentes	Supervisión	Manejo Menor Puentes	Supervisión	Reconstrucción	Supervisión	Emergencias Técnicas	Total
<b>VERACRUZ</b>												
Cd. Minicoba - Corroba	\$ 9,653,308.28	\$ 1,113,165.00	\$ 2,000,270.71	\$ 422,912.25					\$ 1,504,505.77	\$ 90,779.01		\$ 16,780,934.78
Corroba - Veracruz	\$ 24,020,572.98	\$ 821,132.85	\$ 4,522,000.84	\$ 465,629.09	\$ 2,504,000.23				\$ 2,041,859.43	\$ 612,317.00	\$ 397,971.06	\$ 30,544,337.34
La Tinaja - Cosoleacaque (Tramo La Tinaja - H)	\$ 190,398,975.96	\$ 11,170,884.12	\$ 3,093,892.75	\$ 490,227.32	\$ 96,594,854.77	\$ 8,970,298.01			\$ 4,333,549.45	\$ 697,294.30	\$ 950,181.50	\$ 324,651,788.00
Libramiento Perifoneo Tampico	\$ 667,078.97		\$ 1,022,456.89	\$ 693,498.89	\$ 3,886,929.78				\$ 389,048.85	\$ 262,313.24	\$ 894,616.33	\$ 7,576,229.35
Cuflirmez Zamora - Tihuelán	\$ 1,970,534.02	\$ 222,143.00	\$ 1,448,335.51	\$ 413,620.21					\$ 864,077.05	\$ 190,400.04	\$ 594,000.23	\$ 5,305,241.26
<b>Total Veracruz</b>	\$ 235,235,067.81	\$ 13,435,496.85	\$ 13,020,936.48	\$ 2,396,891.25	\$ 103,783,587.88	\$ 9,878,250.41			\$ 10,191,003.15	\$ 2,466,179.99	\$ 2,488,648.79	\$ 309,803,902.83
<b>REYNOSA</b>												
Matamoros - Reynosa	\$ 4,160,017.71	\$ 278,420.59	\$ 2,519,183.62	\$ 420,838.97					\$ 1,828,324.41	\$ 324,018.97	\$ 181,001.03	\$ 9,541,415.81
Puente Internacional Reynosa - Pharr									\$ 277,195.36	\$ 294,790.00		\$ 571,985.36
Puente Internacional Ignacio Zaragoza									\$ 305,132.00	\$ 240,895.74	\$ 240,094.75	\$ 1,000,099.97
<b>Total Reynosa</b>	\$ 4,160,017.71	\$ 278,420.59	\$ 2,519,183.62	\$ 420,838.97					\$ 2,306,641.88	\$ 819,202.51	\$ 1,022,895.27	\$ 11,543,297.14
<b>GUADALAJARA</b>												
Guadalajara - Tepic	\$ 182,860,006.17	\$ 4,449,001.97	\$ 3,889,019.56	\$ 1,482,716.14					\$ 1,207,408.04	\$ 575,917.47	\$ 7,059,902.17	\$ 210,231,097.00
Maravillo - Zapotlaneo			\$ 22,999,919.41	\$ 1,571,225.10					\$ 1,264,746.88	\$ 929,494.03		\$ 26,765,232.42
Zapotlaneo - Ocuajalajara			\$ 2,022,411.68	\$ 483,230.28					\$ 506,156.89	\$ 212,511.40		\$ 3,064,006.17
Zapotlaneo - Lagos de Moreno			\$ 8,227,457.11	\$ 968,281.48					\$ 443,108.72	\$ 371,009.40		\$ 10,470,276.77
<b>Total Guadalajara</b>	\$ 182,860,006.17	\$ 4,449,001.97	\$ 43,333,693.56	\$ 4,333,223.06					\$ 2,221,546.73	\$ 2,880,613.26	\$ 7,839,902.17	\$ 251,022,786.42
<b>MONTERREY</b>												
Monterrey - Nuevo Laredo	\$ 1,004,080.95		\$ 14,480,849.80	\$ 847,429.81					\$ 1,204,029.63	\$ 201,212.10	\$ 1,022,449.27	\$ 20,880,224.16
Terminó - Sotillo	\$ 1,466,191.30		\$ 7,792,209.87	\$ 660,837.91					\$ 986,782.77	\$ 203,930.88	\$ 482,871.55	\$ 11,777,254.19
Carbonera - Ojo Caliente			\$ 2,170,350.76	\$ 620,269.97					\$ 102,874.77	\$ 63,302.39	\$ 308,143.49	\$ 3,295,196.27
Cadereyta - Reynosa	\$ 41,226,630.60	\$ 1,001,174.45	\$ 9,889,767.34	\$ 687,894.82					\$ 1,214,750.00	\$ 443,225.51	\$ 543,885.49	\$ 54,898,254.24
Comas Paucico - Corralitos	\$ 21,871,004.05	\$ 884,271.28	\$ 8,092,891.12	\$ 686,273.32					\$ 286,371.81	\$ 108,211.79	\$ 663,873.38	\$ 32,644,487.35
Puerto México - Carbonera	\$ 46,005,195.70	\$ 331,077.91	\$ 3,457,318.74	\$ 733,830.01					\$ 1,427,778.85	\$ 74,129.74	\$ 517,004.20	\$ 52,141,943.31
Vientos Tramos											\$ 4,090,395.77	\$ 4,090,395.77
<b>Total Monterrey</b>	\$ 116,647,002.88	\$ 3,416,522.24	\$ 43,784,482.63	\$ 4,262,871.84					\$ 4,204,439.83	\$ 1,213,932.41	\$ 9,028,788.15	\$ 179,726,487.45
<b>CHIAPAS</b>												
Las Chispas - Raucoles - Ocozacoatlán	\$ 438,112,329.73	\$ 17,841,261.23	\$ 6,159,471.92	\$ 1,299,102.91	\$ 542,074.28				\$ 1,272,623.05	\$ 990,209.60	\$ 5,008,178.95	\$ 474,580,219.85
<b>Total Chiapas</b>	\$ 438,112,329.73	\$ 17,841,261.23	\$ 6,159,471.92	\$ 1,299,102.91	\$ 542,074.28				\$ 1,272,623.05	\$ 990,209.60	\$ 5,008,178.95	\$ 474,580,219.85
<b>OAXACA</b>												
Cd. Cuicatlan - Oaxaca	\$ 214,727,701.22	\$ 5,944,202.58	\$ 29,518,928.32	\$ 2,195,828.38	\$ 8,842,239.21	\$ 495,878.47			\$ 2,125,439.25	\$ 1,482,344.30	\$ 990,668.87	\$ 255,418,666.76
<b>Total Oaxaca</b>	\$ 214,727,701.22	\$ 5,944,202.58	\$ 29,518,928.32	\$ 2,195,828.38	\$ 8,842,239.21	\$ 495,878.47			\$ 2,125,439.25	\$ 1,482,344.30	\$ 990,668.87	\$ 255,418,666.76
<b>Total General</b>	\$ 2,183,900,785.86	\$ 11,875,532.42	\$ 30,455,457.80	\$ 4,747,483.88	\$ 30,572,820.42	\$ 6,024,822.66	\$ 3,812,720.42	\$ 18,278,310.66	\$ 6,204,424.12	\$ 3,410,627.41	\$ 62,082,380.31	\$ 3,677,263,003.56




RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Contratado A		Anticipos		Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Eliminado en ítem D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance financiero (%)
	Ocupados	Anticipos	Amortizados	Ejercido a Falso de Efectivo						Relaciones - Devoluciones	Ajusto de Costos Pagados		
Tijuana	\$ 38,849,944.46	\$ 7,486,421.57	\$ 7,486,421.57	\$ 38,849,944.46	\$ 38,849,427.69	\$ 516.77	\$ 39,094,556.90	\$ 245,129.21				100.0%	
Culiacán	\$ 283,253,622.38	\$ 63,586,213.71	\$ 63,586,213.71	\$ 263,253,622.38	\$ 272,786,237.84	\$ 10,467,384.54	\$ 274,796,413.30	\$ 2,010,175.46	\$ 1,989,396.70			100.0%	
Quedóxtaro	\$ 165,315,455.83	\$ 43,651,977.53	\$ 43,651,977.53	\$ 165,315,455.83	\$ 161,123,429.18	\$ 4,192,026.65	\$ 161,155,991.95	\$ 32,562.77				100.0%	
Cuernavaca	\$ 769,528,142.34	\$ 110,497,583.23	\$ 110,497,583.23	\$ 769,528,142.34	\$ 694,535,199.21	\$ 74,992,943.13	\$ 781,402,460.06	\$ 72,140,912.04	\$ 1,919,656.70			100.0%	
Puebla	\$ 622,453,484.96	\$ 123,919,636.86	\$ 123,919,636.86	\$ 622,453,484.96	\$ 433,829,727.03	\$ 198,623,757.93	\$ 535,626,269.07	\$ 65,921,590.63	\$ 460,791.58			100.0%	
Coahuila	\$ 99,004,419.37	\$ 27,354,319.60	\$ 27,354,319.60	\$ 99,004,419.37	\$ 96,626,657.58	\$ 2,377,761.79	\$ 96,626,657.58	\$ 1,219,892.67				100.0%	
Veracruz	\$ 251,225,025.98	\$ 50,187,235.82	\$ 46,587,048.33	\$ 251,225,025.98	\$ 233,235,667.61	\$ 17,989,358.37	\$ 371,020,925.65	\$ 134,204,670.55	\$ 101,070.71			100.0%	
Roymosa	\$ 4,100,634.58	\$ 1,248,190.37	\$ 1,248,190.37	\$ 4,160,634.58	\$ 4,160,617.71	\$ 16.87	\$ 4,160,617.71					100.0%	
Guadaluajara	\$ 192,367,357.44	\$ 38,284,007.43	\$ 38,284,007.43	\$ 192,367,357.44	\$ 182,866,606.17	\$ 9,500,751.27	\$ 183,585,039.03	\$ 719,332.86	\$ 376,470.86			100.0%	
Monterrey	\$ 110,947,727.26	\$ 10,972,474.62	\$ 10,972,474.62	\$ 110,947,727.26	\$ 110,347,032.89	\$ 694.37	\$ 111,362,555.34	\$ 415,522.45				100.0%	
Chiapas	\$ 518,574,901.15	\$ 102,036,130.31	\$ 87,112,970.25	\$ 518,574,901.15	\$ 438,112,359.73	\$ 90,462,561.42	\$ 466,056,928.23	\$ 15,021,328.44	\$ 10,968,294.57			100.0%	
Oaxaca	\$ 216,944,903.44	\$ 32,822,280.69	\$ 32,822,280.69	\$ 216,944,903.44	\$ 214,727,761.22	\$ 4,217,142.22	\$ 215,955,960.60	\$ 1,228,183.38				100.0%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,274,625,619.19</b>	<b>\$ 612,065,671.14</b>	<b>\$ 542,961,223.37</b>	<b>\$ 3,274,625,619.19</b>	<b>\$ 2,881,800,703.86</b>	<b>\$ 392,824,915.33</b>	<b>\$ 3,242,844,765.42</b>	<b>\$ 291,939,413.79</b>	<b>\$ 17,035,533.79</b>			<b>100.0%</b>	

Nota: Para la obra de Veracruz, partida RS02407 existe Convenio de Ampliación de recursos por \$184,500,000.00 pero están cargados al ejercicio 2009.

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

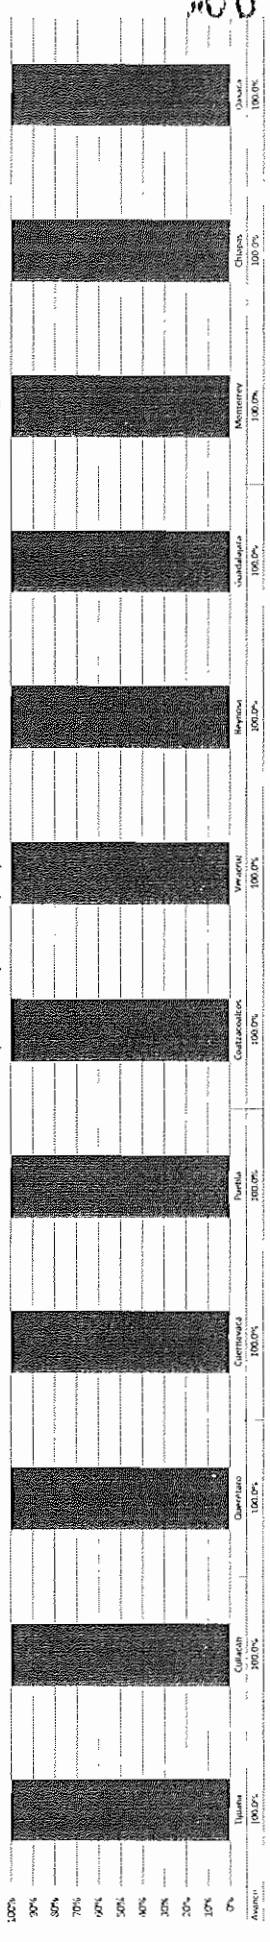

CAMINOS Y PUNTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONJUNTOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puntaje	Cuentas No.	Empresa	Partida de Control	Fin	Concepto	Monto Cuantificado	Diligencia	Actividad	Programa Aprobado	Estrategia de Trabajo	Requisitos de Desempeño	Dimensiones C	Tareas Completadas	Evaluación de Calidad	Avance Financiero (%)	Avance Administrativo (%)	Monto Disponible
<b>Tierras y Canchales</b>																	
1	40000727 40000728		1172200	09042007	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLEN MULACION SUCRO CARBONATA, BLENADO INCLUYE ZONAMIENTO HORIZONTAL DEL NM 10-200 - 0.900 CUBIERTOS Y V-T	790727047		3,264,551	2,534,564.71	20,972,922.87			\$ 604.24		100%		20,972,922.87
<b>Liberacion de Co. Via</b>																	
2	40000727 40000728		1172200	09042007	REHABILITACION DE LOS TERRAPLENES DE ACCESOS A LOS INGRESOS EN LOS NMS 10-200 AL 10-999 LO 10-7000 U 10-8000 U 10-9400 10-9500 LO 10-9600 LO 10-9800 U 10-9900 DEL TRAMO LO 10-8000 U Y RESECCION DE CONTRATACION	18,694,646		2,011,888.00	18,495,434.00	19,495,434.00			\$ -		100%		18,495,434.00
ET-200148	40000727 40000728		0167200	04052006	EMERGENCIA TECNICA REHABILITACION DE TERRAPLENES, ZONAMIENTOS Y TRAMADOS "CHIRIETE"	1,200,245.00			1,200,245.00	1,200,245.00			\$ 42.53		100%		1,200,245.00
ET- Reservacion 2007-24	40000727 40000728		2107200	09112006	DEFINICION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OJIVA EMERGENCIA TECNICA REHABILITACION DE TERRAPLENES, ZONAMIENTOS Y TRAMADOS "MARIETTE"	217,507.59			217,507.59	217,507.59			\$ -		N/A		217,507.59
<b>Carreteras</b>																	
<b>Cabecera Departamento Nariño</b>																	
3	40000727 40000728	COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAN	02072007	04052007	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE LA CALZADA DE PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND A 10% DE LA CALZADA DE LOS INGRESOS Y DEL ZONAMIENTO CANTONAL	31,079,410.00		11,003,026.00	11,003,026.00	30,075,418.00			\$ 7,795.18		100%		30,075,418.00
4	40000727 40000728	COMPAÑIA CONSTRUCTORA MAS	09052007	31042007	RENOVACION DEL PAVIMENTO EN LA ZONA DE ACCESOS AL INGRESO DEL TRAMO CUERPO Y 10-8000 DEL TRAMO LO 11-4000 DEL NM 11-4000 AL 12-1000 CUERPO Y	14,400,776.23		4,279,322.47	14,400,776.23	13,820,079.56			\$ 203,000.43		100%		13,820,079.56
5	40000727 40000728	EMPRESAS MINERALES DEL COCINTE	04052007	14072007	RESECCION DEL TRAZO Y OBRAS DE DEFINICION DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE	12,794,412.91		3,830,323.07	2,784,412.91	11,909,044.00			\$ 843,246.46		100%		11,909,044.00
6	40000727 40000728	RECY	04072007	30042007	MANEJO Y COLOCACION DE VEREDALES JANERIO Y FEBRERO DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE Y OBRAS DE MANTENIMIENTO TRAMO OBRERA - GUAYAMA DEL NM 2400 AL NM 10-200	5,817,202.52		1,740,184.71	5,817,202.52	3,847,202.52			\$ -		100%		3,847,202.52
<b>Marietta, Calacana</b>																	
7	40000727 40000728	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES CALACANA	30072007	30052007	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA DE PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND A 10% DE LA CALZADA DE LOS INGRESOS Y DEL ZONAMIENTO CANTONAL	103,005,243.27		20,790,480.00	103,005,243.27	89,940,000.00			\$ 4,289,600.00		100%		89,940,000.00
8	40000727 40000728	GRUPO APALTES PRECOLAZON	30052007	30052007	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA CALZADA DE PAVIMENTACION CON CEMENTO PORTLAND A 10% DE LA CALZADA DE LOS INGRESOS Y DEL ZONAMIENTO CANTONAL	90,000,000.00		21,900,201.89	100,000,000.00	80,332,101.00			\$ 10,147,328.00		100%		80,332,101.00
<b>Guayama</b>																	
9	40000727	CONSTRUCIONES REYES	14072007	30042007	ALCANTARILLADO Y JUSTIFICACION DE LA INGENIERIA CENTRAL EXISTENTE Y COLOCACION DE MALLA PROTECTORA EQUIVALENTE ENTRE NM 14000 AL NM 17-200	1,600,271.43		570,171.43	1,600,271.43	1,600,271.43			\$ -		100%		1,600,271.43
10	40000727	LATE CONSTRUCTORA	14072007	14072007	RESECCION DEL TRAZO Y OBRAS DE DEFINICION DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE	2,099,833.31		997,199.69	2,099,833.31	2,099,833.31			\$ -		100%		2,099,833.31
11	40000727	GLOBAL	14072007	30052007	RESECCION DEL TRAZO Y OBRAS DE DEFINICION DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE	1,696,497.41			1,696,497.41	1,696,497.41			\$ -		100%		1,696,497.41
<b>Pedernales, Guayama</b>																	
12	40000727	PROYECTO ALUMINIA CONSTRUCCION SUPERFICIE ESPERANZA, GUAYAMA	14072007	14072007	ALCANTARILLADO Y JUSTIFICACION DE LA INGENIERIA CENTRAL EXISTENTE Y COLOCACION DE MALLA PROTECTORA EQUIVALENTE ENTRE NM 14000 AL NM 17-200	513,009.82		163,009.84	513,009.82	513,009.82			\$ -		100%		513,009.82
13	40000727	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES CALACANA	14072007	14072007	RESECCION DEL TRAZO Y OBRAS DE DEFINICION DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE	3,762,534.76		1,727,076.43	3,762,534.76	3,762,534.76			\$ 1.10		100%		3,762,534.76
14	40000727	PROMOTORA Y CONSTRUCION AMENAZ	14072007	14072007	RESECCION DEL TRAZO Y OBRAS DE DEFINICION DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE	2,224,879.59		967,222.07	2,224,879.59	2,224,879.59			\$ -		100%		2,224,879.59
15	40000727	GENI INGENIERIA	14072007	30042007	ACTUALIZACION DEL PROYECTO DE DEFINICION DEL TRAMO HORIZONTALIZADO MARIETTE Y OBRAS DE MANTENIMIENTO TRAMO OBRERA - GUAYAMA DEL NM 2400 AL NM 10-200	1,940,900.00			1,940,900.00	1,940,900.00			\$ -		100%		1,940,900.00
16	40000727	RECY	14072007	14072007	DEFINICION HORIZONTALIZADA Y VERIFICACION DEL NM 14000 AL 14000 INCLUYE RAMAL DEL NM 14000 AL 10-200	4,457,200.51		1,337,200.10	4,457,200.51	4,457,200.51			\$ -		100%		4,457,200.51

CAMINOS Y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Cuenta	Cuenta No.	Empresa	Proyecto de Cuenta	Concepto	Monto Contratado		Cargado	Antes	Amortizado	Pagado	Revisado	Situación en Termino	Mantenciones	Desviaciones	Límite Cuantía	Plazo	Fecha de Pago	Asignación	Avance
					A	B													
17	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
18	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
19	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
20	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
Nueva Parte																			
21	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
22	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
23	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
24	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
25	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
Mantenimiento																			
26	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
27	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
28	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
Mantenimiento																			
29	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
30	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
Mantenimiento																			
31	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
32	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	
33	4000000	CONSTRUCIONES	1000000	1000000	RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100%			500,000.00	100%	2007-01-01	100%	

006 0037















PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Contrato	Centro de Costos	Estructura	Periodo de Ejecucion		Concepto	Monto Contratado	Activos		Ejecucion Acumulada	Diferencia B.C.D.E	Importe Contratado	Descripciones	Asesores	Monto Ingresos de Alta Disponibilidad
			Inicio	Fin			Operativo	Administrado						
ET-2007-12	60000000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	15/02/07	14/11/07	RECONSTRUCCION DE LA ALICANTARILLA DEL TUNEL UBICADO EN EL KM 84+000	1 061 000.00			1 061 000.00		1 061 000.00		100%	
ET-2007-13	60000000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	15/02/07	14/11/07	RECONSTRUCCION DE LA ALICANTARILLA DEL TUNEL UBICADO EN EL KM 84+000	20 000.00			20 000.00		20 000.00		100%	
ET-2007-14	60000000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	15/02/07	14/11/07	RECONSTRUCCION DE LA ALICANTARILLA DEL TUNEL UBICADO EN EL KM 84+000	1 000 000.00			1 000 000.00		1 000 000.00		100%	
<b>SUBTOTAL GENERAL</b>						<b>3 081 000.00</b>			<b>3 081 000.00</b>		<b>3 081 000.00</b>			<b>3 081 000.00</b>
111	60000000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	01/02/07	30/11/07	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE ALCAMBITO HORIZONTAL Y VERTICAL	120 000 000.00		120 000 000.00	120 000 000.00		120 000 000.00		100%	
112	60000000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	01/02/07	30/11/07	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DE ALCAMBITO HORIZONTAL Y VERTICAL	80 000 000.00		80 000 000.00	80 000 000.00		80 000 000.00		100%	
113	60000000	CONSTRUCCION DE CARRETERAS	01/02/07	30/11/07	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL EN ALICANTARILLAS EN LOS KM 100+000 Y 101+000	300 000.00		300 000.00	300 000.00		300 000.00		100%	
<b>SUBTOTAL GENERAL</b>						<b>300 000.00</b>			<b>300 000.00</b>		<b>300 000.00</b>			<b>300 000.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>3 381 000.00</b>			<b>3 381 000.00</b>		<b>3 381 000.00</b>			<b>3 381 000.00</b>

000 0043 012




CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Contratado A		Anticipo		Programado Acumulado B		Estimado Acumulado C		Estimado en Trámite D		Saldo Cancelado E		Diferencia D-C-D+E		Seguimiento al Avance Presupuestal		Avance Financiero (%)	
	Original	Amortizado	Original	Amortizado	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M		
Tijuana	\$ 1,259,376.86				\$ 1,259,376.86	\$ 1,259,376.86							\$ 1,259,376.86					
Culiacán	\$ 8,140,187.30		\$ 702,725.38		\$ 8,140,187.30	\$ 7,895,509.83					\$ 244,677.47		\$ 7,895,509.83	\$ 9,210.49				
Querétaro	\$ 10,184,045.90				\$ 10,184,045.90	\$ 10,184,045.90							\$ 10,184,045.90					
Cuernavaca	\$ 23,356,764.86		\$ 1,514,957.68		\$ 23,356,764.86	\$ 23,266,437.75					\$ 90,327.11		\$ 23,266,437.75	\$ 3,489.83				
Puebla	\$ 16,828,943.17		\$ 1,851,235.36		\$ 16,828,943.17	\$ 16,736,212.77					\$ 92,730.40		\$ 16,736,212.77	\$ 314.06				
Coahuila	\$ 6,810,678.76		\$ 497,159.27		\$ 6,810,678.76	\$ 6,569,215.62					\$ 41,463.14		\$ 6,569,215.62	\$ 12,287.94				
Veracruz	\$ 13,472,031.43		\$ 1,304,777.51		\$ 13,472,031.43	\$ 13,435,406.85					\$ 36,624.58		\$ 13,435,406.85					
Morelia	\$ 278,429.50				\$ 278,429.50	\$ 278,429.50							\$ 278,429.50					
Guadalupe	\$ 4,849,061.91				\$ 4,849,061.91	\$ 4,849,061.91							\$ 4,849,061.91					
Morelia	\$ 3,616,522.74		\$ 350,463.22		\$ 3,616,522.74	\$ 3,616,522.74							\$ 3,616,522.74					
Chiapas	\$ 18,023,104.41		\$ 1,126,242.15		\$ 18,023,104.41	\$ 17,941,301.25					\$ 181,803.16		\$ 17,941,301.25	\$ 89,776.88				
Oaxaca	\$ 6,449,567.99		\$ 549,578.43		\$ 6,449,567.99	\$ 5,944,262.56					\$ 505,305.43		\$ 5,944,262.56	\$ 40,795.99				
<b>TOTAL</b>	\$ 113,063,714.83		\$ 7,897,139.00		\$ 113,063,714.83	\$ 111,875,332.42					\$ 1,193,382.41		\$ 111,875,332.42	\$ 115,099.20				\$ 1,595,562.39

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No Incluye anticipos)



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Perfil	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programado Acumulado B	Estimado en Trámite D	Reservaciones - Devoluciones E	Devoluciones E	Saldo Cancelado F	Diferencia D-F-D-E	Dijecio a Filio de Cuobro	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Alinea de Contos U
		Inicio	Fin			Orogado	Amortizado									
<b>Tijuana</b>																
<b>Tijuana - Ensenada</b>																
15	450007355 500002079	05/12/2008	05/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE REVELACION, BACHEO, CARPETA FRIEDA Y CEMENTO PORTLAND EN LOS RAMALES DE LA CARRETERA FEDERAL FEDERAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL KM 02+000 - 02+900 CUERPO "A" Y "B"	\$ 500,199.34	\$ 500,199.34	\$ 500,199.34	\$ 500,199.34	\$ 500,199.34	\$	\$	\$	\$	\$ 500,199.34	100.00	\$
<b>Libramiento Los Cabos</b>																
25	450007372 500002083	27/11/2008	21/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DE LOS TERRAPLENOS EN LOS RAMALES DE LA CARRETERA FEDERAL FEDERAL INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL KM 10+000 AL 10+450 DEL KM 10+450 AL 10+700 U	\$ 970,100.52	\$ 970,100.52	\$ 970,100.52	\$ 970,100.52	\$ 970,100.52	\$	\$	\$	\$	\$ 970,100.52	100.00	\$
<b>Culiacan</b>																
<b>Estación Don - Nogales</b>																
35	450007352 500002075	15/01/2007	15/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 20 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DEL KM 0+000 AL KM 21+900 CUERPO "B"	\$ 960,493.42	\$ 960,493.42	\$ 960,493.42	\$ 960,493.42	\$ 960,493.42	\$ 101.34	\$	\$ 493.30	\$	\$ 960,050.08	100.00	\$
45	450007355 500002077	30/01/2007	15/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 20 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 10 CM DEL KM 0+000 AL KM 10+000 DEL KM 10+000 AL 134+000 DEL KM 10+000 DEL 210+000 AL 219+000 CUERPO "A" Y DEL KM 0+000	\$ 940,570.42	\$ 940,570.42	\$ 940,570.42	\$ 940,570.42	\$ 940,570.42	\$ 101.81	\$	\$	\$	\$ 940,570.42	100.00	\$
55	450007361	15/01/2007	17/07/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA RECTIFICACION DEL TRAZO Y CURVAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 171+000 CUERPO "B" DEL TRAMO HERMOSELLO MACALENA	\$ 88,071.02	\$ 88,071.02	\$ 88,071.02	\$ 88,071.02	\$ 88,071.02	\$ 609.95	\$	\$	\$	\$ 88,071.02	100.00	\$
65	450007354 500002076 500002070	15/01/2007	15/10/2007	SUPERVISION DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL TRAMO ESTACION DON - OBREGON KM 0+000 AL KM 22+725 TRAMO OBREGON - CUATRAMAS KM 0+000 AL KM 107+000	\$ 918,954.95	\$ 918,954.95	\$ 918,954.95	\$ 918,954.95	\$ 918,954.95	\$ 2,100.99	\$	\$ 4.00	\$	\$ 918,954.95	100.00	\$
<b>Mazatlan - Culiacan</b>																
75	450007366 500002070	15/01/2007	05/11/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 0+000 AL KM 20+000 CUERPO "A" Y "B"	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 6,073.82	\$	\$ 180,127.54	\$	\$ 2,054,484.10	100.00	\$
85	450007370 500002074	15/01/2007	19/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 20+000 AL KM 50+000 CUERPO "B"	\$ 150,210.70	\$ 150,210.70	\$ 150,210.70	\$ 150,210.70	\$ 150,210.70	\$ 301.50	\$	\$ 55,050.74	\$	\$ 1,814,141.80	100.00	\$
<b>Quetzaro</b>																
<b>Libramiento Nuevito de Cuetzaro</b>																
95	450007320	01/01/2007	19/05/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 0+000 AL KM 19+000 CUERPO "A"	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$ 200,306.32	\$	\$	\$	\$	\$ 200,306.32	100.00	\$
105	450007310	01/01/2007	30/07/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 19+000 CUERPO "B"	\$ 200,707.00	\$ 200,707.00	\$ 200,707.00	\$ 200,707.00	\$ 200,707.00	\$	\$	\$	\$	\$ 200,707.00	100.00	\$
<b>Pitiquito - Uruapan</b>																
120	450007352	01/01/2007	12/05/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 0+000 AL KM 21+900 CUERPO "A"	\$ 210,300.30	\$ 210,300.30	\$ 210,300.30	\$ 210,300.30	\$ 210,300.30	\$	\$	\$	\$	\$ 210,300.30	100.00	\$
130	450007315	01/01/2007	30/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 0+000 AL KM 21+900 CUERPO "B"	\$ 800,400.00	\$ 800,400.00	\$ 800,400.00	\$ 800,400.00	\$ 800,400.00	\$	\$	\$	\$	\$ 800,400.00	100.00	\$
145	450007319	01/01/2007	30/07/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 21+900 RAMAL "A"	\$ 600,401.10	\$ 600,401.10	\$ 600,401.10	\$ 600,401.10	\$ 600,401.10	\$	\$	\$	\$	\$ 600,401.10	100.00	\$
160	450007322	01/01/2007	30/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DEL PAVIMENTO 30 CM DE BASE MEJORADA CON CEMENTO PORTLAND AL 4% DE SU P.V.S.M Y CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DEL KM 1+000 AL 19+000	\$ 300,375.37	\$ 300,375.37	\$ 300,375.37	\$ 300,375.37	\$ 300,375.37	\$	\$	\$ 91.09	\$	\$ 300,375.37	100.00	\$

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado	Anticipo		Programado Acumulado	Caldado Acumulado	Estimado en Termino	Relaciones - Devoluciones	Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia B - C - D - E	Ejecutado a Fin de Ejercicio	Avance Inocurrido (%)	Monto pagado de Ajuste de Costos							
		Inicio	Fin			Diario	Amortizado																	
<b>Uruguay - Nueva Estia</b>																								
175	400007525	01/01/2007	15/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD, ADICCION Y HABILITACION DE SUDOREN EN KM 113+250 AL KM 113+500.	420,940.33			420,940.33	420,940.33							420,940.33								
180	400007520	01/01/2007	15/07/2007	TREATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE REVELACION, BACHEO Y RECO DE SELLO INCLUYE SEÑALAMIENTO	677,968.79			677,968.79	677,968.79							677,968.79								
205	400007525	01/01/2007	15/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, C, INDUCTIVO DEL KM 134+000 AL 310+750	143,487.75			143,487.75	143,487.75							143,487.75								
<b>Nuevo Italis - Llanero Cadenas</b>																								
215	400007531	01/01/2007	30/05/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL E INDUCTIVO DEL KM 154+000 AL 310+750	779,600.10			779,600.10	779,600.10							779,600.10								
<b>México - Querétaro</b>																								
220	400007540 500002910 500002913	01/01/2007	13/11/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD REPARACION DE LOGAS DE CONCRETO HORILLADO, REPARACION DE JUNTAS CON REFRIGERANTE EN LOGAS DE CONCRETO HORILLADO, CON MORTERO DE ALTA RESISTENCIA EN PALMILLAS, QUERETARO	1,101,586.86			1,101,586.86	1,101,586.86				339.00			1,101,586.86								
245	400007528 500002763	10/05/2007	20/05/2007	SUPERVISION DE LA OBRA SUSTITUCION DE DEFENSA METALICA CON SISTEMA DE AMORTIGUAMIENTO DEL TRAMO PALMILLAS, QUERETARO	313,857.27			313,857.27	313,857.24				0.23			313,857.24								
245	400007540 500002907	01/01/2007	15/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO METALICA DE D05 Y TREC CREGTAS EN PALMILLAS QUERETARO	943,274.27			943,274.27	943,274.27							943,274.27								
<b>Queretaro - Inpuerto</b>																								
265	400007542 500002909	01/01/2007	14/02/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL 3+000 AL 104+750.	360,814.30			360,814.30	360,814.30							360,814.30								
270	400007543 500002915	01/01/2007	25/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD CARPETA DELGADA DEL KM 32+000 AL KM 105+000 CUERPO A INCLUYENDO SEÑALAMIENTO HORIZONTAL (SOBRE REHABILITACIONES ANTERIORES).	2,160,020.04			2,160,020.04	2,160,020.04							2,160,020.04								
285	400007544 500002924	01/01/2007	13/07/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD REHABILITACION DE LA ESTRUCTURA DEL CUERPO A Y BAJA DEL KM 105+000 AL 107+000 OBRAS COMPLEMENTARIAS (BARRAS, BORDILLOS Y CONTRACUNETAS) DEL KM 03+000 AL KM 60+000 CUERPO A.	966,207.25			966,207.25	966,207.25							966,207.25								
<b>Subtotal Querétaro</b>																								
					10,154,045.00			10,154,045.00	10,153,264.28				461.12			10,153,264.28								
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																								
315	400007504 500002910 500003000	02/01/2007	15/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA ESTABILIZACION DE 6 CURTES UBICADOS EN LOS KM 209+000 CUERPO A, KM 203+000 CUERPO A, KM 209+150 CUERPO A Y KM 257+000 CUERPO A Y B	132,374.03			132,374.03	132,374.03							132,374.03								
3FAC02007	400006983 500002914	10/02/2008	25/11/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION Y RENOVACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CARRILES DE ALTA Y BAJA DEL KM 105+000 AL KM 222+000 CUERPOS "A" Y "D" Y CARPETA DELGADA ALTERNANTE ADHERIDA, finalizada en 2008	3,494,610.81			3,494,610.81	3,494,610.81							3,494,610.81								
<b>La Plata - Ciautla</b>																								
505	400007545	20/12/2006	10/01/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA REHABILITACION Y RENOVACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CARRILES DE ALTA Y BAJA DEL KM 209+150 CUERPO UNICO DEL CAMINO DIRECTO	4,908,249.58			4,908,249.58	4,908,249.58							4,908,249.58								
<b>Puerto de Itila - Itash</b>																								
515	400007569 500002910	05/01/2007	17/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA REHABILITACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 0+000 AL KM 20+000 Y SOLUCION DEL SUPERVALE DEL KM 23+485 AL KM 25+982 INCLUYE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	270,195.56			270,195.56	270,195.56							270,195.56								
																3,490.03								
																60,307.87								
																4,908,249.58								
																5,220,001.58								



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA REO DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado D	Estimado Acumulado C	Evaluado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Devoluciones C	Saldo Cancelado F	Diferencia D - C - D - E	Cajada a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Alícuota de Costos G
		Inicio	Fin			Obrigado	Amortizado										
525	4500007547 5000003592 5000003591	25/12/2006	19/10/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DE REHABILITACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL DEL VINCULO 10+000 AL 10+400 DEL CARRILLO AL LADO HORIZONTAL Y VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	4,200,020.00 \$	352,150.00 \$	352,150.00 \$	4,200,020.00 \$	4,200,020.00 \$						4,200,020.00 \$		
Zapotitlan - Rancho Viejo																	
535	4500007095 5000002790 5000003224	12/02/2007	29/03/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO, SOLUCION DEL SUDORNALE LONGITUDINAL DEL KM 9+000 AL KM 17+124 Y SOLUCION DEL DRENAJE KM 11+330 AL KM 2+970 KM 3+540 AL KM 3+800, KM 8+300 AL KM 9+400	3,100,370.00 \$	257,205.64 \$	257,205.64 \$	3,100,370.00 \$	3,100,370.00 \$						3,100,370.00 \$		
Subtotal Cuernavaca					23,256,704.00 \$	1,834,057.64 \$	1,834,057.64 \$	23,256,704.00 \$	23,256,437.75 \$		3,495.00 \$		92,927.11 \$		23,264,457.75 \$		

Mexico - Puebla																	
No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado D	Estimado Acumulado C	Evaluado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Devoluciones C	Saldo Cancelado F	Diferencia D - C - D - E	Cajada a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Alícuota de Costos G
		Inicio	Fin			Obrigado	Amortizado										
565	4500007557 5000003290 5000003290	01/02/2007	31/05/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE FRESCO Y REPOSICION DE CARPETA BELGADA DE 4 CM DEL KM 33+000 AL KM 35+000 AMBOS CUERPOS Y DEL KM 43+000 AL KM 48+000 CUERPO 1º	680,030.00 \$	50,090.71 \$	50,090.71 \$	680,030.00 \$	680,459.00 \$				30,124.00 \$		603,459.00 \$		
575	4500007658 5000002780 5000002807	01/02/2007	10/02/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE FRESCO Y REPOSICION DE CARPETA BELGADA DE 4 CM DEL KM 50+000 AL KM 03+000 AMBOS CUERPOS Y DEL KM 03+000 AL KM 08+000 CUERPO 1º	790,212.73 \$	62,000.05 \$	62,000.05 \$	790,212.73 \$	760,350.00 \$				30,085.74 \$		700,320.00 \$		
585	4500007659	01/02/2007	10/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE FRESCO Y REPOSICION DE CARPETA BELGADA DE 4 CM DEL KM 2+000 AL KM 35+000 DEL 2º CUERPO EN CUERPO 1º	482,000.00 \$	40,200.00 \$	40,200.00 \$	482,000.00 \$	482,000.00 \$				0.01 \$		482,000.00 \$		
595	4500007670 5000003492	09/02/2007	15/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE FRESCO Y REPOSICION DE CARPETA BELGADA DE 4 CM DEL KM 2+000 AL KM 35+000 DEL 2º CUERPO EN CUERPO 1º	690,001.80 \$	42,000.07 \$	42,000.07 \$	690,001.80 \$	666,091.00 \$						666,091.00 \$		
RS03073	4800009498 5000002771 5000003290	23/09/2007	03/01/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONCLUSION DE LA AMPLIACION DEL CARRILLO AL LADO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LOS KM 8+284 Y KM 8+400	715,052.21 \$	49,264.47 \$	49,264.47 \$	715,052.21 \$	715,052.10 \$	314.00 \$			0.02 \$		715,052.10 \$		

Puebla - Acapulco																	
No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado D	Estimado Acumulado C	Evaluado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Devoluciones C	Saldo Cancelado F	Diferencia D - C - D - E	Cajada a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Alícuota de Costos G
		Inicio	Fin			Obrigado	Amortizado										
605	4500007667 5000003190 5000003170 5000003400	01/02/2007	19/09/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL KM 172+500 AL KM 195+000 AMBOS CUERPOS.	4,520,711.50 \$	572,915.71 \$	572,915.71 \$	4,520,711.50 \$	4,520,698.01 \$				12.09 \$		4,690,070.04 \$		441,181.00 \$
615	4500002770 5000005407 5000003003 5000003004 (2009)	16/02/2007	08/11/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL KM 195+000 AL KM 217+500 AMBOS CUERPOS.	7,192,214.44 \$	697,207.70 \$	697,207.70 \$	7,192,214.44 \$	7,165,807.25 \$				21,707.10 \$		7,407,716.41 \$		305,200.00 \$
625	4500007668	01/02/2007	10/05/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE FRESCO Y REPOSICION DE CARPETA BELGADA DE 4 CM DEL KM 128+000 AL KM 141+000.	903,150.04 \$	80,316.00 \$	80,316.00 \$	903,150.04 \$	903,150.04 \$						903,150.04 \$		
Subtotal Cuernavaca					16,959,069.17 \$	1,834,226.36 \$	1,834,226.36 \$	16,959,069.17 \$	16,786,292.27 \$		314.00 \$		92,929.40 \$		17,206,421.93 \$		473,300.00 \$

Acapulco - Cd. Minidom																	
No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado D	Estimado Acumulado C	Evaluado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Devoluciones C	Saldo Cancelado F	Diferencia D - C - D - E	Cajada a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Alícuota de Costos G
		Inicio	Fin			Obrigado	Amortizado										
635	4500007655 5000003180	01/02/2007	19/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE FRESCO Y REPOSICION DE CARPETA BELGADA DE 4 CM DEL KM 217+500 AL KM 245+000 CUERPO A.	941,317.62 \$	82,131.00 \$	82,131.00 \$	941,317.62 \$	941,317.07 \$				0.55 \$		941,317.07 \$		
Subtotal Cuernavaca					16,959,069.17 \$	1,834,226.36 \$	1,834,226.36 \$	16,959,069.17 \$	16,786,292.27 \$		314.00 \$		92,929.40 \$		17,206,421.93 \$		473,300.00 \$

Acapulco - Cuernavaca																	
No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado D	Estimado Acumulado C	Evaluado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Devoluciones C	Saldo Cancelado F	Diferencia D - C - D - E	Cajada a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Alícuota de Costos G
		Inicio	Fin			Obrigado	Amortizado										
605	4500007414 5000003170	09/01/2007	30/11/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 19+000 AL KM 35+000 Y DEL KM 39+000 AL KM 34+000.	1,081,151.00 \$	150,094.62 \$	150,094.62 \$	1,081,151.00 \$	1,050,023.42 \$				30,520.40 \$		1,050,023.42 \$		

*(Handwritten signature)*

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado		Anticipo		Programado Acumulado	Estimado en Trámite	Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia (P+C)-D-E	Ejercicio de Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Fecha de corte	Monto pagado en Ajuste de Cuentas		
		Inicio	Fin		Disputado	Amortizado													
<b>Aguascalientes - Camisetas</b>																			
703	450007737 500005391 500005313	01/04/2007	05/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE NUEVE OBRAS DE DRENAJE Y REHABILITACION DE ALcantarillas EXISTENTES EN TREC. KM 39+000 Y EL KM 09+000 DEL CAMINO FEDERAL DE LOS RIOS, ENTRE LOS KM 71+000 Y 75+000, KM 75+000 Y 79+075, KM 80+233, KM 81+318, KM 84+524, KM 94+461 Y KM 95+144	1,307,418.03 \$	118,120.18 \$	110,120.18 \$	1,307,418.03 \$	1,307,418.03 \$	10,275.70 \$	- \$	- \$	- \$	1,307,418.03 \$	- \$				
<b>Champón - Campeche</b>																			
715	450003375	08/01/2007	10/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO INDUCTIVO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL KM 130+000 AL KM 199+000 INCLUYENDO ENTORNQUES Y DEFENSA METALICA EN SUBTRAMOS DEFINIDOS	531,088.73 \$	53,108.07 \$	53,108.07 \$	531,088.73 \$	530,932.07 \$	1,312.16 \$	- \$	10,056.66 \$	- \$	520,925.07 \$	- \$				
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>																			
750	450007415 500005024	08/01/2007	05/01/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. SUMINISTRO Y APLICACION DE RECUBRIMIENTO DE PAVIMENTO EN CALIENTE S.E. DEL KM 0+000 AL KM 75+000 DEL CAMINO DIRECTO	2,090,222.10 \$	175,039.90 \$	175,039.90 \$	2,090,222.10 \$	2,090,222.10 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2,090,222.10 \$	- \$				
<b>Veracruz</b>																			
SUBTOTAL COATZACOALCOM																			
					6,618,078.76 \$	487,189.27 \$	487,189.27 \$	6,618,078.76 \$	6,599,216.02 \$	12,207.94 \$	- \$	41,400.14 \$	- \$	6,599,216.02 \$	- \$				
<b>Cd. Minatom - Córdoba</b>																			
700	450007735 500005212 500005359	03/04/2007	25/11/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA DELGADA COMO SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL KM 239+000 AL KM 301+300 CUERPO A Y DEL KM 233+000 AL KM 301+300 CUERPO B	1,140,790.03 \$	72,593.33 \$	72,593.33 \$	1,140,790.03 \$	1,113,105.00 \$	- \$	- \$	27,024.35 \$	- \$	1,113,105.00 \$	- \$				
<b>La Tlajala - Cd. Ixta</b>																			
705	450007480	02/01/2007	16/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ANTIDESLUMBRANTE Y MENSULA REFLECTANTE EN BARRERA CENTRAL DEL KM 0+000 AL KM 118+000 EN TRAMOS ACLEDADOS	165,411.20 \$	10,241.13 \$	10,241.13 \$	165,411.20 \$	165,411.20 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	165,411.20 \$	- \$				
8202070	450009432 500005270	18/12/2007	24/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. REHABILITACION INTEGRAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM. 52+000 AL KM. 118+000 AMBOS CUERPOS. INCLuye ENTORNQUE A. COGAMALJAPAN (MCTA FISICA DE 12 KM A LOS CARRETES) Y APLICACION DE OPEN GRADED EN LOS CUERPOS DE LOS CUERPOS DE LOS CUERPOS Y SELLO ROAD-3 A EN ACOTAMIENTOS	11,915,552.84 \$	1,191,555.28 \$	1,191,555.28 \$	11,915,552.84 \$	11,915,552.00 \$	- \$	- \$	0.01 \$	- \$	- \$	11,915,552.00 \$	- \$			1,087,437.21 \$
<b>Culiacán Zamora - Tlaxiahuacán</b>																			
820	450007517	02/07/2007	18/04/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. CONSTRUCCION DE CONTRACINTAS EN CORTEZ DEL KM 100+000 AL KM 201+000	222,145.00 \$	22,214.50 \$	22,214.50 \$	222,145.00 \$	222,145.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	222,145.00 \$	- \$				
<b>Córdoba - Veracruz</b>																			
1145	450005041 500005378	06/06/2007	25/07/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION INTEGRAL DEL PAVIMENTO DEL KM 0+000 AL KM 19+188 CUERPO "A" Y DEL KM 0+000 AL KM 3+000 CUERPO "B"	921,132.05 \$	92,113.27 \$	92,113.27 \$	921,132.05 \$	921,132.05 \$	- \$	- \$	0.02 \$	- \$	921,132.05 \$	- \$				
					13,472,021.43 \$	1,294,777.51 \$	1,294,777.51 \$	13,472,021.43 \$	13,453,489.53 \$	- \$	- \$	36,074.56 \$	- \$	13,453,489.53 \$	- \$			1,087,437.21 \$	
<b>Raynosa</b>																			
					278,429.50 \$	- \$	- \$	278,429.50 \$	278,429.50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	278,429.50 \$	- \$				
<b>Matamoros - Reynosa</b>																			
805	450007409	03/01/2007	01/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA AUTOPISTA MATAMOROS - TAMPULCIPAS EN EL ESTADO DE TAMPULCIPAS	278,429.50 \$	- \$	- \$	278,429.50 \$	278,429.50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	278,429.50 \$	- \$				
					278,429.50 \$	- \$	- \$	278,429.50 \$	278,429.50 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	278,429.50 \$	- \$				
<b>Guadalupe</b>																			
					2,202,310.00 \$	- \$	- \$	2,202,310.00 \$	2,202,310.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2,202,310.00 \$	- \$				
<b>Guadalupe - Tepic</b>																			
505	450007554 500005189	08/01/2007	31/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN LA AUTOPISTA GUADALUPE (METAS 13 E 145)	2,202,310.00 \$	- \$	- \$	2,202,310.00 \$	2,202,310.00 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	2,202,310.00 \$	- \$				

017

0048

000

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Perfil	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado		Anticipo	Amortizado	Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Relaciones - Devoluciones	Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia P-C-D-C	Entrada a Flujo de Efectivo	Amonos Inicialmente (M)	Monto pagado de Ajuste de Costos
		Inicio	Fin		A	B											
875	450007596 450000176	03/01/2007	15/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PASEO DEL KILÓMETRO 130+000 A LOS 130+000 ANTIQUO CUERPO DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	2,540,748.11	2,540,748.11			2,540,748.11	2,545,748.11					2,040,748.11		
SUBTOTAL GUADALAJARA					4,849,861.01	4,849,861.01			4,849,861.01	4,849,861.01					4,849,861.01		

Monterrey

Cadenayta - Guaymas																	
025	450007494	15/01/2007	20/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REGIO DE SELLO 3-E. PREMEZCLADO EN CALIENTE DEL KM. 34+000 AL KM. 36+000 CUERPO T ( SOBRE REHABILITACIONES ANTERIORES )	614,140.14	614,140.14	61,414.01		614,140.14	614,140.14						614,140.14	
045	450007485 450000127	15/01/2007	07/11/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REGIO DE SELLO 3-E. PREMEZCLADO EN CALIENTE DEL KM. 59+700 Y DEL KM. 61+200 AL KM. 62+200	1,187,024.21	1,187,024.21	107,514.38		1,187,024.21	1,187,024.21						1,187,024.21	

Puerto Mexico - Camonera

065	450007480	15/01/2007	20/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUSTITUCION DE BARRERA CENTRAL DEL KM. 25+000 Y DEL KM. 25+412 AL KM. 25+498. AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CAMONERA	330,459.97	330,459.97	30,045.99		330,459.97	330,459.97						330,459.97	
075	450007487	15/01/2007	20/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REGIO DE SELLO 3-E. PREMEZCLADO EN CALIENTE DEL KM. 21+000 AL KM. 25+000 CUERPO T. INCLUYE SUSTITUCION DE CARPETA Y DACHEO	600,617.14	600,617.14	60,061.71		600,617.14	600,617.14						600,617.14	

Camaz Zapicho - Conalites

1025	450007490	15/01/2007	20/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REGIO DE SELLO 3-E. PREMEZCLADO EN CALIENTE DEL KM. 103+000 AL KM. 103+000 ANTIQUO CUERPOS ( SOBRE REHABILITACIONES ANTERIORES )	674,015.40	674,015.40	67,401.53		674,015.40	674,015.40						674,015.40	
1035	450007491	15/01/2007	20/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA CENTRAL DE CONTROL EN BERMELLON Y DEL KM. 183+000 AL KM. 184+000	210,255.70	210,255.70	21,025.56		210,255.70	210,255.70						210,255.70	
SUBTOTAL MONTERREY					3,658,927.74	3,658,927.74	330,483.22		3,658,927.74	3,658,927.74						3,658,927.74	

Chignoles

Las Choapas - Raudales - Ocoacoacoutla																	
1065	450007570 450000334	10/01/2007	21/05/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM. 0+000 AL KM. 31+500 Y DEL KM. 60+110 AL KM. 72+000 CUERPO UNICO DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES - OCOACOACOUTLA	6,391,544.15	6,391,544.15	611,200.08		6,391,544.15	6,391,206.05						6,391,206.05	
1085	450007560 450000323	15/01/2007	07/06/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM. 109+000 AL KM. 129+100 Y DEL KM. 109+000 AL KM. 197+500 CUERPO UNICO DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES - OCOACOACOUTLA	3,612,441.20	3,612,441.20	270,569.66		3,612,441.20	3,612,240.01						3,612,240.01	
1115	450000003 450000309 450000323	01/07/2007	15/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE EN TRAMOS ASALADOS REGIO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALIENTE 3-E Y SENALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES - OCOACOACOUTLA	982,516.33	982,516.33	82,719.23		982,516.33	982,777.26						982,777.26	
1175	450000000 450000305 450000309	14/06/2007	15/10/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE CUERPO UNICO DEL KM. 72+000 AL KM. 109+000 DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES - OCOACOACOUTLA	3,090,454.20	3,090,454.20	281,717.16		3,090,454.20	3,091,810.21						3,091,810.21	
1205	450000004 450000300 450000301	20/06/2007	13/08/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM. 50+000 AL KM. 50+110 Y TRATAMIENTO ESPECIAL DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CONSISTENTE EN REHABILITACIONES ACILADAS C. DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES - OCOACOACOUTLA	3,970,340.41	3,969,250.27			3,970,340.41	3,969,250.27						3,969,250.27	
SUBTOTAL CHAPAS					18,023,684.41	18,023,684.41	1,705,242.15		18,023,684.41	17,841,301.25					17,841,301.25		

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

300 000 49

018



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Parcial	Contrato No.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado	Anticipo		Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Ejercido en Trámite	Retenciones - Devoluciones	Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia B = C - D - E	Ejercido a Flajo de Ejercido	Aprobado Financiero (%)	Monto pagado de Ayuda de Costos
		Inicio	Fin			Concedido	Amortizado										
1115	450007493 5500002006	15/01/2007	15/03/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 129+000 AL KM 159+000 VERTICAL DEL C D CUACHPALAN-OAXACA	3,411,770.02 \$	230,007.00 \$	296,007.00 \$	3,411,770.02 \$	3,035,739.90 \$				378,030.12 \$		3,076,475.79 \$	100.00	40,735.00 \$
1125	450007251 5500002010 5500002008	15/01/2007	15/03/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 195+000 AL KM 229+000 VERTICAL DEL C D CUACHPALAN-OAXACA	3,037,700.07 \$	200,070.77 \$	299,070.77 \$	3,037,700.07 \$	2,500,522.70 \$				129,200.31 \$		2,908,422.70 \$	100.00	
<b>SUBTOTAL OAXACA</b>					<b>6,449,567.09 \$</b>	<b>540,078.43 \$</b>	<b>545,078.43 \$</b>	<b>6,449,567.09 \$</b>	<b>5,544,262.56 \$</b>				<b>507,230.43 \$</b>		<b>5,944,006.55 \$</b>	<b>100.00</b>	<b>40,735.00 \$</b>
<b>TOTAL</b>					<b>113,068,714.83 \$</b>	<b>7,087,130.00 \$</b>	<b>7,687,436.90 \$</b>	<b>113,068,714.83 \$</b>	<b>111,875,332.42 \$</b>				<b>1,193,382.41 \$</b>		<b>113,470,304.82 \$</b>		<b>1,595,582.39 \$</b>

Cd. Cuacnopalan - Oaxaca

000 0050


019

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Contratado		Anticipo		Programación Acumulada		Estimado en trámite	Saldo Calculado	Diferencia	Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance financiero (%)	
	A	B	C	D	E	F				G	H	I		J
Tijuana	\$ 10,008,049.74	\$ 10,008,049.74	\$ 2,001,609.94	\$ 10,008,049.74	\$ 9,812,064.74			\$ 195,985.00			\$ 9,800,264.70	\$ 2,051,511	\$ 48,109.96	98.0%
Culiacán	\$ 24,352,160.89	\$ 24,352,160.89	\$ 6,236,865.06	\$ 24,352,160.89	\$ 22,870,874.13			\$ 1,481,286.76			\$ 22,913,125.02	\$ 82,123.98	\$ 42,250.89	94.3%
Querétaro	\$ 51,736,061.03	\$ 51,736,061.03	\$ 10,347,212.19	\$ 51,736,061.03	\$ 50,881,757.11			\$ 854,303.92			\$ 51,372,802.08	\$	\$ 491,134.97	97.7%
Guatemala	\$ 24,635,850.60	\$ 24,635,850.60	\$ 4,027,170.13	\$ 24,635,850.60	\$ 24,635,598.94			\$ 251.75			\$ 24,635,598.96			100.0%
Puebla	\$ 28,018,912.00	\$ 28,018,912.00	\$ 5,603,782.52	\$ 28,018,912.00	\$ 27,040,181.57			\$ 978,730.43			\$ 27,065,942.81	\$	\$ 25,051.24	100.0%
Coahuila	\$ 21,452,059.82	\$ 21,452,059.82	\$ 6,435,017.06	\$ 21,452,059.82	\$ 21,451,951.94			\$ 107.88			\$ 21,451,951.94			100.0%
Veracruz	\$ 13,631,025.95	\$ 13,631,025.95	\$ 4,089,308.10	\$ 13,631,025.95	\$ 13,620,058.40			\$ 10,970.55			\$ 13,620,058.40	\$ 33,578.12		100.0%
Yucatán	\$ 2,519,235.92	\$ 2,519,235.92	\$	\$ 2,519,235.92	\$ 2,519,183.62			\$ 52.30			\$ 2,519,183.62			100.0%
Guadalajara	\$ 46,298,216.28	\$ 46,298,216.28	\$ 4,629,821.60	\$ 46,298,216.28	\$ 43,155,695.58			\$ 3,142,520.70			\$ 43,348,637.89	\$ 7,003.24	\$ 192,042.11	100.0%
Monterrey	\$ 45,789,485.04	\$ 45,789,485.04	\$ 4,578,946.56	\$ 45,789,485.04	\$ 45,789,483.63			\$ 2.01			\$ 45,789,483.63	\$ 0.40		100.0%
Chiapas	\$ 8,159,474.79	\$ 8,159,474.79	\$ 2,447,942.43	\$ 8,159,474.79	\$ 8,159,471.02			\$ 3.76			\$ 8,312,770.15	\$ 324,759.44	\$ 152,299.13	97.7%
Oaxaca	\$ 21,170,483.05	\$ 21,170,483.05	\$ 6,251,144.92	\$ 21,170,483.05	\$ 20,518,928.32			\$ 651,554.73			\$ 20,518,928.32	\$ 68,086.17		100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 297,771,017.39</b>	<b>\$ 297,771,017.39</b>	<b>\$ 57,649,343.41</b>	<b>\$ 297,771,017.39</b>	<b>\$ 290,455,247.00</b>			<b>\$ 7,315,770.39</b>			<b>\$ 291,408,733.32</b>	<b>\$ 538,201.05</b>	<b>\$ 953,488.30</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

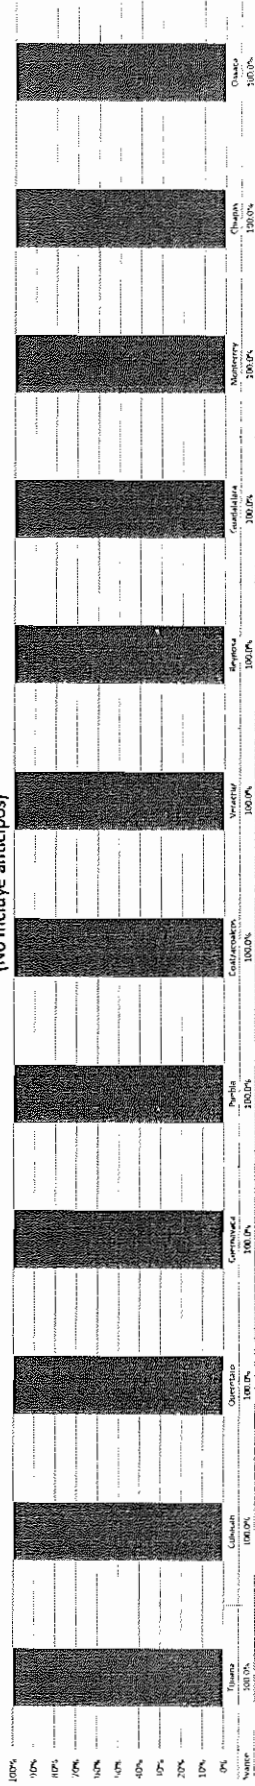

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Folia	Concepto	Monto Contratado	Anticipo		Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Evaluado en Trámite	Relaciones - Derivaciones	Saldo a Cancelar	Diferencia B.C.D.C.	Ejército y FIDEP de Pactivo	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	Monto pagado de Aporte en Contos G
			Obrigado	Acreditado										
Tijuana - Conocido														
1	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 9+000 AL KM 9+040	\$ 4,023,047.07	\$ 964,739.41	\$ 094,739.41	\$ 4,023,047.07	\$ 4,027,962.07			\$ 195,965.00		\$ 4,027,962.07		100%	
La Rumorosa - Tijuana														
2	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 117+200	\$ 3,420,360.70	\$ 605,272.14	\$ 605,272.14	\$ 3,420,360.70	\$ 3,420,360.70		\$ 2,051.91			\$ 3,420,360.70		100%	
Libramiento Lora Deobos														
3	MANTENIMIENTO MENOR DEL LIBRAMIENTO LOG CALLES	\$ 1,737,841.07	\$ 351,500.39	\$ 351,500.39	\$ 1,737,841.07	\$ 1,737,841.07					\$ 1,060,841.03		100%	\$ 40,190.90
Cuicatlan														
Estacion Don. Nogoyas														
4	MANTENIMIENTO MENOR SUB-TRAMO EJECUCION DON. CARRANZA	\$ 4,002,025.20	\$ 1,407,707.57	\$ 1,407,707.57	\$ 4,002,025.20	\$ 3,059,514.01			\$ 964,110.05		\$ 3,060,514.01		100%	
5	MANTENIMIENTO MENOR SUB-TRAMO DIRECCION - LIBRAMIENTO GUAYMAS DEL KM 0+000 AL KM 197+700 Y DEL KM 0+000 AL KM 2+000 ESTADO DE SONORA	\$ 3,070,000.45	\$ 1,103,719.03	\$ 1,103,719.03	\$ 3,070,000.45	\$ 3,070,200.03			\$ 764.42		\$ 3,070,200.03		100%	
6	MANTENIMIENTO MENOR SUB-TRAMO HERMOSILLO - NAJOCALIMA DEL KM 0+000 AL KM 194+000 ESTADO DE SONORA	\$ 3,520,300.43	\$ 1,056,082.53	\$ 1,056,082.53	\$ 3,520,300.43	\$ 3,520,300.43					\$ 3,520,300.43		100%	
Mazatlan - Culiacan														
7	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 181+150 ESTADO DE SINALOA	\$ 8,497,010.75	\$ 2,540,205.03	\$ 2,540,205.03	\$ 8,497,010.75	\$ 8,497,616.75		\$ 70,873.21			\$ 8,520,887.04		100%	\$ 42,250.00
Lyon - Lajos de Moreno - Aguascalientes														
8	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA LTON-LAJOS DE MORENO-AGUASCALIENTES	\$ 8,006,200.17	\$ 1,328,040.03	\$ 1,328,040.03	\$ 8,005,200.17	\$ 8,005,005.91			\$ 640,134.20		\$ 8,020,590.51		100%	\$ 73,332.00
Libramiento Nororiental de Queretaro														
9	MANTENIMIENTO MENOR DEL LIBRAMIENTO NORORIENTAL DE QUERETARO	\$ 3,143,960.96	\$ 620,703.05	\$ 620,703.05	\$ 3,143,960.96	\$ 3,143,960.96					\$ 3,143,960.96		100%	
Chamapa - Lecheria														
10	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CHAMAPA-LECHERIA	\$ 3,050,402.72	\$ 701,692.54	\$ 701,692.54	\$ 3,050,402.72	\$ 3,050,402.72			\$ 0.40		\$ 3,050,402.32		100%	
Urupain - Patzcuaro														
11	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA URUPAIN-PATZCUARO	\$ 4,073,300.40	\$ 934,670.00	\$ 934,670.00	\$ 4,073,300.40	\$ 4,073,300.40					\$ 4,073,300.40		100%	
Urubain - Nueva Italia														
12	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA URUPAIN-NUVA ITALIA	\$ 4,000,400.51	\$ 600,081.70	\$ 600,081.70	\$ 4,000,400.51	\$ 4,000,400.51			\$ 0.05		\$ 4,773,120.00		100%	\$ 122,721.04
Nueva Italia - Lazaro Cardenas														
13	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA NUEVA ITALIA-LAZARO CARDENAS	\$ 5,886,200.70	\$ 1,177,253.74	\$ 1,177,253.74	\$ 5,886,200.70	\$ 5,886,200.70			\$ 3.21		\$ 5,886,200.49		100%	
Tepic - Palmitas														
14	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO SUBTRAMO TEPIC-PALMITAS	\$ 5,094,500.10	\$ 1,010,717.02	\$ 1,010,717.02	\$ 5,094,500.10	\$ 5,094,201.02			\$ 2,096.30		\$ 5,095,791.92		100%	\$ 209,000.00
Palmitas - Cuernavaca														
15	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA PALMITAS-CUERNAVACA SUBTRAMO PALMITAS-CUERNAVACA	\$ 7,408,714.12	\$ 1,407,342.02	\$ 1,407,342.02	\$ 7,408,714.12	\$ 7,408,712.00			\$ 1.43		\$ 7,406,712.00		100%	
Cuernavaca - Irapuato														
16	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-IRAPUATO	\$ 5,000,000.00	\$ 1,138,015.07	\$ 1,138,015.07	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			\$ 11,007.00		\$ 5,000,000.00		100%	\$ 60,000.00
Cuernavaca														
SUBTOTAL CUERNAVACA														
Mexico - Cuernavaca														
17	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO-CUERNAVACA	\$ 2,079,100.00	\$ 416,858.19	\$ 416,858.19	\$ 2,079,100.00	\$ 2,079,100.00					\$ 2,079,100.00		100%	

0052  
021



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Póliza	Contrato No.	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Construido		Anticipo	Programado Acumulado		Ejecutado en Trámite	Relaciones Derivacionales	Saldo a Contabilizar	Diferencia U-C-U-E	Ejecutado al Fin del Ejercicio	Avance Físico (M)	Monto pagado de Ayuda de Contos G
				A	B		C	D							
<b>Libramiento Cuernavaca</b>															
18	450000276 5200002510	30/05/2007 30/04/2008	AMPLIACION CONSTRUCTIVA Y TRANSVERSAL DE UNA ESTRUCTURA DE BARRIOS EN EL KM 39+150	\$ 691,730.40	\$ 109,256.10	\$ 991,796.49	\$ 991,521.25	\$	\$	\$ 249.14	\$	\$	\$ 991,521.25	100%	\$
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>															
19	450000276 5200002522	20/04/2007 30/04/2008	MANTENIMIENTO MENOR, SUBTRAMO DEL KM 95+000 AL KM 208+000	\$ 6,987,091.19	\$ 1,397,410.24	\$ 1,397,410.24	\$ 6,987,091.19	\$	\$	\$ 0.02	\$	\$	\$ 6,987,091.17	100%	\$
20	450000277 5200002531	20/05/2007 30/04/2008	MANTENIMIENTO MENOR, SUBTRAMO DEL KM 230+000 AL KM 388+200	\$ 4,813,980.50	\$ 962,796.10	\$ 4,813,980.50	\$ 4,813,977.91	\$	\$	\$ 2.59	\$	\$	\$ 4,813,977.91	100%	\$
<b>La Pera - Cuautla</b>															
21	450000277 5200002511	20/05/2007 07/05/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL CD LA PIERA GUAUTLA	\$ 2,480,539.03	\$ 490,107.97	\$ 2,480,539.03	\$ 2,480,539.03	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,480,539.03	100%	\$
<b>Puerto de Ixtla - Ixtla</b>															
22	450000279 5200002561	20/05/2007 15/05/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO PUERTO DE IXTLA - IXTLA	\$ 2,170,243.01	\$ 434,648.72	\$ 2,170,243.01	\$ 2,170,243.01	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 2,170,243.01	100%	\$
<b>Zacapalco - Rancho Viejo</b>															
23	450000282 5200002523	22/03/2007 20/04/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO ZACAPALCO - RANCHO VIEJO	\$ 3,180,530.93	\$ 636,106.19	\$ 3,180,530.93	\$ 3,180,530.93	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 3,180,530.93	100%	\$
<b>Rancho Viejo - Taxco</b>															
24	450000281 5200002703	10/04/2007 09/03/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO RANCHO VIEJO - TAXCO	\$ 1,922,492.18	\$ 398,498.64	\$ 1,922,492.18	\$ 1,922,492.18	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 1,922,492.18	100%	\$
<b>Puebla</b>															
25	450000285 5200002703	12/04/2007 09/03/2008	MANTENIMIENTO MENOR, SUBTRAMO SANTA ANTONITA HGO. CD. EN EL KM 10+000 DEL LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	\$ 6,010,152.70	\$ 1,322,030.54	\$ 6,010,152.70	\$ 6,010,152.70	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 6,010,152.70	100%	\$
26	450000284 5200002701	14/04/2007 04/03/2008	MANTENIMIENTO MENOR, SUBTRAMO RIO PRIETO DEL KM 02+000 AL KM 120+000	\$ 6,802,009.25	\$ 1,378,791.07	\$ 6,802,009.25	\$ 6,802,009.25	\$	\$	\$ 0.20	\$	\$	\$ 6,802,009.25	100%	\$
<b>Puebla - Acapulco</b>															
27	450000284 5200002704	13/04/2007 03/03/2008	MANTENIMIENTO MENOR KM 120+000 AL KM 217+000	\$ 10,060,338.05	\$ 2,199,607.21	\$ 10,060,338.05	\$ 10,060,338.05	\$	\$	\$ 978,730.83	\$	\$	\$ 10,060,338.05	100%	\$
<b>Acazulcapan - Cd. Mendoza</b>															
28	450000289 5200002711	19/04/2007 09/03/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 217+000 AL KM 220+000	\$ 3,510,404.50	\$ 793,292.00	\$ 3,510,404.50	\$ 3,510,404.20	\$	\$	\$ 1.30	\$	\$	\$ 3,510,404.20	100%	\$
<b>Coahuila de Zaragoza</b>															
29	450000292 5200002702	01/02/2007 31/01/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 189+000 AL KM 190+200	\$ 2,945,247.19	\$ 882,574.10	\$ 2,945,247.19	\$ 2,945,247.18	\$	\$	\$ 0.01	\$	\$	\$ 2,945,247.18	100%	\$
<b>Cd. Ixtla - Acapulco</b>															
30	450000284 5200002703	01/02/2007 31/01/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 118+000 AL KM 188+000 DEL LA AUTOPISTA LA TRINAJA-AACAPULCO	\$ 4,902,095.09	\$ 1,478,809.53	\$ 4,902,095.09	\$ 4,902,091.57	\$	\$	\$ 3.52	\$	\$	\$ 4,902,091.57	100%	\$
<b>Acapulco - Coahuila de Zaragoza</b>															
31	450000290 5200002703	01/02/2007 31/01/2008	MANTENIMIENTO MENOR DCL KM 0+000 AL KM 49+000	\$ 3,460,230.49	\$ 1,040,770.95	\$ 3,460,230.40	\$ 3,460,132.14	\$	\$	\$ 104.35	\$	\$	\$ 3,460,132.14	100%	\$
<b>Alta Guzman - Cuernavaca</b>															
32	450000295 5200002703	01/02/2007 31/01/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 49+000 AL KM 59+112	\$ 5,998,047.15	\$ 1,525,094.15	\$ 5,998,047.15	\$ 5,998,047.15	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 5,998,047.15	100%	\$
<b>San Marcos - La Ventosa</b>															
33	450000294 5200002703	01/02/2007 31/01/2008	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 72+000	\$ 5,948,233.06	\$ 1,514,479.17	\$ 5,948,233.06	\$ 5,948,233.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 5,948,233.00	100%	\$
<b>Venezuela</b>															
34	450000276 5200002726	02/07/2007 02/07/2008	MANTENIMIENTO MENOR POR CONTRATO EN LA AUTOPISTA CD. MENDOZA-CORDOBA DEL KM 203+000 AL KM 201+300	\$ 2,000,200.44	\$ 789,485.02	\$ 2,000,200.44	\$ 2,000,270.71	\$	\$	\$ 15.73	\$	\$	\$ 2,000,270.71	100%	\$

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puntos	Concepto	Concepto	Monto Contratado	Anticipo	Amortizado	Programado Acumulado	Cobranza Acumulada	Estimado en Trámite	Retenciones - Devoluciones - E	Saldo a Carácter P	Diferencia B - C - D - E	Ejercicio a Fijar de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance físico (%)	Monto pagado de Avance de Costos C	Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012
<b>Coahuila - Veracruz</b>																
35	4500007700	01/02/2007	300020006	1,356,627.32	1,356,627.32	4,522,091.05	4,522,091.05	4,522,091.05	0	0	0	4,522,091.05	100%	100%	4,522,091.05	
<b>La Tmela - Cd. Isa</b>																
50	4500007730	10/01/2007	100012006	3,995,892.75	1,198,707.50	1,198,707.50	3,995,892.75	3,995,892.75	35,578.12	0	0	3,995,892.75	100%	100%	3,995,892.75	
<b>Culiacán - Tlaxiaco</b>																
37	4500007751	01/02/2007	31/01/2008	1,449,359.02	437,789.05	1,449,359.02	1,449,359.02	1,449,359.02	0	0	0	1,449,359.02	100%	100%	1,449,359.02	
<b>Llano de los Rios - Tlaxiaco</b>																
38	4500007715	08/01/2007	000200067	1,023,450.00	307,037.07	1,023,450.00	1,023,450.00	1,023,450.00	0	0	0	1,023,450.00	100%	100%	1,023,450.00	
<b>Reynosa</b>																
<b>Matamoros - Reynosa</b>																
39	4500007710	01/02/2007	31/01/2008	2,519,235.02	2,519,235.02	2,519,235.02	2,519,235.02	2,519,235.02	0	0	0	2,519,235.02	100%	100%	2,519,235.02	
<b>Guadalupe</b>																
<b>Maravatio - Zapotlanero</b>																
40	4500007709	01/02/2007	31/01/2008	13,347,024.04	1,324,782.49	13,347,024.04	10,021,200.18	10,021,200.18	0	0	0	10,021,200.18	100%	100%	10,021,200.18	
41	4500007700	01/02/2007	31/01/2008	12,207,064.23	1,220,769.42	1,220,769.42	12,207,064.23	12,207,064.23	0	0	0	12,207,064.23	100%	100%	12,207,064.23	
<b>Guadalupe - Tepic</b>																
42	4500007710	01/02/2007	31/01/2008	5,757,807.75	575,807.07	5,757,807.75	5,757,807.07	5,757,807.07	4,124.24	0	0	5,757,807.07	100%	100%	5,757,807.07	
42	4500007711	01/02/2007	31/01/2008	3,131,209.11	313,120.91	3,131,209.11	3,131,209.11	3,131,209.11	2,000.00	0	0	3,131,209.11	100%	100%	3,131,209.11	
<b>Zapotlanero - Guadalupe</b>																
44	4500007745	01/02/2007	31/01/2008	2,720,000.00	272,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	2,720,000.00	0	0	0	2,720,000.00	100%	100%	2,720,000.00	
<b>Zapotlanero - La Grana de Moreno</b>																
45	4500007730	01/02/2007	31/01/2008	4,505,464.14	450,546.41	4,505,464.14	4,505,465.57	4,505,465.57	0	0	0	4,505,465.57	100%	100%	4,505,465.57	
46	4500007720	01/02/2007	31/01/2008	4,170,577.50	417,057.75	4,170,577.50	4,170,577.50	4,170,577.50	0	0	0	4,170,577.50	100%	100%	4,170,577.50	
<b>Monterrey</b>																
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																
47	4500007720	01/02/2007	31/01/2008	14,490,045.00	1,449,004.50	14,490,045.00	14,490,045.00	14,490,045.00	0	0	0	14,490,045.00	100%	100%	14,490,045.00	
<b>San Hilario - Torreon</b>																
48	4500007730	01/02/2007	31/01/2008	7,782,211.55	778,221.16	7,782,211.55	7,782,209.97	7,782,209.97	0	0	0	7,782,209.97	100%	100%	7,782,209.97	
<b>Cochimilla - D.F. de Calles</b>																
49	4500007727	01/02/2007	31/01/2008	2,170,350.00	217,035.00	2,170,350.00	2,170,350.00	2,170,350.00	0	0	0	2,170,350.00	100%	100%	2,170,350.00	
<b>Comarca - Coahuila - Coahuila</b>																
50	4500007751	01/02/2007	31/01/2008	8,892,091.12	889,209.11	8,892,091.12	8,892,091.12	8,892,091.12	0	0	0	8,892,091.12	100%	100%	8,892,091.12	
<b>Guadalupe - Reynosa</b>																
51	4500007752	01/02/2007	31/01/2008	9,889,767.34	988,976.73	9,889,767.34	9,889,767.34	9,889,767.34	0	0	0	9,889,767.34	100%	100%	9,889,767.34	

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre del 2012.

No. Periferia	Contrato No.	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programado Acumulado D	Estimado en Trámite D	Retenciones - Devenciones L	Saldo a Cargar F	Diferencia D-C-D-E	Credito a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Monto pagado de Anticipo y Costos D
					Obligado	Amortizado								
<b>Puerto Morelos - Campeche</b>														
52	4500007703	01/02/2007	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 202+000 AL KM 203+000	3,457,210.87 \$	3,457,210.87 \$	3,457,210.87 \$	3,457,210.74 \$	0.13 \$	0.40 \$	0.13 \$	3,457,210.74 \$	100%	3,457,210.74 \$	
			SUBTOTAL MONTERREY	45,789,483.94 \$	45,789,483.94 \$	45,789,483.94 \$	45,789,483.63 \$	2.01 \$	0.49 \$	2.01 \$	45,789,483.63 \$		45,789,483.63 \$	
<b>Chihuahua</b>														
<b>Las Chovanas, Raudales - Cochoapa Uta</b>														
53	4500007091	12/02/2007	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 197+500	8,159,474.78 \$	2,447,942.43 \$	8,159,474.78 \$	8,159,471.02 \$	3.76 \$	324,759.44 \$	3.76 \$	8,152,720.10 \$	100%	8,152,720.10 \$	
			SUBTOTAL CHIHUAHA	8,159,474.78 \$	2,447,942.43 \$	8,159,474.78 \$	8,159,471.02 \$	3.76 \$	324,759.44 \$	3.76 \$	8,152,720.10 \$		8,152,720.10 \$	
<b>Oaxaca</b>														
<b>Cd. Cuicnopalan - Oaxaca</b>														
54	4500008217	03/04/2007	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 120+000	9,950,100.95 \$	2,095,030.20 \$	9,950,100.95 \$	9,314,302.90 \$	635,798.05 \$	42,073.09 \$	635,798.05 \$	9,314,302.90 \$	100%	9,314,302.90 \$	
55	4500008095	02/04/2007	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 130+000 AL KM 240+000 Y RAMAL A HITZCO 17 KM	11,217,382.10 \$	3,365,214.03 \$	11,217,382.10 \$	11,204,505.39 \$	12,876.71 \$	45,112.18 \$	12,876.71 \$	11,204,505.39 \$	100%	11,204,505.39 \$	
			SUBTOTAL OAXACA	21,167,483.05 \$	5,460,244.23 \$	21,167,483.05 \$	20,518,808.32 \$	648,674.73 \$	87,185.27 \$	648,674.73 \$	20,518,808.32 \$		20,518,808.32 \$	
			TOTAL	79,771,617.39 \$	27,697,669.63 \$	79,771,617.39 \$	79,455,747.09 \$	315,870.30 \$	539,091.05 \$	315,870.30 \$	79,455,747.09 \$		79,455,747.09 \$	

000 0055

024


CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TÉCNICA

RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha del corte: 30 de Septiembre de 2012

Designación	Monto Contratado		Anticipo		Programado Autorizado		Ejercido al Fin de Ejercicio		Seguimiento al Avance Presupuestal		Avance Financiero (%)	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Tijuana	\$ 2,037,461.96		\$ 2,067,461.96	\$ 2,054,830.41	\$ 32,622.55			\$ 2,054,030.41				100%
Culiacan	\$ 2,690,001.06		\$ 2,690,001.06	\$ 2,000,001.06			\$ 2,090,001.06	\$ 6,730.52				100%
Quedadero	\$ 4,598,413.37		\$ 4,598,413.37	\$ 4,378,153.38			\$ 4,378,153.38	\$ 950.57				100%
Cuernavaca	\$ 4,075,312.35		\$ 4,075,312.29	\$ 4,075,312.31			\$ 4,075,312.31	\$ 0.07				100%
Puebla	\$ 3,531,913.10		\$ 3,531,913.16	\$ 3,531,922.54			\$ 3,531,922.54	\$ 5,411.23				100%
Coahuila de Zaragoza	\$ 3,046,217.19		\$ 3,046,217.19	\$ 2,950,760.45			\$ 2,950,760.45	\$ 3,435.16				100%
Veracruz	\$ 2,874,543.49		\$ 2,874,543.49	\$ 2,395,691.75			\$ 2,395,691.75	\$ 478,851.74				100%
Roynosa	\$ 429,117.58		\$ 429,117.58	\$ 429,038.97			\$ 429,038.97	\$ 78.61				100%
Guadaluajara	\$ 5,415,881.15		\$ 5,415,881.15	\$ 4,355,523.06			\$ 4,355,523.06	\$ 1,060,358.09				100%
Monterrey	\$ 4,382,871.64		\$ 4,382,871.64	\$ 4,382,871.64			\$ 4,382,871.64	\$ 0.00				100%
Chilpancingo	\$ 1,299,192.81		\$ 1,299,192.81	\$ 1,299,192.81			\$ 1,299,192.81	\$ 0.00				100%
Oaxaca	\$ 2,272,294.04		\$ 2,272,294.04	\$ 2,195,828.30			\$ 2,195,828.30	\$ 76,465.74				100%
<b>TOTAL</b>	\$ 36,452,720.73		\$ 36,452,720.73	\$ 34,747,463.68			\$ 34,778,721.94	\$ 16,577.50			\$ 31,253.25	100%

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

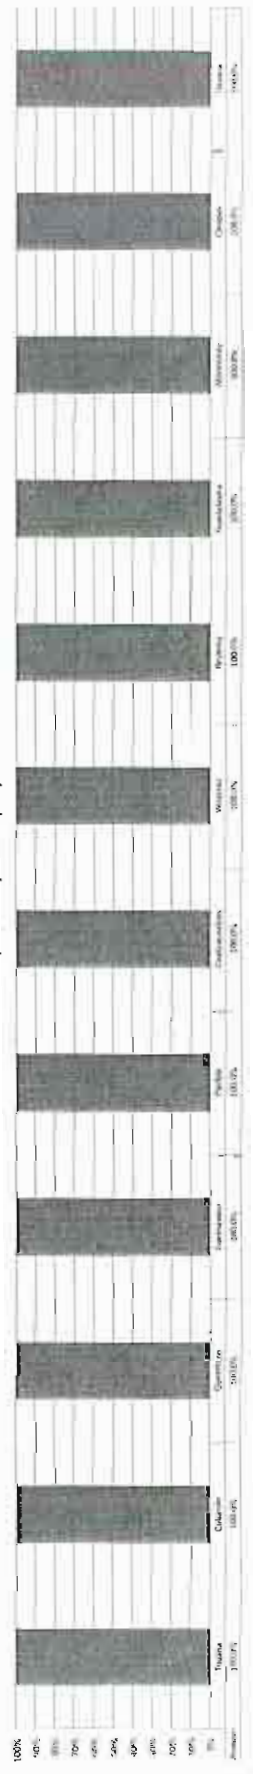

000,0056

025



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Parada	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Saldo Cancelado F	Diferencia B - C - D - E	Ejercido o Flujo de Efectivo	Avance (financiero %)	Monto pagado de Ajuste de Cuentas G
			Inicio	Fin		Ocupado	Amortizado									
<b>Tijuana</b>																
<b>Tijuana - Ensamada</b>																
15	450000777	PROFESIONISTAS EN GEOCONTROL	01/02/2007	15/02/2008	\$ 602,737.87			\$ 602,737.87	\$ 602,737.87			\$	\$	\$ 602,737.87	100.00	
<b>La Rumorosa - Tecate</b>																
25	450000778 550000314	PROFESIONISTAS EN GEOCONTROL	09/05/2007	09/05/2008	\$ 978,127.59			\$ 978,127.59	\$ 945,305.00			\$ 32,822.59	\$	\$ 845,395.00	86.33	
<b>Libertad Leon Cebon</b>																
35	450000779	ARMAY INGENIERIA Y CONSTRUCCION	01/02/2007	15/02/2008	\$ 540,596.50			\$ 540,596.50	\$ 540,596.48			\$ 0.02	\$	\$ 540,596.48	100.00	
<b>Culliacan</b>																
<b>Entación Don - Nogales</b>																
45	450000772	CONSTRUCTORA GARPE	01/02/2007	15/02/2008	\$ 541,756.82			\$ 541,756.82	\$ 541,756.80	\$ 174.71		\$	\$	\$ 541,756.80	100.00	
55	450000773	FELIPE DE JESUS GARCA MANCINAS	01/02/2007	15/02/2008	\$ 519,481.06	\$ 57,184.20	\$ 57,184.20	\$ 519,481.06	\$ 519,481.06	\$ 4,105.84		\$	\$	\$ 519,481.06	100.00	
65	450000774	FELIPE DE JESUS GARCA MANCINAS	01/02/2007	15/02/2008	\$ 514,526.04	\$ 51,452.81	\$ 51,452.81	\$ 514,526.04	\$ 514,526.05	\$ 704.72		\$	\$	\$ 514,526.05	100.00	
550000290		CONSTRUCTORA XINSA	01/03/2007	31/03/2007	\$ 95,976.97			\$ 95,976.97	\$ 95,976.97			\$	\$	\$ 95,976.97	100.00	
<b>Mazatlan - Culiacan</b>																
75	450000771	JOSE REYES PARRA MARMOLERO	01/02/2007	15/02/2008	\$ 1,018,289.27	\$ 101,828.83	\$ 101,828.83	\$ 1,018,289.27	\$ 1,018,289.27	\$ 1,715.24		\$	\$	\$ 1,018,289.27	100.00	
<b>Queretaro</b>																
<b>Lion - Lopez de Moreno - Aguascalientes</b>																
95	450000779	PROYECTO ASESORIA CONSTRUCCION SUPERVISION LEGONDIARIOS DE OBRAS	17/01/2007	15/02/2008	\$ 691,662.39			\$ 691,662.39	\$ 476,530.61			\$ 214,551.59	\$	\$ 476,530.61	68.91	
<b>Libramiento Noroeste de Oaxaca</b>																
95	450000775	FELIPE DE JESUS GARCA MANCINAS	17/01/2007	15/02/2008	\$ 410,309.49			\$ 410,309.49	\$ 410,309.49			\$	\$	\$ 410,309.49	100.00	
<b>Chamapa - Lachoria</b>																
105	450000774	GRUPO LAFER	17/01/2007	15/02/2008	\$ 486,456.02			\$ 486,456.02	\$ 486,456.02			\$	\$	\$ 486,456.02	100.00	
<b>Urupitan - Patzcuaro</b>																
115	450000778	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAM	17/01/2007	15/02/2008	\$ 527,142.94			\$ 527,142.94	\$ 527,142.94			\$	\$	\$ 527,142.94	100.00	
<b>Urupitan - Nueva Italia</b>																
125	450000774	FELIPE DE JESUS GARCA MANCINAS	17/01/2007	19/02/2008	\$ 511,202.25			\$ 511,202.25	\$ 511,202.25			\$	\$	\$ 511,202.25	100.00	
<b>Nueva Italia - Lazaro Cardenas</b>																
135	450000770	CIAM INGENIERIA	17/01/2007	15/02/2008	\$ 597,628.14			\$ 597,628.14	\$ 597,628.14			\$	\$	\$ 597,628.14	100.00	
<b>Mexico - Queretaro</b>																
145	450000771	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAM	17/01/2007	15/02/2008	\$ 458,183.05			\$ 458,183.05	\$ 458,273.98			\$ 1,909.47	\$	\$ 458,273.98	100.00	
155	450000772	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAM	17/01/2007	15/02/2008	\$ 458,163.05			\$ 458,163.05	\$ 454,364.11	\$ 950.57		\$ 3,818.94	\$	\$ 454,364.11	100.00	

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

(fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012)

No. Pkts/Id	Contenido No.	Empresa	Periodo del Contrato		Monto Contratado A	Anticipo		Procesado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Saldo Cancelado F	Diferencia B + C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Avance financiero (%)	Monto pagado de Ajusto de Cuentas G
			Inicio	Fin		Obligado	Amortizado									
<b>Queretaro - Irapuato</b>																
165	4500007723	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAM	17/01/2007	15/02/2008	\$ 456,183.05			\$ 456,183.05	\$ 456,183.05		\$ 950.97	\$ 220,339.99	\$	\$ 456,183.05	100.00	\$
<b>Cuernavaca</b>																
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																
195	4500000888	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES	01/08/2007	28/04/2008	\$ 1,149,978.46	\$ 114,997.86	\$ 114,997.86	\$ 1,149,978.46	\$ 1,149,978.46			\$ 0.00	\$	\$ 1,149,978.46	100.00	\$
205	4500008800	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA	01/08/2007	09/04/2008	\$ 506,342.14	\$ 50,634.21	\$ 50,634.21	\$ 506,342.14	\$ 506,342.14			\$	\$	\$ 506,342.14	100.00	\$
<b>Varios tramos</b>																
505	4500008991	JOSE LUIS SATURNINO AGUILAR BAHENA	01/09/2007	28/06/2008	\$ 1,236,854.85	\$ 123,685.48	\$ 123,685.48	\$ 1,236,854.85	\$ 1,236,854.85			\$	\$	\$ 1,236,854.85	100.00	\$
575	4500008943	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	16/09/2007	14/06/2008	\$ 1,182,136.90	\$ 118,213.69	\$ 118,213.69	\$ 1,182,136.90	\$ 1,182,136.90			\$ 0.00	\$	\$ 1,182,136.90	100.00	\$
<b>Puebla</b>																
<b>México - Puebla</b>																
255	4500007594 5500002707	COMP. APLICADA PARA PROYECTOS. ARQ. E ING.	13/04/2007	18/03/2008	\$ 975,119.72	\$ 97,511.97	\$ 97,511.97	\$ 975,119.72	\$ 975,119.72		\$ 2,834.06	\$	\$	\$ 975,119.72	100.00	\$
265	4500007995 5500002708	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES	14/01/2007	10/03/2008	\$ 1,001,012.84	\$ 100,101.28	\$ 100,101.28	\$ 1,001,012.84	\$ 1,001,012.23		\$ 2,770.30	\$ 90.82	\$	\$ 1,001,022.23	100.00	\$
275	4500007990 5500002709	ICTAM CONSULTORES. CONSTRUCTORES	13/04/2007	18/03/2008	\$ 805,402.95	\$ 80,540.29	\$ 80,540.29	\$ 805,402.95	\$ 805,402.95			\$	\$	\$ 805,402.95	100.00	\$
<b>Acatzingo - Cd. Mendoza</b>																
285	4500007996 5500002716	GRUPO CONSTRUCTOR SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE MEXICO	19/04/2007	24/02/2008	\$ 750,077.64	\$ 75,007.76	\$ 75,007.76	\$ 750,077.64	\$ 750,077.64			\$	\$	\$ 750,077.64	100.00	\$
<b>Coahuila de Zaragoza</b>																
<b>Champón - Compecho</b>																
295	4500007010	OVALO CONSTRUCCIONES	01/02/2007	15/02/2008	\$ 584,424.70	\$ 58,424.70	\$ 58,424.70	\$ 584,424.05	\$ 584,424.07		\$ 906.85	\$ 28,306.95	\$	\$ 585,040.87	100.00	\$
<b>La Trinitaria - Acapulco</b>																
305	4500007989	OVALO CONSTRUCCIONES	01/02/2007	15/02/2008	\$ 665,519.46	\$ 66,551.95	\$ 66,551.95	\$ 665,519.46	\$ 644,895.60			\$	\$	\$ 644,895.60	100.00	\$
<b>Acapulco - Cosahuatlan</b>																
315	4500007591	OVALO CONSTRUCCIONES	01/02/2007	15/02/2008	\$ 594,419.91	\$ 59,419.91	\$ 59,419.91	\$ 594,419.05	\$ 593,596.74		\$ 2,526.34	\$ 24,632.31	\$	\$ 590,556.75	100.00	\$
<b>Agua Dulce - Cuernavaca</b>																
325	4500007593	OVALO CONSTRUCCIONES	01/02/2007	15/02/2008	\$ 596,305.28	\$ 59,630.53	\$ 59,630.53	\$ 596,305.28	\$ 592,176.98			\$	\$	\$ 592,176.98	100.00	\$
<b>Saltillo Cruz - La Venecia</b>																
335	4500007595	GEOTECNIA Y SUPERVISION TECNICA	01/02/2007	15/02/2008	\$ 606,146.44	\$ 60,614.64	\$ 60,614.64	\$ 606,146.44	\$ 597,420.26			\$	\$	\$ 597,420.26	100.00	\$
<b>TOTAL</b>																
					\$ 4,075,312.36	\$ 407,531.24	\$ 407,531.24	\$ 4,075,312.36	\$ 4,075,312.31	\$	\$	\$ 0.07	\$	\$ 4,075,312.31	100.00	\$

0058

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Partida	Contenido No.	Empresa	Periodo del Contrato		Monto Contratado A	Anticipo		Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Evaluado en Trámite D	Revoluciones Devoluciones E	Saldo Cancelado P	Diferencia B - C - D - E	Ejercido e Flujo de Efectivo	Avance financiero (%)	Monto pagado de Ajusto de Costos G
			Inicio	Fin		Otorgado	Amortizado									
<b>Veracruz</b>																
<b>Cd. Mendoza - Córdoba</b>																
34S	4500007942 5500002926	WAS INGENIERIA	02/07/2007	17/06/2008	\$ 575,549.00	\$ 57,254.00	\$ 57,254.00	\$ 572,549.01	\$ 422,318.29			\$ 145,000.70	\$	\$ 422,318.29	100.00	\$ 422,318.29
<b>Córdoba - Veracruz</b>																
35S	4500007712 5500002897	PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL	01/02/2007	14/03/2008	\$ 465,020.08	\$ 46,502.04	\$ 46,502.04	\$ 465,020.08	\$ 465,020.08			\$	\$	\$ 465,020.08	100.00	\$ 465,020.08
<b>La Trinitaria - Cd. Ixila</b>																
30S	4500007702 5500002878	GRUPO CONSTRUCTOR SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE MEXICO	12/03/2007	25/03/2008	\$ 400,227.32	\$ 40,022.72	\$ 40,022.72	\$ 400,227.32	\$ 400,227.32			\$	\$	\$ 400,227.32	100.00	\$ 400,227.32
<b>Guerrero Zamora - Tlaxiuhán</b>																
37S	4500007811	ROCHER INGENIERIA	01/02/2007	16/02/2008	\$ 492,841.19	\$ 49,284.12	\$ 49,284.12	\$ 492,841.18	\$ 413,620.21			\$ 79,020.96	\$	\$ 413,620.21	100.00	\$ 413,620.21
<b>Libramiento Poniente de Tampico</b>																
33S	4500007717 5500002861	CUA INDUSTRIAL	08/03/2007	21/03/2008	\$ 803,490.88	\$ 60,340.88	\$ 60,340.88	\$ 603,490.88	\$ 603,490.88			\$	\$	\$ 603,490.88	100.00	\$ 603,490.88
<b>Reynosa</b>																
39S	4500007807	FEH PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	29/01/2007	15/02/2008	\$ 429,117.58	\$	\$	\$ 429,117.58	\$ 428,938.07			\$ 179.51	\$	\$ 428,938.07	100.00	\$ 428,938.07
<b>Guadaluajara</b>																
<b>Mazatlán - Zapotlán</b>																
40S 41S	4500007707	COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA	01/02/2007	15/02/2008	\$ 2,212,766.15	\$	\$	\$ 2,212,766.15	\$ 1,521,225.16			\$ 691,541.00	\$	\$ 1,521,225.16	100.00	\$ 1,521,225.16
<b>Guadaluajara - Tepic</b>																
42S 43S	4500007800	CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS	01/02/2007	15/02/2008	\$ 1,482,716.14	\$	\$	\$ 1,482,716.14	\$ 1,482,716.14			\$	\$	\$ 1,482,716.14	100.00	\$ 1,482,716.14
<b>Zapotlán - Guadaluajara</b>																
44S	4500007829	CLAPADH	01/02/2007	15/02/2008	\$ 709,120.15	\$	\$	\$ 709,120.15	\$ 480,320.28			\$ 228,799.87	\$	\$ 480,320.28	100.00	\$ 480,320.28
<b>Zapotlán - Lomas de Moreno</b>																
45S 46S	4500007510	RAUL VICENTE ORCZCO Y COMPANIA	01/02/2007	15/02/2008	\$ 1,011,278.07	\$	\$	\$ 1,011,278.07	\$ 668,201.48			\$ 343,076.59	\$	\$ 668,201.48	100.00	\$ 668,201.48
<b>Monterrey</b>																
47S	4500007558	HQ CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	01/02/2007	15/02/2008	\$ 847,559.00	\$ 84,755.90	\$ 84,755.90	\$ 847,559.01	\$ 847,529.01			\$	\$	\$ 847,529.01	100.00	\$ 847,529.01
<b>Saltillo - Torreon</b>																
48S	4500007557	RAUL VICENTE ORCZCO Y COMPANIA	01/02/2007	15/02/2008	\$ 650,937.81	\$ 65,093.78	\$ 65,093.78	\$ 650,937.81	\$ 650,937.81			\$	\$	\$ 650,937.81	100.00	\$ 650,937.81
<b>Carbонера - Ojo Caliente</b>																
49S	4500007558	HQ CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	01/02/2007	15/02/2008	\$ 826,299.97	\$ 82,630.00	\$ 82,630.00	\$ 826,299.97	\$ 826,299.97			\$	\$	\$ 826,299.97	100.00	\$ 826,299.97

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Monto Contratado A	Amortizado		Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Retenciones - Devoluciones E	Saldo Calculado F	Diferencia B+C-D-E	Ejército a Flujo de Efectivo de Efectivo	Avance financiero (%)	Monto pagado de Ajuste de Costos G
			Inicio	Fin		Oportado	Amortizado									
<b>Gómez Palacio - Carrizales</b>																
505	4500007759	RAUL VICENTE DROZCO Y COMPAÑIA	01/02/2007	15/02/2008	\$ 656,270.32			\$ 656,270.32	\$ 656,270.32			\$	\$	\$ 656,270.32	100.00%	\$
<b>Cadereyta - Reynosa</b>																
515	4500007760	SMC Y ASOCIADOS	01/02/2007	15/02/2008	\$ 667,994.92	\$ 66,799.46	\$ 66,799.46	\$ 667,994.92	\$ 667,994.92			\$	\$	\$ 667,994.92	100.00%	\$
<b>Puerto México - Carbonera</b>																
525	4500007761	SOLUCIONES DE INGENIERIA Y LABORATORIO TECNICO	01/02/2007	15/02/2008	\$ 733,630.01	\$ 73,363.00	\$ 73,363.00	\$ 733,630.01	\$ 733,630.01			\$	\$	\$ 733,630.01	100.00%	\$
<b>Chilpancingo</b>																
					\$ 4,382,674.64	\$ 372,629.83	\$ 372,629.83	\$ 4,382,674.64	\$ 4,382,674.64			\$	\$	\$ 4,382,674.64	100.00%	\$
<b>Las Choapas - Raudales - Coahuila</b>																
535	4500007600	GRUPO CONSTRUCTOR SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE MEXICO	12/02/2007	15/02/2008	\$ 1,299,192.81	\$ 129,919.28	\$ 129,919.28	\$ 1,299,192.81	\$ 1,299,192.81			\$	\$	\$ 1,299,192.81	100.00%	\$
<b>Oaxaca</b>																
<b>Cd. Cuernavaca - Oaxaca</b>																
545	4500008183	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAM	22/04/2007	15/02/2008	\$ 1,061,604.17	\$ 106,160.42	\$ 106,160.42	\$ 1,061,604.17	\$ 1,070,423.17			\$ 11,161.00	\$	\$ 1,070,420.17	100.00%	\$
555	4500008040	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS RAM	02/04/2007	16/02/2008	\$ 1,190,690.77	\$ 119,000.08	\$ 119,000.08	\$ 1,190,690.77	\$ 1,125,483.13			\$ 65,207.64	\$	\$ 1,125,483.13	100.00%	\$
<b>TOTAL</b>																
					\$ 2,272,294.04	\$ 227,229.50	\$ 227,229.50	\$ 2,272,294.04	\$ 2,195,674.30			\$ 76,604.64	\$	\$ 2,195,674.30	100.00%	\$
					\$ 36,452,720.73	\$ 2,268,023.05	\$ 2,268,023.05	\$ 36,452,720.73	\$ 34,747,463.68			\$ 1,705,257.05	\$	\$ 34,779,721.64	100.00%	\$ 31,268.25

0060

029

7



RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES Z107 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Contratado		Anticipo		Programado Acumulado		Estimado Acumulado		Estimado en trámite	Saldo Contratado	Diferencia D-C-D-E	Cerrado a Fines de Ejercicio	Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance Financiero (%)
	A	B	C	D	E	F	G	H					I	J	K	
Culiacán	\$ 20,832,768.64	\$ 2,276,836.50	\$ 4,844,040.39	\$ 20,632,788.64	\$ 15,700,082.14	\$ 5,232,726.50	\$ 17,153,831.58	\$ 171,240.43	\$ 17,970.24	\$ 17,153,831.58	\$ 171,240.43	\$ 17,970.24	\$ 17,970.24	\$ 171,240.43	\$ 17,970.24	100%
Queretaro	\$ 10,637,637.20	\$ 2,886,095.82	\$ 2,886,095.82	\$ 10,637,637.20	\$ 10,402,794.79	\$ 234,852.41	\$ 10,402,794.79	\$ 42,798.78	\$ 42,798.78	\$ 234,852.41	\$ 42,798.78	\$ 42,798.78	\$ 42,798.78	\$ 42,798.78	\$ 42,798.78	100%
Coahuila	\$ 45,997,014.13	\$ 106,365.62	\$ 106,365.62	\$ 45,997,014.13	\$ 45,997,014.12	\$ 0.01	\$ 45,997,014.12	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	\$ 0.01	100%
Puebla	\$ 60,798,721.04	\$ 11,898,726.03	\$ 11,898,726.03	\$ 60,798,721.04	\$ 60,798,233.15	\$ 428.79	\$ 60,798,233.15	\$ 428.79	\$ 428.79	\$ 428.79	\$ 428.79	\$ 428.79	\$ 428.79	\$ 428.79	\$ 428.79	100%
Coahuila	\$ 55,522,981.85	\$ 10,656,864.50	\$ 10,656,864.50	\$ 55,522,981.85	\$ 55,522,755.40	\$ 120.30	\$ 55,522,755.40	\$ 120.30	\$ 120.30	\$ 120.30	\$ 120.30	\$ 120.30	\$ 120.30	\$ 120.30	\$ 120.30	100%
Veracruz	\$ 106,671,753.09	\$ 30,275,089.05	\$ 29,547,089.05	\$ 106,671,753.09	\$ 105,765,587.88	\$ 900,165.21	\$ 105,765,587.88	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	\$ 900,165.21	100%
Chiapas	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	\$ 542,074.36	100%
Oaxaca	\$ 8,375,095.12	\$ 2,512,528.54	\$ 2,512,528.54	\$ 8,375,095.12	\$ 6,942,239.21	\$ 1,432,865.91	\$ 6,942,239.21	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	\$ 1,432,865.91	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 309,477,966.35</b>	<b>\$ 70,612,506.21</b>	<b>\$ 69,451,715.16</b>	<b>\$ 309,477,966.35</b>	<b>\$ 301,670,611.16</b>	<b>\$ 7,807,155.19</b>	<b>\$ 317,225,910.53</b>	<b>\$ 3,245,846.11</b>	<b>\$ 13,303,305.42</b>	<b>\$ 7,807,155.19</b>	<b>\$ 3,245,846.11</b>	<b>\$ 13,303,305.42</b>	<b>\$ 13,303,305.42</b>	<b>\$ 3,245,846.11</b>	<b>\$ 13,303,305.42</b>	<b>100%</b>

Nota: Incluye obra y supervisión del Distribuidor vial Qualitec (Obra a cargo del Fideicomiso no. 2092)

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

0% < 50% < 60% < 80% < 90% < 100% < 100%








RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2007 DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Contratado A		Programado Acumulado D		Estimado Acumulado C		Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Seguimiento al Avance Presupuestal		Avance financiero (%)
	Obligado	Anticipo Amortizado	Programado Acumulado D	Estimado Acumulado C	Estimado en tramite D	Ejercido a Fijo de Efectivo			Retenciones + Devoluciones	Ajuste de Costos Pagados	
Coloacion	\$ 1,234,452.06	\$ 55,474.64	\$ 1,234,452.06	\$ 1,182,515.82	\$ 51,936.24	\$ 1,182,515.82	\$ 15,166.13				
Queretaro	\$ 635,339.50		\$ 635,339.50	\$ 635,339.50		\$ 635,339.50					
Puebla	\$ 3,039,326.06		\$ 3,039,326.06	\$ 3,038,444.21	\$ 881.85	\$ 3,038,444.21	\$ 39,352.44				
Coahuila de Zaragoza	\$ 4,645,184.95	\$ 359,885.82	\$ 4,645,184.95	\$ 4,645,184.95		\$ 4,645,184.95					
Veracruz	\$ 6,942,065.14	\$ 482,963.50	\$ 6,942,065.14	\$ 6,878,259.61	\$ 63,805.53	\$ 6,878,259.61	\$ 355,245.93				
Oaxaca	\$ 517,290.19	\$ 51,729.02	\$ 517,290.19	\$ 495,078.47	\$ 22,211.72	\$ 495,078.47					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,013,657.90</b>	<b>\$ 950,052.98</b>	<b>\$ 17,013,657.90</b>	<b>\$ 16,874,822.56</b>	<b>\$ 138,835.34</b>	<b>\$ 16,874,822.56</b>	<b>\$ 409,764.40</b>				

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

400% 60% < 80% 90% < 100% 100%

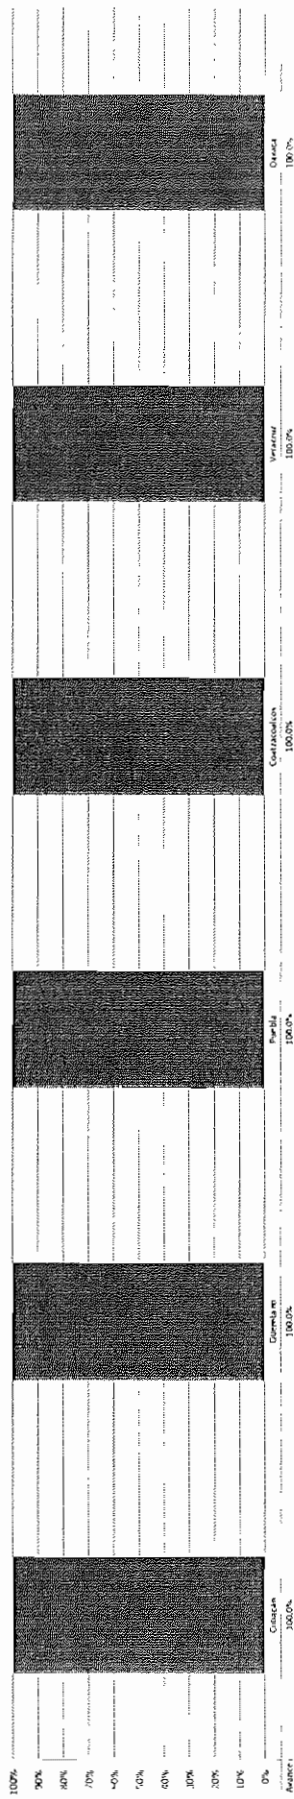

0064 093



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado (A)	Anticipo		Programado Acumulado (B)	Climado Acumulado (C)	Climado en Trámite (D)	Remisiones - Devoluciones (E)	Saldo Cancelado (F)	Diferencia D - (F) - (E)	Cierres a Flujos de Efectivo	Avance financiero (%)
		Inicio	Fin			Ordinado	Anotificado								
<b>Coloaber</b>															
<b>Estacion Don - Nariño</b>															
1 - SP	460005706	CONSTRUCTORA IGUALAMA	13/06/2007	24/12/2007	204,120.00			204,120.00	207,250.10		2,292.43	1,330.96		3	797,200.10
2 - SP	460005715 560005719	CONSTRUCTORA IGUALAMA	10/04/2007	04/01/2007	186,203.22			186,203.22	186,203.22		600.00			1	186,203.22
3 - SP	460005803	DAEGIA MANCINAS FELIPE DE JESUS	20/04/2007	04/01/2006	239,420.90		16,743.70	256,164.60	250,020.10					1	250,020.10
4 - SP	460006142 560006140 560006140	CONSTRUCTORA IGUALAMA	02/04/2007	14/12/2007	560,300.34		36,720.00	597,020.34	464,195.00		12,713.04	50,100.34		1	454,195.00
<b>Subtotal Coloaber</b>					<b>1,204,044.46</b>		<b>53,463.70</b>	<b>1,257,508.16</b>	<b>1,192,515.32</b>		<b>15,605.47</b>	<b>10,030.74</b>			<b>1,192,515.32</b>
<b>Quintero</b>															
<b>Palmarazo - Urupan</b>															
5 - SP	560006196 560006194	COGRUPO DEL CENTRO	03/04/2007	10/09/2007	626,320.92			626,320.92	626,320.92					1	626,320.92
<b>Subtotal Quintero</b>					<b>626,320.92</b>			<b>626,320.92</b>	<b>626,320.92</b>						<b>626,320.92</b>
<b>Mexico - Puebla</b>															
20 - SP	460006563 560006564 560006565 560006566	KEATEL	03/09/2007	12/02/2006	950,492.12			950,492.12	950,492.12		1,448.15			1	950,492.12
30 - SP	460006594 560006595 560006596	ICTAM CONSULTORES CONSTRUCTORES	03/09/2007	14/01/2009	2,080,023.04			2,080,023.04	2,087,069.89		37,204.20	881.85		1	2,087,069.89
<b>Subtotal Mexico - Puebla</b>					<b>2,070,514.16</b>			<b>2,070,514.16</b>	<b>2,087,562.01</b>		<b>37,652.35</b>	<b>881.85</b>			<b>2,087,562.01</b>
<b>Puerto Zarcón</b>															
32 - SP	460006603 560006604 560006605 560006606	CONSTRUCTORA SUPERVISION TECNICA Y OPERACION EN SRETTMAS	11/09/2007	14/10/2006	4,045,104.00		359,885.02	4,404,989.02	4,045,104.00					1	4,045,104.00
<b>Subtotal Puerto Zarcón</b>					<b>4,404,989.02</b>		<b>359,885.02</b>	<b>4,764,874.04</b>	<b>4,045,104.00</b>						<b>4,045,104.00</b>
<b>Venezuela</b>															
<b>La Trinidad - Cc. Iba</b>															
35 - SP	560006700 560006700 560006700	NEUR INCINERIA	21/09/2007	20/12/2006	630,000.14		495,000.00	1,125,000.14	630,000.14		265,246.00	63,606.63		1	630,000.14
<b>Subtotal Venezuela</b>					<b>630,000.14</b>		<b>495,000.00</b>	<b>1,125,000.14</b>	<b>630,000.14</b>		<b>265,246.00</b>	<b>63,606.63</b>			<b>630,000.14</b>
<b>Oaxaca</b>															
<b>Cd. Chiconomastlan - Oaxaca</b>															
40 - SP	460006746 560006744	CONSTRUCTORA ANSORIA Y LABORATORIO	24/07/2007	23/11/2007	517,200.10		517,200.07	517,200.10	476,076.17			22,211.77		1	476,076.17
<b>Subtotal Oaxaca</b>					<b>517,200.10</b>		<b>517,200.07</b>	<b>517,200.10</b>	<b>476,076.17</b>			<b>22,211.77</b>			<b>476,076.17</b>
<b>TOTAL</b>					<b>17,013,607.90</b>		<b>950,003.38</b>	<b>17,963,611.28</b>	<b>16,874,822.36</b>		<b>489,744.40</b>	<b>138,833.24</b>			<b>16,874,822.36</b>

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Contratado A		Anticipo Obrajero		Anticipo Anualizado		Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance Financiero (%)
							B	C	D	E	Diferencia D - C - D - E	Ejercicio a Final de Ejercicio	Reintegraciones - Devoluciones	Ajuste de Costos Pagados	
Tijuana	\$ 2,874,014.21	\$ 574,802.83	\$ 574,802.83	\$ 574,802.83	\$ 2,874,014.21	\$ 2,037,360.79	\$ 2,037,360.79	\$ 836,653.42	\$ 2,037,360.79	\$ 2,037,360.79	\$ 2,037,360.79	\$ 2,037,360.79			100.0%
Culiacán	\$ 2,895,250.44	\$ 865,575.14	\$ 865,575.14	\$ 865,575.14	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 2,895,250.44	\$ 67,000.94	\$ 67,000.94	100.0%
Querétaro	\$ 9,850,819.17	\$ 1,970,163.81	\$ 1,970,163.81	\$ 1,970,163.81	\$ 9,850,819.17	\$ 9,043,484.62	\$ 9,043,484.62	\$ 7,334.45	\$ 9,043,484.62	\$ 9,043,484.62	\$ 9,043,484.62	\$ 9,043,484.62			100.0%
Guerrero	\$ 5,156,279.03	\$ 506,893.49	\$ 506,893.49	\$ 506,893.49	\$ 5,156,279.03	\$ 5,156,279.03	\$ 5,156,279.03		\$ 5,156,279.03	\$ 5,156,279.03	\$ 5,156,279.03	\$ 5,156,279.03			100.0%
Puebla	\$ 7,437,060.14	\$ 1,487,418.03	\$ 1,487,418.03	\$ 1,487,418.03	\$ 7,437,060.14	\$ 6,890,873.30	\$ 6,890,873.30	\$ 537,216.78	\$ 7,437,060.14	\$ 7,437,060.14	\$ 7,437,060.14	\$ 7,437,060.14	\$ 198,997.52	\$ 198,997.52	100.0%
Coahuila	\$ 7,254,379.44	\$ 2,176,313.54	\$ 2,176,313.54	\$ 2,176,313.54	\$ 7,254,379.44	\$ 7,252,705.33	\$ 7,252,705.33	\$ 1,673.11	\$ 7,252,705.33	\$ 7,252,705.33	\$ 7,252,705.33	\$ 7,252,705.33	\$ 19,911.51	\$ 19,911.51	100.0%
Veracruz	\$ 10,245,191.89	\$ 3,073,557.54	\$ 3,073,557.54	\$ 3,073,557.54	\$ 10,245,191.89	\$ 10,167,063.15	\$ 10,167,063.15	\$ 48,128.68	\$ 10,167,063.15	\$ 10,167,063.15	\$ 10,167,063.15	\$ 10,167,063.15			100.0%
Yucatán	\$ 2,366,885.15				\$ 2,366,885.15	\$ 2,366,641.86	\$ 2,366,641.86	\$ 43.29	\$ 2,366,641.86	\$ 2,366,641.86	\$ 2,366,641.86	\$ 2,366,641.86			100.0%
Guadalajara	\$ 5,875,093.60	\$ 587,509.36	\$ 587,509.36	\$ 587,509.36	\$ 5,875,093.60	\$ 3,731,540.73	\$ 3,731,540.73	\$ 2,143,552.86	\$ 3,731,540.73	\$ 3,731,540.73	\$ 3,731,540.73	\$ 3,731,540.73	\$ 527.92	\$ 527.92	100.0%
Monterrey	\$ 4,304,462.47	\$ 336,055.33	\$ 336,055.33	\$ 336,055.33	\$ 4,304,462.47	\$ 4,304,458.83	\$ 4,304,458.83	\$ 3.64	\$ 4,304,458.83	\$ 4,304,458.83	\$ 4,304,458.83	\$ 4,304,458.83	\$ 132,212.98	\$ 132,212.98	100.0%
Chiapas	\$ 1,572,825.93	\$ 471,847.78	\$ 471,847.78	\$ 471,847.78	\$ 1,572,825.93	\$ 1,572,023.05	\$ 1,572,023.05	\$ 202.88	\$ 1,572,023.05	\$ 1,572,023.05	\$ 1,572,023.05	\$ 1,572,023.05	\$ 2,326.26	\$ 2,326.26	100.0%
Oaxaca	\$ 2,299,796.05	\$ 689,938.82	\$ 689,938.82	\$ 689,938.82	\$ 2,299,796.05	\$ 2,125,438.25	\$ 2,125,438.25	\$ 174,357.80	\$ 2,125,438.25	\$ 2,125,438.25	\$ 2,125,438.25	\$ 2,125,438.25	\$ 66,708.73	\$ 66,708.73	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 62,121,887.45</b>	<b>\$ 12,740,975.67</b>	<b>\$ 12,740,975.67</b>	<b>\$ 12,740,975.67</b>	<b>\$ 62,121,887.45</b>	<b>\$ 58,375,720.34</b>	<b>\$ 58,375,720.34</b>	<b>\$ 3,749,167.11</b>	<b>\$ 58,375,720.34</b>	<b>\$ 58,375,720.34</b>	<b>\$ 58,375,720.34</b>	<b>\$ 58,375,720.34</b>	<b>\$ 488,617.86</b>	<b>\$ 488,617.86</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Petilla	Código No.	Empresa	Periodo de Contabilización	Concepto	Monto Contratado		Amortización		Programado Acumulado B	Ejecutado Acumulado C	Estimado al Trimestre D	Reservaciones Derivadas E	Devoluciones F	Diferencia D.C.D.E	Estado a Final de Ejercicio	Años Financieros (N)	Aporte Inicial (M)	Monto pagado de Aporte Inicial (M)
					A	B	C	D										
<b>Tlaxcala - Tlaxcala</b>																		
1	40000010 50000014	TECERACERAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS	1/07/2007 09/02/07	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 9 PUENTES, 10 P.V.S. Y 13 P.P.S.	1,107,291.56 \$	271,470.31 \$	271,470.31 \$	1,107,291.56 \$	1,107,291.56 \$	1,107,291.56 \$			109,520.77 \$	- \$	1,109,100.79		100%	
<b>La Huasteca - Tepic</b>																		
2	40000010 50000014	TECERACERAS E INSTALACIONES HIDRAULICAS	1/06/2007 09/02/07	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 5 PUENTES, 24 P.V.S. Y 15 P.P.S.	1,345,874.41 \$	290,174.05 \$	290,174.05 \$	1,345,874.41 \$	1,345,874.41 \$	1,345,874.41 \$			88,024.50 \$	- \$	855,549.92		100%	
<b>Libramiento Log Cabon</b>																		
3	40000010 50000014	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DE OBRAS HIDRAULICAS	1/06/2007 09/02/07	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 9 PUENTES Y 4 P.V.S.	400,748.28 \$	94,149.84 \$	94,149.84 \$	400,748.28 \$	400,748.28 \$	400,748.28 \$			40,200.99 \$	- \$	306,487.15		100%	
<b>Colaba</b>																		
<b>SUBTOTAL Tlaxcala</b>																		
					2,854,914.25 \$	551,694.16 \$	551,694.16 \$	2,854,914.25 \$	2,854,914.25 \$	2,854,914.25 \$			159,745.26 \$	- \$	2,825,169.79 \$			
<b>Fraccion Dos - Nogales</b>																		
4	40000014	CONTRATACIONES	07/02/2007 27/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 37 PUENTES, 1 P.V.S. Y 2 P.P.S.	1,682,152.25 \$	584,830.00 \$	584,830.00 \$	1,682,152.25 \$	1,682,152.25 \$	1,682,152.25 \$	310.00 \$			- \$	1,682,152.25		100%	
<b>Meritane - Culiacan</b>																		
5	40000010 50000014	CONSTRUCCIONES DERRIBOS	20/04/2007 15/10/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 91 PUENTES, 46 P.V.S. Y 5 P.P.S.	900,119.19 \$	270,036.48 \$	270,036.48 \$	900,119.19 \$	900,119.19 \$	900,119.19 \$				- \$	900,119.19		100%	
<b>Queretaro</b>																		
					2,087,292.44 \$	855,072.14 \$	855,072.14 \$	2,087,292.44 \$	2,087,292.44 \$	2,087,292.44 \$				- \$	2,087,292.44 \$			
<b>Leon - Lago de Moreno - Aguascalientes</b>																		
6	40000010 50000014	SUBSTITUCION Y SERVICIOS DE OBRAS HIDRAULICAS	17/06/2007 31/07/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 14 PUENTES, 39 P.V.S. Y 3 P.P.S.	700,007.91 \$	140,013.56 \$	140,013.56 \$	700,007.91 \$	700,007.91 \$	700,007.91 \$				- \$	700,007.91		100%	
<b>Libramiento Noroeste de Chantlario</b>																		
7	40000010 50000014	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VALENCES	10/04/2007 10/04/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 12 P.V.S., 2 P.P.S. Y 1 P.P.C.	440,201.43 \$	88,040.28 \$	88,040.28 \$	440,201.43 \$	440,201.43 \$	440,201.43 \$				- \$	440,201.43		100%	
<b>Chantlario - Leon</b>																		
8	40000010 50000014	FRANCOS CONSTRUCCIONES	17/06/2007 31/07/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 5 PUENTES, 20 P.V.S. Y 1 P.P.S.	1,100,027.41 \$	222,124.00 \$	222,124.00 \$	1,100,027.41 \$	1,100,027.41 \$	1,100,027.41 \$			1.40 \$	- \$	1,100,025.98		100%	
<b>Panajuelo - Uruapan</b>																		
9	40000010 50000014	CAMINOS Y PUENTES METEOROLOGICOS	10/04/2007 10/04/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DERRIBO DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNIONES, BORDADOS, BARRANDILES, PARAPETOS, PANTALLA EN DEFENSA METALICA, SCANALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 4 PUENTES, 40 P.V.S. Y 3 P.P.S.	815,752.48 \$	103,116.00 \$	103,116.00 \$	815,752.48 \$	815,752.48 \$	815,752.48 \$				- \$	815,752.48		100%	

000 0067 036





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2017

No. Puntal	Código No. Proyecto	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contribuido		Ocupado	Amortizado	Programa Acumulado B	Estimado Acumulado C	Deducciones E	Saldo Comprobado F	Diferencia (F-C-D-E)	Ejecución Etapa de Ejecución	Avance Financiero F-J	Avance Físico (K)	Monto pagado de Aporte de Costos G
			Inicia	Fin		A	B											
<b>Puebla</b>																		
<b>Municipio - Puebla</b>																		
21	400000667 500000201	GRUPO CONSTRUCTOR POSADANO	13/07/2007	07/06/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 16 PUENTES, 16 PUNTES, 19 PILES, 2 PILES, 3 PILES Y 4 MANCANA.	2,997,710.76 \$	570,541.10 \$	570,541.10 \$	570,541.10 \$	2,807,710.76 \$	2,807,710.68 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,591,290.09 \$	100%	100%	90,509.36 \$
<b>Puebla - Cd. Amatepec</b>																		
22	400000668 500000202	GRUPO CONSTRUCTOR AMAGON	14/07/2007	09/06/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 17 PUENTES, 16 PUNTES, 19 PILES, 2 PILES, 2 PILES Y 4 MANCANA.	2,540,897.24 \$	500,721.46 \$	500,721.46 \$	500,721.46 \$	2,540,165.74 \$	2,540,165.74 \$	40.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,540,358.74 \$	100%	100%	0.00 \$
<b>Acatzingo - Cd. Amatepec</b>																		
23	400000669 500000203	GL-DAMIAN INDUSTRIA	20/09/2007	21/06/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 17 PUENTES, 16 PUNTES, 19 PILES, 2 PILES, 2 PILES Y 4 MANCANA.	1,906,876.17 \$	300,154.47 \$	300,154.47 \$	300,154.47 \$	1,506,695.93 \$	1,506,695.93 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,506,695.93 \$	100%	100%	0.00 \$
<b>Cordoba</b>																		
<b>Cordoba - Cd. Amatepec</b>																		
24	400000670 500000204	TECNOLOGIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	10/06/2007	24/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 19 PILES, 2 PILES Y 4 MANCANA.	602,607.20 \$	100,762.17 \$	100,762.17 \$	100,762.17 \$	602,607.20 \$	602,607.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	602,607.20 \$	100%	100%	0.00 \$
<b>Cd. Ixmiquilpan</b>																		
25	400000646	SERVIRINT AMANE	10/06/2007	24/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 19 PILES, 2 PILES Y 4 MANCANA.	1,674,302.74 \$	602,204.42 \$	602,204.42 \$	602,204.42 \$	1,674,302.74 \$	1,674,277.77 \$	24.97 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,674,277.77 \$	100%	100%	0.00 \$
<b>Acatzingo - Cordoba</b>																		
26	400000673	TECNOLOGIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	10/06/2007	24/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 20 PUENTES, 20 PUNTES, 2 PILES, 2 PILES Y 7 OTRAS ESTRUCTURAS.	1,296,938.00 \$	370,702.43 \$	370,702.43 \$	370,702.43 \$	1,296,938.00 \$	1,296,913.31 \$	24.69 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,296,913.31 \$	100%	100%	0.00 \$
<b>Aguililla - Cordoba</b>																		
27	400000690	INDUSTRIAL-TEL PUERTO	10/06/2007	24/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 20 PUENTES, 20 PUNTES, 2 PILES, 2 PILES Y 7 OTRAS ESTRUCTURAS.	1,131,024.75 \$	300,020.43 \$	300,020.43 \$	300,020.43 \$	1,131,024.75 \$	1,131,024.75 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,131,024.75 \$	100%	100%	0.00 \$
<b>Puebla - Puebla</b>																		
28	400000665 500000211	GRUPO OCC.S.A. DE CV	11/06/2007	17/06/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBIO DEL DORCHO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORNILLOS, TIRAMALLALES, SERNALAMIENTOS HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 20 PUENTES, 20 PUNTES, 2 PILES, 2 PILES Y 7 OTRAS ESTRUCTURAS.	951,600.51 \$	205,660.15 \$	205,660.15 \$	205,660.15 \$	951,600.51 \$	951,600.29 \$	0.22 \$	0.00 \$	0.00 \$	951,600.29 \$	100%	100%	0.00 \$

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Puentes	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato	Concepto	Monto Contratado	Anticipo		Programado Acumulado	Ejecuciones	Devoluciones	Saldo Comprometido	Gastos	Ejecución a Flujos de Efectivo	Avance financiero (%)	Avance financiero	Monto pagado de Alícuota de Ganancias																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Original	Acreditado																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<p><b>Venezuela</b></p> <p><b>Cd. Mucubiza - Curitiba</b></p> <tr> <td>29</td> <td>40000094</td> <td>INDUSTRIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL VALLE</td> <td>01/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,598,676.12</td> <td>479,682.24</td> <td>479,682.24</td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,598,676.12</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL CONTRATACIONES</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1,598,676.12</td> <td>479,682.24</td> <td>479,682.24</td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Córdoba - Mucubizor</b></p> <tr> <td>31</td> <td>60000020</td> <td>INGENIERIA LACUTIVA S.O.L</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>2,941,029.43</td> <td>702,418.09</td> <td>702,418.09</td> <td>2,941,029.43</td> <td>80.00</td> <td>2,059.47</td> <td></td> <td>2,941,029.43</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>La Trinita - Cd. Isla</b></p> <tr> <td>32</td> <td>60000028</td> <td>PUENTES CONSTRICCIONES</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>4,333,552.01</td> <td>1,335,269.75</td> <td>1,335,269.75</td> <td>4,333,552.01</td> <td></td> <td>1,003.09</td> <td></td> <td>4,333,552.01</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	29	40000094	INDUSTRIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL VALLE	01/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,598,676.12	479,682.24	479,682.24	1,598,676.12				1,598,676.12	100%				<p><b>SUBTOTAL CONTRATACIONES</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1,598,676.12</td> <td>479,682.24</td> <td>479,682.24</td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						1,598,676.12	479,682.24	479,682.24	1,598,676.12				1,598,676.12					<p><b>Córdoba - Mucubizor</b></p> <tr> <td>31</td> <td>60000020</td> <td>INGENIERIA LACUTIVA S.O.L</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>2,941,029.43</td> <td>702,418.09</td> <td>702,418.09</td> <td>2,941,029.43</td> <td>80.00</td> <td>2,059.47</td> <td></td> <td>2,941,029.43</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>La Trinita - Cd. Isla</b></p> <tr> <td>32</td> <td>60000028</td> <td>PUENTES CONSTRICCIONES</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>4,333,552.01</td> <td>1,335,269.75</td> <td>1,335,269.75</td> <td>4,333,552.01</td> <td></td> <td>1,003.09</td> <td></td> <td>4,333,552.01</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	31	60000020	INGENIERIA LACUTIVA S.O.L	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	2,941,029.43	702,418.09	702,418.09	2,941,029.43	80.00	2,059.47		2,941,029.43	100%				<p><b>La Trinita - Cd. Isla</b></p> <tr> <td>32</td> <td>60000028</td> <td>PUENTES CONSTRICCIONES</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>4,333,552.01</td> <td>1,335,269.75</td> <td>1,335,269.75</td> <td>4,333,552.01</td> <td></td> <td>1,003.09</td> <td></td> <td>4,333,552.01</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	32	60000028	PUENTES CONSTRICCIONES	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	4,333,552.01	1,335,269.75	1,335,269.75	4,333,552.01		1,003.09		4,333,552.01	100%				<p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	33	60000040	CONSTRICCIONES VELASCO	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	864,170.76	256,201.23	256,201.23	864,170.76		83.11		864,077.65	100%				<p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																	34	60000047	INDUSTRIAS BETAMANG	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	433,173.94	120,693.10	120,693.10	433,173.94		64,133.09		368,940.85	100%				<p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26					<p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr>																	35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%				<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15				
29	40000094	INDUSTRIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL VALLE	01/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,598,676.12	479,682.24	479,682.24	1,598,676.12				1,598,676.12	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>SUBTOTAL CONTRATACIONES</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>1,598,676.12</td> <td>479,682.24</td> <td>479,682.24</td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,598,676.12</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						1,598,676.12	479,682.24	479,682.24	1,598,676.12				1,598,676.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					1,598,676.12	479,682.24	479,682.24	1,598,676.12				1,598,676.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p><b>Córdoba - Mucubizor</b></p> <tr> <td>31</td> <td>60000020</td> <td>INGENIERIA LACUTIVA S.O.L</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>2,941,029.43</td> <td>702,418.09</td> <td>702,418.09</td> <td>2,941,029.43</td> <td>80.00</td> <td>2,059.47</td> <td></td> <td>2,941,029.43</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>La Trinita - Cd. Isla</b></p> <tr> <td>32</td> <td>60000028</td> <td>PUENTES CONSTRICCIONES</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>4,333,552.01</td> <td>1,335,269.75</td> <td>1,335,269.75</td> <td>4,333,552.01</td> <td></td> <td>1,003.09</td> <td></td> <td>4,333,552.01</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	31	60000020	INGENIERIA LACUTIVA S.O.L	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	2,941,029.43	702,418.09	702,418.09	2,941,029.43	80.00	2,059.47		2,941,029.43	100%				<p><b>La Trinita - Cd. Isla</b></p> <tr> <td>32</td> <td>60000028</td> <td>PUENTES CONSTRICCIONES</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>4,333,552.01</td> <td>1,335,269.75</td> <td>1,335,269.75</td> <td>4,333,552.01</td> <td></td> <td>1,003.09</td> <td></td> <td>4,333,552.01</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	32	60000028	PUENTES CONSTRICCIONES	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	4,333,552.01	1,335,269.75	1,335,269.75	4,333,552.01		1,003.09		4,333,552.01	100%				<p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	33	60000040	CONSTRICCIONES VELASCO	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	864,170.76	256,201.23	256,201.23	864,170.76		83.11		864,077.65	100%				<p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																	34	60000047	INDUSTRIAS BETAMANG	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	433,173.94	120,693.10	120,693.10	433,173.94		64,133.09		368,940.85	100%				<p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26					<p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr>																	35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%				<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																								
31	60000020	INGENIERIA LACUTIVA S.O.L	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	2,941,029.43	702,418.09	702,418.09	2,941,029.43	80.00	2,059.47		2,941,029.43	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>La Trinita - Cd. Isla</b></p> <tr> <td>32</td> <td>60000028</td> <td>PUENTES CONSTRICCIONES</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>4,333,552.01</td> <td>1,335,269.75</td> <td>1,335,269.75</td> <td>4,333,552.01</td> <td></td> <td>1,003.09</td> <td></td> <td>4,333,552.01</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	32	60000028	PUENTES CONSTRICCIONES	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	4,333,552.01	1,335,269.75	1,335,269.75	4,333,552.01		1,003.09		4,333,552.01	100%				<p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	33	60000040	CONSTRICCIONES VELASCO	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	864,170.76	256,201.23	256,201.23	864,170.76		83.11		864,077.65	100%				<p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																	34	60000047	INDUSTRIAS BETAMANG	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	433,173.94	120,693.10	120,693.10	433,173.94		64,133.09		368,940.85	100%				<p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26					<p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr>																	35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%				<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																										
32	60000028	PUENTES CONSTRICCIONES	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	4,333,552.01	1,335,269.75	1,335,269.75	4,333,552.01		1,003.09		4,333,552.01	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>Guillermos - Trinita - Trinita</b></p> <tr> <td>33</td> <td>60000040</td> <td>CONSTRICCIONES VELASCO</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>864,170.76</td> <td>256,201.23</td> <td>256,201.23</td> <td>864,170.76</td> <td></td> <td>83.11</td> <td></td> <td>864,077.65</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr></td></tr>																	33	60000040	CONSTRICCIONES VELASCO	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	864,170.76	256,201.23	256,201.23	864,170.76		83.11		864,077.65	100%				<p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																	34	60000047	INDUSTRIAS BETAMANG	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	433,173.94	120,693.10	120,693.10	433,173.94		64,133.09		368,940.85	100%				<p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26					<p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr>																	35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%				<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																												
33	60000040	CONSTRICCIONES VELASCO	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	864,170.76	256,201.23	256,201.23	864,170.76		83.11		864,077.65	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>Urumaco - Mucubizor de Tampico</b></p> <tr> <td>34</td> <td>60000047</td> <td>INDUSTRIAS BETAMANG</td> <td>11/02/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>433,173.94</td> <td>120,693.10</td> <td>120,693.10</td> <td>433,173.94</td> <td></td> <td>64,133.09</td> <td></td> <td>368,940.85</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr></td></tr>																	34	60000047	INDUSTRIAS BETAMANG	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	433,173.94	120,693.10	120,693.10	433,173.94		64,133.09		368,940.85	100%				<p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26					<p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr>																	35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%				<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																																																														
34	60000047	INDUSTRIAS BETAMANG	11/02/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	433,173.94	120,693.10	120,693.10	433,173.94		64,133.09		368,940.85	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>Subtotal Mucubizor</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>10,258,103.26</td> <td>3,072,653.41</td> <td>3,072,653.41</td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td>15,911.67</td> <td></td> <td>10,258,103.26</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					10,258,103.26	3,072,653.41	3,072,653.41	10,258,103.26		15,911.67		10,258,103.26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p><b>Puentes Internacionales - Bayamo</b></p> <tr> <td>35</td> <td>60000027</td> <td>ENERGIA INGENIERIA</td> <td>20/05/2007 - 21/11/2007</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td></td> <td>7.50</td> <td></td> <td>377,197.98</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr></td></tr>																	35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%				<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																																																																																																																																		
35	60000027	ENERGIA INGENIERIA	20/05/2007 - 21/11/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	377,197.98			377,197.98		7.50		377,197.98	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>Majamaera - Bayamo</b></p> <tr> <td>36</td> <td>60000027</td> <td>GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td></td> <td>7.70</td> <td></td> <td>1,028,324.11</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr> </td></tr>																	36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%				<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																																																																																																																																																																				
36	60000027	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y CONSTRUCCIONES	10/04/2007 - 31/01/2008	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	1,028,324.11			1,028,324.11		7.70		1,028,324.11	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>Puentes Internacionales - Insoel Zamora</b></p> <tr> <td>37</td> <td>60000027</td> <td>CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION</td> <td>10/04/2007 - 31/01/2008</td> <td>PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS</td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td></td> <td>351,150.00</td> <td></td> <td>32.94</td> <td></td> <td>291,122.09</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17"> <p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </td> </tr>																	37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%				<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
37	60000027	CONSTRICCIONES Y CONSTRUCCION	10/04/2007 - 31/01/2008	PUENTE INTERNACIONAL GENERAL INICIO DE OBRAS DE CONSERVACION DE PUENTES EN LAS VAS DE LOS GUARANDONES, HORRILLOS, DAMANDELIS, PARAPUENTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SENSAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, P.V.S., P.F.S., P.P.S., P.F.S. Y P.F.S. Y OTRAS ALTERNATIVAS	351,150.00			351,150.00		32.94		291,122.09	100%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p><b>SUBTOTAL INTERNACIONAL</b></p> <tr> <td colspan="5"></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td>43.29</td> <td></td> <td>2,206,662.15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr>																						2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					2,206,662.15			2,206,662.15		43.29		2,206,662.15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

0000070

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2017

No. Periodo	Concepto No.	Empresa	Periodo del Contrato (Inicio - Fin)	Concepto	Monto Contratado		Programado Acreditado B	Estimado Acreditado C	Devoluciones E	Saldo Cancelado F	Diferencia B-C-D-E	Ejecución a Flulo de Efectivo	Avance Directorio (%)	Avance Reporte (%)	Monto pagado de Acreditaciones G	
					A	B										
<b>Mazatlan - Tepic</b>																
38	60000240	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS	01/06/2007 - 02/12/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DEL DRECHERO DE VA. PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	3,361,620.00	3,361,620.00	3,361,620.00	1,334,746.98		2,086,777.66		1,334,746.98	100%	100%		
<b>Cuadabasca - Toluca</b>																
39	60000240	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS	15/06/2007 - 16/10/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	1,307,400.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1,307,400.04		0.00		1,307,400.04	100%	100%		
<b>Zapotitlan - Cuicatlan</b>																
40	60000240	IS PUNOS CONSTRUCTORA S DE INGENIERIA	15/06/2007 - 16/10/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	535,146.89	535,146.89	535,146.89	535,146.89	537.92			535,146.89	100%	100%		
<b>Zapotitlan - Lago de Mireno</b>																
41	60000240	SUPERVISION Y DISEÑO DE CONSTRUCCIONES	16/06/2007 - 16/10/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	978,040.00	978,040.00	978,040.00	443,108.77		1,361,749.99		443,108.77	100%	100%		
<b>Montevideo</b>																
<b>Montevideo - Nueva Laredo</b>																
42	60000240	MARCILL MORGAN ANTON	02/12/2007 - 03/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00	1,306,000.00				1,306,000.00	100%	100%		
<b>Toluca - Saltillo</b>																
43	60000240	CONSTRUCTORA CLORSA GARCIA RODRIGUEZ	03/10/2007 - 03/10/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	660,706.15	660,706.15	660,706.15	660,702.77		3.38		660,702.77	100%	100%		
<b>Cuadabasca - Ojin Galletera</b>																
44	60000240	CONSTRUCTORA VENTAS UNIVEL	06/06/2007 - 03/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	302,574.77	302,574.77	302,574.77	302,574.77				302,574.77	100%	100%		
<b>Comis. Paises - Corralitas</b>																
45	60000240	LUNA INGENIERIA DE LUNA DEL	06/06/2007 - 03/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	290,371.01	290,371.01	290,371.01	290,371.01				290,371.01	100%	100%		
<b>Cuadabasca - Revocasa</b>																
46	60000240	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS	06/06/2007 - 03/06/2007	TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DEFENSA METALICA, BORDILLOS, GUARNICIONES, BORDILLOS, PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PAVES, PISOVA, P.P., P.P.S.O.S., P.P.C. Y P.P.F.C.	1,314,700.17	1,314,700.17	1,314,700.00	1,314,700.00		0.17		1,314,700.00	100%	100%		

040

00071



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMPLEJOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Perfil	Contrato No. Cliente	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado al Trámite D	Reservados - Devoluciones E	Devoluciones E	Saldo Cancelado F	Diferencia B+C-D+E	Estado a Fines del Ejercicio	Aprovechamiento (%)	Aprovechamiento (Índice)	Monto pagado de Aprovechamiento G
			Inicio	Fin			Cancelado	Aprobado											
47	40000047	CONSTRUCCIONES Y VITINIA S.A. DE CVL	08/06/2007	03/06/2007	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE BARRILES DEL DRENAJE DE VA. PINTURA EN GUARDEROS, BARRILES, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 4 PUENTES Y 4 CULOS	\$ 4.396.482,77	\$ 308.858,33	\$ 308.858,33	\$ 4.396.482,77	\$ 4.396.482,77	\$ -	\$ 132.272,96	\$ -	\$ 314	\$ -	\$ 4.396.482,77	100%	100%	\$ -
<b>CHILE</b>																			
Luz Chocobar-Raufshan - Comunalistas																			
48	40000048	JESUS MARTIN COLLES MOLINA	10/04/2007	02/10/2007	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE BARRILES DEL DRENAJE DE VA. PINTURA EN GUARDEROS, BARRILES, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 21 PUENTES, 56 P.I.S., 5 P.S., 14 P.S.D. Y 15 CULOS	\$ 1.572.820,93	\$ 471.847,70	\$ 471.847,70	\$ 1.572.820,93	\$ 1.572.820,93	\$ -	\$ 2.320,26	\$ -	\$ 202,08	\$ -	\$ 1.177.973,95	100%	100%	\$ -
<b>CHILE</b>																			
Cecilia Cuscopoma - Orono																			
49	45000049	GANMA MATEJUNALES	15/05/2007	31/05/2008	MANTENIMIENTO DE CONSERVACION DE BARRILES DEL DRENAJE DE VA. PINTURA EN GUARDEROS, BARRILES, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 23 PUENTES, 6 P.I.S., 1 P.S., 3 P.S.D. Y 15 CULOS	\$ 2.290.798,95	\$ 680.038,92	\$ 680.038,92	\$ 2.290.798,95	\$ 2.105.468,25	\$ -	\$ 68.330,70	\$ -	\$ 14.357,80	\$ -	\$ 2.115.405,20	100%	100%	\$ -
<b>CHILE</b>																			
<b>TOTAL</b>																			
						\$ 8.360.004,65	\$ 1.098.554,25	\$ 1.098.554,25	\$ 8.360.004,65	\$ 8.360.004,65	\$ -	\$ 162.923,92	\$ -	\$ 324.374,01	\$ -	\$ 6.935.077,72			\$ -

000 0072

041

Handwritten mark




RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Ejecutado		Anuncio		Programado Acumulado		Examinado Acumulado	Cotizado en Termino	Saldo Cancelado	Diferencia D - C - D - C	Cierro a Flujo de Efectivo	Revoluciones - Devoluciones	Alcance de los Planos Pagados	Avance Financiero (%)
	Original	Cancelado	Original	Cancelado	Original	Cancelado								
Tijuana	\$ 518,373.50		\$ 110,181.07	\$ 110,181.07	\$ 518,873.50	\$ 486,010.52	\$ 486,010.52	\$ 32,862.98	\$ 32,862.98		\$ 486,010.52			100%
Culiacán	\$ 1,288,040.45	\$ 122,142.10	\$ 122,142.10	\$ 122,142.10	\$ 1,288,040.45	\$ 1,257,337.79	\$ 1,257,337.79	\$ 31,008.66	\$ 31,008.66		\$ 1,257,337.79	\$ 4,304.10		100%
Querétaro	\$ 2,324,512.92				\$ 2,324,512.92	\$ 2,324,440.19	\$ 2,324,440.19	\$ 63.63	\$ 63.63		\$ 2,324,440.19			100%
Cuernavaca	\$ 1,101,810.74		\$ 110,181.07	\$ 110,181.07	\$ 1,101,810.74	\$ 1,101,810.74	\$ 1,101,810.74	\$ 769.45	\$ 769.45		\$ 1,101,810.74			100%
Puebla	\$ 2,377,081.37	\$ 213,223.48	\$ 213,223.48	\$ 213,223.48	\$ 2,377,081.37	\$ 2,376,911.92	\$ 2,376,911.92	\$ 0.03	\$ 0.03		\$ 2,376,911.92			100%
Coahuacuilco	\$ 2,202,181.27	\$ 220,218.14	\$ 220,218.14	\$ 220,218.14	\$ 2,202,181.27	\$ 2,202,181.24	\$ 2,202,181.24	\$ 100,267.74	\$ 100,267.74		\$ 2,202,181.24	\$ 32,471.17		100%
Veracruz	\$ 2,572,467.73	\$ 257,246.77	\$ 257,246.77	\$ 257,246.77	\$ 2,572,467.73	\$ 2,460,179.99	\$ 2,460,179.99	\$ 818,302.51	\$ 818,302.51		\$ 2,460,179.99			100%
Rayón	\$ 818,302.51				\$ 818,302.51	\$ 818,302.51	\$ 818,302.51	\$ 181,480.54	\$ 181,480.54		\$ 818,302.51			100%
Guadaluajara	\$ 2,271,093.90				\$ 2,271,093.90	\$ 2,069,613.20	\$ 2,069,613.20	\$ 47,883.04	\$ 47,883.04		\$ 2,069,613.26			100%
Monterrey	\$ 1,261,310.35				\$ 1,261,310.35	\$ 1,213,932.41	\$ 1,213,932.41	\$ 950,236.66	\$ 950,236.66		\$ 1,213,932.41	\$ 246.48		100%
Pueblas	\$ 950,236.66		\$ 95,023.66	\$ 95,023.66	\$ 950,236.66	\$ 856,236.66	\$ 856,236.66	\$ 1,482,344.36	\$ 1,482,344.36		\$ 856,236.66			100%
Oaxaca	\$ 1,482,344.36		\$ 148,234.44	\$ 148,234.44	\$ 1,482,344.36	\$ 1,482,344.36	\$ 1,482,344.36	\$ 18,775,310.59	\$ 18,775,310.59		\$ 18,775,310.59	\$ 37,086.75		100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 19,176,267.56</b>	<b>\$ 1,166,869.75</b>	<b>\$ 1,166,869.75</b>	<b>\$ 1,166,869.75</b>	<b>\$ 19,176,267.56</b>	<b>\$ 18,775,310.59</b>	<b>\$ 18,775,310.59</b>	<b>\$ 400,956.97</b>	<b>\$ 400,956.97</b>		<b>\$ 18,775,310.59</b>	<b>\$ 37,086.75</b>		<b>100%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

00% 20% 40% 60% 80% 100%



77

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Tipo de No. Contrato No.	Empresa	Actividad del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Contratado		Análisis		Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Cantidades B-C-D-E	Estado Cancelado F	Retenciones y Deducciones	Ejecución, Estado de Efectivo	Avance Financiero (%)	Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012	Monto pagado de Ajuda de Contas G
				Ortigado	Amortizado											
<b>Tijuana - Guaymas</b>																
16	PROFESIONISTAS EN CONTROL	09/05/2007 30/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS DERECHOS DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PISO Y P.F.S., DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA.	221,025.00	221,025.00	70,070.70	70,070.70	221,025.00	221,025.00				221,025.00			
<b>La Paz - Tuxtla</b>																
26	PROFESIONISTAS EN CONTROL	10/06/2007 30/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS DERECHOS DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PISO Y P.F.S., DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - TONTE.	152,143.00	152,143.00			152,143.00	152,143.00				152,143.00			
<b>Libramiento Los Cabos</b>																
36	PROFESIONISTAS EN CONTROL	11/05/2007 24/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS DERECHOS DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PISO Y P.F.S., DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - TONTE.	112,241.01	112,241.01			112,241.01	112,241.01				112,241.01			
<b>Coliagua</b>																
<b>Estación Dim - Nogales</b>																
46	PROFESIONISTAS EN CONTROL	02/09/2007 02/09/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS DERECHOS DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PISO Y P.F.S., DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - TONTE.	700,444.36	700,444.36			700,444.36	700,444.36				700,444.36			
<b>Mazatlan - Coliagua</b>																
56	CONSTRUCTORA UNILAMA	20/04/2007 16/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS DERECHOS DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PISO Y P.F.S., DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - TONTE.	560,000.44	560,000.44			560,000.44	560,000.44				560,000.44			
<b>Querétaro</b>																
66	INGENIEROS Y ARQUITECTOS	01/06/2007 31/05/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE CONSERVACION DE LOS DERECHOS DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN PARAPETOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, PISO Y P.F.S., DE PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - TONTE.	1,595,411.00	1,595,411.00			1,595,411.00	1,595,411.00				1,595,411.00			
<b>Varitas Armas</b>																
<b>Subtotal Tijuana</b>																
				1,250,000.00	1,250,000.00	372,142.19	372,142.19	1,250,000.00	1,250,000.00			4,294.63	1,250,000.00			
				1,250,000.00	1,250,000.00	372,142.19	372,142.19	1,250,000.00	1,250,000.00			4,294.63	1,250,000.00			
<b>Subtotal Coliagua</b>																
				1,250,000.00	1,250,000.00	372,142.19	372,142.19	1,250,000.00	1,250,000.00			4,294.63	1,250,000.00			
				1,250,000.00	1,250,000.00	372,142.19	372,142.19	1,250,000.00	1,250,000.00			4,294.63	1,250,000.00			
<b>Subtotal Mazatlan - Coliagua</b>																
				1,250,000.00	1,250,000.00	372,142.19	372,142.19	1,250,000.00	1,250,000.00			4,294.63	1,250,000.00			
				1,250,000.00	1,250,000.00	372,142.19	372,142.19	1,250,000.00	1,250,000.00			4,294.63	1,250,000.00			
<b>Subtotal Querétaro</b>																
				1,595,411.00	1,595,411.00			1,595,411.00	1,595,411.00				1,595,411.00			
				1,595,411.00	1,595,411.00			1,595,411.00	1,595,411.00				1,595,411.00			

200 0074

043



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMERCIALES  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Incluso de corte 30 de Septiembre de 2017

No. Partida	Centro No	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado		Cargado	Amortizado	Programado Acumulado	Cantidades Acumuladas	Estimado al Término	Revisión de Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia B-C-D-E	Ejecutado Plus de Ejercicio	Monto pagado de Aporte de Contingencia
			Inicio	Fin		A	B										
<b>Guatemala - Guatemala</b>																	
<b>Champanón - Champanón</b>																	
245	40000706	OMALD CONSTRUCCIONES	10/04/2007	01/03/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 10 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S., 2 P.P.F.C. Y 7 OTROS INFRAESTRUCTURAS	322,743.99 \$	322,743.97 \$	322,743.99 \$	322,743.99 \$	322,743.99 \$	322,743.96 \$	- \$	- \$	322,743.96 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Cd. Nra. - Atlixco</b>																	
255	400000128	ROCHEL INGENIERIA	19/04/2007	01/03/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 10 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S. Y 10 OTROS INFRAESTRUCTURAS	301,200.00 \$	301,200.00 \$	301,200.00 \$	301,200.00 \$	301,200.00 \$	301,200.01 \$	0.01 \$	0.01 \$	301,200.01 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Acapulcan - Champanón</b>																	
259	400005170	ROCHEL INGENIERIA	08/04/2007	01/03/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 16 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S., 2 P.P.F.C. Y 7 OTROS INFRAESTRUCTURAS	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.01 \$	0.01 \$	0.01 \$	363,259.01 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Aguila Dulce - Ciudadana</b>																	
275	400008138	ROCHEL INGENIERIA	10/04/2007	01/03/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 20 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S. Y 10 OTROS INFRAESTRUCTURAS	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.00 \$	363,259.04 \$	0.04 \$	0.04 \$	363,259.04 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Puerto Zarcón</b>																	
285	40000706	OMALD CONSTRUCCIONES	10/04/2007	01/03/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 10 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S., 2 P.P.F.C. Y 7 OTROS INFRAESTRUCTURAS	300,077.25 \$	300,077.25 \$	300,077.25 \$	300,077.25 \$	300,077.25 \$	300,077.26 \$	0.01 \$	0.01 \$	300,077.26 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>																	
295	40000594	GEOTECHNIA Y SUPERVISION TECNICA	26/02/2007	01/03/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 12 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S., 1 P.P.F.C. Y 10 OTROS INFRAESTRUCTURAS	510,222.78 \$	510,222.78 \$	510,222.78 \$	510,222.78 \$	510,222.78 \$	510,222.79 \$	0.01 \$	0.01 \$	510,222.79 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Venezuela</b>																	
<b>Cd. Miranda - Carabobo</b>																	
305	40000446	GALECS	11/02/2007	21/01/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 21 PUENTES, 20 PILES, 20 P.S.O.S., 1 P.P.F.C. Y 6 OTROS INFRAESTRUCTURAS	617,127.01 \$	617,127.01 \$	617,127.01 \$	617,127.01 \$	617,127.01 \$	617,127.01 \$	- \$	- \$	617,127.01 \$	- \$	- \$	- \$
<b>Cd. Mérida - Venezuela</b>																	
315	40000446	SI RUI INGENIERIA	11/04/2007	21/01/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LOS BARRILES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BARRILES, BARRANCALES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y EN METALICA, ETC. EN 11 PUENTES, 47 PILES Y 2 P.S.O.S.	600,054.00 \$	600,054.00 \$	600,054.00 \$	600,054.00 \$	600,054.00 \$	612,317.90 \$	12,263.90 \$	12,263.90 \$	612,317.90 \$	- \$	- \$	- \$

Handwritten mark



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RCO DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesta	Concepto No	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Comprobado A	Anticipos		Programa Acumulado D	Estimado Acumulado C	Diferencia B-C-D-L	Ejercicio a Faltos de Efectivo	Monto pagado de Avance Ejercicio Actual
			Inicio	Fin			Ocupado	Amortizado					
I. La Tabla - Chiapas													
Guatemala - Tuxtla Gutierrez													
325	40000000 50000000	WAO INGENIERIA	11/06/2007	20/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 27 PUENTES, 02 P.I.V.S., 1 P.P.S. Y 1 P.S.V.	\$ 807,294.30	\$ 96,726.43	\$ 96,726.43	\$ 807,294.30	\$ 807,294.30	\$ -	\$ 907,294.30	
325	40000000	SOCHES INGENIERIA	11/06/2007	20/02/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 9 PUENTES, 9 P.I.V.S. Y 1 P.S.V.	\$ 109,480.04	\$ 10,948.00	\$ 10,948.00	\$ 109,480.04	\$ 109,480.04	\$ -	\$ 109,480.04	
345	40000000	WAO INGENIERIA	11/06/2007	20/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 10 PUENTES	\$ 262,510.76	\$ 26,251.06	\$ 26,251.06	\$ 262,510.76	\$ 262,510.76	\$ -	\$ 262,510.76	
SUBTOTAL MARATHON													
						\$ 2,472,462.73	\$ 272,447.73	\$ 272,447.73	\$ 2,472,462.73	\$ 2,472,462.73	\$ -	\$ 2,472,462.73	
Raytheon													
Punta International Espinas - Pinar													
325	40000000	JORGE OMBRI VERGARA	20/02/2007	09/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC.	\$ 234,700.00			\$ 234,700.00	\$ 234,700.00	\$ -	\$ 234,700.00	
Matacaro - Pinaros													
305	40000000	JORGE OMBRI VERGARA	10/06/2007	18/01/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 5 PUENTES, 20 P.I.V.S., 10 P.S.V.S., 3 P.P.S. Y 3 P.S.V.S. Y 1 P.S.V.	\$ 234,698.07			\$ 234,698.07	\$ 234,698.07	\$ -	\$ 234,698.07	
Puente Internacional Ignacio Zaragoza													
375	40000000	ARCHI CONSTRUCCION	10/06/2007	21/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC.	\$ 246,092.74			\$ 246,092.74	\$ 246,092.74	\$ -	\$ 246,092.74	
						\$ 845,392.51	\$ -	\$ -	\$ 845,392.51	\$ 845,392.51	\$ -	\$ 845,392.51	
Guadalupe													
Mercurio - Zimolani													
305	40000000 50000000	ALVAREZ CUELLEN INGENIEROS CONSULTORES	01/06/2007	13/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 10 PUENTES, 10 P.I.V.S., 6 P.S.V.S., 1 P.P.S., 5 P.S.V.S., 2 P.P.C.S. Y 1 P.S.V.	\$ 1,110,974.47			\$ 1,110,974.47	\$ 1,110,974.47	\$ -	\$ 1,110,974.47	
						\$ 576,974.47			\$ 576,974.47	\$ 576,974.47	\$ -	\$ 576,974.47	
Guadalupe - Tuxtla													
305	40000000 50000000	SERVER INGENIERIA	01/06/2007	09/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE DESHERBES DEL DERECHO DE VIA, PINTURA EN GUARNICIONES, BORDILLOS, BARRANCALES, PARAMONTES, PINTURA EN DEFENSA METALICA, RECAMBIAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 14 PUENTES, 14 P.I.V.S., 1 P.P.S., 1 P.S.V.S., 3 P.P.C.S. Y 2 P.S.V.	\$ 576,974.47			\$ 576,974.47	\$ 576,974.47	\$ -	\$ 576,974.47	

0077

046

*[Handwritten mark]*



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2067 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No Partida	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programado Acumulado D	Ejercido Autorizado C	Ejercido en Trámite D	Revoluciones - Devoluciones E	Saldo Contratado F	Plazamiento B.C.D.E.	Ejercido Flujos de Efectivo	Monto pagado de Antes de Conto G	Fecha de corte 30 de Septiembre de 2017
			Inicio	Fin			Ortoposto	Amortizado									
<b>Zapopan - Guadalajara</b>																	
405	400000001	GRUPO DEL CENTRO	1/05/2007	30/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 1 PUENTES, 4 P.V.S Y 3 P.V.S.	\$ 212,511.40			\$ 212,511.40	\$ 212,511.40		\$	\$	\$ 212,511.40			
<b>Zapotlan - Lugo de Morones</b>																	
415	400000011	SECTER INGENIERIA	1/05/2007	30/06/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 18 PUENTES, 21 P.V.S Y 3 P.V.S.	\$ 371,056.40			\$ 371,056.40	\$ 371,056.40		\$	\$	\$ 371,056.40			
<b>Monterrey</b>																	
<b>Monterrey - Nueva Lareda</b>																	
425	400000020	RS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	09/05/2007	19/12/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 15 PUENTES Y 27 P.V.S.	\$ 209,996.00			\$ 209,996.00	\$ 209,996.00		\$	\$	\$ 209,996.00			
<b>Tehuacan - Saltillo</b>																	
425	400000034	ANGEL FERRIZ MONTANO	05/06/2007	15/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 2 PUENTES Y 4 P.V.S.	\$ 200,660.00			\$ 200,660.00	\$ 200,660.00		\$	\$	\$ 200,660.00			
<b>Cochimilla - Ojo Caliente</b>																	
445	400000035	ANGEL FERRIZ MONTANO	05/06/2007	15/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 2 PUENTES Y 4 P.V.S.	\$ 93,302.20			\$ 93,302.20	\$ 93,302.20		\$	\$	\$ 93,302.20			
<b>Comer - Pablan - Carralillo</b>																	
455	400000036	ANGEL FERRIZ MONTANO	05/06/2007	15/10/2007	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 1 PUENTE, 6 P.V.S Y 3 P.V.S.	\$ 100,211.70			\$ 100,211.70	\$ 100,211.70		\$	\$	\$ 100,211.70			
<b>Cadereas - Rayones</b>																	
465	400000037	GRUPO EMPRESARIAL DELTA	09/06/2007	14/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 10 PUENTES, 30 P.V.S Y 3 P.V.S.	\$ 443,329.51			\$ 443,329.51	\$ 443,329.51		\$	\$	\$ 443,329.51			
<b>Puerto Mexico - Guadalupe</b>																	
475	400000038	RS CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	09/06/2007	14/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DIVERSOS DE CONSERVACION DE LOS PUENTES DEL DISTRITO DE VAJALTA EN GUANAJUATO, BORDALLO, BARRANCALES, PARAMITOS, PINTURA EN DEFENSA METALICA, MANTENIMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL, DEFENSA METALICA, ETC. EN 4 PUENTES Y 2 P.V.S.	\$ 74,129.74			\$ 74,129.74	\$ 74,129.74		\$	\$	\$ 74,129.74			
<b>SUMATORIA MONTERREY</b>																	
						\$ 2,271,053.00			\$ 2,271,053.00	\$ 2,271,053.00		\$	\$	\$ 2,271,053.00			

7

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Puntal	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Contratado A	Oncargo	Anticipo Acreditado	Programado Autorizado B	Estimado Asimilado C	Relaciones- Devoluciones C	Saldo Cancelado F	Diferencia B+C-D-E	Ejercido a Falso de Efectivo	Monto pagado de Avance Financiero Aplicado G	Fecha de corte
Chiapas															
La Chagüta, San Félix, Desprohobida															
45B	490008150 540002740	INGENIEROS CONSULTORES E INACOSUMARIA	09/04/2007 17/10/2007	18710307	959,229.09 \$	94,022.09 \$	95,422.09 \$	949,206.99 \$	069,230.99 \$	246.48 \$	- \$	- \$	309,249.04 \$		
					SUBTOTAL CHIAPAS	95,422.09 \$	95,422.09 \$	949,206.99 \$	069,230.99 \$	246.48 \$	- \$	- \$	309,249.04 \$		
Oaxaca															
Cd. Cuicatlan - Oaxaca															
45C	490006697	CLA/7614	05/05/2007 16/02/2008	16022008	1,482,344.26 \$	146,224.44 \$	146,224.44 \$	1,482,344.26 \$	1,482,344.26 \$	- \$	- \$	- \$	1,482,344.26 \$		
					SUBTOTAL OAXACA	146,224.44 \$	146,224.44 \$	1,482,344.26 \$	1,482,344.26 \$	- \$	- \$	- \$	1,482,344.26 \$		
					TOTAL	201,646.53 \$	201,646.53 \$	2,431,551.25 \$	1,551,465.25 \$	246.96 \$	- \$	- \$	1,791,593.30 \$		

0079


048

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MODERNIZACION 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Definicion	Monto Contratado A		Anticipo		Programado Acumulado B		Estimado Acumulado C	Eliminado en Informe D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Seguimiento al Avance Presupuestal		Avance facturado (%)	
	Ortoposto	Anticipo	Amortizado	Programado Acumulado	Seguimiento al Avance Presupuestal	Retenciones - Devoluciones					Ejército o Fijado de Efectivo	Ajuste de Costos Pagados		
Tijuana	\$ 1,058,447.08			\$ 1,058,447.68	\$ 1,058,447.68		\$ 1,058,447.68					\$ 1,058,447.08		100.0%
Culiacán	\$ 3,315,433.45	\$ 102,021.61	\$ 102,021.61	\$ 3,315,433.45	\$ 3,315,433.45	\$ 3,311,304.13	\$ 4,120.32					\$ 3,311,304.13	\$ 13,724.10	100.0%
Querétaro	\$ 8,854,924.89	\$ 700,433.68	\$ 700,433.68	\$ 8,854,624.30	\$ 8,753,921.50	\$ 101,003.30						\$ 8,753,921.50	\$ 200,800.11	100.0%
Cuernavaca	\$ 14,038,309.48	\$ 2,087,986.28	\$ 2,087,986.28	\$ 14,038,309.48	\$ 14,705,707.78	\$ 172,511.70						\$ 14,705,707.78		100.0%
Puebla	\$ 6,044,551.84	\$ 742,499.11	\$ 742,499.11	\$ 6,044,651.84	\$ 6,044,024.53	\$ 627.31						\$ 6,044,024.53		100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 4,975,595.14			\$ 4,975,599.14	\$ 4,075,599.06	\$ 0.08						\$ 4,075,599.06		100.0%
Veracruz	\$ 2,871,465.54	\$ 307,718.70	\$ 307,718.70	\$ 2,871,465.54	\$ 2,960,648.70	\$ 1,816.75						\$ 2,960,648.70	\$ 28,034.64	100.0%
Reynosa	\$ 1,022,593.22			\$ 1,022,593.22	\$ 1,022,593.22							\$ 1,022,593.22		100.0%
Guadaluajara	\$ 51,039,046.76	\$ 10,265,295.30	\$ 10,265,295.30	\$ 51,039,046.76	\$ 7,859,502.17	\$ 44,078,544.50						\$ 10,072,745.07	\$ 1,475,020.47	100.0%
Monterrey	\$ 10,793,047.68	\$ 2,059,950.44	\$ 1,530,402.56	\$ 10,793,047.68	\$ 9,038,756.15	\$ 1,754,890.53						\$ 9,565,225.01	\$ 34,658.08	100.0%
Chiapas	\$ 5,608,178.08	\$ 643,270.45	\$ 643,270.45	\$ 5,608,178.08	\$ 5,608,178.05	\$ 0.03						\$ 5,608,178.05	\$ 34,202.41	100.0%
Oaxaca	\$ 986,008.00			\$ 986,508.09	\$ 986,008.07	\$ 0.02						\$ 986,008.07		100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 112,407,706.75	\$ 17,722,154.86	\$ 7,792,443.08	\$ 112,407,796.75	\$ 86,294,274.12	\$ 46,113,522.63						\$ 75,633,864.80	\$ -1,027,170.71	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)



PROGRAMA DE MODERNIZACION 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de septiembre de 2017

No. Proyecto	Categoría de Proyecto	Ejercicio	Periodo del Contrato (Inicio-Fin)	Concepto	Monto Contratado		Anticipos	Acreditado	Programado Aprobado	Estimado Documentado	Tramites D	Requisitos C	Saldo Contratado	Obligaciones D.C.D.E.	Ejecución del Presupuesto	Avance Realizado
					A	B										
<b>1. Sistema de Puente</b>																
1	40000000	SAC Y PAVIMENTOS	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	250,312.00	250,312.00	0	0	250,312.00	250,312.00	0	0	0	0	0	100%
2	40000000	PAVIMENTOS Y RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	30/9/2008-30/9/2009	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	241,326.77	241,326.77	0	0	241,326.77	241,326.77	0	0	0	0	0	N/A
<b>2. Sistema de Puente</b>																
3	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	60,491.31	60,491.31	0	0	60,491.31	60,491.31	0	0	0	0	0	100%
4	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	30/9/2008-30/9/2009	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	362,600.07	362,600.07	0	0	362,600.07	362,600.07	0	0	0	0	0	N/A
<b>3. Sistema de Puente</b>																
5	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	60,330.06	60,330.06	0	0	60,330.06	60,330.06	0	0	0	0	0	N/A
<b>4. Sistema de Puente</b>																
6	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	1,001,000.14	1,001,000.14	0	0	1,001,000.14	1,001,000.14	0	0	0	0	0	N/A
<b>5. Sistema de Puente</b>																
7	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	540,872.08	540,872.08	0	0	540,872.08	540,872.08	0	0	0	0	0	100%
8	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	30/9/2008-30/9/2009	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	704,341.27	704,341.27	0	0	704,341.27	704,341.27	0	0	0	0	0	N/A
<b>6. Sistema de Puente</b>																
9	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	1,275,847.25	1,275,847.25	0	0	1,275,847.25	1,275,847.25	0	0	0	0	0	N/A
<b>7. Sistema de Puente</b>																
10	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	201,150.26	201,150.26	0	0	201,150.26	201,150.26	0	0	0	0	0	N/A
<b>8. Sistema de Puente</b>																
11	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	1,499,200.72	1,499,200.72	0	0	1,499,200.72	1,499,200.72	0	0	0	0	0	100%
12	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	30/9/2008-30/9/2009	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	62,648.76	62,648.76	0	0	62,648.76	62,648.76	0	0	0	0	0	100%
13	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	127,462.17	127,462.17	0	0	127,462.17	127,462.17	0	0	0	0	0	N/A
<b>9. Sistema de Puente</b>																
14	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	1/1/2007-30/9/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	240,272.41	240,272.41	0	0	240,272.41	240,272.41	0	0	0	0	0	100%
15	40000000	RECONSTRUCCION DE PUENTES Y OBRAS DE RECONSTRUCCION DE PUENTES CIVILES	30/9/2008-30/9/2009	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN CALIDAD EN EL SISTEMA DE PUENTES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE LOS RIOS	152,248.06	152,248.06	0	0	152,248.06	152,248.06	0	0	0	0	0	N/A

PROGRAMA DE MODERNIZACION 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Parada	Contrato No.	Empresa	Avance del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programa Acreditado B	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado F	Diferencia B+C-D-E	Estado a Fines de Ejercicio	Avance (Porcentaje)
			Inicio	Fin			Disputado	Amortizado						
<b>Uruguay - Nuevo Italia</b>														
	400010457 (A)	CECOSOL	20052006	20122006	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	200,201.22	200,201.22		200,201.22					N/A
	400010457 (B)	CECOSOL	20052006	20122006	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	538,724.67			538,724.67		11,931.20			1,077,925.87
<b>Nuevo Italia - Lajaró, Curitiba</b>														
<b>Domenico - Itapúa</b>														
7	400006296 540002012	TEFRAC (RAI) PAVIMENTOS DEL CAMARERO	20052007	20122007	SUBSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO HERRILLADO EN LA PLAZA DEL GOBIERNO EN EL SECTOR TIPO DE LA PLAZA DE COMERCIO	2,000,301.14	719,460.34		2,000,301.14	2,000,301.14	460.14			100%
41	400006219	CAMPOS CONSTRUCTORES Y PLAN ORGANIZACION	01/11/2007	20122008	OBRA REFORZACION DE PISO PROFUNDO EN LA PLAZA DE COMERCIO EN EL SECTOR TIPO	807,700.31			807,700.31	807,700.31	24,277.78			100%
42	400006219	CANCELADA			REFORZACION DE PISO PROFUNDO EN LA PLAZA DE COMERCIO EN EL SECTOR TIPO									
<b>Guatemala</b>														
<b>Mutun - Guatemala</b>														
8	400008417	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AME	20042007	20092007	SISTEMA Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AGUAS RESERVALES DE LA PLAZA DE COMERCIO EN LA PLAZA DE COMERCIO No. 25 - 250	242,850.40			242,850.40	242,850.40				100%
10	400008284	SISTEMAS DE ALEROS DEL TRANSITO	15/09/2007	15/09/2008	ANALISIS DIAGNOSTICO Y PROYECTO DE 16 MANEJOS DE EMERGENCIAS EN LAS AUTORISTAS MEXICO - GUATEMALA, MEXICO - PUERTO QUETZAL, PATZUN, PATZUN, LAS CHONAS, BALDIZOLA, OCCIDENTAL, GUANAJARA - TIPO Y PUERTO MEXICO - GUATEMALA	1,200,700.00			1,200,700.00	1,200,700.00	64.00			100%
	400008417 (B)	CECOSOL	20052008	20122009	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	201,690.28			201,690.28	201,690.28	12,091.20			N/A
<b>El Estero - Guatemala</b>														
	400010467 (B)	CECOSOL	20052006	20122006	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	51,264.65			51,264.65	51,264.65				N/A
<b>La Paz - Guatemala</b>														
	400010467 (B)	CECOSOL	20052006	20122009	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	110,072.07			110,072.07	110,072.07				N/A
<b>Puerto de Itza - Itzamal</b>														
	400010467 (B)	CECOSOL	20052009	20122006	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	220,004.02			220,004.02	220,004.02	9,074.67			N/A
<b>Rancho Viejo - Tuxtla</b>														
	400010467 (B)	CECOSOL	20052009	20122006	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	20,001.30			20,001.30	20,001.30	2,001.00			N/A
<b>Zacamal - Rancho Viejo</b>														
11	400008284 500002012	SERVICIO DE INGENIERIA Y PAVIMENTOS	20052007	07/02/2008	ADMINISTRACION E INSTALACION DE 12 PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESERVALES PRETAMONTE DE COMERCIO MEXICO - GUATEMALA, PLAZA DE COMERCIO TRES MARCAS, DEL C/O MANOJO VIEJO - MEXICO, PLAZA DE COMERCIO TANGO DEL COMERCIO DIRECTO	8,275,200.00	1,258,600.00		8,275,200.00	8,275,200.00				100%
	400010467 (B)	CECOSOL	20052006	20122006	RECONSTRUCCION Y PROYECTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	60,010.00			60,010.00	60,010.00	2,004.27			N/A





PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de noviembre de 2012

No. Proceso	Contrato No	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Estimado en Trámite D	Retenciones-Devengados E	Saldo Cancelado F	Diferencia B-C-D-E	Ejército a Faltos de Equipo	Avance (Ingresos P+I)	Avance (Ingresos Fisico%)
			Inicio	Fin			Ocupado	Amortizado							
<b>Entronque Agua Dulce - Cárdenas</b>															
20	450007060	DEL COBRO Y BLANCO CONSTRUCTORES	15/03/2007	27/07/2007	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS PLAZAS DE COBRO NO. 99 TERNANTIC PARA LA PLAZA DE COBRO SAN JUAN N.º 1100.	450,000.00			450,000.00				450,000.00	100%	
	450010400	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	400,000.00			400,000.00		0.00		400,000.00	N/A	
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>															
24	450007050	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TOROAT	15/03/2007	27/07/2007	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LAS PLAZAS DE COBRO NO. 99 TERNANTIC PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN N.º 1000 DEL CAMINO DIRECTO	440,000.00			440,000.00				440,000.00	100%	
25	450007064	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TOROAT	15/03/2007	27/07/2007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA LA PLAZA DE COBRO NO. 99 TERNANTIC, JARDON EN EL KM. 1400 Y PLAZA DE COBRO NO. 99 TERNANTIC UBICADOS EN LA URBAN DEL CAMINO DIRECTO	600,000.00			600,000.00				600,000.00	100%	
	450010500	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	40,000.00			40,000.00				40,000.00	N/A	
<b>Puerto El Zapotal</b>															
26	450007051	RECONSTRUCCIONES POZOS PROFUNDOS	15/03/2007	27/07/2007	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA FACTIBILIDAD DE REPARACION O EN SU CASO LA RECONSTRUCCION DE UN NUEVO POZO PROFUNDO UBICADO EN LA PLAZA DE COBRO TOROAT N.º 1000	300,000.00			300,000.00				300,000.00	100%	
27	450007060	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TOROAT	15/03/2007	27/07/2007	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS SANITARIOS CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE COBRO SAN JUAN N.º 1100	300,000.00			300,000.00				300,000.00	100%	
<b>Versacruz</b>															
<b>Del Mandepe - Córdoba</b>															
	450010400	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	150,000.00			150,000.00		0.00		150,000.00	N/A	
<b>Cárdenas - Veracruz</b>															
	450010400	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	300,000.00			300,000.00		0.00		300,000.00	N/A	
<b>La Troncal - Cd. Ixtla</b>															
	450010400	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	950,000.00			950,000.00		0.00		950,000.00	N/A	
<b>Urb. Reforma Proletrada de Tlapachula</b>															
28	450000070	JOFRAAN CONSTRUCCIONES	24/05/2007	27/07/2007	RECONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO DESARROLLADO EN CARRETERA DE CIRCULACION EN LA CARRETERA DE COBRO N.º 1112.	140,000.00	224,000.00	224,000.00	140,000.00		1,000.00		140,000.00	100%	
	450010400	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	50,000.00			50,000.00		0.00		50,000.00	N/A	
<b>Cárdenas - Zempoala - Tlaxiahuacan</b>															
29	450007070	CAJONEL	06/07/2007	23/09/2007	COMPLEMENTACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE FACTIBILIDAD DE POZO PROFUNDO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA A LA PLAZA DE COBRO N.º 1117 TOROAT N.º 1000	400,000.00	143,000.00	143,000.00	400,000.00				400,000.00	100%	
	450010400	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	20/05/2006	30/12/2008	RECONSTRUCCION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	100,000.00			100,000.00		0.00		100,000.00	N/A	
<b>RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS</b>															
						2,400,000.00	307,000.00	307,000.00	2,400,000.00		1,800.00		2,400,000.00		

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Póliza	Cuenta No.	Ejercicio	Periodo de Conteo	Concepto	Monto Continuada		Anticipo	Programado Acumulado	Ejecutado al Cierre	Ejecutado en Trámite	Revisión - Devolución	Saldo Cancelado	Diferencia (N.C. - D.C.)	Vigencia al Cierre	Autosuscripción
					Inicio	Fin									
<b>Matamoros - Reynosa</b>															
01	44000000	2007	01/01/07	RECONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	111,001.00			101,000.00	101,001.00						
02	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	941,201.26			941,201.26	941,201.26						
<b>Guadalupe</b>															
03	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	1,400,000.00			1,400,000.00	1,400,000.00						
04	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	911,700.20			911,700.20	911,700.20						
<b>Monterrey</b>															
05	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	462,871.66			462,871.66	462,871.66						
<b>Gómez Palacio, Coahuila</b>															
06	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	963,000.00			963,000.00	963,000.00						
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>															
07	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	624,000.00			624,000.00	624,000.00						
08	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	466,400.00			466,400.00	466,400.00						
<b>Guadalupe - Reynosa</b>															
09	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	940,000.00			940,000.00	940,000.00						
<b>Puerto Blanco - Coahuila</b>															
10	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	240,000.00			240,000.00	240,000.00						
11	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	146,000.00			146,000.00	146,000.00						
12	44000000	2007	01/01/07	CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA PLAZA DE COHESIÓN DEL NOROCCIDENTE DE NUEVO LEÓN	170,000.00			170,000.00	170,000.00						

PROGRAMA DE MODERNIZACION 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 31 de diciembre de 2017

No. Puentes	Cuentas No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Anticipo		Programado Acreditado D	Limpado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Retenciones - Demeritos E	Saldo Cancelado F	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Flujo de Efectivo	Avance (Importe /%)
			Inicio	Fin			Origen	Amortizado								
39	442000010 550000201 550000204	PROYECTOS ASISTORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRA CIVILES	03/05/2007	03/09/2007	PROYECTO EJECUTIVO PARA SERVICIOS SANITARIOS CORRELACIONANTE A LA PLAZA DE COBRO No. 485 CARRETERA KM 12+369	246,514.55			246,514.55	246,514.55					246,514.55	N.A.
			29/05/2008	30/12/2009	RECUPERACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	60,320.94			60,320.94	60,320.94						60,320.94
37	440000000 440000000	COMERCIALIZACION DE OBRAS PERSIGINDA	29/05/2007	08/11/2007	MANEJO E INSTALACION DE PLANTAS MOVIDORAS METALICAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES PERTENCIENTES A LA PLAZA DE COBRO No. 198 SAUMAS KM 15+650 DEL CAMINO DIRECTO DE LA CARRETERA FEDERAL DEL TRAMO CADREYTA - RIVIERA PLAZAS DE COBRO No. 123 OLANIHAL BRANCO KM 120+400 DEL TRAMO CADREYTA - RIVIERA PLAZAS DE COBRO No. 123 OLANIHAL BRANCO KM 120+400 DEL TRAMO CADREYTA - RIVIERA PLAZAS DE COBRO No. 141 LA CARRETERA KM 12+369 PLAZA DE COBRO No. 141 LA CARRETERA KM 12+369 PLAZA DE COBRO No. 141 LA CARRETERA KM 12+369 Y No. 102 PLAN DE AYALA KM 8+500 DEL TRAMO CADREYTA - RIVIERA PLAZAS DE COBRO No. 102 PLAN DE AYALA KM 8+500 DEL TRAMO CADREYTA - RIVIERA PLAZAS DE COBRO No. 102 PLAN DE AYALA KM 8+500 Y No. 101 CUJALLOS KM 121+750 DEL TRAMO COMEZT PALACIO - COMAHUAT	6,059,195.20	1,596,150.89	1,470,001.73	6,059,195.20	4,689,208.77			1,774,696.62		4,689,208.77	100%
					SUBTOTAL MODERNIZACION	80,753,847.08	2,029,899.44	1,533,482.26	80,753,847.08	6,632,726.14				1,743,099.53		8,495,228.81
38	440000001 550000201 550000204	AGUA Y AIRE INGENIEROS	29/05/2007	03/11/2007	SUMINISTRO E INSTALACION DE 3 PLANTAS MOVIDORAS METALICAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES PARA LAS PLAZAS DE COBRO NO. 179 LAS CHAMPAS KM. 17+000 NO. 181 MALPASITOS KM. 17+000 NO. 182 CHAMPAS KM. 18+700 DEL CAMINO DIRECTO	3,219,262.27	643,276.43	643,276.43	3,219,262.27	3,219,262.27				3,219,262.27	100%	
			09/06/2007	07/12/2007	PROYECTO DE INFORMACION DEL POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION EN LAS PLAZAS DE COBRO No. 181 MALPASITOS KM 17+000 DEL CAMINO DIRECTO	621,971.06			621,971.06	427,871.99					427,871.99	50%
36	440000110 550000110	DE ACOSOS Y BLANCO CONSTRUCTORES	07/03/2007	19/01/2007	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL AREA DE LAS CURVAS AUXILIARES EN LAS PLAZAS DE COBRO NO. 181 MALPASITOS KM 17+000 (OBRAS) Y 179 LAS CHAMPAS KM 18+700 (UNO) DEL CAMINO DIRECTO	228,664.11			228,664.11	228,664.11				228,664.11	100%	
			03/06/2007	10/09/2007	PROYECTO PARA LA AMPERACION DE ZONA DEL TRAMO CADREYTA - RIVIERA PLAZAS DE COBRO NO. 179 LAS CHAMPAS KM 18+700 NO. 181 MALPASITOS KM 17+000 Y NO. 182 CHAMPAS KM 18+700 DEL CAMINO DIRECTO	737,206.68			737,206.68	737,206.68					737,206.68	100%
40	440010000 550000110	PROYECTO CIVIL INTEGRAL	29/05/2008	30/12/2008	RECUPERACION Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION PARA EL SISTEMA DE GESTION DE PAVIMENTOS	664,056.06			664,056.06	664,056.06				664,056.06	N.A.	
					SUBTOTAL CHAMPAS	5,083,178.09	843,276.43	1,453,759.43	5,083,178.09	3,208,178.85				9,027		5,019,178.43
<p>Subtotal Chamapas - Guasca</p> <p>112,407,700.75 \$ 17,122,134.86 \$ 7,782,443.08 \$ 112,407,700.75 \$ 46,294,274.17 \$ 46,113,327.40 \$ 76,037,064.60 \$</p>																
<p>Subtotal Chamapas - Guasca</p> <p>940,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 940,000.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 940,000.00 \$</p>																
<p>TOTAL</p> <p>113,347,700.75 \$ 17,122,134.86 \$ 7,782,443.08 \$ 113,347,700.75 \$ 46,294,274.17 \$ 46,113,327.40 \$ 76,037,064.60 \$</p>																

00000000

055

Handwritten signature


CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Origen		Amortizado		Programado Acumulado B	Ejercido Acumulado C	Ejecutado en el mes D	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Mobilizaciones A	Anticipos	Amortizado	Amortizado						Retenciones y Devoluciones	Entrada a Flujo de Efectivo	Alfabeto de Gastos Pagados	Avance Financiero (%)
Culiacán	\$ 74,442.15				\$ 74,442.15	\$ 74,442.15				\$ 423.40	\$ 74,442.15		74.1%
Cuernavaca	\$ 223,334.57				\$ 223,334.57	\$ 223,334.57					\$ 223,334.57		100.0%
Puebla	\$ 315,745.20				\$ 315,745.20	\$ 315,745.20					\$ 315,745.20	\$ 17,252.84	100.0%
Reynosa	\$ 248,694.75				\$ 248,694.75	\$ 248,694.75					\$ 248,694.75		100.0%
Guadalajara	\$ 2,738,902.85				\$ 2,738,902.85	\$ 2,115,223.54	\$ 623,759.31				\$ 2,115,223.54		77.2%
Monterrey	\$ 432,587.20	\$ 43,258.71	\$ 41,829.31	\$ 41,829.31	\$ 432,587.20	\$ 432,587.20					\$ 432,587.20	\$ 1,420.40	100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 4,033,766.72	\$ 43,258.71	\$ 41,829.31	\$ 41,829.31	\$ 4,033,766.72	\$ 3,410,027.41	\$ 623,739.31	\$ 3,411,456.81	\$ 19,105.44				77.2%

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

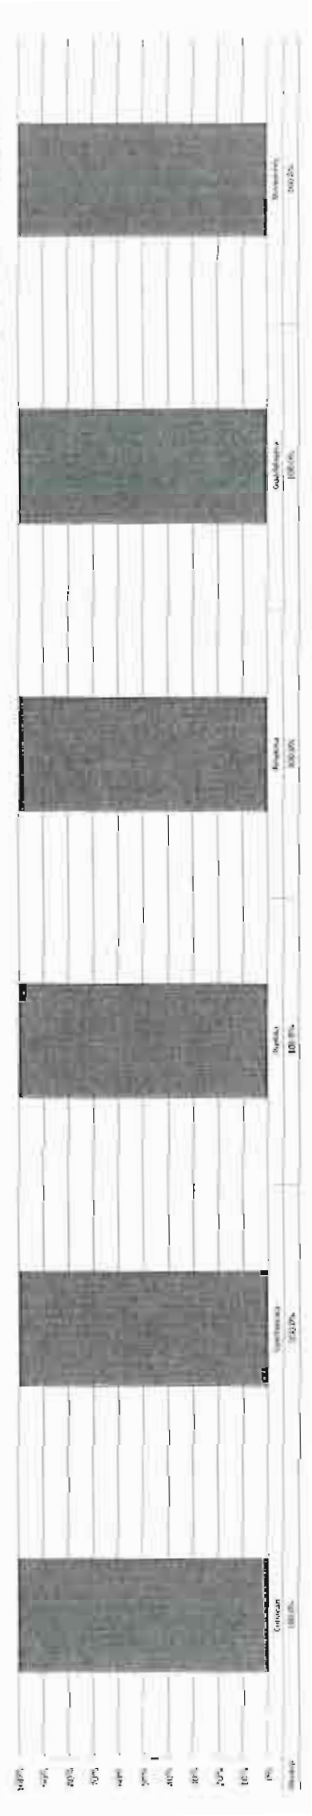

000 0087 056

*[Handwritten signature]*



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha al corte: 30 de Septiembre de 2012


No. Periodo	Control Mo.	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contribuido		Anticipo		Programado Acumulado	Estimado Adjudicado	Estimado en Trámite	Retenciones Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia P.C. - D.E.	Ejercido a Fecha de Finicio	Avance Programado (%)										
		Inicio	Fin		Obrigado	Anticipo																				
<b>Coliagua</b>																										
<b>Mizatlán - Cuicatlan</b>																										
3 S	45000010	25/01/2007	30/07/2007	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE COBRO CALZADA DE SINALOA KM 125+00 Y 145+00, KM 20+00, 237+00 DE SINALOA	74,442.15	74,442.15	74,442.15	74,442.15	74,442.15	74,442.15	423.40	423.40	74,442.15	74,442.15	74,442.15	100.00										
SUBTOTAL COLIAGUA					74,442.15	74,442.15	74,442.15	74,442.15	74,442.15	74,442.15	423.40	423.40	74,442.15	74,442.15	74,442.15	100.00										
<b>Guerrero</b>																										
<b>México - Cuernavaca</b>																										
9 S	45000012	16/04/2007	26/07/2007	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONCRETO HIDRAULICO AILAGADO EN ZONA DE CARRETERAS DE LA PLAZA DE COBRO No. 1 BIS TRES MARÍAS CUERPO "A", TRAMO MÉXICO - CUERNAVACA, PLAZA DE COBRO No. 90 BIS TAYCO DEL GRUPO DIRECTO	220,324.57	220,324.57	220,324.57	220,324.57	220,324.57	220,324.57	17,750.04	17,750.04	220,324.57	220,324.57	220,324.57	100.00										
SUBTOTAL GUERRERO					220,324.57	220,324.57	220,324.57	220,324.57	220,324.57	220,324.57	17,750.04	17,750.04	220,324.57	220,324.57	220,324.57	100.00										
<b>Puebla</b>																										
<b>México - Puebla</b>																										
20 S	45000014	01/07/2007	26/10/2007	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REPARACIÓN Y/O REPOSICIÓN DE LOGAJAS DE CONCRETO HIDRAULICO AILAGADO EN ZONA DE CARRETERAS DE LA PLAZA DE COBRO No. 77 CHALCO CUERPO "A" Y "B", KM 32+000 No. 7 SAN MARCOS, AN. 35+000, No. 8 SAN MARTIN	315,745.20	315,745.20	315,745.20	315,745.20	315,745.20	315,745.20	17,750.04	17,750.04	315,745.20	315,745.20	315,745.20	100.00										
SUBTOTAL PUEBLA					315,745.20	315,745.20	315,745.20	315,745.20	315,745.20	315,745.20	17,750.04	17,750.04	315,745.20	315,745.20	315,745.20	100.00										
<b>Veracruz</b>																										
<b>Puerto Internacional Inpadu Zaragoza</b>																										
30 S	45000016	09/04/2007	06/08/2007	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLAMIENTO VERTICAL, UBICADA EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	246,004.75	246,004.75	246,004.75	246,004.75	246,004.75	246,004.75	17,750.04	17,750.04	246,004.75	246,004.75	246,004.75	100.00										
SUBTOTAL VERACRUZ					246,004.75	246,004.75	246,004.75	246,004.75	246,004.75	246,004.75	17,750.04	17,750.04	246,004.75	246,004.75	246,004.75	100.00										
<b>Yucatán</b>																										
<b>Cuadabana - Teot</b>																										
43 S	45000018	18/02/2008	31/01/2009	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACIÓN DE LA PLAZA DE COBRO PLAN DE BARRIJAS SITUADA EN EL KM 100+000	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	17,750.04	17,750.04	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	100.00										
SUBTOTAL YUCATÁN					2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	17,750.04	17,750.04	2,738,962.35	2,738,962.35	2,738,962.35	100.00										
<b>Morelos</b>																										
<b>Monteserr - Nueva Laredo</b>																										
32 S	45000020	25/02/2007	21/11/2007	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 3 PUNTAS MODULARES METÁLICAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES PERTENECIENTES A LA PLAZA DE COBRO No. 103 SAGUNAG, KM 100+000	402,607.20	402,607.20	402,607.20	402,607.20	402,607.20	402,607.20	17,750.04	17,750.04	402,607.20	402,607.20	402,607.20	100.00										
SUBTOTAL MORELOS					402,607.20	402,607.20	402,607.20	402,607.20	402,607.20	402,607.20	17,750.04	17,750.04	402,607.20	402,607.20	402,607.20	100.00										
TOTAL													4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	4,053,766.72	100.00

RESUMEN DEL PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monte Contratado		Amortizado		Seguimiento al Avance de Obra			Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance Financiero (%)
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Culiacán	\$ 1,246,110.00	\$ 373,833.00	\$ 373,833.00	\$ 1,246,110.00	\$ 1,246,110.00	\$ 1,246,110.00	\$ 1,246,110.00	\$ 1,246,110.00	\$ 1,505.64	\$ 1,505.64	100%
Querétaro	\$ 8,054,795.23	\$ 1,100,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 8,054,795.23	\$ 8,054,795.23	\$ 8,054,795.23	\$ 8,054,795.23	\$ 8,054,795.23	\$ 1,869.74	\$ 1,869.74	100%
Cuernavaca	\$ 46,442,450.32			\$ 46,442,450.32	\$ 46,442,450.32	\$ 46,442,450.32	\$ 46,442,450.32	\$ 46,442,450.32	\$ 14,834.04	\$ 14,834.04	100%
Coahuila	\$ 6,822,765.56			\$ 6,822,765.56	\$ 6,822,765.56	\$ 6,822,765.56	\$ 6,822,765.56	\$ 6,822,765.56	\$ 2,551.86	\$ 2,551.86	100%
Chiapas	\$ 488,802.00			\$ 488,802.00	\$ 488,802.00	\$ 488,802.00	\$ 488,802.00	\$ 488,802.00	\$ 488,802.00	\$ 488,802.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 63,069,767.11</b>	<b>\$ 1,473,833.00</b>	<b>\$ 1,473,833.00</b>	<b>\$ 63,069,767.11</b>	<b>\$ 63,069,767.11</b>	<b>\$ 63,069,767.11</b>	<b>\$ 63,069,767.11</b>	<b>\$ 63,069,767.11</b>	<b>\$ 17,306.80</b>	<b>\$ 3,175.38</b>	<b>100%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra  
(No incluye anticipos)

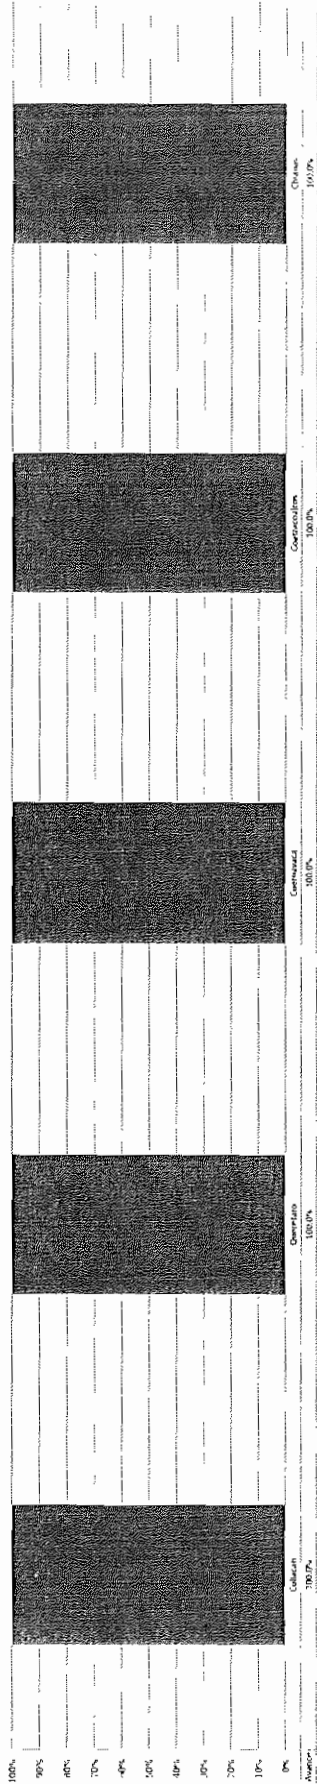

PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2007 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Código del Proyecto	Empresa	Monto del Contrato		Monto Garantado	Monto Pagar		Programa de Aportación	Cuentas Administradas	Mantenciones y Reparaciones	Monto Garantado	Monto Pagar	Monto Pagar (Miles de Dólares)	Monto Pagar (Miles de Dólares)	Monto Pagar (Miles de Dólares)
			Inicio	Fin		Original	Actualizado								
<b>Mantención - Colombia</b>															
ETP-2007-01	00000001	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0001	2007/0001	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
<b>Quemados</b>															
ETP-2007-02	00000002	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0002	2007/0002	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>Colombia</b>															
<b>Atenuación - Colombia</b>															
ETP-2007-03	00000003	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0003	2007/0003	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>Atenuación - Colombia</b>															
ETP-2007-04	00000004	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0004	2007/0004	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>Atenuación - Colombia</b>															
ETP-2007-05	00000005	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0005	2007/0005	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>Atenuación - Colombia</b>															
ETP-2007-06	00000006	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0006	2007/0006	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>Atenuación - Colombia</b>															
ETP-2007-07	00000007	CONSTRUCIONES Y OBRAS CIVILES S.A.S.	2007/0007	2007/0007	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
<b>Atenuación - Colombia</b>															
<b>TOTAL</b>															

00000000

159

Handwritten signature

OTROS PAGOS REALIZADOS CON CARGO A RECURSOS DEL PROGRAMA 2007

fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

CONVENIOS

Contrato	Referencia	Monto	Programa	Pospr	Observación
4500004088	5500002741	\$ 6,950,145.23	FOP-TJ-48-MY001	6108	ARRENDADORA LASSELLE, S.A. DE C.V. CONVENIO DE AMPLIACION DE LA OBRA TRATAMIENTO DE ESPERA EN LA AUTOPISTA LA RUMOROSA-TECATE, EN LOS TRAMOS DEL KM. 81+100-AL-KM-114+000.-CUERPO A, Y DEL KM 61+800 AL KM 114+000 CUERPO B
4500004087	5500002742	\$ 3,930,592.64	FOP-TJ-47-MY002	6108	ARRENDADORA LASSELLE, S.A. DE C.V. CONVENIO DE AMPLIACION DE LA OBRA TRATAMIENTO DE ESPERA EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO MEDIANTE BACHEO Y TENDIDO DE CARPETA ASFALTICA DELGADA DEL KM 9+500 AL KM 98+800, TRAMOS AISLADOS, AMBOS CUERPOS Y DEL KM 9+500
	5500002902	\$ 557,732.88	FOP-QRO-04-MY007	6108	AVILA ASSAD Y ASOCIADOS SA DE CV. PAGO DE SENTENCIA DE LA OBRA CONSTRUCCION INTEGRAL DE DRENAJE PLUVIAL DEL ENTORQUE SAN FRANCISCO DEL RINCON KM 19+000 DE LA AUTOPISTA LEON LAGOS DE MORENO AGUASCALIENTES
4500006334	5500003204	\$ 669,019.06	FOP-PUE-40-MY018	6107	GRUPO IMASA SA CV DE CV. SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION DEL PAVIMENTO Y AMPLIACION A TERCEROS CARRILES DEL KM 90+000 AL KM 102+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA.
	5500003128	\$ 318,090.34	FOP-CVA-09-MY007	6107	CONSULTORIA SUPERVISION TECNICA, NOVENO CONVENIO
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 12,425,580.15</b>			

AJUSTE DE COSTOS

Contrato	Referencia	Monto	Programa	Pospr	Observación
4500004088	7500000295	\$ 519,397.20	FOP-TJ-48-MY001	6108	* Contrato fondos FARAC DELL (2004)
4500004087	7500000296	\$ 380,212.80	FOP-TJ-47-MY002	6108	* Contrato fondos FARAC DELL (2004)
4500006194	7500000297	\$ 413,391.20	FOP-CHI-38-MND04	6108	* SLORAM, S.A. DE C.V. Contrato fondos 2006 (FARAC-D06) y 2007
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,313,001.20</b>			

000 0091

060



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 2**








RESUMEN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Deligación	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Ajustes de Costos Pagaros	Ajustes Modificas (%)					
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programas Acumulado B	Costos Acumulado C	Eliminado en Terminado D	Saldo Cancelado E	Diferencia O - C - D - E			Anticipo Obra	Anticipo Amortizado	Ejercido a Flujo de Efectivo	Reservaciones - Devoluciones	
Tijuana	\$ 160,016,385.56	\$ 167,400,315.91	\$ 167,400,315.91	\$ 167,400,315.91	\$ 166,160,652.48		\$ 940,703.43				\$ 179,736,101.37	\$ 1,127,329.63	\$ 13,265,548.89	100.0%	
Querétaro	\$ 727,398,823.40	\$ 694,431,695.85	\$ 694,431,695.85	\$ 694,431,695.85	\$ 556,567,507.83		\$ 134,864,088.02				\$ 615,117,774.99	\$ 4,825,099.96	\$ 55,550,207.10	100.0%	
Quintana Roo	\$ 459,245,004.95	\$ 182,660,049.52	\$ 182,660,049.52	\$ 182,660,049.52	\$ 179,438,133.54		\$ 3,221,915.98				\$ 190,467,680.23	\$ 3,320,519.03	\$ 11,479,448.05	100.0%	
Guerrero	\$ 805,266,879.48	\$ 1,020,333,864.23	\$ 1,020,333,864.23	\$ 1,020,333,864.23	\$ 1,002,902,121.50		\$ 17,431,742.73	\$ -			\$ 1,063,781,677.30	\$ 13,244,089.19	\$ 56,665,009.25	100.0%	
Puebla	\$ 170,510,616.27	\$ 134,012,744.59	\$ 134,012,744.59	\$ 134,012,744.59	\$ 134,264,803.02		\$ 647,541.57				\$ 138,156,467.89	\$ 171,108.42	\$ 3,691,694.86	100.0%	
Coahuila	\$ 50,371,680.40	\$ 89,917,935.42	\$ 89,917,935.42	\$ 89,917,935.42	\$ 85,241,820.94		\$ 4,676,084.48	\$ 0.00			\$ 89,981,406.21	\$ 602,103.77	\$ 3,729,779.27	100.0%	
Veracruz	\$ 107,576,877.17	\$ 142,703,376.70	\$ 142,703,376.70	\$ 142,703,376.70	\$ 146,510,612.68		\$ 2,192,764.05				\$ 147,038,623.04	\$ 2,725,177.12	\$ 7,362,660.59	100.0%	
Morelos	\$ 18,799,035.54	\$ 19,361,916.25	\$ 19,361,916.25	\$ 19,361,916.25	\$ 18,793,440.00		\$ 98,476.25				\$ 19,763,440.00	\$ 94,322.62		100.0%	
Guadaluajara	\$ 26,756,745.78	\$ 13,954,674.15	\$ 13,954,674.15	\$ 13,954,674.15	\$ 13,417,789.52		\$ 536,884.63				\$ 14,020,112.46	\$ 211,152.11	\$ 811,322.94	100.0%	
Monterrey	\$ 54,692,512.37	\$ 78,936,195.68	\$ 78,936,195.68	\$ 78,936,195.68	\$ 78,820,634.75		\$ 315,560.93				\$ 91,459,296.30	\$ 492,797.41	\$ 2,805,681.99	100.0%	
Chiapas	\$ 230,854,731.68	\$ 312,905,241.00	\$ 312,905,241.00	\$ 312,905,241.00	\$ 258,677,270.89		\$ 50,229,468.09				\$ 292,000,580.34	\$ 760,806.40	\$ 33,393,318.45	98.7%	
Oaxaca	\$ 36,935,914.18	\$ 41,461,638.88	\$ 41,461,638.88	\$ 41,461,638.88	\$ 38,927,208.19		\$ 2,534,400.69				\$ 41,401,956.27	\$ 621,592.61	\$ 2,504,748.08	100.0%	
Varos Tamao	\$ 131,272,302.16	\$ 125,288,915.20	\$ 125,288,915.20	\$ 125,288,915.20	\$ 93,040,100.48		\$ 31,948,811.72				\$ 94,379,947.48	\$ 206,607.10		100.0%	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 3,061,497,290.00</b>	<b>\$ 3,024,708,464.37</b>	<b>\$ 3,024,708,464.37</b>	<b>\$ 3,024,708,464.37</b>	<b>\$ 2,771,721,804.82</b>		<b>\$ 249,039,156.57</b>	<b>\$ 0.00</b>			<b>\$ 158,702,522.00</b>	<b>\$ 153,977,680.89</b>	<b>\$ 28,411,834.64</b>	<b>\$ 181,295,427.86</b>	<b>99.9%</b>
<b>Gros Pagos 2008</b>															
<b>Total General</b>															

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

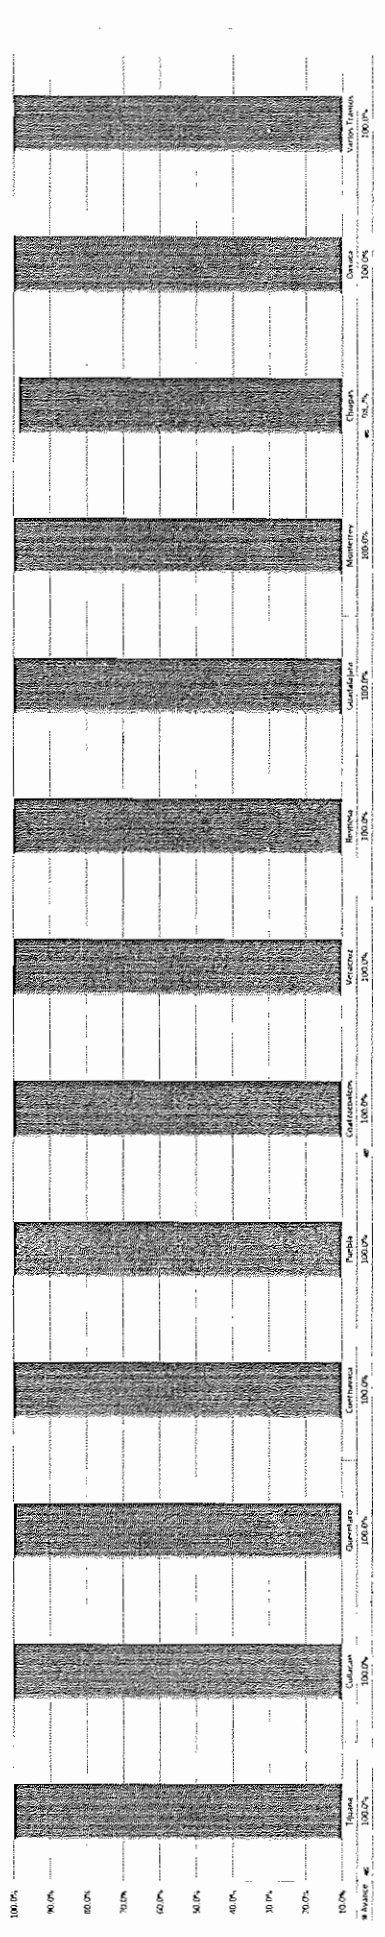

Nota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Oligado más (+), Eliminaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Anticipo de Anticipo






CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2003 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 31 de Diciembre de 2012

Designación	Monto Original Autorizado	Monto Aumentado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite E	Anticipo		Diferencia B+C+D+E	Ejercicio a Flujo de Efectivo	Retenciones - Obligaciones	Ayuda de Costos Fijados	Avance Financiero (%)
							Orogado	Amortizado					
Tijuana	\$ 104,852,000.00	\$ 102,629,724.82	\$ 102,629,724.82	\$ 102,629,724.82	\$ 102,625,303.32	\$ 4,321.50				\$ 113,759,396.00	\$ 11,129,672.74	\$ 11,129,672.74	100.0%
Culiacán	\$ 620,864,000.00	\$ 596,609,449.94	\$ 596,000,449.94	\$ 596,000,449.94	\$ 461,740,817.50	\$ 131,849,632.44	\$ 12,363,402.47	\$ 12,363,402.47		\$ 518,314,732.38	\$ 1,100,402.40	\$ 63,333,304.84	100.0%
Querétaro	\$ 349,500,000.00	\$ 82,191,611.92	\$ 82,191,611.92	\$ 82,191,611.92	\$ 76,328,871.10	\$ 2,862,740.82				\$ 96,361,124.68	\$ 3,745,315.39	\$ 7,032,252.98	100.0%
Cuernavaca	\$ 169,000,000.00	\$ 220,923,879.84	\$ 220,923,879.84	\$ 220,923,879.84	\$ 220,891,048.18	\$ 32,831.66				\$ 269,694,855.01	\$ 35,787.74	\$ 48,603,906.83	100.0%
Proba	\$ 110,000,000.00	\$ 36,082,204.12	\$ 36,082,204.12	\$ 36,082,204.12	\$ 36,041,042.07	\$ 20,051.15	\$ 40,912.28	\$ 40,912.28		\$ 36,041,642.07	\$ 595,264.30		100.0%
Coahuila	\$ 4,200,000.00	\$ 32,085,004.89	\$ 32,085,004.89	\$ 32,085,004.89	\$ 32,061,103.37	\$ 23,901.52				\$ 35,004,816.30		\$ 2,943,812.00	100.0%
Veracruz	\$ 17,150,000.00	\$ 18,790,157.56	\$ 18,790,157.56	\$ 18,790,157.56	\$ 18,122,065.87	\$ 670,161.69	\$ 90,004.50	\$ 34,744.02		\$ 23,713,867.58	\$ 56,001.32	\$ 4,595,821.14	100.0%
Yucatán													0.0%
Guatemala													0.0%
Monteclaro	\$ 4,000,000.00	\$ 29,040,807.71	\$ 29,040,807.71	\$ 29,040,807.71	\$ 29,037,682.04	\$ 43,195.67				\$ 31,082,150.14		\$ 1,194,477.10	100.0%
Chilchik	\$ 293,000,000.00	\$ 287,946,980.06	\$ 287,946,980.06	\$ 287,946,980.06	\$ 234,183,016.57	\$ 4,007,502.98				\$ 267,487,103.66	\$ 748,314.91	\$ 33,294,487.09	99.0%
Quixau	\$ 1,500,000.00	\$ 486,093.53	\$ 486,093.53	\$ 486,093.53	\$ 486,093.53					\$ 486,093.53			100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 1,628,566,000.00	\$ 1,408,608,454.30	\$ 1,408,608,454.30	\$ 1,408,608,454.30	\$ 1,210,308,724.45	\$ 4,007,502.98	\$ 12,513,309.34	\$ 12,546,148.77	\$ 1,381,006,180.00	\$ 5,940,716.11	\$ 182,442,205.67		98.7%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

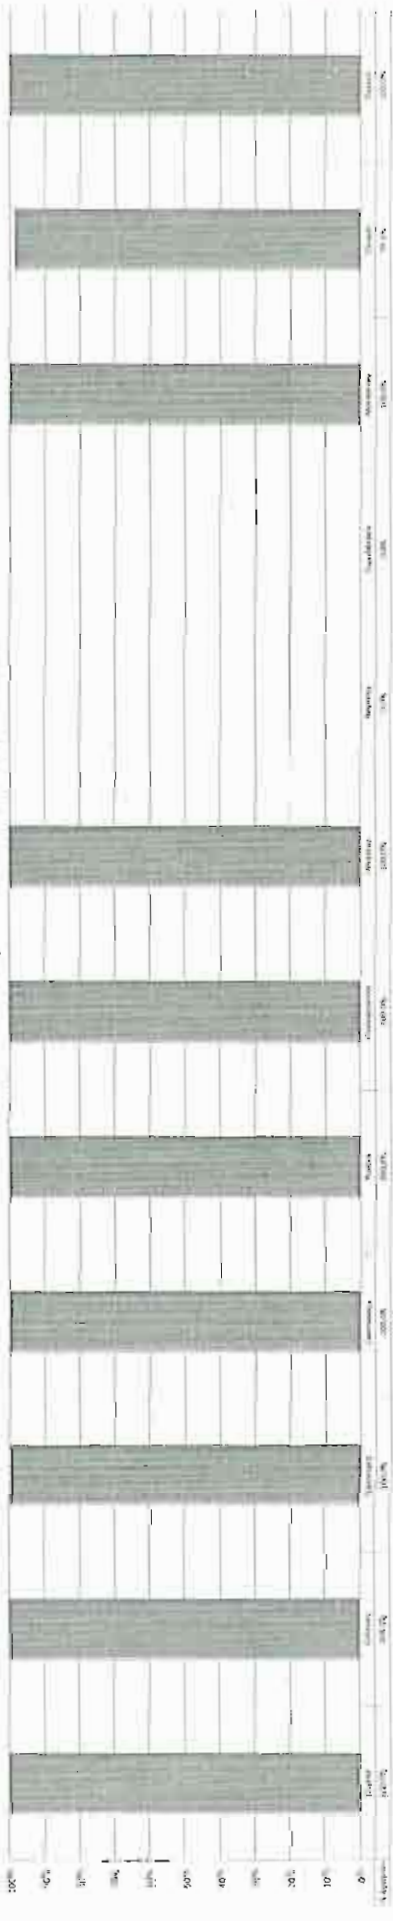

Nota: El Ejercicio a Flujo de Efectivo es: la suma del Anticipo Orogado más (+), Estimaciones más (+), Ajustos de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

Handwritten signature or mark.

0.61







PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


No. Fondo	Centros de Costos	Centro de Costos	Fecha del Contrato	Concepto	Monto Original	Monto Aprobado	Revisión	Revisión	Revisión	Monto Programado	Nombre Cliente	Entrega al Cliente	Financiamiento	Sueto Cancelado	Saldo	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	Porcentaje de Ejecución	
07	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
38	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Parital-Cancelado</b>																			
40	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	7,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
42	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
43	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
44	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
45	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
46	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
47	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
48	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
<b>Parital-Cancelado</b>																			
49	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
50	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
51	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
52	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
<b>Parital-Cancelado</b>																			
53	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
54	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
55	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
<b>Parital-Cancelado</b>																			
56	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			
<b>Parital-Cancelado</b>																			
57	ADMONESTACION GENERAL	ADMONESTACION GENERAL	2008/01/01	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE ACERQUE EN EL CANTON DE MANABITA	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	CONTRATISTA	2008/01/01	CONTRATISTA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Montoneo</b>																			

RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance financiero (%)				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado en Trámite C	Saldo Cancelado D	Diferencia B - C - F	Anticipo Otorgado		Anticipo Amortizado	Ejercido a Flujo de Efectivo	Revoluciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 5,242,800.00	\$ 2,457,732.43	\$ 2,457,732.43	\$ 2,457,732.43	\$ 2,457,732.43	\$ 2,457,732.43				\$ 2,457,732.43			100.0%
Culiacán	\$ 31,273,205.00	\$ 17,689,856.72	\$ 17,689,856.72	\$ 17,689,856.72	\$ 14,893,570.80	\$ 2,776,285.92		\$ 68,421.38	\$ 68,421.38	\$ 15,019,183.22	\$ 1,391,885.50	\$ 125,672.42	100.0%
Querétaro	\$ 16,750,000.00	\$ 4,955,503.19	\$ 4,955,503.19	\$ 4,955,503.19	\$ 4,955,503.19					\$ 4,955,503.19	\$ 8,738.22		100.0%
Coahuila	\$ 8,450,000.00	\$ 8,280,915.81	\$ 8,280,915.81	\$ 8,280,915.81	\$ 8,280,915.81					\$ 8,374,943.95		\$ 94,028.14	100.0%
Puebla	\$ 5,500,000.00	\$ 1,422,586.13	\$ 1,422,586.13	\$ 1,422,586.13	\$ 1,422,586.13					\$ 1,422,586.13			100.0%
Coahuila	\$ 958,441.11	\$ 958,441.11	\$ 958,441.11	\$ 958,441.11	\$ 958,441.11					\$ 958,441.11	\$ 96,347.59		100.0%
Veracruz	\$ 725,000.00	\$ 1,662,105.29	\$ 1,662,105.29	\$ 1,662,105.29	\$ 1,438,818.55	\$ 223,286.74				\$ 1,436,818.55	\$ 2,699.57		100.0%
Reynosa													0.0%
Guadaluajara													0.0%
Monterrey	\$ 200,000.00	\$ 977,812.01	\$ 977,812.01	\$ 977,812.01	\$ 977,812.01					\$ 2,648,996.49		\$ 1,671,184.48	100.0%
Chiapas	\$ 12,600,000.00	\$ 5,324,537.68	\$ 5,324,537.68	\$ 5,324,537.68	\$ 5,279,790.98	\$ 44,746.70				\$ 5,378,422.94		\$ 98,631.96	100.0%
Oaxaca													0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,740,805.00</b>	<b>\$ 43,709,490.37</b>	<b>\$ 43,709,490.37</b>	<b>\$ 43,709,490.37</b>	<b>\$ 40,663,171.01</b>	<b>\$ 3,046,319.36</b>		<b>\$ 68,421.38</b>	<b>\$ 68,421.38</b>	<b>\$ 42,652,627.41</b>	<b>\$ 1,499,671.48</b>	<b>\$ 1,589,456.40</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

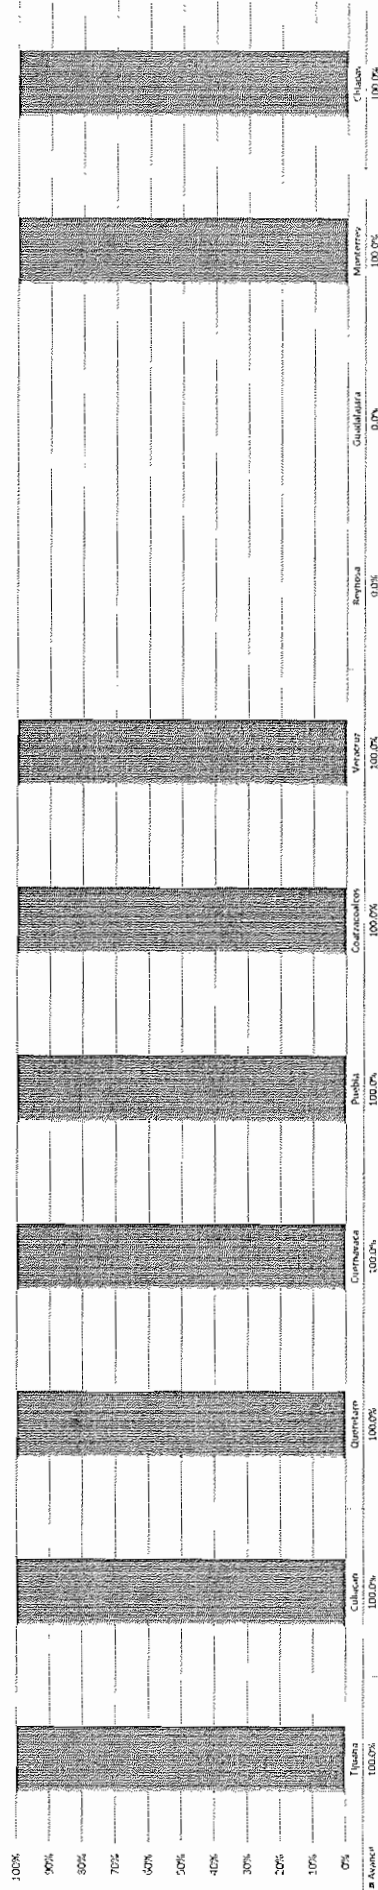

Nota: El Ejercicio a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

Handwritten signature or mark.

No. Proyecto	Cuentas No.	Empresa	Fecha de Cobro Inicial	Fecha de Cobro Final	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Subvencionado	Monto Cancelado	Cheques	Activos	Monto Programado	Monto Ejecutado	Diferencial	Ejecución de Presupuesto (%)	Atenas de Control
<b>TIJUANA</b>															
<b>Subproyecto 7</b>															
1	400001028	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	3,000,000.00	1,037,187.33	1,037,187.33			1,037,187.33	1,037,187.33		100.0%	1,037,187.33
7	400001029	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	1,720,000.00	816,646.10	816,646.10			816,646.10	816,646.10		100.0%	816,646.10
<b>SUBTOTAL TIJUANA</b>						<b>4,720,000.00</b>	<b>1,853,833.43</b>	<b>1,853,833.43</b>			<b>1,853,833.43</b>	<b>1,853,833.43</b>		<b>100.0%</b>	<b>1,853,833.43</b>
<b>CULIACAN</b>															
<b>Subproyecto 8</b>															
3	400001030	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	2,540,376.15	2,328,959.79	2,328,959.79			2,328,959.79	2,328,959.79		100.0%	2,328,959.79
4	400001031	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	2,100,000.00	1,993,874.38	1,993,874.38			1,993,874.38	1,993,874.38		100.0%	1,993,874.38
5	400001032	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	2,700,000.00	1,663,572.27	1,663,572.27			1,663,572.27	1,663,572.27		100.0%	1,663,572.27
6	400001033	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	3,038,613.25	1,986,643.15	1,986,643.15			1,986,643.15	1,986,643.15		100.0%	1,986,643.15
7	400001034	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	3,026,328.58	2,468,776.34	2,468,776.34			2,468,776.34	2,468,776.34		100.0%	2,468,776.34
8	400001035	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	3,460,000.00	2,906,999.00	2,906,999.00			2,906,999.00	2,906,999.00		100.0%	2,906,999.00
9	400001036	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	3,960,000.00	2,964,552.22	2,964,552.22			2,964,552.22	2,964,552.22		100.0%	2,964,552.22
<b>SUBTOTAL CULIACAN</b>						<b>21,272,246.08</b>	<b>17,488,618.32</b>	<b>17,488,618.32</b>			<b>17,488,618.32</b>	<b>17,488,618.32</b>		<b>100.0%</b>	<b>17,488,618.32</b>
<b>MEXICO, COAHUILA</b>															
<b>Subproyecto 9</b>															
11	400001037	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	1,960,000.00	2,171,279.32	2,171,279.32			2,171,279.32	2,171,279.32		100.0%	2,171,279.32
12	400001038	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	964,210.79	964,210.79	964,210.79			964,210.79	964,210.79		100.0%	964,210.79
<b>SUBTOTAL COAHUILA</b>						<b>2,924,210.79</b>	<b>3,135,490.11</b>	<b>3,135,490.11</b>			<b>3,135,490.11</b>	<b>3,135,490.11</b>		<b>100.0%</b>	<b>3,135,490.11</b>
<b>MEXICO, GUANAJUATO</b>															
<b>Subproyecto 10</b>															
14	400001039	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	990,000.00	1,131,487.37	1,131,487.37			1,131,487.37	1,131,487.37		100.0%	1,131,487.37
15	400001040	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	60,000.00	168,223.40	168,223.40			168,223.40	168,223.40		100.0%	168,223.40
<b>SUBTOTAL GUANAJUATO</b>						<b>1,050,000.00</b>	<b>1,300,710.77</b>	<b>1,300,710.77</b>			<b>1,300,710.77</b>	<b>1,300,710.77</b>		<b>100.0%</b>	<b>1,300,710.77</b>
<b>MEXICO, QUERETARO</b>															
<b>Subproyecto 11</b>															
16	400001041	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	1,100,000.00	1,023,826.11	1,023,826.11			1,023,826.11	1,023,826.11		100.0%	1,023,826.11
17	400001042	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	422,211.84	422,211.84	422,211.84			422,211.84	422,211.84		100.0%	422,211.84
<b>SUBTOTAL QUERETARO</b>						<b>1,522,211.84</b>	<b>1,446,037.95</b>	<b>1,446,037.95</b>			<b>1,446,037.95</b>	<b>1,446,037.95</b>		<b>100.0%</b>	<b>1,446,037.95</b>
<b>MEXICO, VERACRUZ</b>															
<b>Subproyecto 12</b>															
18	400001043	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	2,990,000.00	2,196,251.26	2,196,251.26			2,196,251.26	2,196,251.26		100.0%	2,196,251.26
19	400001044	RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	15/02/2008	31/03/2009	SUPERVISION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM 4+000 AL KM 5+000 CARRERA 30	10,700,000.00	4,855,503.18	4,855,503.18			4,855,503.18	4,855,503.18		100.0%	4,855,503.18
<b>SUBTOTAL VERACRUZ</b>						<b>13,690,000.00</b>	<b>7,051,754.44</b>	<b>7,051,754.44</b>			<b>7,051,754.44</b>	<b>7,051,754.44</b>		<b>100.0%</b>	<b>7,051,754.44</b>
<b>TOTAL</b>															
<b>SUBTOTAL</b>						<b>47,276,562.03</b>	<b>38,898,618.32</b>	<b>38,898,618.32</b>			<b>38,898,618.32</b>	<b>38,898,618.32</b>		<b>100.0%</b>	<b>38,898,618.32</b>








RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)		
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido = Flujo de Efectivo		Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 9,778,622.58	\$ 14,267,152.73	\$ 14,267,152.73	\$ 14,267,152.73	\$ 14,267,152.44		\$ 0.29		\$ 15,183,222.51	\$ 436,888.77	\$ 916,070.07	100.0%
Culiacán	\$ 19,312,140.31	\$ 21,511,817.56	\$ 21,511,817.56	\$ 21,511,817.56	\$ 21,489,357.57		\$ 22,459.99		\$ 22,107,420.65	\$ 673.57	\$ 618,063.08	100.0%
Querétaro	\$ 55,920,579.84	\$ 50,668,268.58	\$ 50,668,268.58	\$ 50,668,268.58	\$ 50,640,211.32		\$ 28,057.26		\$ 54,813,844.41		\$ 4,173,533.09	100.0%
Cuernavaca	\$ 33,447,260.09	\$ 38,253,356.87	\$ 38,253,356.87	\$ 38,253,356.87	\$ 38,011,446.34		\$ 241,910.53		\$ 38,011,446.34	\$ 71,525.15		100.0%
Puebla	\$ 25,974,297.97	\$ 24,033,924.64	\$ 24,033,924.64	\$ 24,033,924.64	\$ 23,796,238.79		\$ 237,685.85		\$ 26,320,563.60	\$ 237,910.06	\$ 2,524,324.81	100.0%
Coahuila	\$ 26,546,131.96	\$ 26,162,054.83	\$ 26,162,054.83	\$ 26,162,054.83	\$ 26,161,996.90		\$ 57.93		\$ 26,858,323.24	\$ 19,668.66	\$ 796,326.34	100.0%
Veracruz	\$ 14,620,597.79	\$ 17,590,732.79	\$ 17,590,732.79	\$ 17,590,732.79	\$ 17,588,678.97		\$ 2,053.82		\$ 17,588,678.97			100.0%
Reynosa	\$ 4,134,253.46	\$ 4,097,501.56	\$ 4,097,501.56	\$ 4,097,501.56	\$ 4,097,492.60		\$ 8.96		\$ 4,097,492.60			100.0%
Guadalupe	\$ 9,970,397.44	\$ 9,446,578.95	\$ 9,446,578.95	\$ 9,446,578.95	\$ 8,951,187.53		\$ 495,391.42		\$ 9,450,735.20	\$ 29,723.49	\$ 499,547.67	100.0%
Monterrey	\$ 38,940,254.40	\$ 37,011,195.69	\$ 37,011,195.69	\$ 37,011,195.69	\$ 37,011,190.25		\$ 5.44		\$ 37,011,190.25	\$ 304,050.29		100.0%
Chiapas	\$ 8,921,644.88	\$ 6,937,362.66	\$ 6,937,362.66	\$ 6,937,362.66	\$ 6,937,295.69		\$ 66.97		\$ 6,937,295.69			100.0%
Oaxaca	\$ 20,248,191.97	\$ 21,388,675.07	\$ 21,388,675.07	\$ 21,388,675.07	\$ 20,577,276.75		\$ 811,398.32		\$ 23,082,024.83	\$ 77,085.49	\$ 2,504,748.08	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 268,264,372.69</b>	<b>\$ 271,368,621.93</b>	<b>\$ 271,368,621.93</b>	<b>\$ 271,368,621.93</b>	<b>\$ 269,528,525.15</b>		<b>\$ 1,839,096.78</b>		<b>\$ 281,562,238.29</b>	<b>\$ 1,177,525.48</b>	<b>\$ 12,032,713.14</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

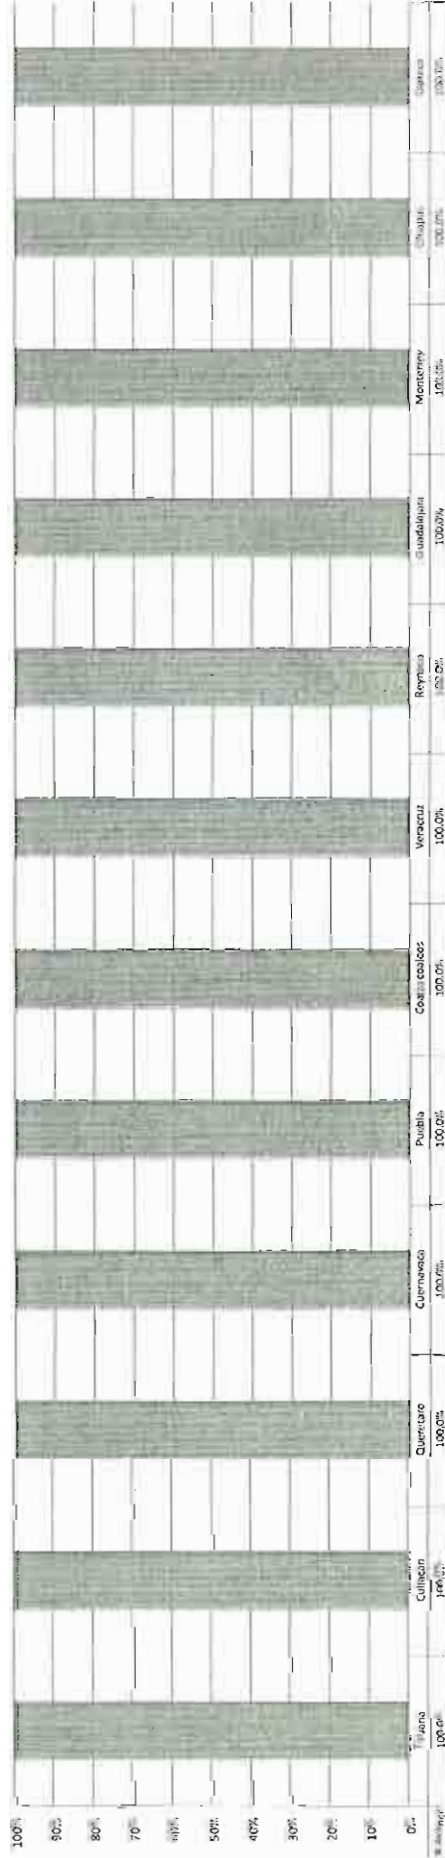

Nota: El Ejercicio a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Centro de Ingresos y Servicios Comexos	Código	Fejuna	Plazo de Ejecución (meses)	Carencia	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Pagado B	Monto Cancelado C	Estado de Cuenta D	Reservación Devaluatoria	Monto Cancelado E	Cancelación de Cuenta Efectiva	Antes del 2008 (%)	Después del 2008 (%)
<b>Tierras y Fincas</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	5,500,000.00	5,000,000.00	6,000,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	100.0%	100.0%
<b>Urbes y Poblaciones</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	5,200,000.00	2,511,866.67	5,511,866.67	5,511,866.67	5,511,866.67	5	0.00	5,511,866.67	5,511,866.67	100.0%	100.0%
<b>Urbes y Poblaciones - Cables</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	3,200,000.00	1,511,866.67	4,511,866.67	4,511,866.67	4,511,866.67	5	0.00	4,511,866.67	4,511,866.67	100.0%	100.0%
<b>Mant. y Repar. Carreteras</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Mant. y Repar. Puentes</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	5	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras - Cables</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras - Puentes</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	5	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras - Puentes - Cables</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras - Puentes - Cables - Cables</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras - Puentes - Cables - Cables - Cables</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Carreteras - Puentes - Cables - Cables - Cables - Cables</b>															
40000000	00000000	00000000	00000000	00000000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	5	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	100.0%

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Cuentas de Ingresos y Gastos	Empresa	Periodo del Contrato (Inicio - Fin)	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado	Monto Ejecutado	Monto Comprometido	Ejercido en el Ejercicio D	Plazamiento de Recursos	Saldo Ejecutado E	Diferencia B-C-D-E	Cuentas de Pago de Ejercicio	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Aprobación de Cuenta Propuesta
<b>La Plata - Córdoba</b>																	
21	44000000	GRUPO CONSTRUCTORA MAYA	13/03/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMPO DIRECTO	3,094,307.45 \$	2,998,270.25 \$	2,998,270.25 \$	2,998,270.25 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Zacapala - Rancho Viejo</b>																	
22	44000000	SAE DE CARRETERO DE INGENIERIA	01/04/2009 - 02/03/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMPO DIRECTO	3,888,895.93 \$	3,849,341.34 \$	3,849,341.34 \$	3,849,341.34 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Rancho Viejo - Teaco</b>																	
23	44000000	MFC CONSTRUCTORA Y CONTRATASAS	01/04/2009 - 14/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMPO DIRECTO	2,324,246.65 \$	2,225,800.93 \$	2,225,800.93 \$	2,225,800.93 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>PUEBLA</b>																	
<b>Mexico - Puebla</b>																	
24	44000000	GRUPO OCE	01/05/2009 - 01/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR 500150000 GAVIA MARTHA - RIO HRO KM 15+00 AL KM 13+000	9,144,531.70 \$	9,144,531.70 \$	9,144,531.70 \$	9,144,531.70 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
25	44000000	CONSTRUCTORA SANJA EN PARTICIPACION CON PENSION COLABORADORA	01/03/2009 - 14/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR SERRANITO RIO HRO - PUEBLA DEL KM 14+000 AL KM 12+000	9,729,939.49 \$	9,729,939.49 \$	9,729,939.49 \$	9,729,939.49 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Puebla - Azahingo</b>																	
26	44000000	GRUPO CONSTRUCTORA TECNICA Y TECNOLOGIA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SANJA EN PARTICIPACION CON PENSION COLABORADORA	01/03/2009 - 14/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR KM 12+000 AL KM 21+000	9,962,974.71 \$	9,962,974.71 \$	9,962,974.71 \$	9,962,974.71 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Azahingo - Ctl. Mendota</b>																	
27	44000000	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	01/04/2009 - 14/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR KM 21+000 AL KM 27+000	3,252,421.61 \$	3,252,421.61 \$	3,252,421.61 \$	3,252,421.61 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>CONTRATACIONES</b>																	
<b>Chetumal - Campeche</b>																	
28	44000000	TECNOLOGIA EN SERVICIOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	01/04/2009 - 21/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR	3,943,002.90 \$	3,943,002.90 \$	3,943,002.90 \$	3,943,002.90 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>La Trinita - Arizapan</b>																	
29	44000000	CARLOS J. VAS - SERVICIOS DE INGENIERIA	01/04/2009 - 21/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL TRAMO 18+000 A 24+000	9,100,000.00 \$	9,100,000.00 \$	9,100,000.00 \$	9,100,000.00 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Arizapan - Campeche</b>																	
30	44000000	GRUPO OCE	01/04/2009 - 21/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR	3,462,293.20 \$	3,462,293.20 \$	3,462,293.20 \$	3,462,293.20 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Alpa Dulce - Continencia</b>																	
31	44000000	GRUPO OCE	01/04/2009 - 21/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR	9,200,000.00 \$	9,200,000.00 \$	9,200,000.00 \$	9,200,000.00 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Valle Guay - La Ventana</b>																	
32	44000000	GRUPO OCE	01/04/2009 - 21/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL TRAMO 18+000 A 24+000	5,421,720.70 \$	5,421,720.70 \$	5,421,720.70 \$	5,421,720.70 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>VERACRUZ</b>																	
<b>Ctl. Mendota - Córdoba</b>																	
33	44000000	GRUPO OCE	02/03/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 20+000 AL KM 20+300	3,297,622.21 \$	3,297,622.21 \$	3,297,622.21 \$	3,297,622.21 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Córdoba - Veracruz</b>																	
34	44000000	GRUPO OCE	02/03/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 14+000 AL KM 14+500	3,300,304.04 \$	3,300,304.04 \$	3,300,304.04 \$	3,300,304.04 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>La Trinita - Ctl. Iala</b>																	
35	44000000	GRUPO OCE	02/03/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 3+000 AL KM 11+000	3,454,320.19 \$	3,454,320.19 \$	3,454,320.19 \$	3,454,320.19 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Córdoba - Veracruz - Tehuacan</b>																	
36	44000000	PROYECTOS Y FORNADORA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	02/03/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 181+000 AL KM 21+150M	1,969,364.68 \$	1,969,364.68 \$	1,969,364.68 \$	1,969,364.68 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Lugar de Promoción de Empleo</b>																	
37	44000000	PROYECTOS Y FORNADORA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	02/03/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 3+000 AL KM 14+500	397,810.97 \$	1,106,209.11 \$	1,106,209.11 \$	1,106,209.11 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>PCN0064</b>																	
<b>Mexico - Veracruz</b>																	
38	44000000	POJALBA Y COLABORADORA EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA	20/01/2009 - 29/01/2009	MANTENIMIENTO MENOR	4,124,253.91 \$	4,097,901.56 \$	4,097,901.56 \$	4,097,901.56 \$	-	-	-	-	-	-	100.0%	100.0%	
<b>Subtotal</b>																	
<b>Subtotal Veracruz</b>																	






Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance Financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Estimado en Trámite	Saldo Cancelado	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones		Ajuste de Costos Pagados
Tijuana	\$ 506,717.95	\$ 2,304,096.32	\$ 2,304,096.32	\$ 2,304,066.32	\$ 2,176,320.46		\$ 127,765.86		\$ 2,176,320.46			100.0%
Culiacán	\$ 1,158,728.42	\$ 2,195,350.98	\$ 2,195,350.98	\$ 2,195,350.98	\$ 2,135,910.64		\$ 49,440.34		\$ 2,135,910.64	\$ 85,219.13		100.0%
Querétaro	\$ 3,356,234.79	\$ 4,929,732.10	\$ 4,929,732.10	\$ 4,929,732.10	\$ 4,599,695.81		\$ 330,036.29		\$ 4,599,695.81	\$ 5,982.13		100.0%
Guerrero	\$ 2,006,935.62	\$ 2,004,933.05	\$ 2,004,933.05	\$ 2,004,933.05	\$ 2,004,933.05				\$ 2,004,933.05	\$ 11,457.31		100.0%
Puebla	\$ 1,558,457.67	\$ 2,300,006.13	\$ 2,300,006.13	\$ 2,300,006.13	\$ 2,116,516.79		\$ 183,489.34		\$ 2,116,516.79	\$ 3,544.21		100.0%
Colima	\$ 1,619,767.93	\$ 4,704,561.98	\$ 4,704,561.98	\$ 4,704,561.98	\$ 4,249,969.12		\$ 454,592.86		\$ 4,249,969.12	\$ 6,634.00		100.0%
Veracruz	\$ 877,235.96	\$ 4,668,029.86	\$ 4,668,029.86	\$ 4,668,029.86	\$ 4,011,105.63		\$ 656,924.23		\$ 4,011,105.63	\$ 30,232.70		100.0%
Reynosa	\$ 248,055.21	\$ 761,251.22	\$ 761,251.22	\$ 761,251.22	\$ 730,796.27		\$ 30,454.95		\$ 730,796.27			100.0%
Guadaluajara	\$ 598,223.84	\$ 1,327,399.84	\$ 1,327,399.84	\$ 1,327,399.84	\$ 1,285,921.58		\$ 41,478.26		\$ 1,285,921.58			100.0%
Monterrey	\$ 2,336,415.26	\$ 3,499,117.75	\$ 3,499,117.75	\$ 3,499,117.75	\$ 3,314,462.21		\$ 184,655.54		\$ 3,314,462.21			100.0%
Chiapas	\$ 535,208.69	\$ 1,314,170.73	\$ 1,314,170.73	\$ 1,314,170.73	\$ 1,243,860.80		\$ 70,309.93		\$ 1,243,860.80			100.0%
Oaxaca	\$ 1,214,891.52	\$ 2,833,392.13	\$ 2,833,392.13	\$ 2,833,392.13	\$ 2,752,798.39		\$ 80,603.74		\$ 2,752,798.39	\$ 38,066.54		100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 16,095,862.36</b>	<b>\$ 32,832,032.09</b>	<b>\$ 32,832,032.09</b>	<b>\$ 32,832,032.09</b>	<b>\$ 30,622,300.75</b>		<b>\$ 2,209,731.34</b>		<b>\$ 30,622,300.75</b>	<b>\$ 231,206.02</b>		<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

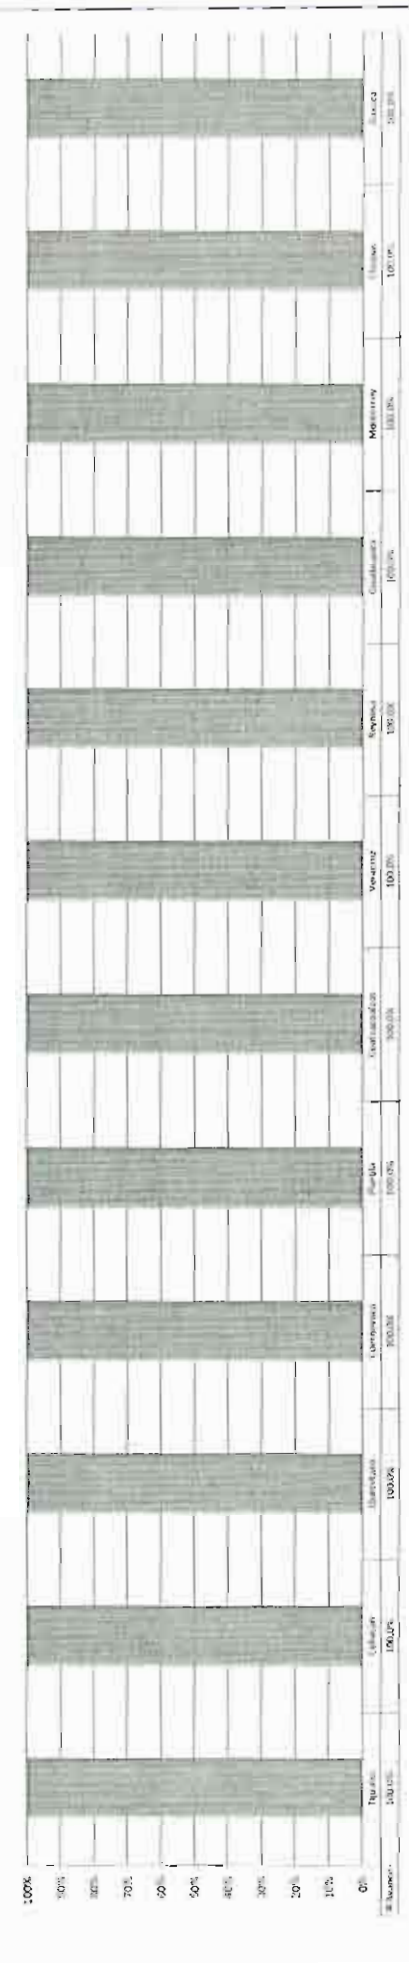

Nota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

15

075



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Revisado	Monto Contratado	Monto Programado	Monto Ejecutado	Estimado en Trámite	Revoluciones Previstas	Saldo Ejecutado	Obliga. B.U.C.	Ejercicio a cargo de	Avance Financiero (%)
			Inicio	Fin												
<b>TLAJUAMA</b>																
Tlajuma - Etmoacán																
1	450000713 500000210	ROCHER INGENIERIA	10/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	300,500.00	720,752.12	720,752.12	720,752.12	071,300.74			55,203.21		071,300.74	100.0%
2	450000714 500000340	ROCHER INGENIERIA	25/02/2008	11/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 01+000 AL KM. 117+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	127,377.77	600,207.65	600,207.65	600,207.65	055,047.00			26,240.20		055,047.00	100.0%
<b>Libramiento Los Cabos</b>																
3	450000727	PROFESIONISTAS EN OCHO CONTROL	20/02/2008	03/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 100+000 AL KM. 120+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	110,770.64	807,000.00	807,000.00	807,000.00	640,074.53			32,162.17		640,074.53	100.0%
<b>CUILAÇÁN</b>																
Estación Dnc. - Nogales																
4.516	450000730	CONSTRUCTORA OAVE	20/02/2008	07/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	715,603.38	1,530,770.00	1,530,770.00	1,530,770.00	1,401,370.34			60,402.24		1,401,370.34	100.0%
<b>Mazatlán - Culiacán</b>																
7	450000733 500000227	ROCHER INGENIERIA	20/02/2008	07/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN INFRAESTRUCTURA	443,125.04	694,566.30	694,566.30	694,566.30	074,556.30			20,700.72		694,566.30	100.0%
<b>QUERCÁRO</b>																
Subtotal CUILAÇÁN																
						1,100,778.42	2,125,336.92	2,125,336.92	2,125,336.92	2,135,000.64			80,465.24		2,135,000.64	100.0%
<b>Libramiento Noroeste de Querétaro</b>																
8	450000216	FELPE DE JESUS GARCIA MORALES Y ASOCIADOS CONSULTORIA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR	100,540.37	606,007.00	606,007.00	606,007.00	020,547.79			46,009.64		606,007.00	100.0%
<b>Chamapa - Lechería</b>																
9	450000248	FELPE DE JESUS GARCIA MORALES Y ASOCIADOS CONSULTORIA DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR	240,250.00	033,302.40	033,302.40	033,302.40	500,100.00			41,172.00		500,100.00	100.0%
<b>Pedernales - Huamantla</b>																
10	450000772	INGENIERIA AMBIENTAL URBANA	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR	442,251.27	489,017.46	489,017.46	489,017.46	654,250.15			25,240.30		654,250.15	100.0%
<b>Huamantla - Nueva Italia</b>																
11	450000781	CLAPANI	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR	250,103.00	724,602.06	724,602.06	724,602.06	007,227.48			47,435.47		007,227.48	100.0%
<b>Nueva Italia - Lazarc Cardenas</b>																
12	450000987	PAQUE CONSULTAS EN GEO CONTROL	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR	401,045.17	716,520.70	716,520.70	716,520.70	001,720.24			47,202.59		001,720.24	100.0%
<b>México - Querétaro</b>																
13	450000784 500000281	BOIRONAL Y ASOCIADOS Y SERVICIOS Y TECNOLOGIAS DE MEXICO	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO MENOR SUBTRAMO TEPICALAPA-FAMILIAR	1,040,437.40	500,021.07	500,021.07	500,021.07	550,942.09			32,070.96		550,942.09	100.0%
14	450000797	CONSTRUCCIONES Y ADJUDICADOS RAM Y CERRAJE INDUSTRIAL	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO MENOR SUBTRAMO FAMILIAR-QUECERARO	500,210.47	500,210.47	500,210.47	500,210.47	497,016.20			43,157.27		497,016.20	100.0%
<b>Querétaro - Tzucuba</b>																
15	450000793	INGENIERIA AMBIENTAL URBANA	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR	719,145.20	500,001.24	500,001.24	500,001.24	544,000.00			27,101.36		544,000.00	100.0%
<b>CUERNAVACA</b>																
Subtotal CUERNAVACA																
						3,355,724.79	4,029,722.10	4,029,722.10	4,029,722.10	4,520,450.61			320,524.29		4,520,450.61	100.0%
<b>México - Cuernavaca</b>																
16	450000712	JOSE LUIS SATURNINO AGUILAR IBAÑEA	01/02/2008	10/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 10+000 AL KM. 30+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTOPISTA	307,002.91	200,343.00	200,343.00	200,343.00	200,343.00					200,343.00	100.0%
<b>Libramiento Chiriquén</b>																
17	450000100	ROCHER INGENIERIA	16/02/2008	16/02/2009	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 00+000 AL KM. 30+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL LIBRAMIENTO CUERNAVACA	80,370.04	00,410.20	00,410.20	00,410.20	00,410.20					00,410.20	100.0%

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Programado	Monto Cumulado	Estimado en Trámite	Revoluciones Devolucionadas	Saldo Cancelado	Diferencia DDOFC	Ejercicio a Cargo de Crédito	Avance Financiero (%)	
			Inicio	Fin												
<b>Carreteras - Acapulco</b>																
10	450001004	ALVAREZ GUILLÉN INGENIEROS CONSULTORES S. DE CV	01/04/2008	14/02/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 183 ESTRUCTURAS DE LA CARRETERA FEDERAL PANAMA - ACAPULCO, DEL KM 95+000 AL KM 261+000	690,150.00	690,240.70	690,240.70	690,240.70	-	-	-	-	690,240.70	100.0%	
<b>Puerto de Ixtla - Ixtla</b>																
20	450001007	RODRIGUEZ INGENIERIA	01/04/2008	15/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO KM 0+000 AL KM 16+000	157,276.02	330,101.26	330,101.06	330,101.06	-	11,473.31	-	-	330,101.06	100.0%	
<b>La Pasa - Cuicatlan</b>																
21	450001012	JOSÉ LUIS SARTUNERO AGUILAR INGENIERIA	01/04/2008	14/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 45 ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO LA PASA-CUICATLAN	300,207.20	276,132.05	276,132.05	276,132.05	-	-	-	-	276,132.05	100.0%	
<b>Zacapano - Rancho Viejo</b>																
22	450001010	SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y URBANIZACION	01/04/2008	13/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL C.D. ANI 0+000 AL KM 17+121	222,006.10	174,016.74	174,016.74	174,016.74	-	-	-	-	174,016.74	100.0%	
<b>Rancho Viejo - Trasco</b>																
23	450001016	SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA ESTRUCTURAL Y URBANIZACION	01/04/2008	15/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO KM 0+000 AL KM 14+000	127,308.17	177,062.27	177,062.27	177,062.27	-	-	-	-	177,062.27	100.0%	
<b>PUERTO</b>																
						<b>SUBTOTAL ACAPULCO</b>	<b>2,290,838.62</b>	<b>2,654,559.86</b>	<b>2,654,559.86</b>	<b>2,654,559.86</b>	<b>-</b>	<b>11,487.31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,654,559.86</b>	<b>100.0%</b>
<b>México - Puebla</b>																
24	450001017	COORDINACION TECNICO ADMINISTRATIVA	03/04/2008	21/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA, SUBITRAMO SANTA MARTHA - RIO FRIO, KM 10+000 AL KM 13+000	696,536.70	497,772.00	497,772.00	445,720.07	-	3,546.21	12,012.30	-	445,720.07	100.0%	
25	450001015	NEBER INGENIERIA	06/04/2008	20/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR SUBITRAMO RIO FRIO - PUERTA DEL KM 10+000 AL KM 13+000	-	900,672.20	900,672.20	940,304.02	-	-	01,487.05	-	940,304.02	100.0%	
<b>Puebla - Acapulco</b>																
26	450001018	CLAFUSA	06/04/2008	26/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR KM 17+850 AL KM 27+700 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	380,722.46	458,107.79	458,107.79	420,650.64	-	-	71,229.15	-	420,650.64	100.0%	
<b>Acapulco - Cr. Mendocino</b>																
27	450001016	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA	09/04/2008	13/04/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 101 ESTRUCTURAS	213,149.01	607,173.00	607,173.00	594,432.20	-	-	6,700.15	-	594,432.20	100.0%	
						<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>	<b>2,290,806.13</b>	<b>2,290,806.13</b>	<b>2,110,616.79</b>	<b>-</b>	<b>3,444.21</b>	<b>193,499.34</b>	<b>-</b>	<b>2,110,616.79</b>	<b>100.0%</b>	
<b>Chamela - Campeche</b>																
28	450001015	OVALO CONSTRUCCIONES	01/04/2008	04/02/2009	SUPERVISION DE OBRAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 23 ESTRUCTURAS	210,371.00	633,039.41	633,039.41	790,180.70	-	-	87,649.10	-	790,180.70	100.0%	
<b>Ciudad del Mar - Atzacantan</b>																
29	450001016	OVALO CONSTRUCCIONES	01/04/2008	04/02/2009	SUPERVISION DE OBRAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 183 ESTRUCTURAS	427,818.40	603,533.45	603,533.45	790,657.20	-	-	73,666.17	-	790,657.20	100.0%	
<b>Acapulco - Coahuila de Zaragoza</b>																
30	450001017	RAFA VICENTE OROZCO Y CIA	01/04/2008	04/02/2009	SUPERVISION DE OBRAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	260,001.07	901,010.40	901,010.40	620,077.00	-	-	121,141.31	-	620,077.00	100.0%	
<b>Agua Dulce - Coahuila de Zaragoza</b>																
31	450001018	RAFA VICENTE OROZCO Y CIA	01/04/2008	04/02/2009	SUPERVISION DE OBRAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 290 ESTRUCTURAS	300,210.44	976,206.07	976,206.07	852,211.11	-	-	120,079.56	-	852,211.11	100.0%	
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>																
32	450001018	GEOTECNIA Y SUPERVISION TECNICA	01/04/2008	04/02/2009	SUPERVISION DE OBRAS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 290 ESTRUCTURAS	271,303.00	1,009,802.80	1,009,802.80	1,000,056.70	-	3,684.07	99,097.00	-	1,000,056.70	100.0%	
						<b>SUBTOTAL COAHUILA DE ZARAGOZA</b>	<b>4,052,951.48</b>	<b>4,052,951.48</b>	<b>3,304,945.05</b>	<b>-</b>	<b>6,928.08</b>	<b>454,975.90</b>	<b>-</b>	<b>3,304,945.05</b>	<b>100.0%</b>	



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Petición	Contrato No	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aumentado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Cumplido C	Licitados en Trámite D	Retenciones-Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia D-C-D-E	Ejercido a Flujo de Efectivo F	Iniciado G
			Iniciado	Fin												
<b>VERACRUZ</b>																
<b>Cd. Minatitlán - Córdoba</b>																
33	4500010586 5000003372 (1)	PROFESIONISTAS EN CTD-CONTROL	02/05/2008	03/04/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 202+000 AL KM. 201+000 Y MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 117,887.33	\$ 960,276.00	\$ 960,276.00	\$ 960,276.90	\$ 960,276.90	\$ 960,276.74	\$ 12,105.91	\$ 2,418,004.00	\$ -	\$ 1,064,779.74	100.0%
<b>Córdoba - Veracruz</b>																
34	4500010586 5000003372 (2)	PROFESIONISTAS EN CTD-CONTROL	03/06/2008	03/04/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 0+000 AL KM. 08+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 203,123.69	\$ 960,276.00	\$ 960,276.00	\$ 960,276.47	\$ 960,276.47	\$ 960,276.51	\$ 12,105.91	\$ 2,418,004.00	\$ -	\$ 874,137.51	100.0%
<b>La Trinita - Cd. Minatitlán</b>																
35	4500010586 5000003372 (3)	INGENIEROS EN CTD-CONTROL	05/05/2008	03/04/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 327,250.21	\$ 960,276.00	\$ 960,276.00	\$ 960,276.07	\$ 960,276.07	\$ 960,276.03	\$ 12,105.91	\$ 2,418,004.00	\$ -	\$ 894,779.03	100.0%
<b>Cuártema - Zimatlán - Tlaxiahuacán</b>																
36	4500010513 5000003370 (1)	CONSTRUCCIONES SILEC	07/06/2008	03/04/2009	SUPERVISION DE OBRAS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 16,121.27	\$ 909,276.00	\$ 909,276.00	\$ 909,276.00	\$ 909,276.00	\$ 909,276.00	\$ 21,740.32	\$ 2,173,007.77	\$ -	\$ 725,230.32	100.0%
<b>El Balam - Pomián - San Felipe</b>																
37	4500010513 5000003370 (2)	CONSTRUCCIONES SILEC	05/05/2008	03/04/2009	SUPERVISION DE OBRAS DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 53,874.00	\$ 877,016.25	\$ 877,016.25	\$ 877,016.25	\$ 877,016.25	\$ 877,016.03	\$ 22,144.06	\$ 2,523,817.07	\$ -	\$ 875,897.03	100.0%
<b>ACAFOSA</b>																
<b>Subtotal Veracruz</b>																
						\$ 877,258.81	\$ 4,658,828.00	\$ 4,658,828.00	\$ 4,658,828.00	\$ 4,658,828.00	\$ 4,658,828.00	\$ 89,279.79	\$ 18,543,827.77	\$ -	\$ 5,071,100.63	100.0%
<b>Mahabasca - Reynosa</b>																
38	4500009728	F.C. PROYECTOR Y CONSTRUCCIONES	21/02/2008	16/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 248,654.21	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 30,654.00	\$ 2,306,796.27	\$ -	\$ 720,796.27	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>																
<b>Subtotal Reynosa</b>																
						\$ 248,654.21	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 701,251.22	\$ 30,654.00	\$ 2,306,796.27	\$ -	\$ 720,796.27	100.0%
<b>Cuadahuéres - Tepic</b>																
39 y 40	4000009841	SERVIDOR INGENIERIA	01/02/2008	15/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 958,222.84	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.16	\$ 41,418.21	\$ 2,265,571.36	\$ -	\$ 1,235,571.36	100.0%
<b>MONTERRCY</b>																
<b>Subtotal Guadalajara</b>																
						\$ 958,222.84	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.04	\$ 1,327,306.16	\$ 41,418.21	\$ 2,265,571.36	\$ -	\$ 1,235,571.36	100.0%
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																
41	4000009777	H. C. CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	01/02/2008	06/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 861,103.31	\$ 895,706.13	\$ 895,706.13	\$ 895,709.13	\$ 895,710.00	\$ 895,710.00	\$ 52,081.57	\$ 1,442,716.90	\$ -	\$ 942,716.90	100.0%
<b>Torresón - Sanfilas</b>																
42	4000009789	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS	01/02/2008	06/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 424,050.00	\$ 778,081.03	\$ 778,081.03	\$ 778,081.03	\$ 778,081.03	\$ 778,081.19	\$ 45,948.44	\$ 1,233,035.16	\$ -	\$ 733,035.16	100.0%
<b>Córdoba - Ojo Caliente</b>																
43	4000010511	ANGEL PEREZ MONTAÑO	01/02/2008	15/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 197,382.02	\$ 126,776.66	\$ 126,776.66	\$ 126,776.66	\$ 126,776.66	\$ 126,776.66	\$ -	\$ 126,776.66	\$ -	\$ 126,776.66	100.0%
<b>Genes - Pánuco - Coahuila</b>																
44	4000009773	GRUPO CONSTRUCTOR DE OBRAS Y TECNOLOGIAS DE VEHICULOS	01/02/2008	06/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 631,999.94	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.00	\$ 703,000.12	\$ 40,000.00	\$ 862,000.42	\$ -	\$ 862,000.42	100.0%
<b>Córdoba - Reynosa</b>																
45	4000009773 5000003346 (2003)	ASORIS CONSTRUCCIONES	01/02/2008	03/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 472,025.47	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.10	\$ 46,776.99	\$ 1,242,173.10	\$ -	\$ 858,173.10	100.0%
<b>Puerto Morelos - Calceyem</b>																
46	4000010010	ANGEL PEREZ MONTAÑO	01/02/2008	15/02/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	\$ 119,000.00	\$ 194,700.20	\$ 194,700.20	\$ 194,700.20	\$ 194,700.20	\$ 194,700.20	\$ -	\$ 194,700.20	\$ -	\$ 194,700.20	100.0%
<b>CHIAPAS</b>																
<b>Subtotal Monte Rrey</b>																
						\$ 3,259,445.24	\$ 3,690,117.75	\$ 3,690,117.75	\$ 3,690,117.75	\$ 3,690,117.75	\$ 3,690,117.75	\$ 3,254,652.21	\$ 18,543,827.77	\$ -	\$ 3,254,652.21	100.0%
<b>Las Chobarras - Pánuco - Coahuila</b>																
47	4000009776 5000003346 5000003346	PAUL VICENT ORDOZCO Y COMPANIA	01/02/2008	16/02/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	\$ 532,288.08	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 10,200.00	\$ 1,243,800.00	\$ -	\$ 1,243,800.00	100.0%
<b>Subtotal Chiapas</b>																
						\$ 532,288.08	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 1,314,170.23	\$ 10,200.00	\$ 1,243,800.00	\$ -	\$ 1,243,800.00	100.0%




CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA  
PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo en Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Estimado C	Estimado en Trámite D	Retenciones-Deducciones	Saldo Cancelado E	Diferencia G+J-K	Fecha de Cierre de Cuenta	Avance Financiero (%)
			Inicio	Fin												
40	400000787	CAUTCS, S.A. DE C.V.	03/05/2008	14/02/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LOS TRAMO DE 120+000 Y TRAZADOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRECHURAS	1,244,804.99	1,420,017.70	1,420,017.70	1,420,017.70	1,420,017.70	-	10,074.14	-	1,420,017.70	100.0%	
40	400000014	SOLORAM, S.A. DE C.V.	04/05/2008	15/02/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LOS TRAMO DE 210+000 Y RAMAL NUTIZO 1.7 KM Y TRAZADOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN	1,244,804.99	1,420,017.70	1,420,017.70	1,420,017.70	1,320,170.00	11,000.40	10,000.74	-	1,320,170.00	100.0%	
<b>TOTAL</b>						<b>2,489,609.98</b>	<b>2,840,035.40</b>	<b>2,840,035.40</b>	<b>2,840,035.40</b>	<b>2,740,180.70</b>	<b>21,000.70</b>	<b>20,074.88</b>	<b>2,740,180.70</b>	<b>100.0%</b>		

000 0111 620



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
DIRECCIÓN TÉCNICA  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA




Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Revisado	Monto Centralizado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia (E-C-D-E)	Anticipo		Ejercido a Flujo de Efectivo	Revoluciones Devoluciones	Ayuda de Costos Pagada	Avance (Inmanipulado) F/G
									Diorgado	Amortizado				
Tijuana	\$ 42,500,000.00	\$ 37,289,069.96	\$ 37,289,069.96	\$ 37,289,069.96	\$ 36,471,710.70	\$	\$ 817,359.26	\$	\$	\$ 37,707,216.78	\$ 642,696.56	\$ 1,305,608.08	100.0%	
Culiacán	\$ 19,050,000.00	\$ 21,311,600.19	\$ 21,311,600.19	\$ 21,311,600.19	\$ 21,219,214.66	\$	\$ 92,385.53	\$	\$	\$ 22,042,721.56	\$ 2,093,837.51	\$ 1,233,700.90	100.0%	
Querétaro	\$ 16,450,000.00	\$ 15,895,161.58	\$ 15,895,161.58	\$ 15,895,161.58	\$ 15,895,161.58	\$	\$	\$	\$	\$ 15,895,161.58	\$ 55,417.39	\$	100.0%	
Guerrero	\$ 55,000,000.00	\$ 52,371,022.07	\$ 52,371,022.07	\$ 52,371,022.07	\$ 52,371,022.07	\$	\$ 24.09	\$	\$	\$ 59,338,243.13	\$ 219,536.39	\$ 6,946,635.15	100.0%	
Puebla *	\$ 47,610,720.02	\$ 47,610,720.02	\$ 47,610,720.02	\$ 47,610,720.02	\$ 47,438,497.48	\$	\$ 172,222.54	\$	\$	\$ 48,104,341.13	\$ 842,536.09	\$ 879,449.64	100.0%	
Coahuila	\$ 50,000,000.00	\$ 52,464,579.12	\$ 52,464,579.12	\$ 52,464,579.12	\$ 52,006,424.41	\$	\$ 458,154.71	\$	\$	\$ 64,784,878.10	\$ 2,227,272.47	\$ 2,779,450.60	100.0%	
Veracruz	\$ 4,200,000.00	\$ 5,106,745.67	\$ 5,106,745.67	\$ 5,106,745.67	\$ 5,106,745.67	\$	\$ 41.88	\$	\$	\$ 5,100,700.79	\$ 53,865.16	\$	100.0%	
Quintana Roo	\$ 13,000,000.00	\$ 1,019,511.25	\$ 1,019,511.25	\$ 1,019,511.25	\$ 1,019,511.17	\$	\$ 0.08	\$	\$	\$ 1,007,379.32	\$ 64,845.20	\$ 48,485.15	100.0%	
Morelos	\$ 14,800,000.00	\$ 2,825,195.31	\$ 2,825,195.31	\$ 2,825,195.31	\$ 2,825,195.31	\$	\$	\$	\$	\$ 2,825,195.31	\$ 21,596.28	\$	100.0%	
Oaxaca	\$ 6,000,000.00	\$ 3,848,942.80	\$ 3,848,942.80	\$ 3,848,942.80	\$ 3,848,942.81	\$	\$ 0.02	\$	\$	\$ 3,848,942.81	\$ 98,667.29	\$	100.0%	
<b>TOTAL</b>	\$ 221,000,000.00	\$ 250,352,167.00	\$ 250,352,167.00	\$ 250,352,167.00	\$ 246,791,969.90	\$	\$ 1,566,197.10	\$	\$	\$ 9,979,364.63	\$ 9,674,394.63	\$ 12,550,210.61	100.0%	

\* El monto autorizado modificado incluye las revelaciones (autorización de recursos para convenios, cuyo contrato original corresponde al programa 2007)

**Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)**

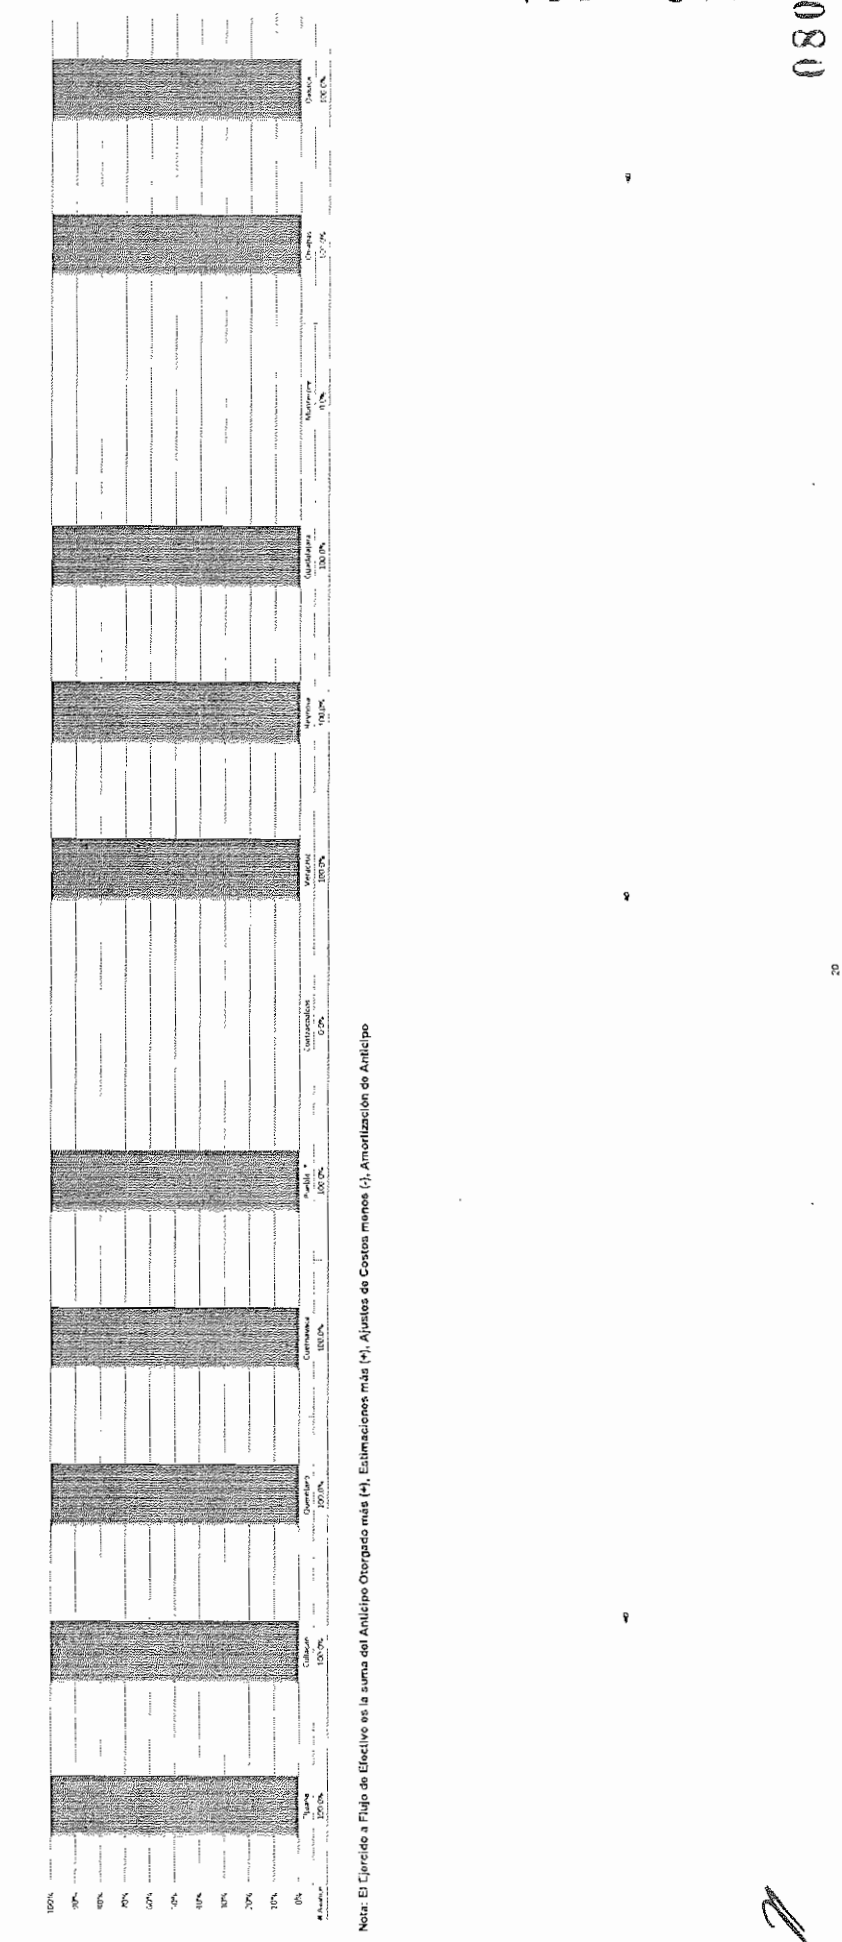

Nota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

0112  
080










PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance financiero (%)		
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo		Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 2,000,000.00	\$ 1,956,472.63	\$ 1,956,472.63	\$ 1,956,472.63	\$ 1,956,472.62	\$ 0.01		\$ 1,956,472.62	\$ 33,286.93		100.0%
Culiacán	\$ 870,000.00	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ 684,709.32	\$ 74,703.65		\$ 684,709.32	\$ 68,674.04		100.0%
Querétaro											0.0%
Cuernavaca	\$ 1,836,000.00	\$ 1,975,681.22	\$ 1,975,681.22	\$ 1,975,681.22	\$ 1,975,681.21	\$ 0.01		\$ 1,975,681.21			100.0%
Puebla *		\$ 2,462,373.72	\$ 2,462,373.72	\$ 2,462,373.72	\$ 2,462,373.72			\$ 2,462,373.72	\$ 611.23		100.0%
Coahuila de Zaragoza											0.0%
Veracruz	\$ 2,700,000.00	\$ 4,989,017.57	\$ 4,989,017.57	\$ 4,989,017.57	\$ 4,956,978.71	\$ 32,038.86		\$ 4,956,978.71	\$ 21,735.51		100.0%
Reynosa	\$ 105,000.00	\$ 564,281.70	\$ 564,281.70	\$ 564,281.70	\$ 564,281.69	\$ 0.01		\$ 564,281.69			100.0%
Guadalupe	\$ 650,000.00	\$ 189,615.66	\$ 189,615.66	\$ 189,615.66	\$ 189,615.66			\$ 189,615.66			100.0%
Monterrey											0.0%
Chiapas	\$ 768,000.00										0.0%
Oaxaca											0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 8,929,000.00</b>	<b>\$ 12,896,855.47</b>	<b>\$ 12,896,855.47</b>	<b>\$ 12,896,855.47</b>	<b>\$ 12,790,112.93</b>	<b>\$ 106,742.54</b>		<b>\$ 12,790,112.93</b>	<b>\$ 123,085.15</b>		<b>100.0%</b>

\* El monto autorizado modificado incluye las revalidaciones (autorización de recursos para convenios, cuyo contrato original corresponde al programa 2007)

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

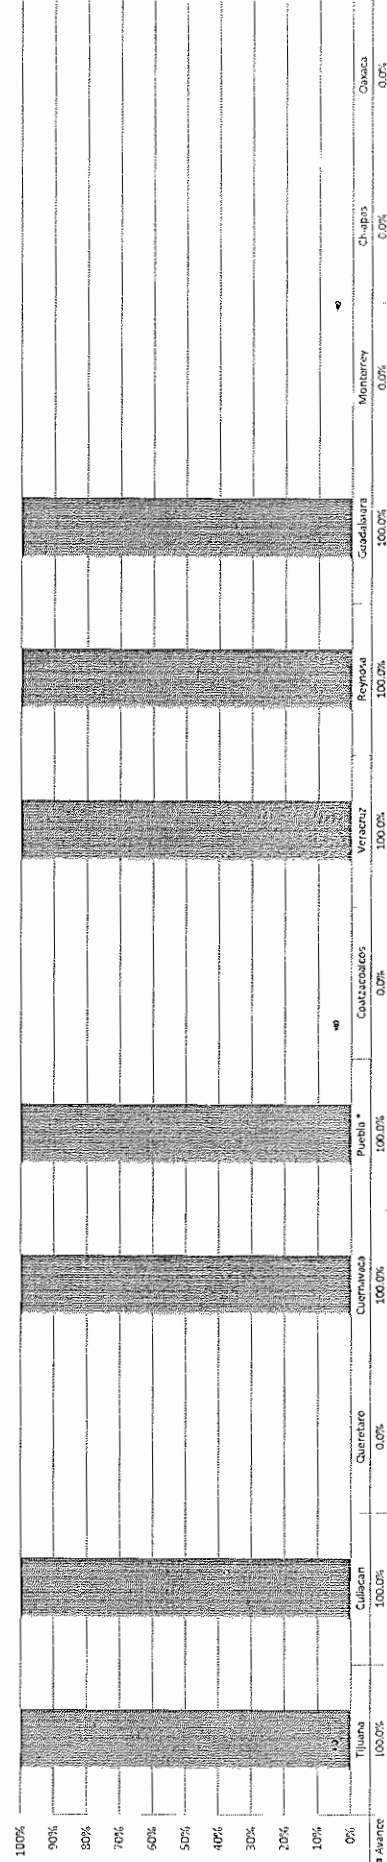

Nota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Póliza	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Programado B	Monto Cancelado C	Eliminado en Trámite D	Revoluciones Devolucionables	Bajo Cancelado E	Diferencia D-C-D+E	Avance Financiero (F)	
			Inicio	Fin											Ejercido	Plazo de Cierre
<b>TLAXIAMA</b>																
Tlaxiama, Tlaxiama																
1P/08	450010092	BOCHER INGENIERIA	07/01/2009	24/11/2009	SUPERVISION DE OBRA SUBSTITUCION DE LA SUELO DE SUPERFICIE DEL PUENTE LA MISIÓN, SUBTOTAL TLAXIAMA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>																
Mazatlan, Guadalupe																
4P/08	550003784	CONSTRUCTORA GUMBA	10/02/2009	15/09/2009	SUPERVISION DE OBRA SUBSTITUCION DE LA SUELO DE SUPERFICIE DEL PUENTE SIN NOMBRE, UBICADO EN EL KM 179+417 DEL QUERPO 76, SUBTOTAL GUADALAJARA	\$ 870,000.00	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ -	\$ 68,074.04	\$ -	\$ -	\$ 68,074.04	100.0%
<b>QUERETARO</b>																
Chamela, Queretaro																
4P/08	550003784	CONSTRUCTORA GUMBA	10/02/2009	15/09/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DE TRES ESPERDUAS (MANTENIMIENTO MAJOR) EN EL QUERPO 76, SUBTOTAL QUERETARO	\$ 870,000.00	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ 759,412.97	\$ -	\$ 68,074.04	\$ -	\$ -	\$ 68,074.04	100.0%
<b>GUERRERAO</b>																
Paritla, Paritla																
2P/08	450010092	BOCHER INGENIERIA	07/01/2009	24/11/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL GUERRERAO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>GUERRERAO</b>																
Paritla, Paritla																
4P/08	550003784	CONSTRUCTORA GUMBA	10/02/2009	15/09/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL GUERRERAO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>PUNTO DE IGUALA</b>																
2P/08	450010092	BOCHER INGENIERIA	07/01/2009	24/11/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL PUNTO DE IGUALA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>MEXICO, PUEBLA</b>																
Paritla, Paritla																
4P/08	550003784	CONSTRUCTORA GUMBA	10/02/2009	15/09/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL MEXICO, PUEBLA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>VERACRUZ</b>																
Cid. Minicoria, Córdoba																
3P/08	450010092	BOCHER INGENIERIA	07/01/2009	24/11/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL VERACRUZ	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>COAHUILA</b>																
Paritla, Paritla																
3P/08	450010092	BOCHER INGENIERIA	07/01/2009	24/11/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL COAHUILA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>																
Paritla, Paritla																
3P/08	450010092	BOCHER INGENIERIA	07/01/2009	24/11/2009	SUPERVISION DE OBRA REPARACION DEL ESTRIBO SUR Y REPARACION DE TETRA ARMADA EN EL ENTUBADO NOROCCIDENTAL DEL PUENTE QUERPO 76, SUBTOTAL GUADALAJARA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ 1,994,472.03	\$ -	\$ 33,396.03	\$ -	\$ -	\$ 1,994,472.03	100.0%




No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Anticipado Multiplicado	Monto Contratado A	Monto Programado G	Monto Estimado G	Estimado en Trámite G	Reintegraciones- Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia (P-Q)-R	Ejecución a Fines de Ejercicio	Avance Financiero (%)	
			Inicio	Fin													
Las Chiapas - Rendición Oportuna																	
371/08		Partida Cancelada			SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES EN CARRETERAS FEDERALES EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y QUINTANA ROO	507,000.00											
427/08		Partida Cancelada			SUPERVISIÓN DE OBRAS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUENTES EN CARRETERAS FEDERALES EN LOS ESTADOS DE CHIAPAS Y QUINTANA ROO	27,000.00											
					SUBTOTAL CHIAPAS	534,000.00											
					TOTAL	534,000.00	12,308,855.47	12,896,855.47	12,790,117.33	12,790,117.33		177,045.15	106,742.54			12,790,117.33	100.0%

0118

086

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal		Avance financiero (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Fljo de Efectivo	Retenciones - Dedicaciones	Ajustes de Costos Pagados		
Tijuana	\$ 4,206,415.63	\$ 5,564,803.15	\$ 5,564,803.15	\$ 5,564,803.15	\$ 5,564,496.64		\$ 306.51		\$ 5,564,496.64	\$ 14,558.47		100.0%	
Coliacoén	\$ 6,363,775.49	\$ 3,910,757.01	\$ 3,910,757.01	\$ 3,910,757.01	\$ 3,910,756.71		0.30		\$ 3,939,166.49	\$ 28,409.78		100.0%	
Querétaro	\$ 18,155,797.48	\$ 18,645,382.57	\$ 18,645,382.57	\$ 18,645,382.57	\$ 18,644,300.96		1,081.61		\$ 18,917,861.58	\$ 4,825.45		100.0%	
Guerravaca	\$ 9,006,507.95	\$ 8,753,137.57	\$ 8,753,137.57	\$ 8,753,137.57	\$ 8,753,135.32		2.25		\$ 9,347,433.90	\$ 9,759.12		100.0%	
Puebla	\$ 9,940,799.17	\$ 8,188,590.56	\$ 8,188,590.56	\$ 8,188,590.56	\$ 8,180,294.51		8,296.05		\$ 8,391,306.11	\$ 21,161.21		100.0%	
Coatzacoacoicos	\$ 12,495,698.60	\$ 12,585,452.37	\$ 12,585,452.37	\$ 12,585,452.37	\$ 12,585,449.26		3.11		\$ 12,585,449.26	\$ 27,520.74		100.0%	
Veracruz	\$ 12,639,711.00	\$ 12,983,719.66	\$ 12,983,719.66	\$ 12,983,719.66	\$ 12,977,865.76		5,853.90		\$ 12,977,865.76	\$ 223,942.79		100.0%	
Reynosa	\$ 5,758,726.87	\$ 5,975,444.58	\$ 5,975,444.58	\$ 5,975,444.58	\$ 5,975,417.59		26.99		\$ 5,975,417.59			100.0%	
Guadalajara	\$ 1,537,124.50	\$ 1,371,568.45	\$ 1,371,568.45	\$ 1,371,568.45	\$ 1,371,553.58		14.87		\$ 1,434,863.70	\$ 116,593.39		100.0%	
Monterrey	\$ 6,159,892.89	\$ 5,712,492.85	\$ 5,712,492.85	\$ 5,712,492.85	\$ 5,624,778.57		87,714.28		\$ 5,624,778.57			100.0%	
Chetapas	\$ 2,979,848.11	\$ 3,007,535.67	\$ 3,007,535.67	\$ 3,007,535.67	\$ 3,007,534.22		1.45		\$ 3,007,534.22			100.0%	
Oaxaca	\$ 6,463,600.63	\$ 6,928,604.18	\$ 6,928,604.18	\$ 6,928,604.18	\$ 5,430,203.45		1,498,400.73		\$ 5,430,203.45	\$ 188,482.13		100.0%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 95,765,288.12</b>	<b>\$ 95,627,488.62</b>	<b>\$ 95,627,488.62</b>	<b>\$ 95,627,488.62</b>	<b>\$ 92,025,786.59</b>		<b>\$ 1,601,702.03</b>		<b>\$ 93,196,377.29</b>	<b>\$ 600,760.76</b>	<b>\$ 1,170,580.70</b>	<b>100.0%</b>	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

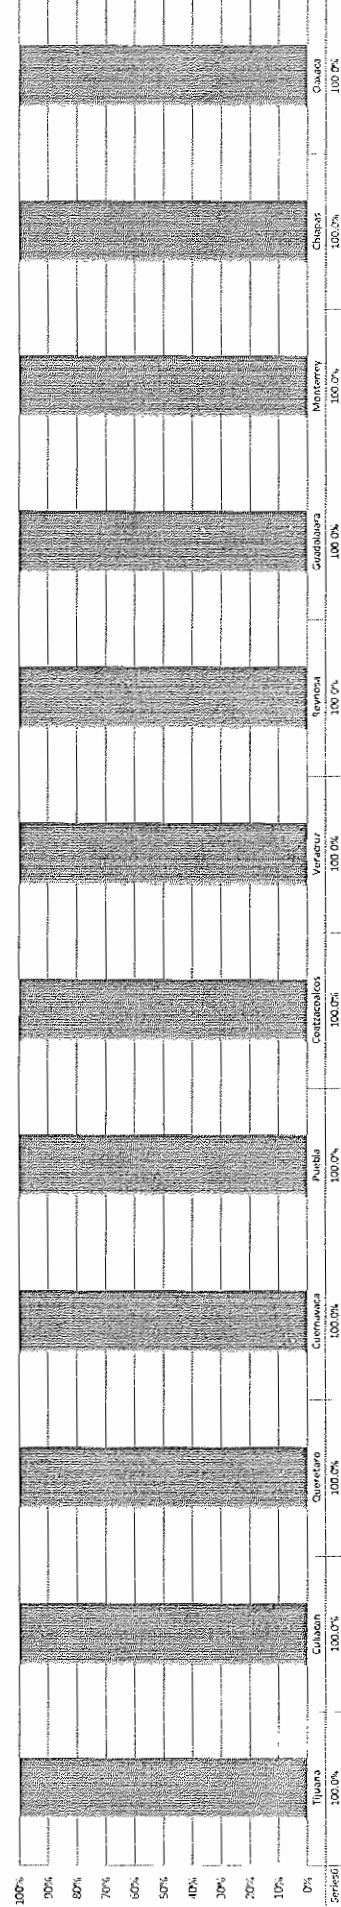

Nota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMERCIALES  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2006 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Centro de No.	Empresa	Periodo de Cuantificación		Cuentas tipo	Monto Original Autorizado	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Diferencia (P) (Q)	Cobertura de Ejecución	Avance físico (R) (%)	Avance de Costos (S) (%)
			Inicio	Fin								
<b>Guatemala - Itzamal</b>												
48001007	48001007	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	19/02/2006	19/02/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE DEL PUENTE (CENTRALIZADA)	200,000.00	400,000.00	100,000.00	-	50.00%	100.00%	N/A
48001020	48001020	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/10/2006	16/10/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	2,570,707.00	2,199,251.00	2,199,251.00	-	85.53%	100.00%	100.00%
<b>Veracruz - Tamias</b>												
48001016	48001016	INGENIERIA GENERAL INTEGRAL	16/04/2006	08/12/2006	MANTENIMIENTO VISUAL DE 216 ESTRUCTURAS TRADICIONALES LIGADAS A LAS AUTOSTRADAS CHAMPA, LUCERIA, FOTI, LINDAMAR Y TALLA, SACADO CAJONCILLO, PRIZONTO, JUPARAN Y UERUPAN - NUEVA ITALIA (33 L.P. Y 33 SUBESTACIONES (CENTRALIZADA))	1,260,000.00	1,199,000.00	1,166,300.00	20.00	92.56%	100.00%	N/A
48001017	48001017	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	08/12/2006	MANTENIMIENTO VISUAL DE 216 ESTRUCTURAS TRADICIONALES LIGADAS A LAS AUTOSTRADAS CHAMPA, LUCERIA, FOTI, LINDAMAR Y TALLA, SACADO CAJONCILLO, PRIZONTO, JUPARAN Y UERUPAN - NUEVA ITALIA (33 L.P. Y 33 SUBESTACIONES (CENTRALIZADA))	2,380,000.00	2,380,000.00	2,380,000.00	-	100.00%	100.00%	100.00%
<b>Licenciación de Obras de Mantenimiento Menor de Puentes</b>												
48001025	48001025	INGENIERIA GENERAL INTEGRAL	16/04/2006	16/04/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	400,000.00	340,000.00	340,000.00	-	85.00%	100.00%	100.00%
<b>México - Querétaro</b>												
48001027	48001027	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	01/09/2006	12/12/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	4,270,377.44	5,110,046.40	5,110,046.40	-	120.00%	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL GUATEMALA</b>						<b>18,545,270.44</b>	<b>18,545,270.44</b>	<b>18,545,270.44</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>México - Coahuila</b>												
48001029	48001029	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	19/02/2006	19/02/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE EN LOS PUENTES (CENTRALIZADA)	200,000.00	112,000.00	112,000.00	-	56.00%	100.00%	N/A
48001030	48001030	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	19/02/2006	19/02/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	840,000.00	887,000.00	887,000.00	47,000.00	105.60%	100.00%	100.00%
<b>Licenciación de Obras de Mantenimiento Menor de Puentes</b>												
48001032	48001032	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE EN LOS PUENTES (CENTRALIZADA)	600,000.00	240,000.00	240,000.00	-	40.00%	100.00%	N/A
48001033	48001033	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	440,000.00	410,000.00	410,000.00	-	93.18%	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL COAHUILA</b>						<b>1,880,000.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>-</b>	<b>83.51%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Guatemala - Atitlan</b>												
48001035	48001035	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE EN LOS PUENTES (CENTRALIZADA)	1,900,000.00	900,000.00	900,000.00	-	47.37%	100.00%	N/A
48001036	48001036	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	2,274,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	1,016,000.00	144.67%	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL ATITLAN</b>						<b>4,174,000.00</b>	<b>4,190,000.00</b>	<b>4,190,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>100.38%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>México - Tlaxcala</b>												
48001037	48001037	INGENIERIA GENERAL INTEGRAL	16/04/2006	16/04/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE EN LOS PUENTES (CENTRALIZADA)	1,500,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	80.00%	100.00%	N/A
48001038	48001038	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	2,274,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	1,016,000.00	144.67%	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL TLAXCALA</b>						<b>3,774,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>119.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Puerto Rico - San Juan</b>												
48001039	48001039	INGENIERIA GENERAL INTEGRAL	16/04/2006	16/04/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE EN LOS PUENTES (CENTRALIZADA)	600,000.00	240,000.00	240,000.00	-	40.00%	100.00%	N/A
48001040	48001040	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	2,274,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	1,016,000.00	144.67%	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL PUERTO RICO</b>						<b>2,874,000.00</b>	<b>3,530,000.00</b>	<b>3,530,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>123.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>Zacatecas - Espinazo Vago</b>												
48001041	48001041	INGENIERIA GENERAL INTEGRAL	16/04/2006	16/04/2006	REPARACION EN ESTRUCTURAS DE TIPO SUPLENTE EN LOS PUENTES (CENTRALIZADA)	1,500,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	-	80.00%	100.00%	N/A
48001042	48001042	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y PROYECTOS	16/04/2006	16/04/2006	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN ESTRUCTURAS	2,274,000.00	3,290,000.00	3,290,000.00	1,016,000.00	144.67%	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL ZACATECAS</b>						<b>3,774,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>119.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL GUATEMALA</b>						<b>18,545,270.44</b>	<b>18,545,270.44</b>	<b>18,545,270.44</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL COAHUILA</b>						<b>1,880,000.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>1,570,000.00</b>	<b>-</b>	<b>83.51%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL ATITLAN</b>						<b>4,174,000.00</b>	<b>4,190,000.00</b>	<b>4,190,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>100.38%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL TLAXCALA</b>						<b>3,774,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>119.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL PUERTO RICO</b>						<b>2,874,000.00</b>	<b>3,530,000.00</b>	<b>3,530,000.00</b>	<b>660,000.00</b>	<b>123.17%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL ZACATECAS</b>						<b>3,774,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>4,490,000.00</b>	<b>716,000.00</b>	<b>119.24%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUBTOTAL TOTAL</b>						<b>37,937,740.44</b>	<b>37,937,740.44</b>	<b>37,937,740.44</b>	<b>-</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

No. Proyecto	Contrato No.	Empresa	Periodo de Ejecucion		Comercio	Monto Original Autorizado	Monto Subastado	Monto Comprobado	Monto Pagaado	Monto Ejecutado	Estimados Trámites	Obras de Obra Civil	Ejecución de Obra Civil	Avance Realizado (%)	Avance Programado
			Inicio	Fin											

**PIEHLA**

**Municipio - Pinar del Rio**

400001037	400001037	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE 100 PUEBLOS UNIDOS (RECONSTRUCCION)	500.000.00	371.902.22	371.902.22	371.902.22	371.902.22	-	-	74.38%	74.38%
400001038	400001038	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.187.481.85	2.204.503.59	2.204.503.59	2.204.503.59	2.204.503.59	0.00	0.00	185.72%	185.72%
400001039	400001039	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION VISUAL DE 302 ESTACIONES DE SERVICIO EN LAS CARRETERAS FEDERALES DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.200.000.00	1.940.150.20	1.940.150.20	1.940.150.20	1.940.150.20	-	-	161.67%	161.67%
400001040	400001040	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	2.297.972.74	2.297.972.74	2.297.972.74	2.297.972.74	2.297.972.74	-	-	100.00%	100.00%
400001041	400001041	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	2.024.899.11	2.024.899.11	2.024.899.11	2.024.899.11	2.024.899.11	-	-	100.00%	100.00%
400001042	400001042	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	3.245.293.17	3.245.293.17	3.245.293.17	3.245.293.17	3.245.293.17	-	-	100.00%	100.00%

**COATZACOALCOS**

**Municipio - Zetisal**

400001037	400001037	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE 100 PUEBLOS UNIDOS (RECONSTRUCCION)	200.000.00	419.775.49	419.775.49	419.775.49	419.775.49	-	-	209.89%	209.89%
400001038	400001038	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.548.027.48	1.744.852.75	1.744.852.75	1.744.852.75	1.744.852.75	0.00	0.00	112.71%	112.71%
400001039	400001039	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION VISUAL DE 302 ESTACIONES DE SERVICIO EN LAS CARRETERAS FEDERALES DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	700.000.00	919.214.13	919.214.13	919.214.13	919.214.13	-	-	130.03%	130.03%
400001040	400001040	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.641.114.01	1.720.308.00	1.720.308.00	1.720.308.00	1.720.308.00	0.00	0.00	104.83%	104.83%
400001041	400001041	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION VISUAL DE 302 ESTACIONES DE SERVICIO EN LAS CARRETERAS FEDERALES DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.310.000.00	1.597.215.56	1.597.215.56	1.597.215.56	1.597.215.56	-	-	121.93%	121.93%
400001042	400001042	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.415.000.00	1.633.844.21	1.633.844.21	1.633.844.21	1.633.844.21	-	-	115.46%	115.46%
400001043	400001043	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION VISUAL DE 302 ESTACIONES DE SERVICIO EN LAS CARRETERAS FEDERALES DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	946.012.00	946.012.00	946.012.00	946.012.00	946.012.00	-	-	100.00%	100.00%
400001044	400001044	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.392.250.00	1.349.444.56	1.349.444.56	1.349.444.56	1.349.444.56	-	-	96.92%	96.92%
400001045	400001045	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	2.544.000.24	1.204.611.65	1.204.611.65	1.204.611.65	1.204.611.65	-	-	47.35%	47.35%
400001046	400001046	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.759.542.94	1.754.204.51	1.754.204.51	1.754.204.51	1.754.204.51	-	-	99.75%	99.75%
400001047	400001047	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	12.824.845.48	12.824.845.48	12.824.845.48	12.824.845.48	12.824.845.48	-	-	100.00%	100.00%

**Camaguey - Camaguey**

400001037	400001037	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION DE PUENTES DE 100 PUEBLOS UNIDOS (RECONSTRUCCION)	500.000.00	371.902.22	371.902.22	371.902.22	371.902.22	-	-	74.38%	74.38%
400001038	400001038	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.187.481.85	2.204.503.59	2.204.503.59	2.204.503.59	2.204.503.59	0.00	0.00	185.72%	185.72%
400001039	400001039	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	RECONSTRUCCION VISUAL DE 302 ESTACIONES DE SERVICIO EN LAS CARRETERAS FEDERALES DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	1.200.000.00	1.940.150.20	1.940.150.20	1.940.150.20	1.940.150.20	-	-	161.67%	161.67%
400001040	400001040	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	2.297.972.74	2.297.972.74	2.297.972.74	2.297.972.74	2.297.972.74	-	-	100.00%	100.00%
400001041	400001041	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	2.024.899.11	2.024.899.11	2.024.899.11	2.024.899.11	2.024.899.11	-	-	100.00%	100.00%
400001042	400001042	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES	19/03/2008	19/03/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MEJOR EN OBRAS CIVILES	3.245.293.17	3.245.293.17	3.245.293.17	3.245.293.17	3.245.293.17	-	-	100.00%	100.00%



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2000 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puntaje	Control de No. Contrato	Empresa	Periodo de Contrato (Inicio-Fin)	Concepto	Monto Original Adjudicado	Monto Contratado A	Monto Pagar hasta B	Monto Estimado C	Estimado en Trámite D	Prorrateo - Devoluciones	Saldo a favor de E	Diferencia P-C-D-E	Estado e Impacto Ejecucion	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
<b>Guatemala - Maracuz</b>															
384943	44001887 (P)	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 18/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	2,602,700.76 \$	2,602,700.76 \$	2,602,700.76 \$	2,602,700.47 \$	2,602,700.47 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,602,700.47 \$	100.0%	100.0%
371840	44001887 (P)	CONSTRUCCION Y MONTAJE DE PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 18/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	4,760,807.70 \$	5,375,213.31 \$	5,375,213.31 \$	5,375,213.31 \$	5,375,213.31 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	5,375,213.31 \$	100.0%	100.0%
<b>Guatemala - Tzucucul</b>															
330938	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 26/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,125,462.02 \$	1,125,462.02 \$	1,125,462.02 \$	1,125,462.02 \$	1,125,462.02 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,125,462.02 \$	100.0%	100.0%
<b>Libramiento Puentes - Tzucucul</b>															
334951	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 26/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	470,493.33 \$	677,209.79 \$	677,209.79 \$	677,209.79 \$	677,209.79 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	677,209.79 \$	100.0%	100.0%
<b>RENTGSA</b>															
<b>Removal - Malabar</b>															
13413493	44001887 (P)	CONTRATO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	18/02/2009 - 18/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,000,000.00 \$	505,000.00 \$	505,000.00 \$	505,000.00 \$	505,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	505,000.00 \$	100.0%	N.A.
334953	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 26/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,802,852.20 \$	1,802,852.20 \$	1,802,852.20 \$	1,802,852.20 \$	1,802,852.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,802,852.20 \$	100.0%	100.0%
<b>Puentes Interseccion - Guatemala - Pinar</b>															
334954	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 26/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	230,000.00 \$	666,802.20 \$	666,802.20 \$	666,802.20 \$	666,802.20 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	666,802.20 \$	100.0%	N.A.
334955	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 26/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,074,701.21 \$	1,074,701.21 \$	1,074,701.21 \$	1,074,701.21 \$	1,074,701.21 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,074,701.21 \$	100.0%	100.0%
<b>Puentes Interseccion - Espacio Urbano</b>															
14401408	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	18/02/2009 - 18/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	250,000.00 \$	400,120.36 \$	400,120.36 \$	400,120.36 \$	400,120.36 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	400,120.36 \$	100.0%	N.A.
334958	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	26/02/2009 - 26/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	610,178.40 \$	820,510.70 \$	820,510.70 \$	820,510.70 \$	820,510.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	820,510.70 \$	100.0%	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>															
<b>Guadalupe - Tzuc</b>															
334959	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	01/02/2009 - 01/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,371,124.50 \$	100.0%	100.0%
<b>MONTERREY</b>															
<b>Monterrey - Tzuc</b>															
334960	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	01/02/2009 - 01/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	1,371,124.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,371,124.50 \$	100.0%	100.0%
<b>Monterrey - Nuevo Leon</b>															
334961	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	01/02/2009 - 01/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,300,114.27 \$	1,300,114.27 \$	1,300,114.27 \$	1,300,114.27 \$	1,300,114.27 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,300,114.27 \$	100.0%	100.0%
<b>Saltillo - Tzuc</b>															
334962	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	01/02/2009 - 01/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	750,000.00 \$	750,000.00 \$	750,000.00 \$	750,000.00 \$	750,000.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	750,000.00 \$	100.0%	100.0%
<b>Saltillo - Coahuila</b>															
441840	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	01/02/2009 - 01/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	421,100.00 \$	367,710.70 \$	367,710.70 \$	367,710.70 \$	367,710.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	367,710.70 \$	100.0%	100.0%
<b>Coahuila - Tzuc</b>															
441841	44001887 (P)	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	01/02/2009 - 01/02/2009	TRABAJO DE MANTENIMIENTO MENOR EN PUENTES DE CEMENTO Y ACERO	1,440,201.70 \$	1,396,217.62 \$	1,396,217.62 \$	1,396,217.62 \$	1,396,217.62 \$	0.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	1,396,217.62 \$	100.0%	100.0%


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Periodo	Contrato No	Empresa	Fecha del Contrato Inicio	Fecha del Contrato Fin	Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Acreditado Realizado	Monto Cuatrimestral	Monto Pagar en el B	Monto Ejecutado C	Estrados y Trámites D	Recepciones y Devoluciones	Saldo Cancelado E	Obreros y O.C.D.E	Cantidad de Materiales Utilizados	Avance de Inversión (%)	Avance de Obras (%)	
																		Avance de Inversión (%)
<b>Puerto Mexico - Campeche</b>																		
4334-08	430018034	COMERCIALIZADORA Y AGENCIAS S.A.P. DE CV	01/07/2008	28/05/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 11 ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 377,951.24	\$ 408,199.41	\$ 408,199.41	\$ 408,199.41	\$ 407,187.27			\$ 407,187.27		\$ 407,360.22	106.7%	100.0%	
<b>CHIMIAS</b>																		
<b>Lin Chihuahua-Rauiliana-Ojinacabana</b>																		
4334-08	430018034	COMERCIALIZADORA Y AGENCIAS S.A.P. DE CV	02/05/2008	02/05/2008	INSPECCION EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN CINCO PUENTES (RETRALZADA)	\$ 2,200,000.00	\$ 1,172,462.87	\$ 1,172,462.87	\$ 1,172,462.87	\$ 1,172,462.87			\$ 1,172,462.87		\$ 1,172,462.87	100.0%	N.A.	
4334-08	430018034	COMERCIALIZADORA Y AGENCIAS S.A.P. DE CV	11/05/2008	20/05/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 100 ESTACIONES DE SERVICIO	\$ 1,720,848.11	\$ 335,952.89	\$ 335,952.89	\$ 335,952.89	\$ 335,952.89			\$ 335,952.89		\$ 335,952.89	50.0%	100.0%	
<b>OMAJA</b>																		
<b>Gr. Cuernavaca - Orizaba</b>																		
4334-08	430018034	LUPD LTUROS	25/02/2008	02/09/2008	INSPECCION DE ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN NUEVE PUENTES (RETRALZADA)	\$ 2,200,000.00	\$ 2,107,749.09	\$ 2,107,749.09	\$ 2,107,749.09	\$ 2,107,749.09			\$ 2,107,749.09		\$ 2,107,749.09	100.0%	N.A.	
4334-08	430018034	COMERCIALIZADORA Y AGENCIAS S.A.P. DE CV	19/02/2008	31/12/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 100 ESTACIONES DE SERVICIO (RETRALZADA)	\$ 1,720,848.11	\$ 1,426,599.24	\$ 1,426,599.24	\$ 1,426,599.24	\$ 1,390,264.14		\$ 5,764.80	\$ 1,390,264.14		\$ 1,390,264.14	100.0%	N.A.	
4334-08	430018034	COMERCIALIZADORA Y AGENCIAS S.A.P. DE CV	29/02/2008	31/12/2008	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 142 ESTACIONES DE SERVICIO (RETRALZADA)	\$ 2,200,000.00	\$ 3,322,265.05	\$ 3,322,265.05	\$ 3,322,265.05	\$ 1,991,899.22		\$ 1,627,173.00	\$ 1,420,365.43		\$ 1,991,899.22	100.0%	100.0%	
<b>SUBTOTAL CHIMIAS</b>																		
						\$ 6,443,846.11	\$ 3,872,332.62	\$ 3,872,332.62	\$ 3,872,332.62	\$ 3,872,332.62			\$ 3,872,332.62		\$ 3,872,332.62	100.0%	100.0%	
<b>TOTAL</b>																		
						\$ 9,780,282.17	\$ 9,877,468.52	\$ 9,877,468.52	\$ 9,877,468.52	\$ 9,877,468.52	\$ 9,877,468.52			\$ 9,877,468.52		\$ 9,877,468.52	100.0%	100.0%

*[Handwritten signature]*

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Estimado en Trámite	Saldo Cancelado	Diferencia B - C - D - E		Ejercido a Flujo de Efectivo	Retención - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados
Tijuana												0.0%
Culliacán												0.0%
Querétaro												0.0%
Cuernavaca												0.0%
Puebla												0.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 274,953.32	\$ 274,953.32	\$ 274,953.32	\$ 274,953.32	\$ 274,953.31		\$ 0.01	\$ 0.00	\$ 274,953.31			100.0%
Veracruz												0.0%
Reynosa	\$ 748,821.85	\$ 748,821.85	\$ 748,821.85	\$ 748,821.85	\$ 689,253.12		\$ 59,568.73	\$ 0.00	\$ 689,253.12			100.0%
Guadalajara												0.0%
Monterrey												0.0%
Chapas												0.0%
Oaxaca												0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,023,775.17</b>	<b>\$ 1,023,775.17</b>	<b>\$ 1,023,775.17</b>	<b>\$ 1,023,775.17</b>	<b>\$ 964,206.43</b>		<b>\$ 59,568.74</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 964,206.43</b>			<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

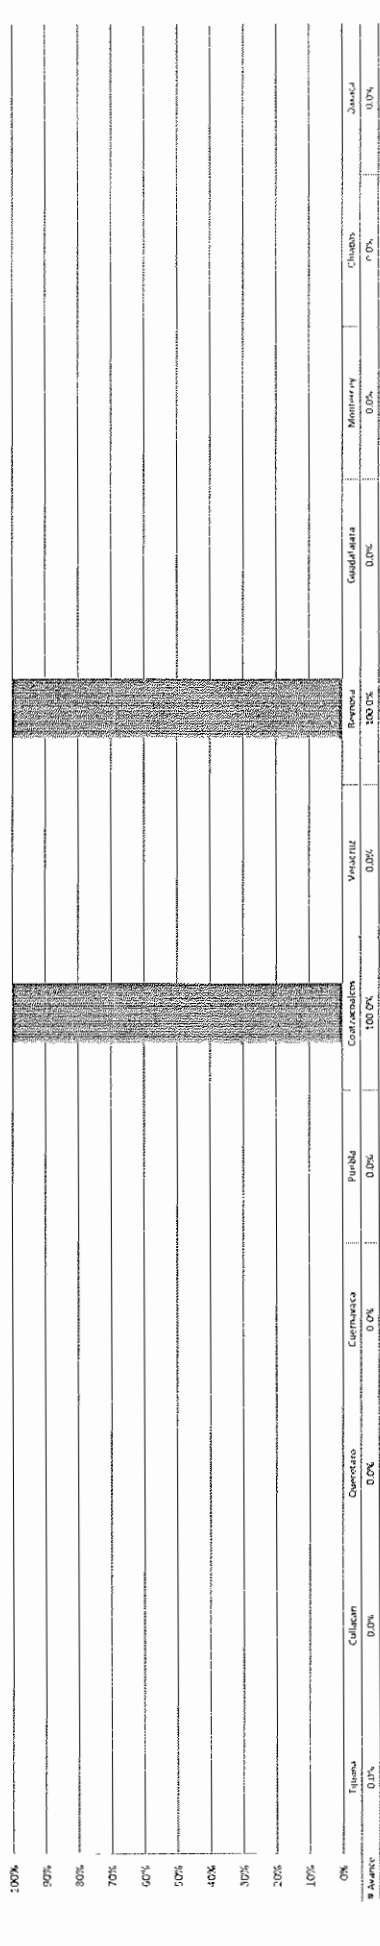

Nota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2008

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Estimado C	Eliminado en Trámite E	Relaciones- Devoluciones	Saldo Cancelado D	Diferencia B+C-E	Ejercido a Flajo de Ejercicio	Avance Financiero (%)
			Inicio	Fin										
<b>COAHUILCO</b>														
<b>Puerto Zacatal</b>														
27MP/08	450001014 550003223	ÓVALO CONSTRUCCIONES	01/04/2008	20/09/2008	SUPERVISIÓN DE OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA INFRAESTRUCTURA	\$ 274,933.32	\$ 274,933.32	\$ 274,933.31			\$ 0.01	\$ -	\$ 274,933.31	100.0%
					<b>SUBTOTAL COAHUILCO</b>	\$ 274,933.32	\$ 274,933.32	\$ 274,933.31			\$ 0.01	\$ -	\$ 274,933.31	100.0%
<b>REYNOSA</b>														
<b>Puerto Internacional Reynosa- Pharr</b>														
34MP/08	450000975	JORGE OMAR VERA ALANIS	29/02/2008	16/03/2009	SUPERVISIÓN DE LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA INFRAESTRUCTURA	\$ 359,237.12		\$ 359,237.12			\$ 20,355.30	\$ -	\$ 339,207.12	100.0%
<b>Puerto Internacional Ignacio Zaragoza</b>														
35MP/08	4500009747	JORGE OMAR VERA ALANIS	26/02/2009	1/02/2009	SUPERVISIÓN DE LA OBRA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN LA INFRAESTRUCTURA	\$ 249,506.00		\$ 249,506.00			\$ 30,213.43	\$ -	\$ 349,956.00	100.0%
					<b>SUBTOTAL REYNOSA</b>	\$ 749,871.85	\$ 749,871.85	\$ 699,293.12			\$ 59,859.73	\$ -	\$ 699,293.12	100.0%
					<b>TOTAL</b>	\$ 1,023,775.17	\$ 1,023,775.17	\$ 964,206.43			\$ 59,859.74	\$ -	\$ 944,291.43	100.0%

000 0126


094

2

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)		
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo		Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 750,000.00	\$ 931,273.87	\$ 931,273.87	\$ 931,273.87	\$ 931,273.87				\$ 931,273.87			100.0%
Culiacán	\$ 17,806,580.00	\$ 15,802,233.72	\$ 15,802,233.72	\$ 15,802,233.72	\$ 15,802,233.64		\$ 0.08		\$ 15,802,773.76		\$ 100,540.12	100.0%
Querétaro	\$ 1,850,000.00	\$ 1,972,377.21	\$ 1,972,377.21	\$ 1,972,377.21	\$ 1,972,377.21				\$ 1,972,377.21			100.0%
Cuernavaca	\$ 12,955,000.00	\$ 12,258,163.59	\$ 12,258,163.59	\$ 12,258,163.59	\$ 12,242,956.19		\$ 15,607.40		\$ 12,242,956.19	\$ 13,607.21		100.0%
Puebla	\$ 14,500,000.00	\$ 11,327,023.14	\$ 11,327,023.14	\$ 11,327,023.14	\$ 11,320,426.49		\$ 6,596.65		\$ 11,800,311.40	\$ 73,269.85	\$ 479,884.91	100.0%
Coahuila	\$ 13,300,000.00	\$ 11,415,942.93	\$ 11,415,942.93	\$ 11,415,942.93	\$ 7,218,199.88		\$ 4,197,743.05		\$ 7,218,199.88	\$ 399,592.45		100.0%
Veracruz	\$ 7,850,000.00	\$ 5,432,234.80	\$ 5,432,234.80	\$ 5,432,234.80	\$ 5,381,649.45		\$ 50,585.35		\$ 5,439,335.21	\$ 77,894.75		100.0%
Reynosa	\$ 2,145,000.00	\$ 2,184,450.18	\$ 2,184,450.18	\$ 2,184,450.18	\$ 2,184,443.52		\$ 6.66		\$ 2,184,443.52	\$ 39,737.36		100.0%
Guadaluajara												0.0%
Monterrey	\$ 850,000.00	\$ 850,973.88	\$ 850,973.88	\$ 850,973.88	\$ 850,973.88				\$ 850,973.88			100.0%
Chiapas	\$ 250,000.00	\$ 240,681.53	\$ 240,681.53	\$ 240,681.53	\$ 240,681.53				\$ 240,681.53			100.0%
Oaxaca	\$ 250,000.00	\$ 249,389.70	\$ 249,389.70	\$ 249,389.70	\$ 249,389.70				\$ 249,389.70			100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 71,907,580.00</b>	<b>\$ 62,664,744.55</b>	<b>\$ 62,664,744.55</b>	<b>\$ 62,664,744.55</b>	<b>\$ 58,394,205.36</b>		<b>\$ 4,270,539.19</b>		<b>\$ 59,032,316.15</b>	<b>\$ 604,092.62</b>	<b>\$ 638,110.79</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

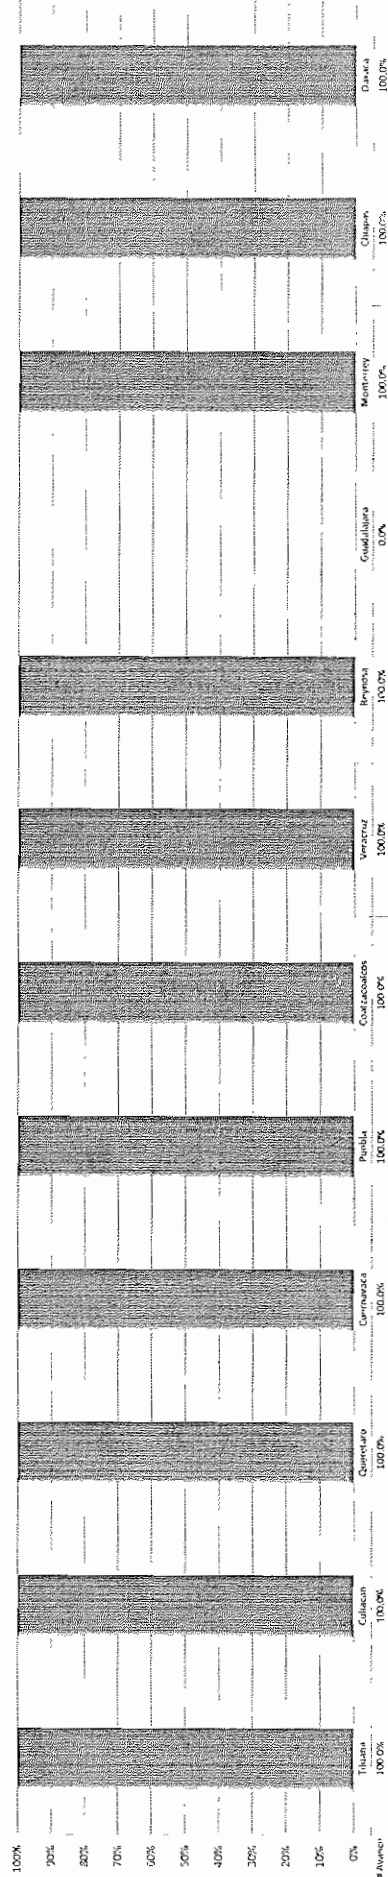

Nº12: El Ejercicio a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA  
PROGRAMA DE MODERNIZACION 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Código de Proyecto	Empresa	Período de Ejecución		Compendio	Monto Contratado (Miles de Pesos)	Monto Adjudicado (Miles de Pesos)	Monto Contratado (Miles de Pesos)	Monto Pagar (Miles de Pesos)	Monto Estimado (Miles de Pesos)	Estimado a Trámite (Miles de Pesos)	Definición de Demanda (Miles de Pesos)	Sólo Cuantificado	MTC-CAS	Ejército y Fomento (Miles de Pesos)	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
			Inicio	Fin													
<b>TIJUANA - Fronteras</b>																	
1	440010023	SAC Y ASOCIADOS	01/04/2008	01/04/2008	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION DE SERVIDOR CONEXOS EN CUERPO N.º 13 DE LA PLAZA DE COBRO No. 12 EL PASO (REINTEGRACION)	690,000.00	577,507.41	577,507.41	577,507.41	577,507.41	577,507.41	0	0	0	100.0%	100.0%	N.A.
<b>L.á. Rumorena - Terrete</b>																	
2	440010485	SAC Y ASOCIADOS	23/04/2008	29/04/2008	ESTUDIO Y PROYECTO PARA MODIFICAR LA DASA DE DIFUSION DE LA REINTEGRACION DE COBRO No. 12 EL PASO (REINTEGRACION)	150,000.00	354,220.49	354,220.49	354,220.49	354,220.49	354,220.49	0	0	0	100.0%	100.0%	N.A.
<b>CHIHUAHUA</b>																	
<b>Estación Dora - Magallanes</b>																	
3	440010077	ARVIZO SUPERVISION Y CONSTRUCCION	01/04/2008	21/07/2008	DISTRIBUCION DE LOGOS EN LAS PLAZAS DE COBRO EN LAS PLAZAS DE COBRO No. 12 EL PASO (REINTEGRACION)	5,201,000.00	5,811,628.96	5,811,628.96	5,811,628.96	5,811,628.96	5,811,628.96	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
4	440010072	INGENIERIA MANTECARRA Y TRAMITACION VALBUENA	12/04/2008	08/09/2008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE ESTACION CON JERONIMO CARRANZA Y GUAYMALI ESTADO DE SONORA	4,819,000.00	4,998,091.00	4,998,091.00	4,998,091.00	4,998,091.00	4,998,091.00	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
5	440010082	CONSTRUYERAS SUPERVISION Y CONSTRUCCION	01/04/2008	21/07/2008	SUBSTITUCION DE LOGOS EN LAS PLAZAS DE COBRO No. 152 THERMOSELLO Y No. 153 MAGDALINA ESTADO DE SONORA	9,425,000.00	4,652,304.73	4,652,304.73	4,652,304.73	4,652,304.73	4,652,304.73	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
5	440010073	INGENIERIA MANTECARRA Y TRAMITACION VALBUENA	12/04/2008	08/09/2008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS PLAZAS DE COBRO No. 152 THERMOSELLO ESTADO DE SONORA	1,250,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00	1,227,000.00	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
<b>QUERETARO</b>																	
<b>Pedernales - Uruapan</b>																	
7	440010033	CAVI AGUINERA	19/04/2008	15/04/2008	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION DE LA PLAZA DE COBRO DE ZARAGOZA No. 17-100 (REINTEGRACION)	850,000.00	821,379.39	821,379.39	821,379.39	821,379.39	821,379.39	0	0	0	100.0%	100.0%	N.A.
<b>Camelero - Tijuana</b>																	
9	440010442	CONSTRUYERAS 2000	01/04/2008	10/06/2008	SUBSTITUCION DE LOGOS EN COBRO No. 14 CALAMANCIA	1,000,000.00	1,361,000.00	1,361,000.00	1,361,000.00	1,361,000.00	1,361,000.00	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
<b>GUERRERAO</b>																	
<b>Veritas Troncos</b>																	
2	440010020	MTC CONSTRUCCIONES	10/04/2008	28/07/2008	SUBSTITUCION DE LOGOS DE CONCRETO HORILLADO APLICADOS EN ZONA DE CARRILES DE LA PLAZA DE COBRO No. 1 TULIPAN TRONCO No. 100 PASO MORELOS No. 100 PASO BLANCO Y LA No. 100 LA VENTA TRAMO CUELLANCA	8,000,000.00	3,757,007.31	3,757,007.31	3,757,007.31	3,757,007.31	3,757,007.31	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
10	440010018	LAINORIOS Y ASOCIADA EN CONSTRUCCION Y ASOCIADA EN CONSTRUCCION Y ASOCIADA EN CONSTRUCCION	02/04/2008	28/07/2008	TRAMO PUEBLO DE INTA - IGUALA PLAZA DE COBRO No. 50 LOS TAJOS TRAMO BANDO VIEJO - TAJOS	9,400,000.00	8,554,000.00	8,554,000.00	8,554,000.00	8,554,000.00	8,554,000.00	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
<b>Coahuila de Zaragoza</b>																	
<b>Comitane - Acapulco</b>																	
11	440010028	GRUPO CONSTRUCTORA	02/04/2008	31/07/2008	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTACION PARA REINTEGRAR EL PASO DE VEHICULOS EN LA PLAZA DE COBRO ACAPULCO QUE REPO	150,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	146,000.00	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
<b>PUEBLA</b>																	
<b>Mexico - Puebla</b>																	
12	440010005	INGE INE SA J CUTIVA BULLO	01/04/2008	30/05/2008	SUBSTITUCION DE LOGOS EN COBRO No. 10 HERALDO ANILADOS EN ZONA DE CARRILES DE LA PLAZA DE COBRO No. 71 CHALCO MAGDOLENA No. 30000 No. 10 SAN MARTIN No. 100	6,000,000.00	7,844,410.04	7,844,410.04	7,844,410.04	7,844,410.04	7,844,410.04	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%
<b>Puebla - Atlixco</b>																	
13	440010006	SOCIUMAT CATEDRALIS DE PUEBLA	01/04/2008	31/07/2008	SUBSTITUCION DE LOGOS EN COBRO No. 10 HERALDO ANILADOS EN ZONA DE CARRILES DE LA PLAZA DE COBRO No. 20 AMOZOC No. 100	3,100,000.00	2,370,307.20	2,370,307.20	2,370,307.20	2,370,307.20	2,370,307.20	0	0	0	100.0%	100.0%	100.0%

Handwritten signature or mark.






PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E		Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados
Tijuana												0.0%
Culiacán	\$ 1,068,394.80	\$ 912,414.05	\$ 912,414.05	\$ 912,414.05	\$ 912,414.05				\$ 912,414.05			100.0%
Querétaro	\$ 60,000.00	\$ 147,826.88	\$ 147,826.88	\$ 147,826.88	\$ 147,826.88				\$ 147,826.88			100.0%
Cuernavaca	\$ 744,300.00	\$ 741,833.85	\$ 741,833.85	\$ 741,833.85	\$ 741,833.85				\$ 741,833.85			100.0%
Puebla	\$ 870,000.00	\$ 943,992.06	\$ 943,992.06	\$ 943,992.06	\$ 943,992.06				\$ 943,992.06			100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 780,000.00	\$ 1,731,433.99	\$ 1,731,433.99	\$ 1,731,433.99	\$ 1,731,433.99				\$ 1,731,433.99	\$ 52,450.03		100.0%
Veracruz	\$ 433,000.00											0.0%
Reynosa	\$ 117,000.00	\$ 423,419.49	\$ 423,419.49	\$ 423,419.49	\$ 415,051.42		\$ 8,368.07		\$ 415,051.42	\$ 750.10		100.0%
Guadalupe												0.0%
Monterrey												0.0%
Chiapas												0.0%
Oaxaca												0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,072,694.80</b>	<b>\$ 4,900,920.32</b>	<b>\$ 4,900,920.32</b>	<b>\$ 4,900,920.32</b>	<b>\$ 4,892,552.25</b>		<b>\$ 8,368.07</b>		<b>\$ 4,892,552.25</b>	<b>\$ 53,180.13</b>		<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

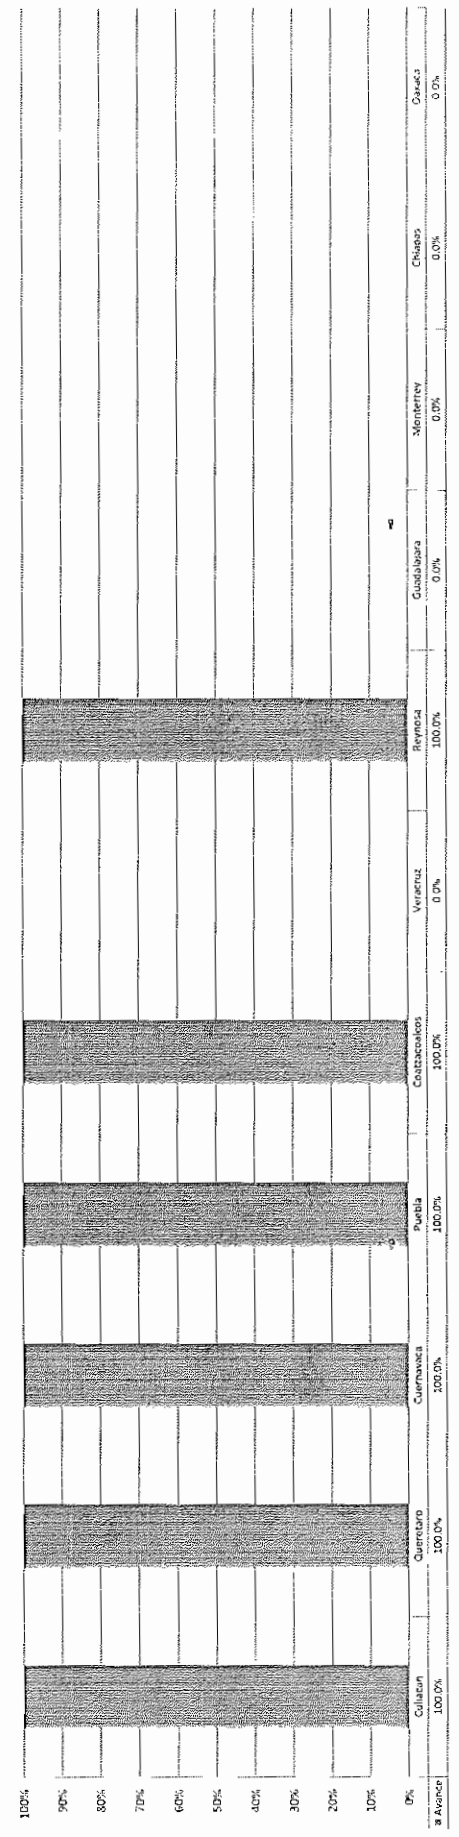

N-ota: El Ejercido a Flujo de Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Contrato No. Póliza	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Estimado C	Estimado en Trámite D	Revoluciones-Dimenciones	Saldo Cancelado C	Diferencia (B+C-D)	Avance Financiero (%)	Fecha de corte: 30 de Septiembre del 2012
<b>GUILAVALI</b>														
<b>Estación Don. Naranja</b>														
3	460810015	HOCHER INGENIERIA	0104/2008	14/07/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN LAS PLAZAS DE COBRO, ESTACION DON. FUNDICION ESPERANZA Y GUAYMAS, ESTADO DE SONORA	310,200.00 \$	108,207.54 \$	108,207.54 \$	108,207.54 \$	108,207.54 \$	108,207.54 \$	0 \$	100.0%	108,207.54
4	460810206	PRODUCTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL	1205/2008	23/09/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS PLAZAS DE COBRO, ESTACION DON. ESPERANZA Y GUAYMAS, ESTADO DE SONORA	294,000.00 \$	290,019.27 \$	290,019.27 \$	290,019.27 \$	290,019.27 \$	290,019.27 \$	0 \$	100.0%	290,019.27
5	460810182	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL	01/04/2008	14/07/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN LAS PLAZAS DE COBRO, ESTACION THERMOBILO Y No. 102 "MADALENA", ESTADO DE SONORA	305,500.00 \$	351,099.10 \$	351,099.10 \$	351,099.10 \$	351,099.10 \$	351,099.10 \$	0 \$	100.0%	351,099.10
6	460810205	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANEL	12/05/2008	23/09/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS PLAZAS DE COBRO, No. 102 "THERMOBILO", ESTADO DE SONORA	75,000.00 \$	73,008.17 \$	73,008.17 \$	73,008.17 \$	73,008.17 \$	73,008.17 \$	0 \$	100.0%	73,008.17
<b>SUBTOTAL GUILAVALI</b>					<b>1,059,700.00 \$</b>	<b>972,414.65 \$</b>	<b>972,414.65 \$</b>	<b>972,414.65 \$</b>	<b>972,414.65 \$</b>	<b>972,414.65 \$</b>	<b>972,414.65 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>100.0%</b>	<b>972,414.65</b>
<b>GUERRAVACA</b>														
<b>Duqueno - Aguas</b>														
8	460810478	CLAYSON	01/04/2008	14/03/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN CARRILES EN LAS PLAZAS DE COBRO, No. 01 "GUERRAVACA" Y No. 41 "SAN MARCOS"	60,000.00 \$	141,078.00 \$	141,078.00 \$	141,078.00 \$	141,078.00 \$	141,078.00 \$	0 \$	100.0%	141,078.00
<b>SUBTOTAL GUERRAVACA</b>					<b>60,000.00 \$</b>	<b>141,078.00 \$</b>	<b>141,078.00 \$</b>	<b>141,078.00 \$</b>	<b>141,078.00 \$</b>	<b>141,078.00 \$</b>	<b>141,078.00 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>100.0%</b>	<b>141,078.00</b>
<b>Varios Tramos</b>														
7	460810607	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	02/03/2008	13/11/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HERALDO ABILAN EN ZONA DE CARRILES DE LA PLAZA DE COBRO No. 101 PALO BLANCO Y LA No. 104 LA VENTA, TRAMO GUERRAVACA - AGUILILL PLAZA DE COBRO No. 101 PALO BLANCO Y LA No. 104 LA VENTA, TRAMO GUERRAVACA - AGUILILL PLAZA DE COBRO No. 101 PALO BLANCO Y LA No. 104 LA VENTA, TRAMO RANCHO VIEJO - TANCOS	360,000.00 \$	356,000.70 \$	356,000.70 \$	356,000.70 \$	356,000.70 \$	356,000.70 \$	0 \$	100.0%	356,000.70
<b>Varios Tramos</b>														
10	460810154	INGENIERIA AMBILVAL Y HELIANA	13/06/2008	15/11/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACION DE 0 PLANTAS MODULARES METALICAS PARA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS PLAZAS DE COBRO, MANERA (UNA PLAZA DE COBRO ZACAPALCO, (UNA ) SERVICIO MEDICO ZACAPALCO, DEL CAMINO DIRECTO ZACAPALCO - RANCHO VIEJO, RANCHO VIEJO - TANCOS Y UNA PLAZA DE COBRO PANO MOHELOS CUERPO "F", (UNA PLAZA DE COBRO PALO BLANCO CUERPO "F", (UNA PLAZA DE COBRO PALO BLANCO CUERPO "F", (UNA PLAZA DE COBRO PALO BLANCO CUERPO "F" DE LA AUTOPISTA GUERRAVACA-AGUILILL	304,300.00 \$	303,007.00 \$	303,007.00 \$	303,007.00 \$	303,007.00 \$	303,007.00 \$	0 \$	100.0%	303,007.00
<b>SUBTOTAL GUERRAVACA</b>					<b>764,300.00 \$</b>	<b>761,075.70 \$</b>	<b>761,075.70 \$</b>	<b>761,075.70 \$</b>	<b>761,075.70 \$</b>	<b>761,075.70 \$</b>	<b>761,075.70 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>100.0%</b>	<b>761,075.70</b>
<b>PUEBLA</b>														
<b>Mexico - Puebla</b>														
12	460810276	ORDONAVE Y ASOCIADOS	01/02/2008	15/07/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS DE CONCRETO HERALDO ABILAN EN LAS PLAZAS DE COBRO, No. 101 SAN MARCOS, No. 101 Y No. 102 SAN MARCOS, No. 101 Y No. 102 SAN MARTIN, No. 101 Y No. 102	480,000.00 \$	500,251.67 \$	500,251.62 \$	500,251.62 \$	500,251.62 \$	500,251.62 \$	0 \$	100.0%	500,251.62
<b>Puebla - Atlixco</b>														
13	460810271	WAS INGENIERIA	01/02/2008	14/06/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN LAS PLAZAS DE COBRO EN ZONA DE CARRILES DE LA PLAZA DE COBRO No. 27 (AMOLTOC, No. 101)	210,000.00 \$	211,140.20 \$	211,140.20 \$	211,140.20 \$	211,140.20 \$	211,140.20 \$	0 \$	100.0%	211,140.20
<b>Atlixco - Ctl. Manaboa</b>														
14	460810272	ORDONAVE Y ASOCIADOS	01/02/2008	14/06/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUSTITUCIÓN DE LOSAS EN LAS PLAZAS DE COBRO EN ZONA DE CARRILES DE LA PLAZA DE COBRO No. 27 ESPERANZA No. 271-200	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	100,000.00 \$	0 \$	100.0%	100,000.00
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>					<b>870,000.00 \$</b>	<b>942,453.96 \$</b>	<b>942,453.96 \$</b>	<b>942,453.96 \$</b>	<b>942,453.96 \$</b>	<b>942,453.96 \$</b>	<b>942,453.96 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>100.0%</b>	<b>942,453.96</b>



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Concepto No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Monto Ejecutado C	Ejecutado en Trámite D	Relaciones Devoluciones	Saldo Cancelado L	Diferencia De-C-E	Ejecutado y Fijado Efectivo	Avance financiero (%)		
			Inicio	Fin														
<b>CONTAZACALCOS</b>																		
<b>Varios Tramos</b>																		
15	450001040 500002215	RAMA VICENTE GONZALEZ Y COMPAÑIA	07/07/2008	09/11/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUBSTITUCIÓN DE LONAS DE CONCRETO HIDRAULICO DANADAS EN LAS PLAZAS DE COBRO No. 119 ACAYUCAN, GUAYMAS Y EN LA PLAZA DE COBRO No. 178 SANCHEZ MAGALANES DEL TRAMO AGUA DULCE - CADEMAS, EN LA PLAZA DE COBRO No. 102 SIERRA PLATA DEL TRAMO CHAMPION Y EN LA PLAZA DE COBRO No. 100 INTERPEC DEL CAMINO DIRECTO SALINA CRUZ - LA TIENDA Y EN LA PLAZA DE COBRO No. 104 PERTENECIENTE AL PUENTE DIGNAL	\$ 300,000.00	\$ 870,330.40	\$ 870,330.40	\$ 820,330.40	\$ 820,330.40		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 820,330.40	100.0%		
<b>Varios Tramos</b>																		
16	450001040 500002215	HIDROTICOMA CALIDAD DEL AGUA Y AGRONOMIA	09/04/2008	20/12/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 7 PLANTAS MODULARES RESIDUALES CONTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: (008) 1 PLAZA DE COBRO No. 119 ACAYUCAN DEL TRAMO ACAYUCAN - GUAYMAS, (009) 1 PLAZA DE COBRO No. 103 SANCHEZ MAGALANES DEL TRAMO AGUA DULCE - CADEMAS, (100) 1 PLAZA DE COBRO No. 102 SIERRA PLATA DEL TRAMO CHAMPION Y (101) 1 PLAZA DE COBRO No. 100 INTERPEC DEL TRAMO SALINA CRUZ - LA TIENDA Y (104) 1 PLAZA DE COBRO No. 104 PERTENECIENTE AL PUENTE DIGNAL	\$ 420,000.00	\$ 905,103.54	\$ 905,103.54	\$ 905,103.54	\$ 905,103.54		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 905,103.54	100.0%
<b>VIA CRUZ</b>																		
<b>Cd. Mendoza - Comalapa</b>																		
17		<b>Supervisión realizada por la Subdelegación Técnica</b>																
<b>Comalapa - Veracruz</b>																		
21		<b>Supervisión realizada por la Subdelegación Técnica</b>																
<b>La Tienda - Cd. bus</b>																		
24		<b>Supervisión realizada por la Subdelegación Técnica</b>																
<b>Libramiento Panteón de Tlapala</b>																		
26		<b>Partida Cancelada</b>																
<b>Comalapa - Veracruz - Tlaxiiltán</b>																		
27		<b>Partida Cancelada</b>																
<b>ACTIVOSA</b>																		
<b>Puerto Internacional Hipólito Zaragoza</b>																		
29	450000770	JORGE OMAR VERA ALVAREZ	20/02/2008	29/04/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN LA ZONA DE PCAF DE LA PLAZA DE COBRO DEL EVENTO	\$ 57,000.00	\$ 105,100.45	\$ 105,100.45	\$ 105,100.45	\$ 156,018.36		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 156,018.36	100.0%		
<b>Puerto Internacional Reynosa - PHARR</b>																		
30	450000723	PRODOTOP	07/03/2008	04/08/2008	SUPERVISIÓN DE LA OBRA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNA PLANTA MODULAR PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (COSTO TOTAL ESTIMADO DE \$1,277,000.00) (INCLUYE ENFERMERA)	\$ 60,000.00	\$ 256,233.04	\$ 256,233.04	\$ 256,233.04	\$ 256,233.04		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 256,233.04	100.0%		
<b>TOTAL</b>																		
						\$ 780,000.00	\$ 1,270,433.99	\$ 1,270,433.99	\$ 1,270,433.99	\$ 1,270,433.99	\$ 1,270,433.99	\$ 10,430.03	\$ -	\$ -	\$ 1,270,433.99	100.0%		



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TÉCNICA


PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Estimado en Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones		Ajuntos de Costos Pagados
Culiacán		\$ 13,758,693.71	\$ 13,758,693.71	\$ 13,756,693.71	\$ 13,758,522.94		\$ 170.77		\$ 13,758,522.94			100.0%
Cuernavaca		\$ 136,788,716.79	\$ 136,788,716.79	\$ 136,788,716.79	\$ 130,681,795.30		\$ 8,106,921.49		\$ 130,681,795.30	\$ 544,041.13		100.0%
Veracruz		\$ 12,868,227.53	\$ 12,868,227.53	\$ 12,868,227.53	\$ 12,777,522.76		\$ 90,704.77		\$ 12,777,522.76	\$ 105.57		100.0%
Chiapas		\$ 5,309,478.32	\$ 5,309,478.32	\$ 5,309,478.32	\$ 4,959,895.79		\$ 349,582.53		\$ 4,959,895.79	\$ 19.80		100.0%
Oaxaca		\$ 5,131,633.74	\$ 5,131,633.74	\$ 5,131,633.74	\$ 4,987,605.86		\$ 144,027.88		\$ 4,987,605.86	\$ 58,624.87		100.0%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 175,856,750.09</b>	<b>\$ 175,856,750.09</b>	<b>\$ 175,856,750.09</b>	<b>\$ 167,165,342.65</b>		<b>\$ 8,691,407.44</b>		<b>\$ 167,165,342.65</b>	<b>\$ 602,752.77</b>		<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

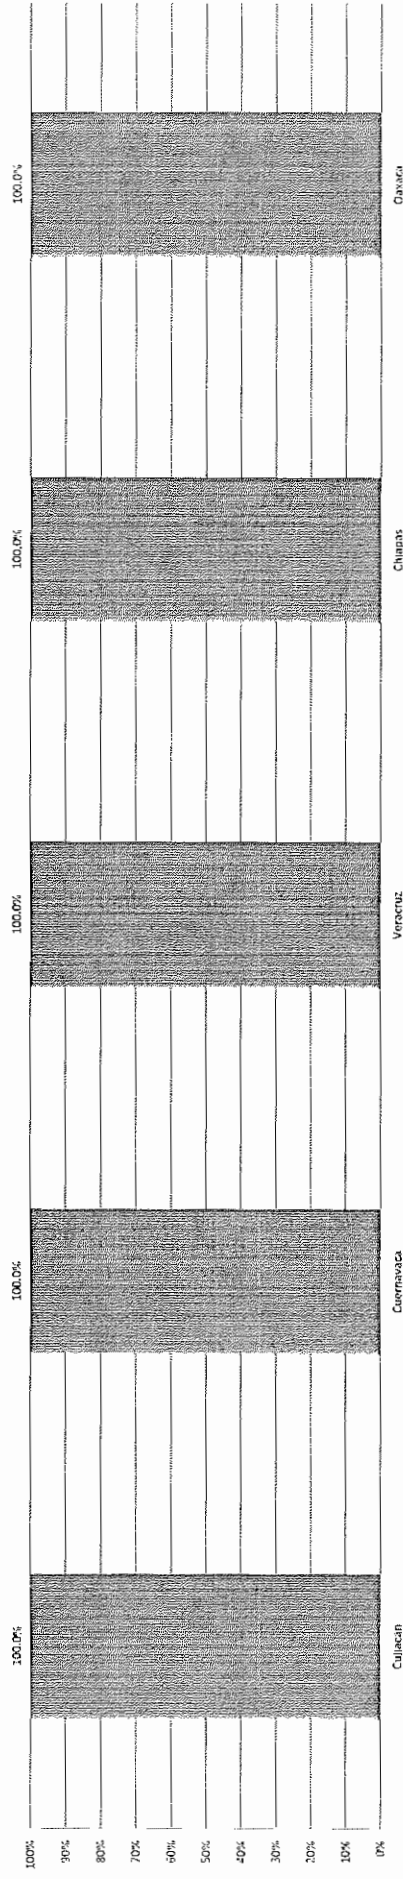

Nta: El Ejercicio a Flujo Efectivo es la suma del Anticipo Otorgado más (+), Estimaciones más (+), Ajustes de Costos menos (-), Amortización de Anticipo

00: 0134



PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Código No. Proyecto	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Progresado II	Monto Estimado C	Cafinado en Trámite D	Relaciones/ Devoluciones	Saldo Cancelado L	Diferencia D-C+D-E	Ejercido o Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance físico (%)
			Inicio	Fin												
GUATEMALA																
Estación Don - Nogales																
4500011200	12/09/2008	CONSTRUCCION GAYFF S.A DE C.V	12/09/2008	30/11/2008	REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "GONNELL" EN LAS CARRETERAS Y PAVIMENTO DEL KM 134+000 AL KM 144+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CD DIRECCION EN LA CARRETERA FEDERAL DE LOS NOGALES, ESTADO DE SONORA	9,041,072.49 \$	9,041,072.49 \$	9,041,072.49 \$	9,041,072.49 \$			170.77 \$		9,041,072.49 \$	100.0%	N.A.
4500011207	15/12/2008	CONSTRUCCION GAYFF S.A DE C.V	12/09/2008	15/12/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REPARACION DE DAÑOS OCASIONADOS POR LA TORMENTA TROPICAL "GONNELL" EN LAS CARRETERAS Y PAVIMENTO DEL KM 134+000 AL KM 144+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CD DIRECCION EN LA CARRETERA FEDERAL DE LOS NOGALES, ESTADO DE SONORA	300,000.00 \$	300,000.00 \$	300,000.00 \$	300,000.00 \$					300,000.00 \$	100.0%	N.A.
4500011208	15/12/2008	CONSTRUCCION GAYFF S.A DE C.V	15/12/2008	24/02/2009	RECONSTRUCCION DE CINCO ESTRUCTURAS DEL CUERPO IZQUIERDO B EL CALLO I KM 144+000 AL KM 144+200 DEL TRAMO ESTACION DON - CD DIRECCION EN LA CARRETERA FEDERAL DE LOS NOGALES, ESTADO DE SONORA	1,002,270.50 \$	1,002,270.50 \$	1,002,270.50 \$	1,002,270.50 \$					1,002,270.50 \$	100.0%	N.A.
4500011400	01/01/2009	HIGHWAY-JONS DE MEXICO, S.A DE C.V	01/01/2009	06/04/2009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RECALAMIENTO VERTICAL, BAZO Y ELEVADO, ASI COMO LA RECONSTRUCCION Y EL MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA FEDERAL DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	1,794,044.72 \$	1,794,044.72 \$	1,794,044.72 \$	1,794,044.72 \$					1,794,044.72 \$	100.0%	N.A.
						12,353,367.71 \$	12,353,367.71 \$	12,353,367.71 \$	12,353,367.71 \$			170.77 \$		12,353,367.71 \$	100.0%	N.A.
						SUBTOTAL GUATEMALA										

GUATEMALA

4500011028	09/07/2008	EDIFICADORA LAZOS	09/07/2008	29/10/2008	TRABAJOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL KM 100+000 AL KM 104+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	11,200,000.00 \$	11,200,000.00 \$	11,200,000.00 \$	11,200,000.00 \$			71,770.07 \$		11,200,000.00 \$	100.0%	100.0%
4500011035	09/07/2008	EXPERIENCIA INGENIERIA TOTAL	09/07/2008	07/11/2008	TRABAJOS Y SUPERVISION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL KM 100+000 AL KM 104+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	547,000.00 \$	547,000.00 \$	547,000.00 \$	547,000.00 \$					547,000.00 \$	100.0%	N.A.
4500011036	10/01/2009	EDIFICADORA LAZOS S.A DE C.V	10/01/2009	10/01/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA ATENCION A LA EMERGENCIA TECNICA DEL KM 100+000 AL KM 104+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	44,774,998.02 \$	44,774,998.02 \$	44,774,998.02 \$	44,774,998.02 \$			250,000.00 \$		44,810,317.22 \$	100.0%	100.0%
4500011224	13/10/2008	JOSLUIN SANTIAGO AGUIAR INGENIERIA	13/10/2008	30/05/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE LA OBRA ATENCION A LA EMERGENCIA TECNICA DEL KM 100+000 AL KM 104+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	1,000,000.00 \$	1,000,000.00 \$	1,000,000.00 \$	1,000,000.00 \$			52,000.00 \$		1,047,250.00 \$	100.0%	N.A.
4500011238	13/10/2008	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMPL S.A DE C.V	13/10/2008	30/05/2009	ATENCION A LA EMERGENCIA TECNICA DEL KM 100+000 AL KM 104+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	24,070,100.00 \$	24,070,100.00 \$	24,070,100.00 \$	24,070,100.00 \$					23,420,300.00 \$	100.0%	100.0%
4500011234	13/10/2008	INGENIERIA AMBIENTAL Y ORGANIZACION DE C.V	13/10/2008	11/07/2009	EMERGENCIA TECNICA DEL TALUD DEL CORTE DEL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	1,222,026.21 \$	1,222,026.21 \$	1,222,026.21 \$	1,222,026.21 \$					1,222,026.21 \$	100.0%	N.A.
4500012135	02/10/2008	TOC INGENIERIA S.A DE C.V	02/10/2008	11/09/2009	ATENCION A LA EMERGENCIA TECNICA DEL TALUD DEL CORTE DEL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	20,340,713.91 \$	20,340,713.91 \$	20,340,713.91 \$	18,995,514.55 \$			5,344,199.04 \$		14,099,514.55 \$	100.0%	100.0%
4500003073	02/10/2008	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMPL S.A DE C.V	02/10/2008	24/09/2009	SUPERVISION DE LA OBRA ATENCION A LA EMERGENCIA TECNICA DEL TALUD DEL CORTE DEL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	2,148,400.00 \$	2,148,400.00 \$	2,148,400.00 \$	2,148,400.00 \$					2,148,400.00 \$	100.0%	N.A.
4500012021	03/10/2008	TOC INGENIERIA S.A DE C.V	03/10/2008	31/11/2008	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE DEL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	1,100,424.70 \$	1,100,424.70 \$	1,100,424.70 \$	1,100,424.70 \$					1,100,424.70 \$	100.0%	N.A.
4500012203	14/11/2008	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMPL S.A DE C.V	14/11/2008	02/04/2009	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE DEL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	560,318.20 \$	560,318.20 \$	560,318.20 \$	560,318.20 \$					560,318.20 \$	100.0%	N.A.
4500012207	15/11/2008	GRUPO INGENIERIA INTEGRAL DE C.V	15/11/2008	31/05/2009	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE DEL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	1,254,710.20 \$	1,254,710.20 \$	1,254,710.20 \$	1,254,710.20 \$					1,254,710.20 \$	100.0%	N.A.
4500012306	21/09/2008	CONSTRUCCION Y DESARROLLO ACCEL S.A DE C.V	21/09/2008	30/04/2009	ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE LOCALIZADO EN EL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	9,706,818.06 \$	9,706,818.06 \$	9,706,818.06 \$	9,706,818.06 \$					9,706,818.06 \$	100.0%	100.0%
4500012375	20/06/2008	INGENIERIA AMBIENTAL Y ORGANIZACION DE C.V	20/06/2008	15/05/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE LOCALIZADO EN EL KM 200+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	400,000.00 \$	400,000.00 \$	400,000.00 \$	400,000.00 \$					400,000.00 \$	100.0%	N.A.
4500012328	13/10/2008	CONSTRUCCION Y DESARROLLO ACCEL S.A DE C.V	13/10/2008	31/05/2009	REPARACION DE LA ACANTARIALLA DEL KM 301+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	7,100,000.00 \$	7,100,000.00 \$	7,100,000.00 \$	6,750,320.25 \$					6,750,320.25 \$	100.0%	100.0%
4500012323	13/10/2008	INGENIERIA AMBIENTAL Y ORGANIZACION DE C.V	13/10/2008	15/05/2009	SUPERVISION DE LA OBRA REPARACION DE LA ACANTARIALLA DEL KM 301+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	921,798.28 \$	921,798.28 \$	921,798.28 \$	921,798.28 \$			0.01 \$		921,798.27 \$	100.0%	N.A.
4500012323	04/11/2008	CONSTRUCCION Y DESARROLLO ACCEL S.A DE C.V	04/11/2008	06/02/2009	REPARACION DE LA ACANTARIALLA DEL KM 301+000 DEL TRAMO ESTACION DON - CIUDAD OURECOA (CENTRALIZADA)	345,500.00 \$	345,500.00 \$	345,500.00 \$	345,500.00 \$					345,500.00 \$	100.0%	N.A.



No. Puntaje	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio	Concepto	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Monto Cumplido C	Exhausto en Termino O	Revisi6nes- Devoluciones	Estado Cancelado E	Diferencia D-C-E	Ejecuci6n a Flujos de Efectivo	Avance financiero (%)	Avance fisisco (%)
<b>Libramiento - Guernavaca</b>															
4500012159		TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIONES	11/06/2008	REPARACION DE LA OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM 4+000 COLICOP A DEL LIBRAMIENTO GUERNAVACA.	1,376,117.51 \$	1,376,117.51 \$	1,376,117.51 \$	1,376,117.51 \$					1,376,117.51	100.0%	N.A.
4500012156		MOCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V	01/06/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS COMISTES EN REPARACION DE LOS 02+400 CUERPO A DEL LIBRAMIENTO GUERNAVACA.	305,140.20 \$	305,140.20 \$	305,140.20 \$	305,140.20 \$					305,140.20	100.0%	N.A.
<b>Puentes de Mela - Iquima</b>															
4500012165		CONSTRUCTORA Y MANTENIDORAS S.A. DE C.V.	26/02/2009	CONSTRUCCION DEL PUENTE ASFA LTICA DE 100M DE ANCHURA EN EL KM 2+000 DEL CARRETERO DEL KM 4+000 AL 5+200 CARRETERO QUERETERO DEL KM 2+400 AL KM 3+000 CARRETERO QUERETERO EN CARRETERO DEL KM 2+400 AL KM 2+000, ASI COMO RECONEXIONES DEL KM 0+000 AL KM 0+400 Y DEL KM 10+000 AL KM 10+400 DEL CARRIL DIRECTO PUENTE DEL VIALCANAL.	6,423,198.01 \$	6,423,198.01 \$	6,423,198.01 \$	6,423,198.01 \$				0.07	6,423,198.01	100.0%	
4500012164		FLORENO ORIZ JAVIER	26/02/2009	SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS EN REPARACION DE LA ASFA LTICA DE 100M DE ANCHURA EN EL KM 2+000 AL KM 2+400 DEL CARRETERO DEL KM 4+000 AL 5+200 CARRETERO DEL KM 2+400 AL KM 3+000 DEL CARRETERO DEL KM 2+400 AL KM 2+000, ASI COMO RECONEXIONES EN CARRETERO DEL KM 2+400 AL KM 2+000, ASFA LTICA DE 100M DE ANCHURA EN EL KM 0+400 Y DEL KM 10+000 AL KM 10+400 DEL CARRIL DIRECTO DEL CARRIL VIALCANAL.	330,000.00 \$	330,000.00 \$	330,000.00 \$	330,000.00 \$					330,000.00	100.0%	N.A.
<b>VERACRUZ</b>															
<b>La Tinaja - Cd. Iste</b>															
4500010471		CONSTRUCCIONES DE CONSTRUCCION Y PROYECTOS	12/12/2007	PROYECTO DE REPARACION DEL PIV (BARRANDA) SAN MIGUEL KM 59+000 DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-ISA.	397,425.50 \$	397,425.50 \$	397,425.50 \$	397,425.50 \$					397,425.50	100.0%	N.A.
4500010472		GRUPO OCE	09/04/2008	REPARACION DEL PIV (BARRANDA) SAN MIGUEL KM 59+000 DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-ISA.	2,689,825.34 \$	2,689,825.34 \$	2,689,825.34 \$	2,610,982.01 \$					68,843.33	100.0%	100.0%
4500010473		EL PLAN CANELAS EGAMILLA	12/12/2007	SUPERVISION DE LA REPARACION DEL PIV (BARRANDA) SAN MIGUEL KM. 59+000 DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-ISA.	461,200.00 \$	460,200.00 \$	460,200.00 \$	460,200.00 \$					460,200.00	100.0%	N.A.
<b>Cd. Mandoza - Cordoba</b>															
4500010474		COCONAL S.A. DE C.V.	10/06/2008	TRABAJO DE LIMPIEZA Y RECONEXIONES DEL PIV (BARRANDA) AL KM 301+000 CARRETERO DE SAN MIGUEL.	8,125,000.00 \$	8,125,000.00 \$	8,125,000.00 \$	8,122,000.00 \$		100.07		2,314.44	8,122,000.00	100.0%	100%
4500010475		MPON CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	10/06/2008	SUPERVISION DE TRABAJOS DE BACHO Y RECONEXIONES DEL KM 307+000 AL KM 301+000 CARRETERO DE SAN MIGUEL.	610,000.00 \$	610,000.00 \$	610,000.00 \$	610,000.00 \$					610,000.00	100.0%	N.A.
4500010476		PROYECTO CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	05/04/2008	PROYECTO PARA LA REPARACION POR EMERGENCIA DE LA OBRA DE BACHO UBICADA EN EL KM 201+000.	560,000.00 \$	560,000.00 \$	560,000.00 \$	560,000.00 \$					560,000.00	100.0%	N.A.
<b>CHIAPAS</b>															
<b>San Chech6n - Ruidi6n - Ocosingo</b>															
5500003259		COLLES MELMA JESUS MARTIN	11/06/2008	RECONSTRUCCION DE LA ALICANTARRILLA DEL TUBO UBICADA EN EL KM 81+200 (CONJUNTO DEL RECONOCIMIENTO Y PAGO TRABAJOS POR EMERGENCIA TECNICA)	751,000.14 \$	751,000.14 \$	751,000.14 \$	407,957.10				343,043.04	407,957.10	100.0%	N.A.
5500003271		MOCHER SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A. DE C.V	24/06/2008	ESTABILIZACION DE TALUD DEL CORTIC Y ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTIC Y CONSTRUCCION DEL MURO ALICANTARRILLA DEL KM 143+900	3,097,900.37 \$	3,097,900.37 \$	3,097,900.37 \$	3,097,900.37 \$				29.79	3,097,900.37	100.0%	100%
5500003272		MEJIA YOC ALONSO IND	24/06/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE REPARACION DEL MURO ALICANTARRILLA DEL KM 143+900 Y ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTIC Y CONSTRUCCION DEL MURO ALICANTARRILLA DEL KM 143+900	901,023.87 \$	901,023.87 \$	901,023.87 \$	901,023.87 \$					901,023.87	100.0%	N.A.
5500003281		PORTICON CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16/06/2008	TRABAJOS URGENTES PARA RECONOCIMIENTO UBICADA EN EL KM 110+600	760,150.00 \$	760,150.00 \$	760,150.00 \$	762,432.46		10.00		6,282.46	762,432.46	100.0%	N.A.
<b>01/07/08</b>															
					5,209,470.22 \$	5,209,470.22 \$	5,209,470.22 \$	4,609,608.73 \$		10.00		308,861.53	4,609,608.73	100.0%	
<b>Guernavaca - Oaxaca</b>															
4500010758		TRABAJOS DEL IUR	15/10/2008	EMERGENCIA TECNICA 2009 KM 104+200	4,710,310.72 \$	4,710,310.72 \$	4,710,310.72 \$	4,574,200.94		16.024.17		144,827.66	4,574,200.94	100.0%	100.0%
4500010759		LABORATORIO DE MATERIALES	17/02/2008	SUPERVISION DE LA EMERGENCIA TECNICA 2009 KM 104+200	413,317.07 \$	413,317.07 \$	413,317.07 \$	413,317.07 \$					413,317.07	100.0%	N.A.
					5,123,627.79 \$	5,123,627.79 \$	5,123,627.79 \$	4,987,518.01 \$		28.036.82		144,827.66	4,987,518.01	100.0%	
					175,656,720.00 \$	175,656,720.00 \$	175,656,720.00 \$	167,185,540.05 \$		662,729.77		8,501,179.44	167,185,540.05	100.0%	

FONDO ESPECIAL PARA EMERGENCIAS PROVOCADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "LOWEY" EN LA ESTACION - DON NOCALES, DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Orden	Cantidad No.	Empresa	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Monto Original Autorizado	Monto Actualizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Pagar		Monto Pagar en Trámite D	Retenciones - Eliminaciones	Monto Cancelado E	Diferencia ITC-DIC	Monto a Cargo de Utilidades	Porcentaje de Pago (F)	Avance (G)	
								Dirigido	Amortizado								
ET-32-2005-10	45000 4480 500004480	CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA MAC S.A. DE C.V.	06/03/2010	25/10/2010	\$ 24,920,453.04	\$ 24,920,453.04	\$ 24,920,453.04	\$ 4,997,266.29	\$ 24,920,453.04	\$ 72,845,305.71	\$ 852,377.00	\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ 2,140,355.29	100.0%	100.0%	
ET-32-2005-10	45000 4480 500004480	CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA MAC S.A. DE C.V.	01/03/2010	11/10/2010	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 400,313.97	\$ 10,718.09	\$ -	\$ -	\$ 400,313.97	100.0%	N/A	
ET-32-2005-10	45000 4480 500004480	CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA MAC S.A. DE C.V.	06/03/2010	25/10/2010	\$ 27,120,250.00	\$ 27,120,250.00	\$ 27,120,250.00	\$ 5,473,071.12	\$ 27,120,250.00	\$ 76,774,770.70	\$ 27,290.17	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 76,774,770.70	100.0%	100.0%	
ET-32-2005-10	45000 4480 500004480	CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA MAC S.A. DE C.V.	01/03/2010	31/10/2010	\$ 500,217.00	\$ 500,217.00	\$ 500,217.00	\$ -	\$ 500,217.00	\$ 500,217.00	\$ 1,167.81	\$ 0.00	\$ -	\$ 500,217.00	100.0%	N/A	
ET-32-2005-10	45000 4480 500004480	CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA MAC S.A. DE C.V.	09/03/2010	30/10/2010	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 35,916,071.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 12,000,000.00	100.0%	100.0%	
ET-32-2005-10	45000 4480 500004480	CONSTRUCCIONES CONSTRUCTORA MAC S.A. DE C.V.	01/03/2010	31/10/2010	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000.00	100.0%	N/A	
<b>TOTAL</b>																	
						\$ 72,845,305.71	\$ 72,845,305.71	\$ 65,264,315.27	\$ 12,853,442.18	\$ 65,264,315.27	\$ 82,260,660.25	\$ 2,000,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ 82,260,660.25	100.0%	

105

00 0137



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA  
PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA 2006 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Código del Proyecto	Lugar del Proyecto	Periodo de Construcción (Meses)	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Gastoado A	Monto Disponible B	Monto Ejecutado C	Ejecución del Proyecto D	Monto Disponible Disponible E	Monto Ejecutado E	Diferencial E-D	Ejecución y Estado del Proyecto	Avance del Proyecto (%)	Avance del Proyecto (R)
1	400011242	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	150,000.00	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100%	750,000.00	750,000.00	0	100%	100%	A.A.
2	400011243	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	10,000,000.00	12,491,267.82	12,491,267.82	11,140,000.00	100%	12,491,267.82	11,140,000.00	1,351,267.82	100%	100%	A.A.
3	400011244	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	10,000,000.00	20,111,456.00	20,111,456.00	20,697,700.00	100%	20,111,456.00	20,697,700.00	586,244.00	100%	100%	A.A.
4	400011245	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	10,000,000.00	19,451,647.50	19,451,647.50	19,451,647.50	100%	19,451,647.50	19,451,647.50	0	100%	100%	A.A.
5	400011246	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	10,000,000.00	1,652,391.62	1,652,391.62	1,652,391.62	100%	1,652,391.62	1,652,391.62	0	100%	100%	A.A.
6	400011247	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	11,000,000.00	13,102,906.48	13,102,906.48	9,725,916.48	100%	13,102,906.48	9,725,916.48	3,376,990.00	100%	100%	A.A.
7	400011248	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	3,000,000.00	1,897,296.75	1,897,296.75	1,897,296.75	100%	1,897,296.75	1,897,296.75	0	100%	100%	A.A.
8	400011249	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	2,000,000.00	2,796,279.00	2,796,279.00	2,796,279.00	100%	2,796,279.00	2,796,279.00	0	100%	100%	A.A.
9	400011250	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	400,000.00	1,471,000.00	1,471,000.00	1,471,000.00	100%	1,471,000.00	1,471,000.00	0	100%	100%	A.A.
10	400011251	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	5,000,000.00	4,822,359.60	4,822,359.60	5,348,040.00	100%	4,822,359.60	5,348,040.00	525,680.40	100%	100%	A.A.
11	400011252	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	10,000,000.00	5,813,720.38	5,813,720.38	3,301,000.44	100%	5,813,720.38	3,301,000.44	2,512,719.94	100%	100%	A.A.
12	400011253	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	2,000,000.00	1,851,791.15	1,851,791.15	1,851,791.15	100%	1,851,791.15	1,851,791.15	0	100%	100%	A.A.
13	400011254	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	2,000,000.00	1,338,874.34	1,338,874.34	1,608,974.24	100%	1,338,874.34	1,608,974.24	270,099.90	100%	100%	A.A.
14	400011255	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	1,000,000.00	1,374,420.94	1,374,420.94	1,374,420.94	100%	1,374,420.94	1,374,420.94	0	100%	100%	A.A.
15	400011256	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	10,000,000.00	10,237,700.19	10,237,700.19	10,237,700.19	100%	10,237,700.19	10,237,700.19	0	100%	100%	A.A.
16	400011257	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	01/01/2006 - 12/31/2006	RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LOS RIOS EN LA ZONA DE SAN JUAN DE LOS RIOS, PROV. DE TACNA	42,317,460.00	40,814,206.08	40,814,206.08	41,814,206.08	100%	40,814,206.08	41,814,206.08	999,999.99	100%	100%	A.A.

PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA 2008 DE LA RCD DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesto	Concepto	Empresa	Periodo del Contrato		Monto Original Autorizado	Monto Contratado		Anticipo		Monto Pagar a la B	Monto Cancelado C	Calculado en Trámite D	Monto Cancelado	Monto Cancelado	Diferencia E-CODE	Ejecutado a Fecha (Efectivo)	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
			Inicio	Fin		Objetos	Advertidos											
17	436001133 550003738	ACABADOS TECNOLÓGICOS DEL NOROCCIDENTE S.A. DE CV	20/12/2008	18/01/2009	30,574,500.00 \$	29,073,349.80 \$	2,907,324.61 \$	2,907,324.61 \$	2,907,324.61 \$	29,073,349.80 \$	10,230,095.43 \$		10,230,095.43 \$	13,305,661.37 \$		17,210,761.43	100.0%	
18	650001133 550003738	CONSTRUCIONES Y OBRAS S.A. DE CV	21/11/2008	29/04/2009	29,205,900.00 \$	28,363,240.40 \$	2,079,324.84 \$	2,079,324.84 \$	2,079,324.84 \$	28,363,240.40 \$	22,334,799.23 \$		22,334,799.23 \$	4,028,441.17 \$		22,704,799.23	100.0%	
<b>SUBTOTAL</b>																		
					59,780,400.00 \$	57,436,590.20 \$	4,986,649.45 \$	4,986,649.45 \$	4,986,649.45 \$	57,436,590.20 \$	32,564,894.66 \$		32,564,894.66 \$	43,364,112.57 \$		40,015,560.66	100.0%	
<b>IMPORTE DE LOS PAGOS Y PROYECTOS DE INICIACIÓN DE OBRAS DE LA RCD DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA</b>																		
					4,000,000.00 \$	4,000,000.00 \$				4,000,000.00 \$								
<b>TOTAL</b>					63,780,400.00 \$	61,436,590.20 \$	4,986,649.45 \$	4,986,649.45 \$	4,986,649.45 \$	61,436,590.20 \$	36,564,894.66 \$		36,564,894.66 \$	47,364,112.57 \$		44,015,560.66	100.0%	

Pantalla Cancelada



PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO DE RUTAS HISTÓRICAS 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Paralelo	Control No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Contratado	Monto Programado	Monto Estimado	Estimado en Trámite	Reservaciones-Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia DC-DC	Ejército a Fajro de Trámite	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
			Inicio	Fin												
<b>VERACRUZ</b>																
Cd. Mendoza - Córdoba																
2	4500011104 (1)	TRIGCASA SIGNS, S.A. DE C.V	09/10/2008	10/11/2009	NUMINSTRADO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS RUTAS HISTORICAS DE MEXICO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA REVOLUCION, EN LO RELATIVO A LA CAMPAÑA DE HIDALGO (CENTRALIZADA)	\$ 61,299.94	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,100.00	\$ -	\$ 31,000.00	100.0%	N.A.
<b>Cordoba - Veracruz</b>																
2	4500011104 (9)	TRIGCASA SIGNS, S.A. DE C.V	09/10/2008	10/11/2009	NUMINSTRADO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS RUTAS HISTORICAS DE MEXICO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DE HIDALGO (CENTRALIZADA)	\$ 489,422.04	\$ 219,000.75	\$ 219,000.75	\$ 219,000.75	\$ -	\$ -	\$ 32,059.66	\$ -	\$ 219,000.75	100.0%	N.A.
<b>MONTEHREY</b>																
Sanillo - Tehuacan																
2	4500011104 (11)	TRIGCASA SIGNS, S.A. DE C.V	09/10/2008	10/11/2009	NUMINSTRADO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS RUTAS HISTORICAS DE MEXICO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DE HIDALGO (CENTRALIZADA)	\$ 1,310,407.04	\$ 546,547.30	\$ 546,547.30	\$ 546,547.30	\$ -	\$ -	\$ 111,308.46	\$ -	\$ 660,347.26	100.0%	N.A.
<b>Oaxaca</b>																
Oaxaca - Palmito - Corralitas																
2	4500011104 (12)	TRIGCASA SIGNS, S.A. DE C.V	09/10/2008	10/11/2009	NUMINSTRADO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS RUTAS HISTORICAS DE MEXICO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DE HIDALGO (CENTRALIZADA)	\$ 400,482.19	\$ 307,193.41	\$ 307,193.41	\$ 307,193.41	\$ -	\$ -	\$ 71,430.04	\$ -	\$ 307,193.41	100.0%	N.A.
<b>OAXACA</b>																
Cuicatlan - Tehuacan - Oaxaca																
2	4500011104 (1)	TRIGCASA SIGNS, S.A. DE C.V	09/10/2008	10/11/2009	NUMINSTRADO E INSTALACION DE LA SEÑALIZACION DE LAS RUTAS HISTORICAS DE MEXICO EN EL MARCO DEL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA Y CENTENARIO DE LA CAMPAÑA DE HIDALGO (CENTRALIZADA)	\$ 1,256,100.00	\$ 594,007.70	\$ 594,007.70	\$ 594,007.70	\$ -	\$ -	\$ 100,700.37	\$ -	\$ 594,007.70	100.0%	N.A.
<b>TOTAL</b>																
						\$ 3,200,600.00	\$ 1,697,200.00	\$ 1,697,200.00	\$ 1,697,200.00	\$ -	\$ -	\$ 304,248.32	\$ -	\$ 1,697,200.00	100.0%	

000 0141





DELEGACIÓN	EJERCICIO	PROGRAMA	CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	REGISTRO SIAC	IMPORTE	RETENCIONES-DEVOLUCIONES
CUERNAVACA	2001	MAYOR	121-076/01MF231-6108	CAMINOS Y PAVIMENTOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	01/09/2001	11/12/2001	REHABILITACION DEL PAVIMENTO MEDIANTE: RENOVACIONES CORRIGIENDO LAS SOBREVARIABLES TRANSVERSALES BOMBEO Y MINICARPETA DRENANTE DEL 3.0 CMS. DE ESPESOR ( OPEN GRADE 9 ENTRE LOS KM. 25+000 AL KM. 32+000 CUERPO "B" Y DEL KM. 25+000 AL KM. 28+000 CUERPO "A"; Y FRESADO, ESTABILIZACION CON CEMENTO HIDRAULICO CARPETA ASFALTICA Y MINICARPETA DRENANTE DE 3 CM. DE ESPESOR (OPEN GRADE) DEL KM. 47+900 AL KM. 52+900 CUERPO "B"	5500002296 RECONOCIMIENTO DE ADUEDO	\$ 278,504.34	\$ 865,787.53
VERACRUZ	2004-2005	MAYOR	4500003115 5500001044	CONAPA, S.A. DE C.V.	08/11/2004	30/06/2006	REHABILITACION INTEGRAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM. 00+000 AL KM. 27+600 CUERPO "A" KM. 00+000 AL KM. 32+000 CUERPO "A" INCLUYE RIEGO SE SELLO EN ACOTAMIENTOS EN LA AUTOPISTA LA TIANJA - CD. ISLA	5500003182 GTS. INDIRECTOS	\$ 2,911,536.34	
VERACRUZ	2004-2005	MAYOR	4500003313 5500001074	AGREGADOS LAS DERRUMBADAS, S.A. DE C.V.	28/11/2004	30/06/2006	REHABILITACION INTEGRAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE DEL KM. 44+000 AL 98+000 CUERPO "B" Y DEL KM. 45+200 AL KM. 83+100 CUERPO "A" INCLUYE RIEGO DE SELLO EN ACOTAMIENTOS DE LA AUTOPISTA CODOBA - VERACRUZ.	5500003183 GTS. INDIRECTOS	\$ 2,201,372.55	
<b>TOTAL</b>									<b>\$ 5,391,413.23</b>	<b>\$ 865,787.53</b>



---

**Memoria Documental  
Programa de Mantenimiento y Modernización de la  
Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de  
Infraestructura (FNI)**

**Tomo II  
Anexos 3 al 5**

---




---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 3**

Descripción	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal									
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contro. Auto. A	Monto Contro. Auto. B	Programa de Avance Obra (C)	Estimado acumulado (D)	Monto C.A. Trámite (E)	Ratio Cancelado (F)	Diferencia (G-H-I-J)	Completos	Adelantos	Empleos de Fomento	Reserva Obra	Devoluciones	Reservaciones Derivadas	Aportes de Contro. Fomento	Avance Fomento (%)			
Tierra	\$ 204,474,069.70	\$ 177,763,200.00	\$ 177,763,200.00	\$ 177,763,200.00	\$ 177,763,200.00	\$ 175,811,209.80	\$ 0.00	\$ 1,952,999.20	\$ 0.00	\$ 46,054,107.19	\$ 46,054,107.19	\$ 8,404,009.00	\$ 0,119,596.40	\$ 143,021.01	\$ 0,119,596.40	\$ 143,021.01	100.0%			
Culiacán	\$ 394,272,110.50	\$ 301,912,094.33	\$ 301,912,094.33	\$ 301,912,094.33	\$ 301,912,094.33	\$ 300,425,751.39	\$ 0.00	\$ 1,486,343.00	\$ 0.00	\$ 64,950,020.04	\$ 64,950,020.04	\$ 0,001,020.00	\$ 9,033,174.20	\$ 202,124.03	\$ 202,124.03	\$ 0,001,020.00	100.0%			
Guadalupe	\$ 914,316,449.32	\$ 650,846,105.21	\$ 650,846,105.21	\$ 650,846,105.21	\$ 650,846,105.21	\$ 649,331,203.48	\$ 0.00	\$ 314,841.73	\$ 0.00	\$ 163,100,766.10	\$ 163,100,766.10	\$ 14,201,100.35	\$ 7,283,000.72	\$ 9,403,029.20	\$ 9,403,029.20	\$ 14,201,100.35	100.0%			
Cuernavaca	\$ 250,816,430.05	\$ 275,351,185.91	\$ 275,351,185.91	\$ 275,351,185.91	\$ 275,351,185.91	\$ 273,540,721.00	\$ 0.00	\$ 1,807,464.95	\$ 0.00	\$ 51,142,305.15	\$ 51,142,305.15	\$ 1,553,093.23	\$ 1,306,208.80	\$ 9,414,292.92	\$ 9,414,292.92	\$ 1,306,208.80	100.0%			
Puebla	\$ 207,210,607.15	\$ 340,513,137.91	\$ 340,513,137.91	\$ 340,513,137.91	\$ 340,513,137.91	\$ 333,093,614.40	\$ 0.00	\$ 7,419,523.51	\$ 0.00	\$ 90,459,703.72	\$ 90,459,703.72	\$ 23,650,003.27	\$ 17,250,172.83	\$ 3,727,209.49	\$ 3,727,209.49	\$ 23,650,003.27	100.0%			
Coahuila	\$ 191,210,566.98	\$ 104,000,022.49	\$ 104,000,022.49	\$ 104,000,022.49	\$ 104,000,022.49	\$ 104,771,032.70	\$ 0.00	\$ 768,010.29	\$ 0.00	\$ 25,943,077.47	\$ 25,943,077.47	\$ 25,420,040.50	\$ 27,704,530.00	\$ 126,119.01	\$ 126,119.01	\$ 25,420,040.50	100.0%			
Veracruz	\$ 307,329,759.51	\$ 407,225,011.74	\$ 407,225,011.74	\$ 407,225,011.74	\$ 407,225,011.74	\$ 392,756,015.74	\$ 0.00	\$ 144,998,416.00	\$ 0.00	\$ 69,870,845.89	\$ 69,870,845.89	\$ 1,042,000.20	\$ 1,762,038.41	\$ 554,166.02	\$ 554,166.02	\$ 1,042,000.20	100.0%			
Reynosa	\$ 97,950,009.70	\$ 92,174,893.39	\$ 92,174,893.39	\$ 92,174,893.39	\$ 92,174,893.39	\$ 91,249,209.14	\$ 0.00	\$ 925,690.24	\$ 0.00	\$ 18,160,377.11	\$ 18,160,377.11	\$ 958,010.19	\$ 522,070.96	\$ 60,251.23	\$ 60,251.23	\$ 958,010.19	100.0%			
Cuadalupe	\$ 100,000,027.83	\$ 157,944,021.43	\$ 157,944,021.43	\$ 157,944,021.43	\$ 157,944,021.43	\$ 155,031,314.00	\$ 0.00	\$ 2,912,707.43	\$ 0.00	\$ 43,425,604.36	\$ 43,425,604.36	\$ 1,350,410.39	\$ 1,322,376.10	\$ 240,009.20	\$ 240,009.20	\$ 1,350,410.39	100.0%			
Monterrey	\$ 243,415,750.20	\$ 242,001,992.45	\$ 242,001,992.45	\$ 242,001,992.45	\$ 242,001,992.45	\$ 242,581,051.72	\$ 0.00	\$ 100,140.73	\$ 0.00	\$ 70,059,409.14	\$ 70,059,409.14	\$ 1,522,097.04	\$ 1,216,940.45	\$ 243,203.62	\$ 243,203.62	\$ 1,522,097.04	100.0%			
Chihuahua	\$ 20,975,554.77	\$ 72,710,304.70	\$ 72,710,304.70	\$ 72,710,304.70	\$ 72,710,304.70	\$ 72,542,441.21	\$ 0.00	\$ 174,143.55	\$ 0.00	\$ 10,304,347.44	\$ 10,304,347.44	\$ 1,000,305.93	\$ 1,441,002.80	\$ 41,914.46	\$ 41,914.46	\$ 1,000,305.93	100.0%			
Oaxaca	\$ 37,020,102.52	\$ 41,012,172.08	\$ 41,012,172.08	\$ 41,012,172.08	\$ 41,012,172.08	\$ 40,956,009.16	\$ 0.00	\$ 56,162.92	\$ 0.00	\$ 10,009,649.10	\$ 10,009,649.10	\$ 1,420,300.00	\$ 1,103,500.99	\$ 90,039.40	\$ 90,039.40	\$ 1,103,500.99	100.0%			
<b>TOTAL</b>	\$ 2,723,776,193.87	\$ 2,044,046,610.38	\$ 2,044,046,610.38	\$ 2,044,046,610.38	\$ 2,044,046,610.38	\$ 2,022,310,376.40	\$ 0.00	\$ 61,736,233.98	\$ 0.00	\$ 682,264,644.87	\$ 682,264,644.87	\$ 86,417,917.08	\$ 69,528,168.36	\$ 262,542,916.61	\$ 262,542,916.61	\$ 86,417,917.08	100.0%			
<b>Suman otros pagos con cargo al ejercicio 2009</b>																				
<b>Total Pagado</b>																				

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

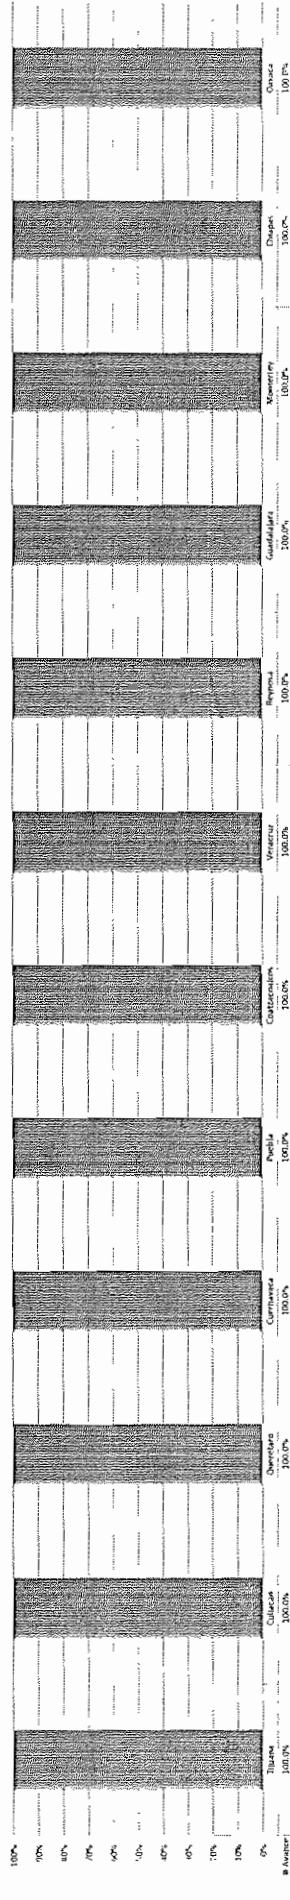

Nota: El ejercicio a Flujo de Efectivo corresponde a la suma (+) del Anticipo Otorgado más (+) Estimaciones más (+) Ajustes de Costos Pagados menos (-) Amortización de Anticipos.





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

DIRECCION TECNICA

Resumen de montos estimados acumulados por materia de los programas 2009 de la Red FONAZON

Descripción	Monto Aprobado		Monto Ejecutado		Monto Disponible		Monto Aprobado		Monto Ejecutado		Monto Disponible		Monto Aprobado		Monto Ejecutado		Monto Disponible		
	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	Presupuesto	Complementos	
<b>CHIDLAJALA</b>																			
Palmarito - Tepic	\$ 381,175.01	\$ 6,010,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 11,465,000.00
Uruapan - Nueva Italia	\$ 20,771,000.00	\$ 480,140.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00	\$ 800,000.00	\$ 11,770,000.00
Nueva Italia - Llaneros - Guadalupe	\$ 10,000,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00	\$ 270,000.00
Guadalupe - Tepic	\$ 42,800,000.00	\$ 1,887,154.74	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40	\$ 1,204,248.40	\$ 11,091,479.40
<b>Total Chidlajala</b>	\$ 78,946,175.01	\$ 7,567,240.74	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40	\$ 3,879,246.80	\$ 34,607,479.40
<b>MONTERREY</b>																			
Monterrey - Nuevo Laredo	\$ 82,411,000.00	\$ 300,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00	\$ 100,000.00	\$ 11,465,000.00
Torresón - S. Abilio	\$ 7,707,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00	\$ 6,000,000.00	\$ 7,707,000.00
Carbón - Ojo Caliente	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00
Guadalupe - Reynosa	\$ 27,710,000.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00	\$ 776,234.00
Comas Palanca - Carrizalito	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00	\$ 40,000,000.00
Puerto Mexico - Carbonera	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00	\$ 2,510,000.00
<b>Total Monterrey</b>	\$ 171,228,000.00	\$ 87,823,234.00	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40	\$ 3,769,276.20	\$ 34,607,479.40
<b>CHIDLAJALA</b>																			
Las Chorreras - Rosales - Ocozacoacoatlán	\$ 15,400,000.00	\$ 940,146.16	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00
<b>Total Chidlajala</b>	\$ 15,400,000.00	\$ 940,146.16	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00	\$ 1,247,314.40	\$ 15,400,000.00
<b>OAXACA</b>																			
Col. Cuauhtémoc - Oaxtepec	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00
<b>Total Oaxaca</b>	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00


0128

*[Handwritten signature]*

Fecha del corte: 30 de Septiembre de 2012

Deligación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal										
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Inicialmente	Monto Ejecutado	Programa Autorizado	Estimado Autorizado	Monto de Tránsito	Saldo Calificado	Diferencia B+C-D-E	Avance	Avance	Tránsito	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	Revoluciones	
Tiangua	\$ 137,793,000.00	\$ 119,042,004.30	\$ 119,042,004.30	\$ 110,940,004.00	\$ 110,970,005.75	\$ 0.00	\$ 370,350.27	\$ 35,000,100.30	\$ 35,000,100.30	\$ 119,770,004.73	\$ 7,711,741.23	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	\$ 7,480,037.01	100.0%
Coahuila	\$ 998,953,669.00	\$ 399,677,522.88	\$ 399,677,522.88	\$ 299,843,129.04	\$ 299,843,129.04	\$ 0.00	\$ 13,70	\$ 80,032,037.76	\$ 80,032,037.76	\$ 299,443,119.00	\$ 5,072,927.50	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	\$ 4,557,233.79	100.0%
Queretaro	\$ 479,499,000.00	\$ 471,315,028.07	\$ 471,315,028.07	\$ 451,310,028.07	\$ 451,297,370.03	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 134,524,147.85	\$ 134,524,147.85	\$ 465,472,037.00	\$ 13,842,000.44	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	\$ 7,605,244.97	100.0%
Guerrero	\$ 157,297,000.00	\$ 107,972,035.97	\$ 107,972,035.97	\$ 107,972,035.97	\$ 107,972,035.97	\$ 0.00	\$ 1,330.01	\$ 47,146,100.33	\$ 47,146,100.33	\$ 107,471,579.70	\$ 28,412.12	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.0%
Puebla	\$ 103,300,000.00	\$ 200,803,614.04	\$ 200,803,614.04	\$ 208,000,614.04	\$ 207,000,571.00	\$ 0.00	\$ 1,240,043.00	\$ 60,757,238.00	\$ 60,757,238.00	\$ 207,534,103.26	\$ 13,024,044.01	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	\$ 10,235,940.04	100.0%
Coahuila	\$ 41,000,000.00	\$ 44,053,572.04	\$ 44,053,572.04	\$ 44,053,572.04	\$ 44,053,572.04	\$ 0.00	\$ 0.16	\$ 6,686,035.70	\$ 6,686,035.70	\$ 44,000,000.00	\$ 25,142,917.13	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	\$ 21,041,081.94	100.0%
Veracruz	\$ 180,700,000.00	\$ 170,079,071.11	\$ 170,079,071.11	\$ 170,079,071.11	\$ 169,000,000.00	\$ 0.00	\$ 41,249,300.01	\$ 19,350,216.45	\$ 19,350,216.45	\$ 200,441,203.81	\$ 1,070,000.22	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	\$ 140,046.13	100.0%
Reynosa	\$ 26,400,000.00	\$ 30,079,041.01	\$ 30,079,041.01	\$ 32,075,041.01	\$ 31,100,130.17	\$ 0.00	\$ 891,215.04	\$ 9,025,952.94	\$ 9,025,952.94	\$ 31,100,132.17	\$ 179,321.09	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	\$ 100,476.28	100.0%
Coahuila	\$ 26,400,000.00	\$ 31,709,126.42	\$ 31,709,126.42	\$ 31,709,126.42	\$ 31,709,126.42	\$ 0.00	\$ 2,704,000.79	\$ 22,472,235.40	\$ 22,472,235.40	\$ 31,709,126.42	\$ 1,072,110.00	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	\$ 972,322.43	100.0%
Monterrey	\$ 160,000,000.00	\$ 171,207,323.64	\$ 171,207,323.64	\$ 171,207,323.64	\$ 171,000,000.00	\$ 0.00	\$ 377.07	\$ 51,180,710.06	\$ 51,180,710.06	\$ 171,200,000.00	\$ 134,403.03	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	\$ 104,832.08	100.0%
Chihuahua	\$ 7,000,000.00	\$ 15,415,000.55	\$ 15,415,000.55	\$ 15,415,000.55	\$ 15,400,107.29	\$ 0.00	\$ 15,442.26	\$ 4,350,512.34	\$ 4,350,512.34	\$ 15,415,000.55	\$ 650,022.44	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	\$ 600,420.00	100.0%
Campeche	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,256.01	\$ 1,000,256.01	\$ 1,000,256.01	\$ 1,000,256.01	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000,256.01	\$ 40,040.52	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	\$ 16,337.17	100.0%
TOTAL	\$ 1,701,940,000.00	\$ 1,701,899,644.55	\$ 1,701,899,644.55	\$ 1,701,899,644.55	\$ 1,701,899,644.55	\$ 0.00	\$ 47,804,197.56	\$ 480,010,856.70	\$ 480,010,856.70	\$ 1,701,899,644.55	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	\$ 52,872,759.43	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipo)

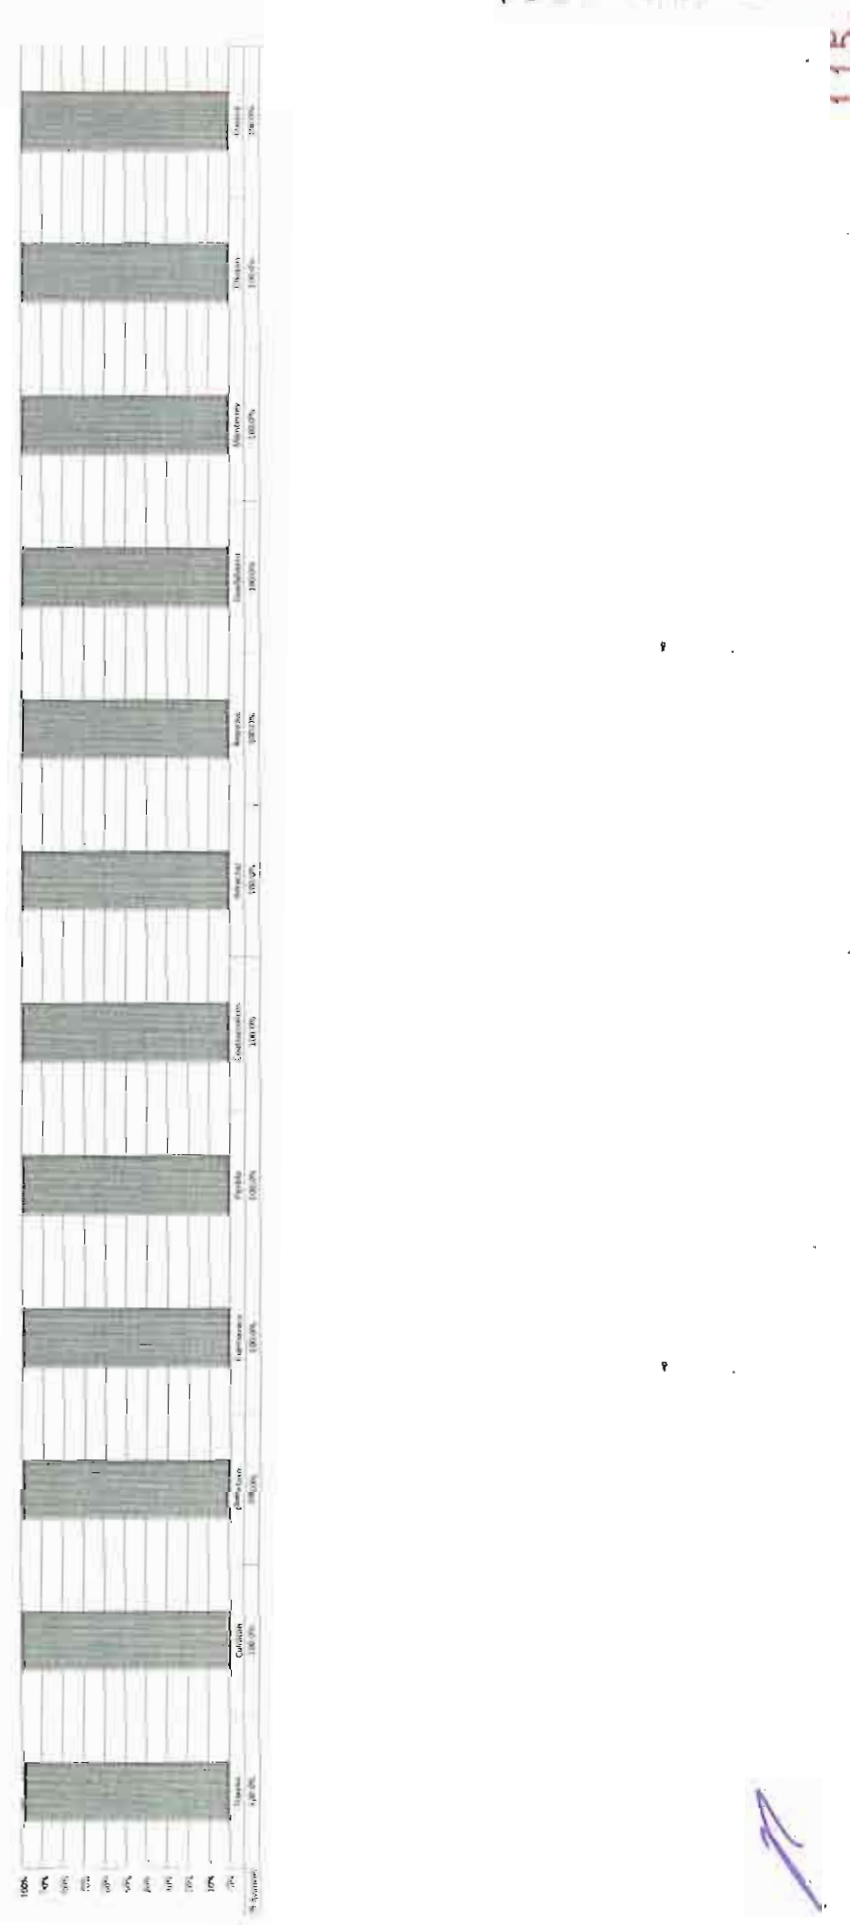

0149

No. Proyecto	Codigo No. Proyecto	Empresa	Fecha de Contrato	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Actividad Autorizada		Monto Programado	Estimado Autorizado	Monto Ejecutado	Reservaciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.O.C.	Ejercicio y Fecha del Ejercicio	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
							Original	Actualizado									

**TAMAYO**

1997	60001194	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
1997	60001195	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+200 AL KM 14+400 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	5,400,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,100,000.00	100.0%	100.0%

**La Paz**

2007	60001196	ATRENDADORA DEL COMAJAL DE LA SIERRA DE C.V.	14/03/2009	14/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 0+000 AL KM 0+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
------	----------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------	--------	--------

**COAHUILA**

2007	60001197	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
2007	60001198	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+200 AL KM 14+400 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	5,400,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,100,000.00	100.0%	100.0%

**Mexico - Cuernavaca**

2007	60001199	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
------	----------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------	--------	--------

**QUERETARO**

2007	60001200	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
------	----------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------	--------	--------

**Mexico - Cuernavaca (Ejercicios Anteriores)**

1997	60001201	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
1997	60001202	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+200 AL KM 14+400 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	5,400,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,100,000.00	100.0%	100.0%

**Mexico - Cuernavaca (Ejercicios Anteriores)**

2007	60001203	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
2007	60001204	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+200 AL KM 14+400 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	5,400,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	4,100,000.00	100.0%	100.0%

**Coahuila - Tampico**

2007	60001205	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CALIFORNIA S.A. DE C.V.	15/03/2009	15/03/2009	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 14+000 AL KM 14+200 DEL TRAMO SAN CARLOS - TAMPICO	11,500,000.00	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	10,313,869.42	0.00	3,600,000.00	0.00	10,313,869.42	100.0%	100.0%
------	----------	--	------------	------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	------	---------------	--------	--------

















MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES  
CAMINOS Y PUERTOS FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2005 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato	Inicio	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado		Monto Programado	Estado Contratado	Anticipado	Monto Co-financiado	Extensión Autorizada	Monto Co-financiado	Bancos y/o Instituciones	Estado Contratado	Diferencia B.C.-D.E.	Ejecución de Estado de Efectivo	Avance Normativo (%)	Avance en Cuantía Pagarla
								A	B												
2000	400011407	REGISTRAR DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/05/2005	10/10/2008	10/10/2008	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	700,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0%	500,000.00
<b>CUENAVACA</b>																					
Mantenimiento - Carreteras							20,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	1,000,000.00
2700	400011201	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	21/04/2005	01/02/2008	01/02/2008	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	7,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	100.0%	2,000,000.00
<b>PAUCALLPA</b>																					
Mantenimiento - Puentes							1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.0%	900,000.00
2800	400011101	LABORATORIO DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	20/05/2005	15/11/2005	15/11/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	1,200,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	100.0%	900,000.00
3000	400011101	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	20/05/2005	20/05/2005	20/05/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	900,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0%	500,000.00
3000	400011204	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	17/05/2005	30/05/2005	30/05/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	100.0%	3,000,000.00
3000	400011101	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	25/05/2005	11/02/2005	11/02/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	100.0%	700,000.00
<b>AREQUIPA - CD Mercedes</b>																					
3100	400011101	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	02/05/2005	11/11/2005	11/11/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.0%	500,000.00
3200	400011101	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	17/05/2005	20/05/2005	20/05/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0%	300,000.00
3400	400011104	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISMO S.A. DE C.V.	18/05/2005	20/05/2005	20/05/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	100.0%	300,000.00
<b>COCHABAMBO</b>																					
Mantenimiento - Carreteras (Tramo Bala-Antares)							2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.0%	2,300,000.00
3500	400011003	PAUCALLPA INGENIERIA S.A. DE C.V.	11/05/2005	21/05/2005	21/05/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.0%	2,300,000.00
<b>VERAVAL</b>																					
Mantenimiento - Carreteras							2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100.0%	2,200,000.00
3700	400011003	CONSTRUCCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	10/05/2005	10/05/2005	10/05/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	100.0%	400,000.00
<b>Cochabamba - Venezuela</b>																					
3800	400011108	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISMO S.A. DE C.V.	02/05/2005	10/11/2005	10/11/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	2,200,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.0%	1,800,000.00
<b>La Troncal - Cochabamba (Tramo La Troncal - Isla)</b>																					
Mantenimiento - Carreteras							1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	1,000,000.00
4000	400011108	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISMO S.A. DE C.V.	02/05/2005	10/11/2005	10/11/2005	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE LA ZONA DE LA AUTOPISTA QUECHUA - HUAYLA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	100.0%	1,000,000.00

00156







PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2009 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


No. Periodo	Código de Cuenta de Cuentas	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Contratado A	Análisis de Ejecución		Monto Programado H	Ejército Autorizado C	Monto E y F menos D	Ingresos y Devoluciones	Saldo Cancelado E	Ejecución B-C-D-E	Ejecución Física de Ejecución	Avance de Ingresos (en %)	Avance de Costos Programados
			Inicio	Fin					Demorada	Acreditado									
01/01/09	400011045 500001014	INDONAVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	20/01/2009	20/02/2009	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE PUENTE DE TUBOS DE PLASTICO CON LAS INSTALACIONES DE EMERGENCIAS CON TUBOS DE CONCRETO (21+900 - 24+100) Y (24+100 - 25+100)	370,000.00	370,000.00	370,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	320,000.00					370,000.00	100.0%	
01/01/09	400011045 500001014	CONSTRUCION Y SUPERVISOR DE OBRAS S.A. DE C.V.	13/01/2009	19/11/2009	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA CONCRECIÓN DE LA ALCANTARILLA (URDIDA EN EL KM. 40.00 DEL CD)	403,722.89	403,722.89	403,722.89	48,322.26	48,322.26	48,322.26	444,072.58		9,534.47	9,534.47		444,072.58	100.0%	
02/01/09	400011020 500001020	INDONAVE Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.	09/02/2009	17/11/2009	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PROLONGACIÓN DEL MÉRMO DE LA CARRETERA EN EL KM. 20.00 DEL CD	124,177.46	124,177.46	124,177.46	18,417.75	18,417.75	18,417.75	105,000.00		15,275.33	15,275.33		105,000.00	100.0%	
<b>SUBTOTAL OBRAS</b>						<b>893,899.35</b>	<b>893,899.35</b>	<b>893,899.35</b>	<b>86,740.01</b>	<b>86,740.01</b>	<b>86,740.01</b>	<b>868,159.34</b>		<b>24,810.20</b>	<b>24,810.20</b>		<b>868,159.34</b>	<b>100.0%</b>	
<b>TOTAL</b>						<b>1,568,722.24</b>	<b>1,568,722.24</b>	<b>1,568,722.24</b>	<b>155,062.27</b>	<b>155,062.27</b>	<b>155,062.27</b>	<b>1,413,660.00</b>		<b>45,620.40</b>	<b>45,620.40</b>		<b>1,413,660.00</b>	<b>100.0%</b>	

77

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2011.

Designación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance (Millones de P.)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A.	Programado Autorizado B.	Estimado Autorizado C.	Monto en Trámite D.	Saldo Cancelado C.	Diferencia D - C + D - E	Obligado	Anticipado	Amortizado	Ejecutado y Flujo de Efectivo	Restricciones	Devoluciones	Reserva (Monto Disponible)		
Tlaxcala	\$ 16,000,000.00	\$ 22,072,000.00	\$ 22,072,000.00	\$ 22,072,000.00	\$ 22,072,000.00	\$ 22,072,000.00	\$ 12,457.00	\$ 12,457.00	\$ 5,709,422.00	\$ 5,709,422.00	\$ 5,709,422.00	\$ 399,337.00	\$ 399,337.00	\$ 205,120.00	\$ 115,502.32	100.0%	
Cubaico	\$ 10,144,150.00	\$ 24,791,100.15	\$ 24,791,100.15	\$ 24,791,100.15	\$ 24,090,552.20	\$ 24,090,552.20	\$ 192,647.95	\$ 192,647.95	\$ 6,417,686.14	\$ 5,339,207.78	\$ 26,077,957.04	\$ 940,001.00	\$ 403,590.40	\$ 403,590.40	\$ 1,587.01	100.0%	
Quintana Roo	\$ 40,761,390.10	\$ 51,243,787.21	\$ 51,243,787.21	\$ 51,243,787.21	\$ 51,243,787.03	\$ 51,243,787.03	\$ 3.18	\$ 3.18	\$ 15,375,136.16	\$ 15,375,136.16	\$ 51,243,786.63	\$ 21,129.62	\$ 21,129.62	\$ 21,129.62	\$ 1,587.01	100.0%	
Guatemala	\$ 49,650,000.00	\$ 52,206,744.35	\$ 52,206,744.35	\$ 52,206,744.35	\$ 51,000,810.37	\$ 51,000,810.37	\$ 3,205,934.01	\$ 3,205,934.01	\$ 1,072,177.47	\$ 1,072,177.47	\$ 51,900,023.37	\$ 322,140.93	\$ 322,140.93	\$ 692,740.00	\$ 156,404.00	100.0%	
Puebla	\$ 24,013,000.01	\$ 23,314,594.10	\$ 23,314,594.10	\$ 23,314,594.10	\$ 23,187,276.47	\$ 23,187,276.47	\$ 126,317.63	\$ 126,317.63	\$ 6,994,376.24	\$ 6,994,376.24	\$ 23,314,593.99	\$ 390,100.00	\$ 390,100.00	\$ 143,000.47	\$ 72,790.50	100.0%	
Coahuila de Zaragoza	\$ 34,620,200.00	\$ 34,620,270.05	\$ 34,620,270.05	\$ 34,620,270.05	\$ 34,620,119.92	\$ 34,620,119.92	\$ 150.13	\$ 150.13	\$ 10,399,091.01	\$ 10,399,091.01	\$ 34,620,121.03	\$ 529,724.11	\$ 529,724.11	\$ 20,940.94	\$ 20,940.94	100.0%	
Veracruz	\$ 30,171,000.07	\$ 32,943,311.00	\$ 32,943,311.00	\$ 32,943,311.00	\$ 32,943,272.86	\$ 32,943,272.86	\$ 38.14	\$ 38.14	\$ 8,890,542.75	\$ 8,890,542.75	\$ 32,943,272.86	\$ 98,422.17	\$ 98,422.17	\$ 96,122.17	\$ 2,300.00	100.0%	
Yucatán	\$ 4,001,070.30	\$ 4,043,445.72	\$ 4,043,445.72	\$ 4,043,445.72	\$ 4,043,444.06	\$ 4,043,444.06	\$ 1.66	\$ 1.66	\$ 1,210,303.72	\$ 1,210,303.72	\$ 4,043,444.06	\$ 300,201.44	\$ 300,201.44	\$ 210,817.53	\$ 89,383.91	100.0%	
Quintana Roo	\$ 59,002,229.77	\$ 52,564,144.23	\$ 52,564,144.23	\$ 52,564,144.23	\$ 52,563,753.05	\$ 52,563,753.05	\$ 391.18	\$ 391.18	\$ 15,775,243.27	\$ 15,775,243.27	\$ 52,563,748.05	\$ 104,517.20	\$ 104,517.20	\$ 174,433.49	\$ 47,083.71	100.0%	
Chiapas	\$ 10,590,200.14	\$ 10,245,003.01	\$ 10,245,003.01	\$ 10,245,003.01	\$ 10,245,002.99	\$ 10,245,002.99	\$ 0.02	\$ 0.02	\$ 3,252,017.20	\$ 3,252,017.20	\$ 10,245,003.00	\$ 359,370.60	\$ 359,370.60	\$ 672,410.31	\$ 47,500.04	100.0%	
Oaxaca	\$ 25,200,724.00	\$ 27,025,700.01	\$ 27,025,700.01	\$ 27,025,700.01	\$ 27,712,204.78	\$ 27,712,204.78	\$ 686,504.77	\$ 686,504.77	\$ 8,347,710.27	\$ 8,347,710.27	\$ 27,025,695.97	\$ 1,310,895.00	\$ 1,310,895.00	\$ 1,143,404.00	\$ 2,073.31	100.0%	
<b>TOTAL</b>	\$ 371,000,144.00	\$ 390,257,607.71	\$ 390,257,607.71	\$ 390,257,607.71	\$ 388,541,377.12	\$ 388,541,377.12	\$ 1,718,767.59	\$ 1,718,767.59	\$ 87,564,796.41	\$ 87,564,796.41	\$ 390,240,662.20	\$ 5,417,226.51	\$ 4,339,492.24	\$ 4,339,492.24	\$ 423,216.47	\$ 106,526.10	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)	
Veracruz	100.0%
Puebla	100.0%
Coahuila de Zaragoza	100.0%
Yucatán	100.0%
Quintana Roo	100.0%
Chiapas	100.0%
Oaxaca	100.0%
Tlaxcala	100.0%
Cubaico	100.0%
Quintana Roo	100.0%
Guatemala	100.0%
Veracruz	100.0%
Puebla	100.0%
Coahuila de Zaragoza	100.0%
Yucatán	100.0%
Quintana Roo	100.0%
Chiapas	100.0%
Oaxaca	100.0%

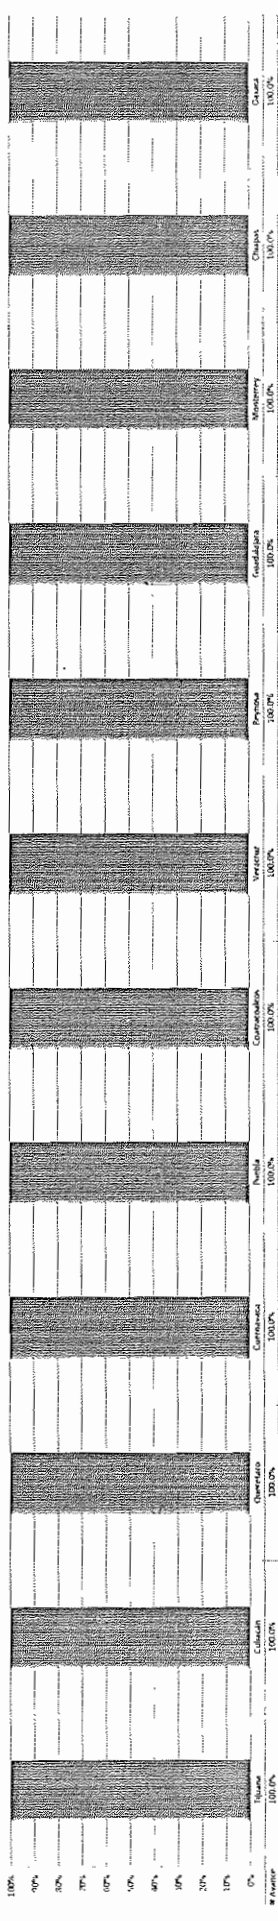



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Contrato No.	Empresa	Periodo de Contrato (Inicio-Fin)	Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Aprobado Modificado	Monto Comprometido A	Anticipo	Anticipo Otorgado	Beneficio Programado D	Estado Actualizado C	Noviembre D	Resolución de Distribución	Valor Comprometido E	Diferencial D-E	Capacidad Física del Contrato	Avance Operativo (%)	Avance Físico	Avance de Cuenta Pagadora
2014	48081018	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 3,148,797.95	\$ 3,116,948.02	\$ 3,116,948.02	\$	\$	\$ 3,116,948.02	\$ 3,116,948.02	\$	\$	\$ 3,116,948.02	\$	\$ 3,116,948.02	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081019	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 1,790,826.95	\$ 1,790,826.95	\$ 1,790,826.95	\$	\$	\$ 1,790,826.95	\$ 1,790,826.95	\$	\$	\$ 1,790,826.95	\$	\$ 1,790,826.95	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081020	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 2,951,132.27	\$ 2,951,132.27	\$ 2,951,132.27	\$	\$	\$ 2,951,132.27	\$ 2,951,132.27	\$	\$	\$ 2,951,132.27	\$	\$ 2,951,132.27	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081021	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 4,309,485.45	\$ 4,309,485.45	\$ 4,309,485.45	\$	\$	\$ 4,309,485.45	\$ 4,309,485.45	\$	\$	\$ 4,309,485.45	\$	\$ 4,309,485.45	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081022	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 8,200,427.00	\$ 8,200,427.00	\$ 8,200,427.00	\$	\$	\$ 8,200,427.00	\$ 8,200,427.00	\$	\$	\$ 8,200,427.00	\$	\$ 8,200,427.00	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081023	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 5,037,482.05	\$ 5,037,482.05	\$ 5,037,482.05	\$	\$	\$ 5,037,482.05	\$ 5,037,482.05	\$	\$	\$ 5,037,482.05	\$	\$ 5,037,482.05	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081024	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 6,969,925.50	\$ 6,969,925.50	\$ 6,969,925.50	\$	\$	\$ 6,969,925.50	\$ 6,969,925.50	\$	\$	\$ 6,969,925.50	\$	\$ 6,969,925.50	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081025	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 7,499,519.91	\$ 7,499,519.91	\$ 7,499,519.91	\$	\$	\$ 7,499,519.91	\$ 7,499,519.91	\$	\$	\$ 7,499,519.91	\$	\$ 7,499,519.91	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081026	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 2,227,884.82	\$ 2,227,884.82	\$ 2,227,884.82	\$	\$	\$ 2,227,884.82	\$ 2,227,884.82	\$	\$	\$ 2,227,884.82	\$	\$ 2,227,884.82	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081027	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 2,499,729.11	\$ 2,499,729.11	\$ 2,499,729.11	\$	\$	\$ 2,499,729.11	\$ 2,499,729.11	\$	\$	\$ 2,499,729.11	\$	\$ 2,499,729.11	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081028	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 6,784,899.39	\$ 6,784,899.39	\$ 6,784,899.39	\$	\$	\$ 6,784,899.39	\$ 6,784,899.39	\$	\$	\$ 6,784,899.39	\$	\$ 6,784,899.39	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081029	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 2,994,432.16	\$ 2,994,432.16	\$ 2,994,432.16	\$	\$	\$ 2,994,432.16	\$ 2,994,432.16	\$	\$	\$ 2,994,432.16	\$	\$ 2,994,432.16	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081030	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$	\$	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$	\$	\$ 5,000,000.00	\$	\$ 5,000,000.00	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081031	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 1,947,954.26	\$ 1,947,954.26	\$ 1,947,954.26	\$	\$	\$ 1,947,954.26	\$ 1,947,954.26	\$	\$	\$ 1,947,954.26	\$	\$ 1,947,954.26	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081032	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 6,270,971.91	\$ 6,270,971.91	\$ 6,270,971.91	\$	\$	\$ 6,270,971.91	\$ 6,270,971.91	\$	\$	\$ 6,270,971.91	\$	\$ 6,270,971.91	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081033	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 6,481,271.95	\$ 6,481,271.95	\$ 6,481,271.95	\$	\$	\$ 6,481,271.95	\$ 6,481,271.95	\$	\$	\$ 6,481,271.95	\$	\$ 6,481,271.95	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081034	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 4,286,954.49	\$ 4,286,954.49	\$ 4,286,954.49	\$	\$	\$ 4,286,954.49	\$ 4,286,954.49	\$	\$	\$ 4,286,954.49	\$	\$ 4,286,954.49	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081035	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 2,831,822.71	\$ 2,831,822.71	\$ 2,831,822.71	\$	\$	\$ 2,831,822.71	\$ 2,831,822.71	\$	\$	\$ 2,831,822.71	\$	\$ 2,831,822.71	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081036	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 3,599,311.93	\$ 3,599,311.93	\$ 3,599,311.93	\$	\$	\$ 3,599,311.93	\$ 3,599,311.93	\$	\$	\$ 3,599,311.93	\$	\$ 3,599,311.93	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081037	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 4,849,449.72	\$ 4,849,449.72	\$ 4,849,449.72	\$	\$	\$ 4,849,449.72	\$ 4,849,449.72	\$	\$	\$ 4,849,449.72	\$	\$ 4,849,449.72	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081038	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 6,076,959.70	\$ 6,076,959.70	\$ 6,076,959.70	\$	\$	\$ 6,076,959.70	\$ 6,076,959.70	\$	\$	\$ 6,076,959.70	\$	\$ 6,076,959.70	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081039	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 2,961,179.97	\$ 2,961,179.97	\$ 2,961,179.97	\$	\$	\$ 2,961,179.97	\$ 2,961,179.97	\$	\$	\$ 2,961,179.97	\$	\$ 2,961,179.97	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081040	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 3,303,956.05	\$ 3,303,956.05	\$ 3,303,956.05	\$	\$	\$ 3,303,956.05	\$ 3,303,956.05	\$	\$	\$ 3,303,956.05	\$	\$ 3,303,956.05	100.0%	100.0%	100.0%
2014	48081041	ING. CONSULTORIA Y SERVICIOS CONEXOS	31/03/2010 - 31/03/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TUNJA - GUANABACO AL KM 12+000	\$ 11,276,021.11	\$ 11,276,021.11	\$ 11,276,021.11	\$	\$	\$ 11,276,021.11	\$ 11,276,021.11	\$	\$	\$ 11,276,021.11	\$	\$ 11,276,021.11	100.0%	100.0%	100.0%





Fecha de corte: 31 de diciembre de 2012

Descripción	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance Financiero (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Autorizado Q	Estimado Autorizado C	Monto E In Tendido D	Saldo Contratado E	Diferencia B-C-D-E	Anticipos Despejados	Anticipos Amortizados	Credito y Flujo de Efectivo por Efectivo	Reservaciones	Devoluciones	Devoluciones - Devoluciones	Avance de Cuenta Pasados	
Tierras	\$ 2,277,004.01	\$ 2,180,000.00	\$ 2,180,000.00	\$ 2,180,000.00	\$ 1,023,105.05	\$	\$ 205,004.00	\$	\$ 210,000.00	\$	\$ 1,320,105.05	\$ 0,004.70	\$ 0,000.00	\$ 2,500.70	\$ 2,500.70	100.0%
Calles	\$ 2,177,298.71	\$ 2,185,000.00	\$ 2,185,000.00	\$ 2,185,000.00	\$ 2,494,007.92	\$	\$ 250,000.00	\$	\$ 220,000.00	\$	\$ 2,564,007.92	\$ 65,000.00	\$ 50,000.00	\$ 9,001.16	\$ 9,001.16	100.0%
Quemados	\$ 5,011,107.19	\$ 4,077,320.00	\$ 4,077,320.00	\$ 4,077,320.00	\$ 4,077,320.00	\$	\$ 0.00	\$	\$ 407,320.00	\$	\$ 4,077,320.00	\$	\$	\$	\$	100.0%
Cuencuena	\$ 5,956,000.75	\$ 5,175,010.40	\$ 5,175,010.40	\$ 5,175,010.40	\$ 5,175,294.76	\$	\$ 30,284.36	\$	\$ 247,000.00	\$	\$ 5,117,294.76	\$ 5,792.38	\$ 2,154.07	\$ 0,302.00	\$ 27,310.30	100.0%
Puebla	\$ 2,063,000.75	\$ 2,470,000.00	\$ 2,470,000.00	\$ 2,470,000.00	\$ 2,107,208.40	\$	\$ 362,791.60	\$	\$ 445,137.00	\$	\$ 4,356,143.24	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	100.0%
Quetzaltenango	\$ 4,375,649.99	\$ 4,451,370.37	\$ 4,451,370.37	\$ 4,451,370.37	\$ 4,306,043.24	\$	\$ 145,327.13	\$	\$ 352,441.00	\$	\$ 3,257,162.81	\$ 1,024.20	\$ 0.00	\$ 3,247.00	\$ 3,247.00	100.0%
Veracruz	\$ 3,020,000.00	\$ 3,024,419.27	\$ 3,024,419.27	\$ 3,024,419.27	\$ 3,207,162.81	\$	\$ 182,743.54	\$	\$ 307,237.16	\$	\$ 3,060,202.08	\$	\$	\$	\$	100.0%
República	\$ 903,307.00	\$ 837,000.00	\$ 837,000.00	\$ 837,000.00	\$ 830,778.99	\$	\$ 6,221.01	\$	\$ 83,700.35	\$	\$ 820,778.99	\$	\$	\$	\$	100.0%
Guatemala	\$ 7,960,337.57	\$ 3,802,020.55	\$ 3,802,020.55	\$ 3,802,020.55	\$ 3,000,202.94	\$	\$ 801,817.61	\$	\$ 307,237.16	\$	\$ 3,800,202.08	\$	\$	\$	\$	100.0%
Montejoy	\$ 1,055,045.17	\$ 3,040,001.20	\$ 3,040,001.20	\$ 3,040,001.20	\$ 3,749,270.25	\$	\$ 709,269.05	\$	\$ 300,100.00	\$	\$ 3,749,270.25	\$ 0,300.00	\$ 7,251.41	\$	\$	100.0%
Chiquis	\$ 1,310,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,247,314.45	\$	\$ 47,314.45	\$	\$ 120,000.00	\$	\$ 1,247,314.45	\$	\$	\$	\$	100.0%
Chusca	\$ 3,020,000.00	\$ 3,395,000.00	\$ 3,395,000.00	\$ 3,395,000.00	\$ 3,395,000.00	\$	\$	\$	\$ 330,000.00	\$	\$ 3,420,227.51	\$ 9,227.51	\$ 4,704.50	\$	\$ 41,004.07	100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 45,270,837.26	\$ 38,200,270.42	\$ 38,200,270.42	\$ 38,200,270.42	\$ 37,065,035.54	\$	\$ 1,135,234.88	\$	\$ 3,186,834.14	\$	\$ 37,100,070.21	\$ 200,000.00	\$ 114,118.42	\$ 100,370.27	\$ 41,004.07	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

Descripción	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Tierras	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Calles	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Quemados	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Cuencuena	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Puebla	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Quetzaltenango	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Veracruz	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
República	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Guatemala	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Montejoy	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Chiquis	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Chusca	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2000 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

No. Folio	Cuadro No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fecha	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Comprobado	Anulado	Chargado	Monto Programado B	Ejecutado Aprobado C	Monto En Tercera D	Impugnaciones Desvirtuadas	Bando Comprobado E	Diferencia B-C+D-E	Ejecutado al Fin de Ejercicio	Avance Programado (%)	Avance Realizado (%)
<b>TEJUANÁ</b>																			
<b>Uruapan - Tzucuzco</b>																			
12001	400011528	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	02/03/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 9+000 AL KM 9+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	1,600,000.00	600,000.00	600,000.00	0	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	600,000.00	100.0%	100.0%
<b>La Romana - Tzucuzco</b>																			
20001	400011929	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	03/03/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 11+000 AL KM 11+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	800,000.00	720,000.00	720,000.00	0	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0	0	0	720,000.00	100.0%	100.0%	
<b>Libramiento Ixmiquilpan</b>																			
30001	400011218	PROFESIONALES EN CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	20/04/2009	19/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	10,000,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0	0	0	2,400,000.00	100.0%	100.0%	
32001	400011392	CONSTRUCCIONES Y ACEROS HERR S.A. DE C.V.	01/11/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 9+000 AL KM 9+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0	0	0	3,000,000.00	100.0%	100.0%	
<b>CUERNAVACA</b>																			
<b>Edificios - Cuernavaca</b>																			
40001	400011716	CONSTRUCCIONES Y ACEROS HERR S.A. DE C.V.	01/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	4,000,000.00	740,000.00	740,000.00	0	740,000.00	740,000.00	740,000.00	0	0	0	740,000.00	100.0%	100.0%	
50001	400011719	CONSTRUCCIONES Y ACEROS HERR S.A. DE C.V.	01/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	612,000.00	490,000.00	490,000.00	0	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0	0	0	490,000.00	100.0%	100.0%	
60001	400011727	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	17/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	3,000,000.00	490,000.00	490,000.00	0	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0	0	0	490,000.00	100.0%	100.0%	
<b>Merida - Culiacan</b>																			
70001	400011710	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	01/02/2009	09/01/2009	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN OBTENCION DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ - CUERNAVACA DEL KM 9+000 AL KM 9+300	5,000,000.00	940,000.00	940,000.00	0	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0	0	0	940,000.00	100.0%	100.0%	
80001	400011737	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	17/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	3,000,000.00	540,000.00	540,000.00	0	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0	0	0	540,000.00	100.0%	100.0%	
<b>QUERETARO</b>																			
<b>Libramiento Nueva de Guzman</b>																			
90001	400011883	CONSTRUCCIONES Y ACEROS HERR S.A. DE C.V.	11/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	2,000,000.00	900,000.00	900,000.00	0	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0	0	0	900,000.00	100.0%	100.0%	
<b>Chetumal - Tuxtla</b>																			
10001	400011909	CONSTRUCCIONES Y ACEROS HERR S.A. DE C.V.	01/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	1,300,000.00	940,000.00	940,000.00	0	940,000.00	940,000.00	940,000.00	0	0	0	940,000.00	100.0%	100.0%	
<b>México - Queretaro</b>																			
12001	400011928	CLAYTON S.A. DE C.V.	01/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	
14001	400011928	OBRA INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	01/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	0	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	
<b>Durango - Durango</b>																			
15001	400011937	INTERMEDIAL S.A. DE C.V.	01/02/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 0+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	1,300,000.00	970,000.00	970,000.00	0	970,000.00	970,000.00	970,000.00	0	0	0	970,000.00	100.0%	100.0%	
<b>CIERRE GENERAL</b>																			
						27,770,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0	2,410,000.00	2,410,000.00	2,410,000.00	0	0	0	2,410,000.00	100.0%	100.0%	
<b>México - Cuernavaca</b>																			
16001	400011774	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	02/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 9+000 AL KM 9+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	760,000.00	540,000.00	540,000.00	0	540,000.00	540,000.00	540,000.00	0	0	0	540,000.00	100.0%	100.0%	
17001	400011774	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	02/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 9+000 AL KM 9+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	200,000.00	490,000.00	490,000.00	0	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0	0	0	490,000.00	100.0%	100.0%	
<b>Libramiento Cuernavaca</b>																			
18001	400011774	INDUSTRIAS AERONAUTICAS S.A. DE C.V.	02/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 9+000 AL KM 9+300 DE LA AUTOPISTA TEPIC-TEJUANÁ	200,000.00	490,000.00	490,000.00	0	490,000.00	490,000.00	490,000.00	0	0	0	490,000.00	100.0%	100.0%	

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2009 DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Programado	Monto Efectivamente Ejecutado	Monto de Tránsito	Ingresos y Servicios Conexos	Subvencionado	Observado	Ejecución a Fines de Ejercicio	Avance Operativo (%)
			Inicio	Fin											
<b>Cuaternaria - Acapulco</b>															
1526A	400011776 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	1,170,340.73	1,199,320.42	1,199,320.42	1,199,320.42					100.0%	
1526B	400011776 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS OBRAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	882,349.47	1,199,320.42	1,199,320.42	1,199,320.42					100.0%	
2223A	400011842 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	487,992.08	487,992.08	487,992.08	487,992.08					100.0%	
2126A	400011774 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	425,147.28	425,147.28	425,147.28	425,147.28					100.0%	
2223B	400011842 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	702,139.99	702,139.99	702,139.99	702,139.99					100.0%	
<b>Puntos de Venta - Iguala</b>															
2526A	400011778 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	305,463.06	305,463.06	305,463.06	305,463.06					100.0%	
2326A	400011774 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	644,139.01	644,139.01	644,139.01	644,139.01					100.0%	
<b>Zacapano - Bordo Viejo</b>															
2526B	400011778 500003058	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	278,452.26	278,452.26	278,452.26	278,452.26					100.0%	
<b>PUEBLA</b>															
<b>Mexico - Puebla</b>															
2726A	400011826 500003078	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	01/04/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	507,992.08	507,992.08	507,992.08	507,992.08					100.0%	
2526B	400011826 500003078	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	01/04/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	647,514.26	647,514.26	647,514.26	647,514.26					100.0%	
<b>Veracruz - Acapulco</b>															
2726B	400011826 500003078	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	01/04/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	672,594.49	672,594.49	672,594.49	672,594.49					100.0%	
<b>Guatemala - Compuche</b>															
2126B	400011826 500003078	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	01/04/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	604,303.02	604,303.02	604,303.02	604,303.02					100.0%	
<b>Chiapas - Acapulco</b>															
2526B	400011817 500003078	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	687,446.42	687,446.42	687,446.42	687,446.42					100.0%	
<b>Apaxtlan - Cuernavaca</b>															
2226A	400011818 500003078	CONSTRUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA	03/02/2009	17/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	416,703.16	416,703.16	416,703.16	416,703.16					100.0%	



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MEJOR 2009 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA




No. Papeles	Cuenta No.	Empresa	Periodo de Control		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Obligado	Anticipo	Amortizado	Nuevo Programa B	Estimado Acreditado D	Monto En T Transferido	Referencias - Emendaciones	Estado Cuenta E	Diferencia LC-CLT	Unidad o Fideicomiso de Ejecución	Avance Financiero (%)	Avance en Cuenta Pagadero
			Inicio	Fin																
<b>MONTERREY</b>																				
Municipio - Nuevo Laredo																				
450011508	450000487	CONSTRUCCIONES Y ADORNOS S.A. DE C.V.	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE NUEVO LAREDO DEL KM 221.000 AL KM 145+000	1,020,000.00	923,463.76	923,463.76	34,831.00	34,831.00	905,632.76	903,493.76	903,493.76						90.0%	903,493.76
450011508	300000727	MONICA ALJAMBRA FUERTI TORRES	09/04/2009	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE NUEVO LAREDO DEL KM 179+000 Y DEL TRAMO LA CIGUELA - MANTENIMIENTO MEJOR AL KM 200 AL KM 200+000	705,993.41	686,300.23	686,300.23	69,693.02	69,693.02	616,607.21	616,607.21	616,607.21						87.3%	616,607.21
<b>Coahuila - Ojo de Chihuahua</b>																				
450011502	450001192	MONICA ALJAMBRA FUERTI TORRES	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DEL KM 1499 AL KM 7+000	364,070.02	351,007.94	351,007.94	33,069.71	33,069.71	327,938.23	327,938.23	327,938.23						89.8%	327,938.23
<b>Coahuila - Parral - Comalapa</b>																				
4124N	450011647	RAIL MONTE CARMELO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DEL KM 2409 AL KM 181+000	1,490,995.40	789,791.79	789,791.79	78,979.15	78,979.15	710,812.64	710,812.64	710,812.64						54.3%	710,812.64
<b>Coahuila - Reynosa</b>																				
4500N	450011577	CONSTRUCCIONES Y ADORNOS S.A. DE C.V.	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DEL KM 2049 AL KM 197+000	1,316,942.03	762,734.44	762,734.44	75,271.46	75,271.46	587,462.58	587,462.58	587,462.58						44.6%	587,462.58
<b>Puerto Mexico - Cuernavaca</b>																				
4500N	450011507	MONICA ALJAMBRA FUERTI TORRES	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE COAHUILA DEL KM 2049 AL KM 197+000	364,175.32	331,843.29	331,843.29	33,144.29	33,144.29	328,700.00	328,700.00	328,700.00						89.7%	328,700.00
<b>QUERETARO</b>																				
Los Choyeros - San Juan - Ocampo																				
4500N	450011504	RAIL MONTE CARMELO Y COMPANIA S.A. DE C.V.	01/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERETARO DEL KM 2049 AL KM 197+000	1,310,028.00	1,269,903.93	1,269,903.93	120,000.00	120,000.00	1,149,903.93	1,149,903.93	1,149,903.93						91.6%	1,149,903.93
<b>QUERETARO - Ocampo</b>																				
4500N	450011507	GALLOS S.A. DE C.V.	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERETARO DEL KM 120+000 AL KM 140+000	1,739,400.00	1,719,071.97	1,719,071.97	171,000.00	171,000.00	1,548,071.97	1,548,071.97	1,548,071.97						95.3%	1,548,071.97
4500N	450011507	ROCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	02/02/2008	15/02/2010	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MEJOR Y MANTENIMIENTO MEJOR EN LOS TRAMOS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DEL NOROCCIDENTE DEL ESTADO DE QUERETARO DEL KM 120+000 AL KM 140+000	1,269,900.00	1,479,021.17	1,479,021.17	167,000.00	167,000.00	1,312,021.17	1,312,021.17	1,312,021.17						103.3%	1,312,021.17
<b>TOTAL</b>																				
						4,208,030.00	3,848,030.00	3,848,030.00	344,000.00	344,000.00	3,504,030.00	3,504,030.00	3,504,030.00						88.0%	3,504,030.00



Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2017

Delegación	Monto Original Autorizado	Monto Reautorizado Modificado	Monto Contratado A	Programas Acumulados B	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Artículo		Ejército y Fijo de Dinero	Revoluciones	Deducciones	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Cuentas Pagadas	Avance Financiero (%)
								Divulgado	Amortizado						
Tijuana	\$ 30,000,000.00	\$ 21,424,252.30	\$ 21,424,252.30	\$ 21,424,252.30	\$ 20,270,521.03	\$ 1,153,730.88		\$ 2,142,425.23	\$ 2,142,425.23	\$ 20,270,521.03	\$ 272,157.48	\$ 105,259.03			100.0%
Culiacán															0.0%
Querétaro		\$ 12,845,602.41	\$ 12,845,602.41	\$ 12,845,602.41	\$ 12,751,526.22	\$ 94,076.19		\$ 3,053,089.73	\$ 3,053,089.73	\$ 12,751,526.22			\$ 182,421.30		100.0%
Guerrero	\$ 6,950,000.00	\$ 3,223,091.30	\$ 3,223,091.30	\$ 3,223,091.30	\$ 3,223,091.31	\$ 1,799.55		\$ 523,154.44	\$ 523,154.44	\$ 3,221,911.01	\$ 209,979.60	\$ 171,810.74			100.0%
Puebla	\$ 111,150,000.00	\$ 81,140,240.78	\$ 81,140,240.78	\$ 81,140,240.78	\$ 70,201,401.42	\$ 4,970,039.38		\$ 19,116,518.47	\$ 19,116,518.47	\$ 76,201,401.42	\$ 8,806,679.18	\$ 6,169,400.73	\$ 1,732,703.73		100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 1,060,000.00														0.0%
Veracruz															0.0%
Reynosa	\$ 14,010,057.00	\$ 14,030,071.82	\$ 14,030,071.82	\$ 14,030,071.82	\$ 14,029,240.07	\$ 825.75		\$ 4,389,021.54	\$ 4,389,021.54	\$ 14,029,240.07	\$ 22,012.73	\$ 11,777.07	\$ 11,365.78		100.0%
Guadaluajara	\$ 22,029,814.00	\$ 209,417.11	\$ 209,417.11	\$ 209,417.11	\$ 271,248.96	\$ 28,107.12		\$ 89,825.13	\$ 89,825.13	\$ 271,248.96	\$ 2,539.02	\$ 2,559.02			100.0%
Morelia	\$ 1,000,000.00														0.0%
Chihuahua	\$ 3,250,000.00	\$ 4,204,200.09	\$ 4,204,200.09	\$ 4,204,200.09	\$ 4,231,676.50	\$ 72,531.53		\$ 1,208,282.43	\$ 1,208,282.43	\$ 4,231,676.50					100.0%
Oaxaca															0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 190,997,871.90</b>	<b>\$ 137,856,883.99</b>	<b>\$ 137,856,883.99</b>	<b>\$ 137,856,883.99</b>	<b>\$ 131,627,533.75</b>	<b>\$ 6,229,350.16</b>		<b>\$ 31,402,887.87</b>	<b>\$ 31,402,887.87</b>	<b>\$ 131,627,533.75</b>	<b>\$ -8,486,386.10</b>	<b>\$ 6,509,864.17</b>	<b>\$ 1,067,080.89</b>		<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

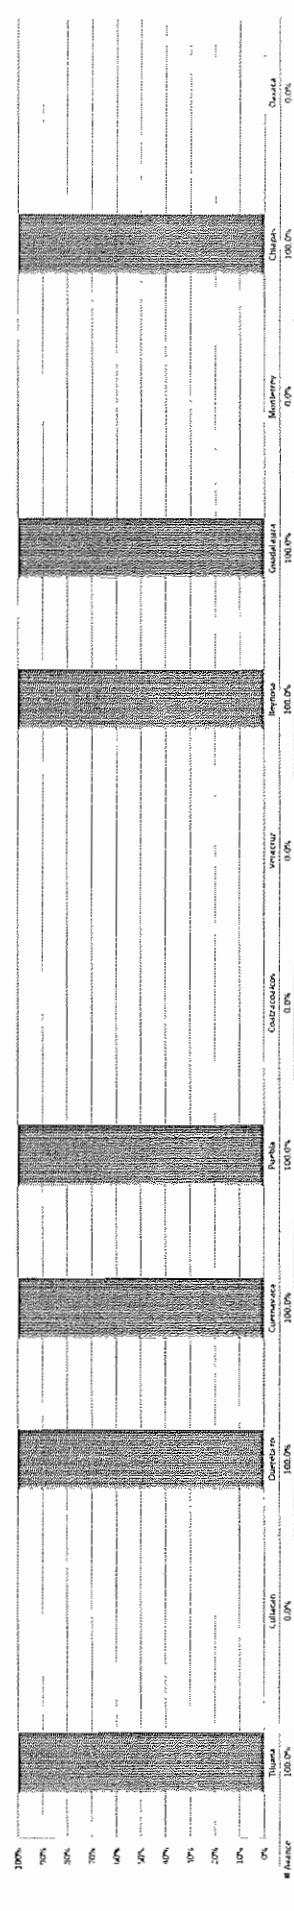






Fecha de corte: 30 de noviembre de 2011

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Reserva financiera (%)						
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Continuada A	Programado Asumido D	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Anticipo Otorgado		Anticipo Acreditado	Ejecido e Fido de Efectivo	Reducciones	Devoluciones	Reservaciones Devoluciones	Ajustes de Cuenta Pagados
Tijuana															0.0%
Culiacan															0.0%
Guatemala	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17	\$ 640,217.17					100.0%
Cuernavaca	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85	\$ 130,798.85					100.0%
Puebla	\$ 5,350,000.00	\$ 7,951,957.08	\$ 7,901,067.08	\$ 7,901,067.08	\$ 7,870,244.00	\$ 22,712.08		\$ 017,723.08	\$ 017,723.08	\$ 7,870,244.00	\$ 30,745.31	\$ 19,709.87	\$ 30,016.01		100.0%
Coahuila de Zaragoza															0.0%
Veracruz	\$ 710,052.85	\$ 432,110.00	\$ 432,110.00	\$ 432,110.00	\$ 429,785.03	\$ 5,324.40		\$ 43,211.01	\$ 43,211.01	\$ 420,785.63	\$ 161.71				100.0%
Guadaluajara	\$ 1,131,490.75														0.0%
Monterrey															0.0%
Chihuahua	\$ 140,000.00	\$ 409,410.17	\$ 409,410.17	\$ 409,410.17	\$ 409,410.17			\$ 40,041.02	\$ 40,041.02	\$ 400,410.17					100.0%
Chalisco															0.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 7,820,640.00	\$ 9,500,403.33	\$ 9,479,403.33	\$ 9,400,403.33	\$ 9,452,406.72	\$ 29,036.61		\$ 785,026.03	\$ 785,026.03	\$ 9,492,466.72	\$ 36,937.02	\$ 49,703.97	\$ 30,318.01		100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

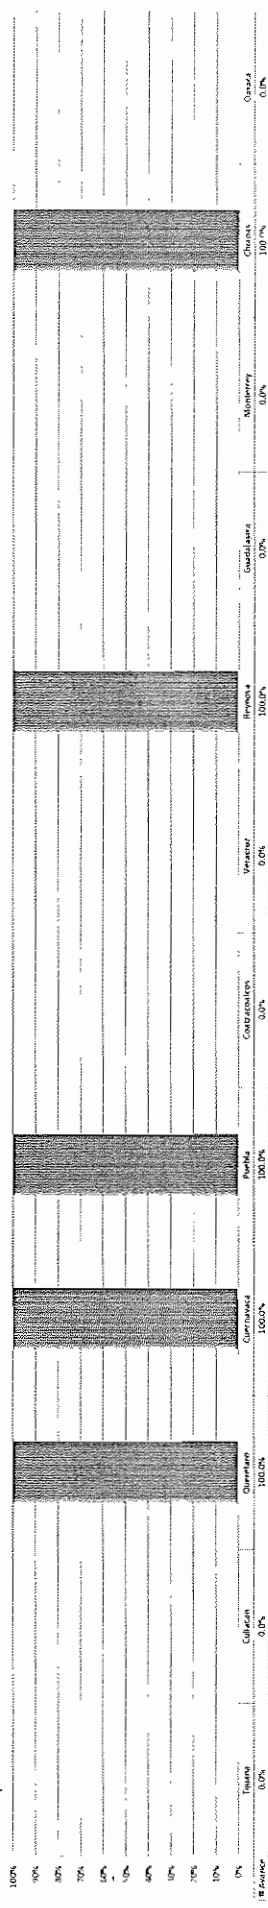

000 0171








Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012.

De Ingestión	Monto Original Autorizado		Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A	Programación Acumulada B	Ejecución Acumulada C	Monto C. T. Ingresos D	Saldo Cancelado E	Diferencia D. C. D. E.	Anticipo		Ejecución y Fideicomisos de Factores	Restricciones	Devoluciones	Reintegraciones	Aportes de Cobros Programados	Área de Ejecución (%)
	Cometido	Administrado															
Tijuana	\$ 7,490,592.76	\$ 7,383,887.07	\$ 7,383,887.07	\$ 7,383,887.07	\$ 7,383,887.07	\$ 7,383,887.07	\$ 65.23	\$	\$	\$ 2,216,698.30	\$ 2,216,698.30	\$ 7,383,887.07	\$ 170,916.85	\$ 110,919.05	\$ 16,487.07	\$	100.0%
Culiacán	\$ 2,912,013.40	\$ 3,178,701.20	\$ 3,178,701.20	\$ 3,178,701.20	\$ 3,178,701.20	\$ 3,178,701.20		\$	\$	\$ 663,810.30	\$ 663,810.30	\$ 3,178,701.20	\$ 4,890.20	\$ 4,890.20	\$	\$	100.0%
Cuernavaca	\$ 23,662,188.27	\$ 19,423,684.68	\$ 19,423,684.68	\$ 19,423,684.68	\$ 19,423,684.68	\$ 19,423,684.68	0.13	\$	\$	\$ 5,827,105.42	\$ 5,827,105.42	\$ 19,423,684.68	\$ 19,022.93	\$ 19,022.93	\$ 32,478.00	\$	100.0%
Comarcas	\$ 9,064,130.75	\$ 8,862,718.06	\$ 8,862,718.06	\$ 8,862,718.06	\$ 8,862,718.06	\$ 8,862,718.06	74.32	\$	\$	\$	\$ 8,862,718.06	\$ 8,862,718.06	\$ 657,827.98	\$ 699,201.50	\$	\$	100.0%
Puebla	\$ 6,196,339.75	\$ 5,789,304.46	\$ 5,789,304.46	\$ 5,789,304.46	\$ 5,789,304.46	\$ 5,789,304.46	259.674.09	\$	\$	\$ 1,730,791.20	\$ 1,730,791.20	\$ 5,518,529.47	\$ 780,433.93	\$ 754,133.62	\$ 46,756.99	\$	100.0%
Coahuila	\$ 14,756,248.19	\$ 14,710,354.06	\$ 14,710,354.06	\$ 14,710,354.06	\$ 14,710,354.06	\$ 14,710,354.06	13.88	\$	\$	\$ 4,413,109.30	\$ 4,413,109.30	\$ 14,710,354.06	\$ 13,496,130.20	\$ 161,645.10	\$ 20,200.07	\$	100.0%
Veracruz	\$ 14,823,989.25	\$ 13,496,131.77	\$ 13,496,131.77	\$ 13,496,131.77	\$ 13,496,131.77	\$ 13,496,131.77	1.51	\$	\$	\$ 4,848,829.92	\$ 4,848,829.92	\$ 13,496,131.77	\$ 161,645.10	\$ 161,645.10	\$	\$	100.0%
Yucatán	\$ 7,659,833.09	\$ 7,018,919.13	\$ 7,018,919.13	\$ 7,018,919.13	\$ 7,018,919.13	\$ 7,018,919.13	18.995.09	\$	\$	\$ 2,105,675.74	\$ 2,105,675.74	\$ 7,018,919.13	\$ 59,770.88	\$ 59,300.70	\$ 20,022.59	\$	100.0%
Quintana Roo	\$ 19,351,349.96	\$ 8,510,879.56	\$ 8,510,879.56	\$ 8,510,879.56	\$ 8,510,879.56	\$ 8,510,879.56	20.12	\$	\$	\$ 2,555,091.10	\$ 2,555,091.10	\$ 8,510,879.56	\$ 73,106.00	\$ 73,106.00	\$ 994.59	\$ 10,320.03	100.0%
Morelos	\$ 7,420,070.99	\$ 7,081,879.04	\$ 7,081,879.04	\$ 7,081,879.04	\$ 7,081,879.04	\$ 7,081,879.04	9.56	\$	\$	\$ 2,124,583.98	\$ 2,124,583.98	\$ 7,081,879.04	\$ 513,030.91	\$ 431,818.26	\$ 193,464.20	\$	100.0%
Chiapas	\$ 2,596,888.95	\$ 2,020,477.29	\$ 2,020,477.29	\$ 2,020,477.29	\$ 2,020,477.29	\$ 2,020,477.29	1.49	\$	\$	\$ 688,143.19	\$ 688,143.19	\$ 2,020,477.29	\$ 150,886.92	\$ 150,886.92	\$	\$	100.0%
Oaxaca	\$ 2,160,230.03	\$ 3,120,134.31	\$ 3,120,134.31	\$ 3,120,134.31	\$ 3,120,134.31	\$ 3,120,134.31	2,003.00	\$	\$	\$ 308,440.29	\$ 308,440.29	\$ 3,120,134.31	\$ 10,278.23	\$ 10,278.23	\$ 30,270.23	\$	100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 108,252,833.47	\$ 100,536,164.06	\$ 100,536,164.06	\$ 100,536,164.06	\$ 100,536,164.06	\$ 100,536,164.06	\$ 271,564.41	\$	\$	\$ 27,520,023.82	\$ 27,520,023.82	\$ 100,274,079.48	\$ 2,186,916.90	\$ 2,064,791.87	\$ 217,337.99	\$ 16,322.83	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

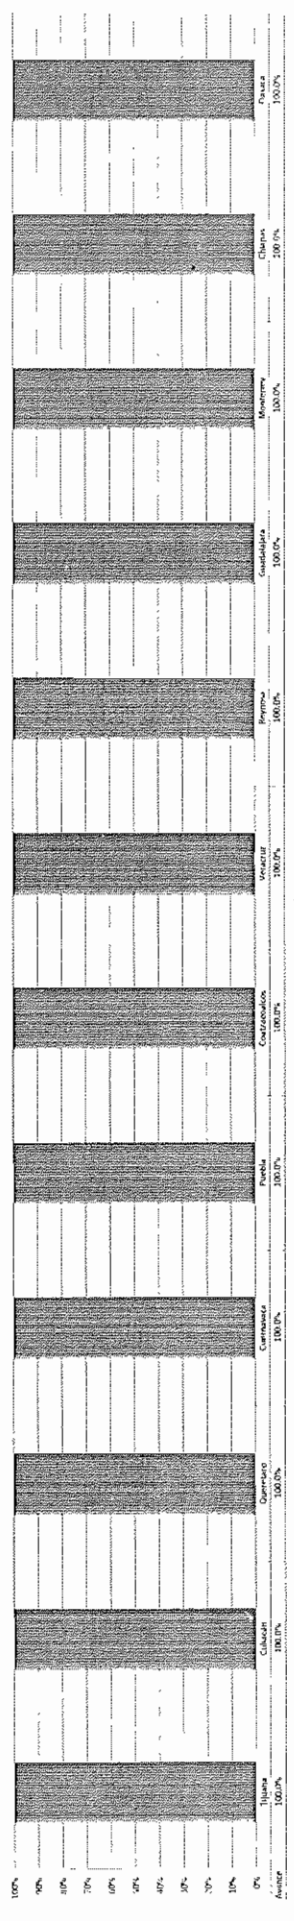








Fecha de corte: 30 de septiembre de 2017

De Ingresos	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Ingresos Diferencia (%)						
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Beneficiario	Monto Contraído A	Programa Acumulado B	Estimado Ejecutado C	Monto en Trámite D	Gastos Cumplidos E	Diferencia B - C - D - E		Completado	Anticipado	Revisado	Devengado	Revisado - Devengado	Alfabeto de Cuentas Pagables
Tijuana															0.0%
Culiacán															0.0%
Querétaro	\$ 31,568,000.00	\$ 7,727,153.92	\$ 6,727,153.92	\$ 6,727,153.92	\$ 6,704,472.28	\$ 7,727,153.92	\$ 22,861.04	\$ 1,762,358.33	\$ 1,762,358.33	\$ 4,704,472.28					100.0%
Quintana Roo	\$ 15,000,000.00	\$ 7,813,159.85	\$ 7,813,159.85	\$ 7,813,159.85	\$ 7,813,059.97	\$ 7,813,159.85	\$ 100.18	\$ 1,765,015.50	\$ 1,765,015.50	\$ 7,813,059.97	\$ 3,207.56				100.0%
Puebla	\$ 2,050,000.00	\$ 2,015,847.47	\$ 2,015,847.47	\$ 2,015,847.47	\$ 2,015,847.47	\$ 2,015,847.47		\$ 201,504.74	\$ 201,504.74	\$ 2,015,847.47					100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 1,319,000.00	\$ 978,379.50	\$ 978,379.50	\$ 978,379.50	\$ 978,097.25	\$ 978,097.25	\$ 322.74	\$ 153,899.56	\$ 153,899.56	\$ 978,097.25	\$ 12,100.03				100.0%
Veracruz	\$ 164,400,000.00	\$ 108,719,150.25	\$ 108,719,150.25	\$ 108,719,150.25	\$ 107,500,803.30	\$ 107,500,803.30	\$ 1,215,257.75	\$ 27,127,898.89	\$ 27,127,898.89	\$ 107,500,803.30	\$ 287,893.51	\$ 272,002.54			100.0%
Reynosa	\$ 2,074,000.00	\$ 1,953,943.25	\$ 1,953,943.25	\$ 1,953,943.25	\$ 1,953,043.25	\$ 1,953,043.25	\$ 899.76	\$ 689,749.40	\$ 689,749.40	\$ 1,953,043.25	\$ 80,004.08	\$ 79,031.13	\$ 9,463.55		100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 4,170,000.00	\$ 3,597,200.25	\$ 3,597,200.25	\$ 3,597,200.25	\$ 3,588,554.05	\$ 3,588,554.05	\$ 8,712.20	\$ 466,495.32	\$ 466,495.32	\$ 3,588,554.05	\$ 5,491.19		\$ 42,048.79		100.0%
Morelos	\$ 6,500,000.00	\$ 6,182,091.52	\$ 6,182,091.52	\$ 6,182,091.52	\$ 6,182,091.52	\$ 6,182,091.52		\$ 2,355,369.20	\$ 2,355,369.20	\$ 6,182,091.52			\$ 60,219.12		100.0%
Chiapas	\$ 450,000.00	\$ 1,497,283.04	\$ 1,497,283.04	\$ 1,497,283.04	\$ 1,497,283.04	\$ 1,497,283.04		\$ 290,000.00	\$ 290,000.00	\$ 1,497,283.04			\$ 2,237.45		100.0%
Oaxaca	\$ 3,556,000.00	\$ 3,083,815.14	\$ 3,083,815.14	\$ 3,083,815.14	\$ 3,082,815.14	\$ 3,082,815.14		\$ 996,040.19	\$ 996,040.19	\$ 3,082,815.14			\$ 27,300.79		100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 173,684,000.00	\$ 145,497,268.08	\$ 145,497,268.08	\$ 145,497,268.08	\$ 144,250,796.57	\$ 144,250,796.57	\$ 1,237,242.51	\$ 35,826,179.36	\$ 35,826,179.36	\$ 144,254,593.26	\$ 388,886.78	\$ 342,833.64	\$ 175,148.52		100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

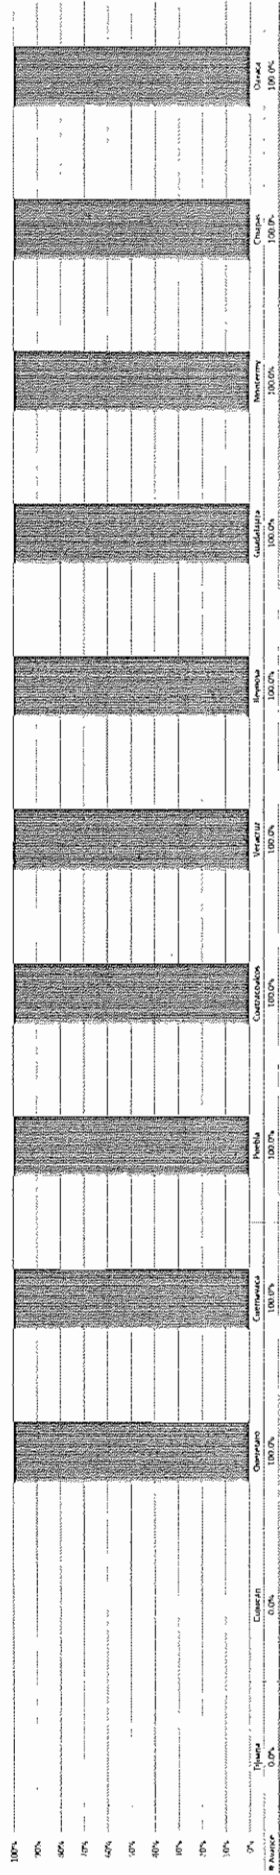

Handwritten mark







PROGRAMA DE MODERNIZACION 2009 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Contrato	Empresa	Periodo de Contrato Inicio	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Reprogramado	Monto Comprobado A	Ocupado	Análisis		Monto en Trámite B	Reprogramación - Desprogramación	Debito Comprobado C	Diferencia (A-B-C-D)	Ejecución a Flujos de Efectivo	Avance Físico Realizado (%)	Avance Físico (M)
									Comprobado	Análisis							
<b>MOTERREY</b>																	
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																	
2040	CONSTRUCCION DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	17/10/2009	17/10/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 135 JARDINES	1,000,000.00	970,444.74	973,444.74	298,020.42	298,020.42	970,444.74	970,444.74	-	-	-	970,444.74	100.0%	970,444.74
<b>Coahuila - Reynosa</b>																	
0400	CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	31/03/2009	31/03/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 135 GENERAL URDANO KM. 135 + 000	1,000,000.00	989,472.00	989,472.00	298,541.75	298,541.75	989,472.00	989,472.00	-	-	-	989,472.00	100.0%	989,472.00
<b>Puerto Morelos - Coahuila</b>																	
3140	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	23/11/2009	23/11/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 162 "MICHIGAN" UTECA EN EL KM 210+000	2,000,000.00	1,548,874.00	1,548,874.00	454,822.20	454,822.20	1,548,874.00	1,548,874.00	-	-	-	1,548,874.00	100.0%	1,548,874.00
3240	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	31/03/2009	31/03/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE LA PLAZA DE CORRO NO. 162 "MICHIGAN" UTECA EN EL KM 210+000 (Otra Centralización)	500,000.00	497,244.20	497,244.20	497,244.20	497,244.20	497,244.20	497,244.20	-	-	-	497,244.20	100.0%	497,244.20
<b>Coahuila - Chihuahua</b>																	
1340	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	03/03/2009	03/03/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 148 LA CALERA	1,000,000.00	877,564.00	877,564.00	263,296.20	263,296.20	877,564.00	877,564.00	-	-	-	877,564.00	100.0%	877,564.00
<b>Sabido - Toluca</b>																	
3440	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	20/07/2009	20/07/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 107 TOLUCA DE AYALA KM. 9 + 000 DEL TRAMO JATULLO - TOLUCA	2,000,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	460,000.00	460,000.00	1,930,000.00	1,930,000.00	-	-	-	1,930,000.00	100.0%	1,930,000.00
<b>Guerrero - Chihuahua</b>																	
3540	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	08/09/2009	08/09/2009	SUBMINISTRO E INSTALACION DE 2 PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 107 TOLUCA DE AYALA KM. 9 + 000 DEL TRAMO JATULLO - TOLUCA	1,000,000.00	730,000.00	730,000.00	510,000.00	510,000.00	730,000.00	730,000.00	38,237.75	-	-	1,230,000.00	100.0%	1,230,000.00
<b>Guerrero - Coahuila</b>																	
3640	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	09/10/2009	09/10/2009	SUBSTITUCION DE EQUIPOS DE LA PLAZA DE CORRO NO. 73 LAS CHIHUAS	900,000.00	1,417,294.04	1,417,294.04	303,900.00	303,900.00	1,417,294.04	1,417,294.04	2,237.40	-	-	1,055,647.42	100.0%	1,055,647.42
<b>Los Chihuas - Reynosa - Coahuila</b>																	
0940	PROYECTO DE ADECUACION DE ANULOS TRATADORAS ADMINISTRATIVAS DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 162 "MICHIGAN" UTECA EN EL KM 210+000 (Otra Centralización)	04/03/2009	04/03/2009	PROYECTO DE ADECUACION DE ANULOS TRATADORAS ADMINISTRATIVAS DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 162 "MICHIGAN" UTECA EN EL KM 210+000 (Otra Centralización)	450,000.00	441,540.42	441,540.42	441,540.42	441,540.42	441,540.42	441,540.42	-	-	-	441,540.42	100.0%	441,540.42
0840	PROYECTO DE ADECUACION DE ANULOS TRATADORAS ADMINISTRATIVAS DE LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 73 LAS CHIHUAS	09/10/2009	09/10/2009	SUBSTITUCION DE EQUIPOS DE LA PLAZA DE CORRO NO. 73 LAS CHIHUAS	900,000.00	1,098,847.00	1,098,847.00	318,732.70	318,732.70	1,098,847.00	1,098,847.00	2,237.40	-	-	1,055,647.42	100.0%	1,055,647.42
<b>Coahuila - Oaxaca</b>																	
2440	LABORATORIO Y AGENCIA DE CONSULTORIA S.A. DE C.V.	21/09/2008	21/09/2008	SUBMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS PLANTAS TRATADORAS DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES EN EL KM 70+000 DEL C.D. GUADAJALUPANA (PROG PLANTAS)	2,000,000.00	2,000,320.40	2,000,320.40	696,468.00	696,468.00	2,000,320.40	2,000,320.40	-	-	-	2,000,320.40	100.0%	2,000,320.40
3740	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	15/08/2009	15/08/2009	ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 77 MANAVALAN UTECA EN EL KM 7+000 DEL C.D. GUADAJALUPANA (Otra Centralización)	275,000.00	251,226.56	251,226.56	251,226.56	251,226.56	251,226.56	251,226.56	-	-	-	251,226.56	100.0%	251,226.56
3840	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	18/09/2009	18/09/2009	ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 77 MANAVALAN UTECA EN EL KM 7+000 DEL C.D. GUADAJALUPANA (Otra Centralización)	275,000.00	274,019.34	274,019.34	25,987.60	25,987.60	274,019.34	274,019.34	-	-	-	259,879.24	100.0%	259,879.24
3940	INDUSTRIAL SAN JUAN Y TRATAMIENTO VALDEQUELLA S.A. DE C.V.	04/05/2009	04/05/2009	PROYECTO DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES A LA PLAZA DE CORRO NO. 77 MANAVALAN UTECA EN EL KM 7+000 DEL C.D. GUADAJALUPANA (Otra Centralización)	500,000.00	493,105.84	493,105.84	48,518.84	48,518.84	493,105.84	493,105.84	-	-	-	493,105.84	100.0%	493,105.84
<b>TOTAL</b>																	
					3,562,000.00	3,389,715.24	3,389,715.24	958,468.20	958,468.20	3,389,715.24	3,389,715.24	27,237.40	-	-	3,048,315.44	100.0%	3,048,315.44
					170,450,000.00	164,477,908.98	164,477,908.98	30,360,000.00	30,360,000.00	164,477,908.98	164,477,908.98	1,727,842.04	-	-	147,244,000.00	100.0%	147,244,000.00







CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA  
PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2000

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Designacion	Seguimiento al Avance de Obra				Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)						
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Comprobado A	Programas Autorizados B	Estimado Autorizado C	Saldo Comprobado C	Diferencia B-C-D-E	Anticipo		Amortizado	Expendio a Favor de Estructuras	Reducciones	Derechos	Reservaciones (Reembolsables)	Anticipo de Costos (Reservado)
Tierras	\$ 926,000.00	\$ 1,065,041.00	\$ 1,040,041.00	\$ 1,095,041.00	\$ 1,095,041.00	\$ 1,095,041.00	\$	\$ 106,504.11	\$	\$ 1,085,041.00	\$ 21,749.43	\$ 7,277.30	\$	\$	100.0%
Construccion	\$ 3,351,000.00	\$ 2,900,082.21	\$ 2,900,082.21	\$ 2,900,082.21	\$ 2,900,082.21	\$ 2,900,082.21	\$ 2.15	\$ 290,088.22	\$ 290,088.22	\$ 2,609,993.99	\$	\$	\$	\$	100.0%
Construccion	\$ 2,824,000.00	\$ 2,672,092.10	\$ 2,672,092.10	\$ 2,672,092.10	\$ 2,672,092.10	\$ 2,672,092.10	\$ 400.00	\$ 267,209.21	\$ 267,209.21	\$ 2,404,882.89	\$ 7,018.00	\$	\$	\$	100.0%
Construccion	\$ 1,988,500.00	\$ 1,901,105.20	\$ 1,901,105.20	\$ 1,901,105.20	\$ 1,901,105.20	\$ 1,901,105.20	\$	\$ 106,110.52	\$ 106,110.52	\$ 2,090,234.67	\$	\$	\$ 79,306.31	\$	100.0%
Puentes	\$ 1,300,000.00	\$ 1,044,120.00	\$ 1,044,120.00	\$ 1,044,120.00	\$ 1,044,120.00	\$ 1,044,120.00	\$	\$ 104,012.00	\$ 104,012.00	\$ 1,040,120.00	\$ 11.38	\$	\$	\$	100.0%
Construccion	\$ 3,300,000.00	\$ 2,907,409.01	\$ 2,907,409.01	\$ 2,907,409.01	\$ 2,907,409.01	\$ 2,907,409.01	\$ 0.25	\$ 290,740.91	\$ 290,740.91	\$ 2,616,668.10	\$ 33,770.04	\$	\$	\$	100.0%
Vialidad	\$ 2,010,000.00	\$ 1,771,513.37	\$ 1,771,513.37	\$ 1,771,513.37	\$ 1,771,513.37	\$ 1,771,513.37	\$ 0.00	\$ 177,181.33	\$ 177,181.33	\$ 1,594,332.07	\$	\$	\$	\$	100.0%
Equipos	\$ 143,000.00	\$ 190,588.00	\$ 190,588.00	\$ 190,588.00	\$ 190,588.00	\$ 190,588.00	\$ 0.10	\$ 12,058.81	\$ 12,058.81	\$ 188,529.19	\$ 1,035.35	\$	\$	\$	100.0%
Suministros	\$ 2,145,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$ 1,650,000.00	\$	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	\$ 1,455,000.00	\$ 3,607.15	\$	\$	\$	100.0%
Mantenimiento	\$ 1,793,000.00	\$ 1,511,989.79	\$ 1,511,989.79	\$ 1,511,989.79	\$ 1,511,989.79	\$ 1,511,989.79	\$	\$ 151,198.98	\$ 151,198.98	\$ 1,360,790.81	\$ 1,574.84	\$	\$	\$	100.0%
Operacion	\$ 1,347,500.00	\$ 1,124,356.50	\$ 1,124,356.50	\$ 1,124,356.50	\$ 1,124,356.50	\$ 1,124,356.50	\$	\$ 112,435.69	\$ 112,435.69	\$ 1,011,920.81	\$ 1,915.58	\$	\$	\$	100.0%
Otros	\$ 742,500.00	\$ 819,544.23	\$ 819,544.23	\$ 819,544.23	\$ 819,544.23	\$ 819,544.23	\$	\$ 81,954.42	\$ 81,954.42	\$ 737,589.81	\$	\$	\$	\$	100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 22,115,000.00	\$ 18,743,614.78	\$ 18,743,614.78	\$ 18,743,614.78	\$ 18,743,614.78	\$ 18,743,614.78	\$ 504.40	\$ 1,874,391.47	\$ 1,845,181.60	\$ 19,872,290.03	\$ 58,315.00	\$ 11,208.15	\$ 79,995.11	\$	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%	
100%											100%											
90%											90%											
80%											80%											
70%											70%											
60%											60%											
50%											50%											
40%											40%											
30%											30%											
20%											20%											
10%											10%											
0%											0%											

000  
0183  
149

Handwritten mark



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS  
DIRECCION TECNICA  
PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES

No. Partida	Concepto No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Compania	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado	Monto Cancelado	Arrendo Ocupado	Monto Programado B	Estado Actualizado C	Monto E.C. Traslado D	Subsidio Capital E	Diferencia FIDELE	Avance Financiero G	Avance Financiero H
<b>COATZACOALCOS</b>															
<b>Cd. San Antonio</b>															
201	400012314 (1)	ALVARO CUBELLEN INGENIEROS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 195 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	520,000.00	959,779.90	658,720.00	85,877.06	959,779.90	959,779.90				599,270.00	100.0%
<b>Champation - Campeche</b>															
201	400012314 (1)	MATILL S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 20 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	120,000.00	10,004.17	10,004.17	0.00	9,994.17	9,994.17				9,994.17	100.0%
<b>Acayucan - Campeche</b>															
201	400012314 (1)	LA VAREZ GALLAN INGENIEROS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 60 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	324,000.00	384,972.20	384,972.20	38,497.20	384,972.20	384,972.20				384,972.20	100.0%
<b>Apiza - Chiapas</b>															
201	400012314 (1)	ALVARO CUBELLEN INGENIEROS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 39 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	379,000.00	300,020.95	300,020.95	30,003.70	299,917.91	300,020.95		0.15		299,917.91	100.0%
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>															
201	400012314 (1)	KONTEL S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 271 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	1,100,000.00	1,196,050.00	1,100,000.00	110,050.00	1,100,050.00	1,196,050.00				1,100,050.00	100.0%
<b>VERACRUZ</b>															
<b>Cd. Mineria - Crodoba</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 89 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	404,000.00	424,777.10	424,777.10	42,477.10	424,777.10	424,777.10				424,777.10	100.0%
<b>Coahuila - Venustiano</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 104 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	522,000.00	502,200.00	502,200.00	50,200.00	502,000.00	502,200.00				502,000.00	100.0%
<b>La Trinitaria - Orizaba</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 145 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	797,000.00	699,919.81	699,919.81	69,919.81	699,919.81	699,919.81				699,919.81	100.0%
<b>Guadalupe - Zimatlán - Tlaxiaco</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 39 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	110,000.00	99,540.24	99,540.24	9,954.02	99,540.24	99,540.24				99,540.24	100.0%
<b>Laboratorio Rómulo Tampon</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	27/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	52,000.00	48,270.12	48,270.12	4,827.01	48,270.12	48,270.12				48,270.12	100.0%
<b>REYES</b>															
<b>Reyes - Marismas</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	11/02/2009 11/01/2010	INSPECCION VISUAL DE 28 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	143,000.00	129,548.01	129,548.01	12,058.81	129,548.01	129,548.01				129,548.01	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>															
<b>Parque de Mineria</b>															
201	400012314 (1)	ELBO ESTRELLA SA DE CV	29/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	440,000.00	509,772.00	509,772.00	50,972.00	509,772.00	509,772.00				509,772.00	100.0%
<b>Uruapan - Nueva Italia</b>															
201	400012314 (1)	PURB CONSULTORIA SA DE CV	29/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 70 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	304,000.00	512,704.40	512,704.40	51,270.40	512,704.40	512,704.40				512,704.40	100.0%
<b>Nueva Italia - Uruapan - Guadalupe</b>															
201	400012314 (1)	PURB CONSULTORIA SA DE CV	29/04/2009 28/12/2009	INSPECCION VISUAL DE 120 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	600,000.00	607,502.00	607,502.00	60,750.20	607,502.00	607,502.00				607,502.00	100.0%
<b>Guadalupe - Tlaxiaco</b>															
201	400012314 (1)	ICI PROYECTOS Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	11/02/2009 11/01/2010	INSPECCION VISUAL DE 14 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	143,000.00	129,548.01	129,548.01	12,058.81	129,548.01	129,548.01				129,548.01	100.0%
<b>MOCTEZUMA</b>															
<b>Moctezuma - Nuevo Laredo</b>															
201	400012314 (1)	DEPFI INGENIERIA S.A. DE C.V.	11/01/2009 11/01/2010	INSPECCION VISUAL DE 72 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	300,000.00	333,000.00	333,000.00	33,000.00	333,000.00	333,000.00				333,000.00	100.0%
<b>Saltillo - Toluca</b>															
201	400012314 (1)	DEPFI INGENIERIA S.A. DE C.V.	11/01/2009 11/01/2010	INSPECCION VISUAL DE 40 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	300,000.00	270,200.00	270,200.00	27,000.00	270,200.00	270,200.00				270,200.00	100.0%
<b>Coahuila - Ote Chihuahua</b>															
201	400012314 (1)	DEPFI INGENIERIA S.A. DE C.V.	11/01/2009 11/01/2010	INSPECCION VISUAL DE 20 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	143,000.00	129,548.01	129,548.01	12,058.81	129,548.01	129,548.01				129,548.01	100.0%
<b>Coahuila - Parral - Cuernavaca</b>															
201	400012314 (1)	DEPFI INGENIERIA S.A. DE C.V.	11/01/2009 11/01/2010	INSPECCION VISUAL DE 82 ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA	451,000.00	300,310.45	300,310.45	30,010.45	300,310.45	300,310.45				300,310.45	100.0%

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION TECNICA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES

No. Póliza	Código No.	Empresa	Período de Contrato	Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Autorizado Modificado	Monto Capitalizado	Amortizado	Monto Programado	Cumulado Acreditado	Monto Ej. Trámite D	Reservaciones Desplazadas	Saldo Capitalizado E	Saldo Ej. Trámite D	Amortizado	Avance Cumplido (%)
<b>Catamarca - Huancayo</b>																
562	46981212	CONSTRUCIONES VISUALES S.A. S.C.	11/01/2009	INSPECCION VISUAL DE 50 ESTRUCTURAS TRADICIONALES EN LA AUTOPISTA	\$ 307,200.00	\$ 307,200.00	\$ 201,470.26	\$ 201,470.26	\$ 201,470.26	\$ 201,470.26	\$	\$	\$	\$	\$	65.56%
<b>Quito - Merida - Cuenca</b>																
307	46981212	CONSTRUCIONES VISUALES S.A. S.C.	11/01/2009	ADQUISICION VISUAL DE 24 ESTRUCTURAS TRADICIONALES EN LA AUTOPISTA	\$ 115,500.00	\$ 115,500.00	\$ 97,300.12	\$ 97,300.12	\$ 97,300.12	\$ 97,300.12	\$	\$	\$	\$	\$	84.33%
<b>QINAPAS</b>																
<b>Luz Choncha - Esmeraldas - Ocotacoche</b>																
417	46981212	CONSTRUCIONES VISUALES S.A. S.C.	11/01/2009	INSPECCION VISUAL DE 24 ESTRUCTURAS TRADICIONALES EN LA AUTOPISTA	\$ 1,124,200.00	\$ 1,124,200.00	\$ 1,124,200.00	\$ 1,124,200.00	\$ 1,124,200.00	\$ 1,124,200.00	\$	\$	\$	\$	\$	100.00%
<b>OMEGA</b>																
<b>Est. Cuzumbogán - Oaxaca</b>																
471	46981212	CONSTRUCIONES VISUALES S.A. S.C.	11/01/2009	INSPECCION VISUAL DE 12 ESTRUCTURAS TRADICIONALES EN LA AUTOPISTA	\$ 22,115,000.00	\$ 22,115,000.00	\$ 18,740,000.00	\$ 18,740,000.00	\$ 18,740,000.00	\$ 18,740,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	84.75%
<b>TOTAL</b>																
					\$ 22,115,000.00	\$ 22,115,000.00	\$ 18,740,000.00	\$ 18,740,000.00	\$ 18,740,000.00	\$ 18,740,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	84.75%

001 0186

152

77



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN TÉCNICA


PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES 2008 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2017

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal						Avance Financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Asignado Disponible	Monto Contratado A	Programado Asignado B	Estimado Asignado C	Saldo Contratado C	Diferencia B-C-D-E	Anticipo Disputado	Anticipo Asignado	Ejercido a Fines de Ejercicio	Reservaciones	Devoluciones		Reservaciones - Devoluciones
Tlaxcala														0.0%
Culiacán	\$ 1,750,000.00	\$ 1,007,200.00	\$ 1,007,200.00	\$ 1,007,200.00	\$ 1,007,200.00	\$ 1,007,200.00		\$ 100,720.19	\$ 1,007,200.00	\$ 1,007,200.00	\$ 30,222.32	\$ 70,315.36	\$ 1,007.48	100.0%
Querétaro	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,704.00	\$ 1,000,704.00	\$ 1,000,704.00	\$ 1,000,704.00	\$ 1,000,704.00		\$ 160,076.48	\$ 1,000,704.00	\$ 1,000,704.00	\$ 30,020.51	\$ 0.00	\$ 0.00	100.0%
Guatemala	\$ 1,750,000.00	\$ 1,500,305.15	\$ 1,500,305.15	\$ 1,500,305.15	\$ 1,500,305.15	\$ 1,500,305.15		\$ 150,029.51	\$ 1,500,305.15	\$ 1,500,305.15	\$ 10,000.78			100.0%
Puebla														0.0%
Coahuila														0.0%
Virgen	\$ 2,500,000.00	\$ 2,207,545.58	\$ 2,207,545.58	\$ 2,207,545.58	\$ 2,207,545.58	\$ 2,207,545.58		\$ 220,754.50	\$ 2,207,545.58	\$ 2,207,545.58	\$ 10,222.18	\$ 0.50	\$ 0.50	100.0%
Reynosa	\$ 3,000,000.00	\$ 2,300,410.30	\$ 2,300,410.30	\$ 2,300,410.30	\$ 2,300,410.30	\$ 2,300,410.30		\$ 230,041.03	\$ 2,300,410.30	\$ 2,300,410.30	\$ 5,042.11			100.0%
Coahuila	\$ 1,000,000.00	\$ 920,001.88	\$ 920,001.88	\$ 920,001.88	\$ 920,001.88	\$ 920,001.88		\$ 92,006.19	\$ 920,001.88	\$ 920,001.88	\$ 30,213.89			0.0%
Guatemala	\$ 500,000.00	\$ 460,000.04	\$ 460,000.04	\$ 460,000.04	\$ 460,000.04	\$ 460,000.04		\$ 40,000.00	\$ 460,000.04	\$ 460,000.04				100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 12,500,000.00	\$ 10,776,420.04	\$ 10,776,420.04	\$ 10,776,420.04	\$ 10,776,420.04	\$ 10,776,420.04		\$ 1,077,342.05	\$ 10,776,420.04	\$ 10,776,420.04	\$ 172,229.20	\$ 96,029.02	\$ 1,007.46	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

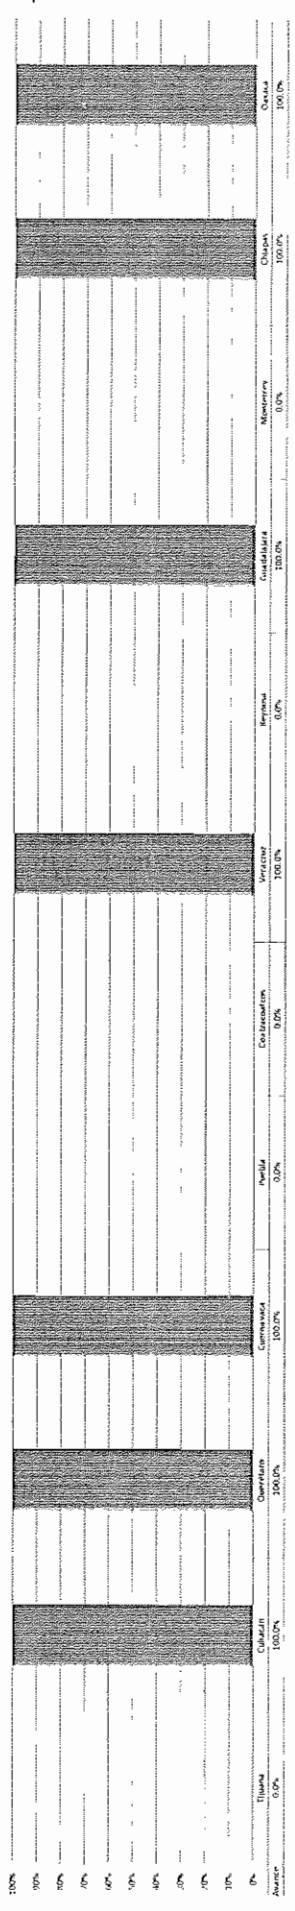

000 0187 153

Handwritten signature



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
DIRECCIÓN TÉCNICA

**PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES**

No. Periodo	Cuenta de Ingresos	Empresa	Periodo de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Facturado de Ingresos	Monto Capex Sudo	Amortizado	Monto Facturado D	Estimado Comenzado	Monto C/T Transm	Diferencias + Diferencias	Estado Cuantificado	Diferencia P-C-T-S	Ejecución y Pago de Ingresos	Ingresos P-C-T-S
			Inicio	Fin													
Fallecidos Dem: Arroyales																	
II	44001219	CONSTRUCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	04/04/2009	14/02/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 2, 0005) puentes, ubicadas en la subzona	560,000.00	2,143,374.02	2,143,374.02	2,143,374.02	2,143,374.02	2,143,374.02	2,143,374.02	0	0	0	2,143,374.02	100.0%
Mantén: Cuernavaca																	
II	44001219	CONSTRUCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	04/04/2009	14/02/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 2, 0005) puentes, ubicadas en la subzona	1,200,000.00	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	0	0	0	1,478,924.31	100.0%
II	44001219	CONSTRUCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	04/04/2009	14/02/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 2, 0005) puentes, ubicadas en la subzona	1,200,000.00	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	1,478,924.31	0	0	0	1,478,924.31	100.0%
GUATEMALA																	
Chimalpa - Lecherías																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	04/04/2009	31/05/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 3) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	750,000.00	478,452.82	478,452.82	478,452.82	478,452.82	478,452.82	478,452.82	0	0	0	478,452.82	100.0%
Llaneros: Noroeste de Querétaro																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	04/04/2009	31/05/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 1) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	200,000.00	204,037.72	204,037.72	204,037.72	204,037.72	204,037.72	204,037.72	0	0	0	204,037.72	100.0%
México - Querétaro																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	04/04/2009	31/05/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 4) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	1,000,000.00	920,274.62	920,274.62	920,274.62	920,274.62	920,274.62	920,274.62	0	0	0	920,274.62	100.0%
GUERRAVACA																	
Cuernavaca - Actulco																	
II	44001219	PUENTE SUDOSUD S.A. DE C.V.	11/05/2009	25/07/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 2) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	1,200,000.00	1,048,325.10	1,048,325.10	1,048,325.10	1,048,325.10	1,048,325.10	1,048,325.10	0	0	0	1,048,325.10	100.0%
MIGUACRUZ																	
Caj. Mérida: Cuernavaca																	
II	44001219	CONSTRUCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	11/05/2009	25/07/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 1) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	250,000.00	217,770.00	217,770.00	217,770.00	217,770.00	217,770.00	217,770.00	0	0	0	217,770.00	100.0%
Cuernavaca - Veracruz																	
II	44001219	CONSTRUCIONES Y OBRAS DE CONCRETO S.A. DE C.V.	11/05/2009	25/07/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 9) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	2,200,000.00	1,987,770.00	1,987,770.00	1,987,770.00	1,987,770.00	1,987,770.00	1,987,770.00	0	0	0	1,987,770.00	100.0%
GUADALAJARA																	
Nueva Jalisco: Estación Cuernavaca																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	04/04/2009	31/05/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 4) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	1,000,000.00	934,270.00	934,270.00	934,270.00	934,270.00	934,270.00	934,270.00	0	0	0	934,270.00	100.0%
Cuernavaca - Tepic																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	11/05/2009	25/07/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 2) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	2,000,000.00	1,677,140.14	1,677,140.14	1,677,140.14	1,677,140.14	1,677,140.14	1,677,140.14	0	0	0	1,677,140.14	100.0%
CHIHUAHUA																	
Luz Chihuahua: Rosales - Cuernavaca																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	11/05/2009	25/07/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 4) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	1,000,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	920,000.00	0	0	0	920,000.00	100.0%
OAXACA																	
Caj. Cuernavaca: Oaxaca																	
II	44001219	MECANICA DE PUNTES S.A. DE C.V.	11/05/2009	25/07/2009	Inspección en estructuras de tipo especial en 2) (PTE-D) puentes, ubicadas en la subzona	500,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0	0	0	460,000.00	100.0%
TOTAL																	
10,778,420.04																	











CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMICAGO  
DIRECCION TECNICA  
PROGRAMA DE SUPERVISION DE LAS EMERGENCIAS TECNICAS

No. Partida	Cuenta No.	Empresa	Periodo de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aumentado Modificado		Monto E n T am i n e	Hydrocarbons Devolucion	Saldo Comprometido E	Diferencia B-C-D-E	Cuentas de Flujo de Efectivo	Amenas Reservas en PDI
			Inicio	Fin			Monto	Programa B						
<b>QUEMAMACA</b>														
<b>Materia - Guatemalaca</b>														
ET- SUPERVISION MAY-2009	40001329 40001329 MAY-2009	SERVICIO INTEGRAL PARA DISEÑO, INGENIERIA Y C.V.	05/02/09	30/07/09	SUPERVISION PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL TALLER DE LOS CUERTOS DEL KM 29+100 AL KM 29+900 Y DEL KM 30+100 AL KM 30+700 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA MEDIO OCCIDENTAL	1	957,429.04	957,429.04	957,429.04				957,429.04	100.0%
<b>Guatemalaca - Acapulco</b>														
	40001308	AGRAL S.A. DE C.V.	06/05/09	29/02/10	SUPERVISION TECNICA DE LOS TRABAJOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL CUERPO "X" DEL KM 20+000 AL KM 20+440 CUERPO "X" DE LA AUTOPISTA GUATEMALCA-ACAPULCO	3	376,000.00	376,000.00	376,000.00				376,000.00	100.0%
	40001303	GRUP COMSAFACTORY SALINICOTIAGUA S.A. DE C.V.	16/06/09	15/02/10	SUPERVISION TECNICA DE LOS TRABAJOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL CUERPO "X" DEL KM 20+000 AL KM 20+900 CUERPO "X" DE LA AUTOPISTA GUATEMALCA-ACAPULCO	3	409,700.00	409,700.00	409,700.00				409,700.00	100.0%
					<b>SUBTOTAL QUEMAMACA</b>		<b>1,742,129.04</b>	<b>1,742,129.04</b>	<b>1,742,129.04</b>				<b>1,742,129.04</b>	<b>100.0%</b>
<b>VERACRUZ</b>														
<b>Cd. Mendocino - Ciudad</b>														
ET- SUPERVISION MAY-2009	40001304 40001304 MAY-2009	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION Y PROYECCION O.C.L.	01/07/09	15/02/10	SUPERVISION TECNICA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA PARA LA REPARACION DEL CUERPO "X" DEL KM 20+000 AL KM 20+900 EN EL KM 20+900 DE LA AUTOPISTA CD MENDOCA-CDOROBIA	3	400,300.27	400,300.27	400,300.27				400,300.27	100.0%
ET- SUPERVISION MAY-2009	40001304 40001304 MAY-2009	CONSTRUCCION DE CONSTRUCCION Y PROYECCION O.C.L.	27/07/09	15/02/10	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE SUSTITUCION POR EMERGENCIA DE LA OBRA DE DRENAJE UNICA EN EL KM 20+900 DE LA AUTOPISTA CD MENDOCA-CDOROBIA	3	4,012,043.22	4,012,043.22	4,012,043.22				4,012,043.22	100.0%
					<b>SUBTOTAL VERACRUZ</b>		<b>4,412,343.49</b>	<b>4,412,343.49</b>	<b>4,412,343.49</b>				<b>4,412,343.49</b>	<b>100.0%</b>
<b>CHIAPAS</b>														
<b>LA Chiriquia - Ruidoso - Ocosingo</b>														
ET- SUPERVISION MAY-2009	40001329 40001329 MAY-2009	SERVICIO INTEGRAL PARA DISEÑO, INGENIERIA Y C.V.	23/04/09	01/07/09	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE TRATAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO CONSISTENTE EN DACHES DE CEMENTO PARA EL CUERPO "X" DEL KM 10+500 AL KM 10+900 DEL C.D. LA CHIRQUIA - RAIBALES - OCOSONGUA	3	614,676.46	614,676.46	614,676.46				614,676.46	100.0%
ET- SUPERVISION MAY-2009	40001329 40001329 MAY-2009	INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION DE LA OBRA DE C.V.	23/04/09	31/07/09	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE TRABAJO IMPERMEABLE PARA LINDAR EL CUERPO UNICO DEL C.D. LA CHIRQUIA - RAIBALES - OCOSONGUA	3	975,037.10	975,037.10	975,037.10				975,037.10	100.0%
					<b>SUBTOTAL CHIAPAS</b>		<b>1,589,713.56</b>	<b>1,589,713.56</b>	<b>1,589,713.56</b>				<b>1,589,713.56</b>	<b>100.0%</b>
					<b>TOTAL</b>		<b>7,514,322.26</b>	<b>7,514,322.26</b>	<b>7,514,322.26</b>				<b>7,514,322.26</b>	<b>100.0%</b>

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
DIRECCIÓN TÉCNICA

OTROS PAGOS REALIZADOS CON CARGO A RECURSOS DEL PROGRAMA 2009

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

DELEGACIÓN	TRAMO	EJERCICIO	PROGRAMA	CONTRATO	EMPRESA	INICIO	TERMINO	CONCEPTO	REGISTRO SIAC	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EN TRAMITE	IMPORTE PAGADO	IMPORTE POR EJERCER
PUEBLA	MEXICO- PUEBLA	2007	SUPERVISION MAYOR PUENTES	4500008959	ICTAM CONSTRUCTORES	01/09/2007	30/07/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 4 ESTRUCTURAS UBICADAS EN LOS KM. 99+412, 96+050, 110+484 Y 112+329 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	5500003902	\$ 128,901.98		\$ 128,450.77	\$ 451.11
PUEBLA	PUEBLA- ACATZINGO	2007	SUPERVISION MAYOR	4500008221	CONSULTORIA TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS	15/05/2007	08/11/2009	REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL KM 159+000 AL KM 127+500 AMBOS CUERPOS.	5500003903	\$ 376,497.96		\$ 376,497.96	\$ -
PUEBLA	PUEBLA- ACATZINGO	2007	SUPERVISION MAYOR	4500008221	CONSULTORIA TECNICA Y OPERACION EN SISTEMAS	16/05/2007	08/11/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL KM 175+000 AL KM 217+500 AMBOS CUERPOS.	5500003904	\$ 354,672.00		\$ 354,672.00	\$ -
PUEBLA	MEXICO- PUEBLA	2007	SUPERVISION MAYOR PUENTES	4500008953	KRATTL	01/09/2007	12/02/2008	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL DE 6 ESTRUCTURAS UBICADAS EN LOS KMS. 85+196, 86+192, 87+263, 88+220, 88+786 Y 90+159.	5500003925	\$ 139,003.19		\$ 139,003.19	\$ -
PUEBLA	MEXICO- PUEBLA	2008	SUPERVISION MAYOR	4500010956	GRUPO IMASA & INGENIERIA MAS ARQUITECTURA	08/09/2008	15/05/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION A TERCER CARRIL DEL KM 119+300 AL KM 175+250 CUERPO "A"	5500003905	\$ 399,544.92		\$ 399,544.92	\$ -
PUEBLA	MEXICO- PUTOLA	2008	SUPERVISION MAYOR	4500010956	GRUPO IMASA & INGENIERIA MAS ARQUITECTURA	08/09/2008	15/09/2009	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION A TERCER CARRIL DEL KM 119+300 AL KM 125+250 CUERPO "A"	5500004015	\$ 141,431.83		\$ 141,431.83	\$ -
CUERNAVACA	CUERNAVACA- ACAPULCO	2008	MAYOR PUENTES	4500012099	PAVIMENTACIONES, CAMINOS Y COMPACTACIONES	06/05/2008	19/02/2010	AMPLIACION DEL P.S.V. UBICADO EN EL KM. 100+250.	5500003966	\$ 3,013,141.49		\$ 3,013,138.87	\$ 2.62
CHIAPAS	LAS CHOAPAS- RAUDALES- OCCOZOCOAUTLA	2008	SUPERVISION MAYOR	4500010445	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACION	20/05/2008	20/03/2010	SUPERVISION DE LA OBRA: REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO UNICO DEL KM. 31+550 AL KM. 35+000, DEL KM. 38+000 AL KM. 40+000, DEL KM. 45+000 AL KM. 52+000 Y DEL KM. 129+150 AL KM. 180+000.	5500003990	\$ 504,913.59		\$ 502,927.05	\$ 1,986.54
MONTERREY	CADEREYTA- RETOSA	2008	SUPERVISION MENOR	4500009779	ARORI CONSTRUCCIONES	01/03/2008	19/07/2009	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR	5500003948	\$ 133,934.00		\$ 133,934.00	\$ -
CUERNAVACA	CUERNAVACA- ACAPULCO	2008	SUPERVISION MAYOR	4500011384	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	16/01/2010	02/02/2010	SUPERVISION DE OBRA: AMPLIACION DEL P.S.V. UBICADO EN EL KM. 100+250.	5500004024	\$ 256,719.84		\$ 256,719.84	\$ -
CHIAPAS	LAS CHOAPAS- RAUDALES- OCCOZOCOAUTLA	2008	MAYOR	4500010445	DIAGNOSTICO EDIFICACIONES URBANAS E INDUSTRIALES & CONSTRUCTORES Y RENTAS DE MAQUINARIA	20/05/2008	09/02/2010	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO UNICO DEL KM. 31+550 AL KM. 35+000, DEL KM. 38+000 AL KM. 40+000, DEL KM. 45+000 AL KM. 52+000 Y DEL KM. 129+150 AL KM. 180+000.	7500000696	\$ 1,307,806.88		\$ 1,307,806.88	\$ -
<b>TOTAL</b>										<b>\$ 6,846,567.38</b>		<b>\$ 6,844,121.11</b>	<b>\$ 2,440.27</b>

000 0194

---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 4**


Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programa Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Contratado E	Diferencia B - C - D - E	Ejército a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Alícuota de Costos Pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico de las Obra (%)		
Tijuana	\$ 47,432,966.03	\$ 168,698,162.39	\$ 168,698,162.39	\$ 168,098,162.38	\$ 166,583,026.30		\$ 2,114,536.08		\$ 170,792,532.34	\$ 1,203,851.24	\$ 3,976,779.64	100.0%	100.0%		
Culiacán	\$ 133,387,576.95	\$ 91,138,158.75	\$ 91,138,158.75	\$ 91,138,158.75	\$ 91,102,715.85		\$ 35,442.90		\$ 97,173,774.29	\$ 58,103.15	\$ 6,071,056.44	100.0%	100.0%		
Querétaro	\$ 340,031,478.85	\$ 332,911,310.68	\$ 332,911,310.68	\$ 332,911,310.68	\$ 330,951,936.13		\$ 1,959,374.55		\$ 334,149,841.99	\$ 28,829.07	\$ 3,197,905.86	100.0%	100.0%		
Guerrero	\$ 703,207,250.85	\$ 752,798,378.51	\$ 752,798,378.51	\$ 752,798,378.51	\$ 722,437,133.68		\$ 30,361,244.83		\$ 742,209,865.69	\$ 2,724,203.41	\$ 22,774,966.27	100.0%	100.0%		
Puebla	\$ 173,158,905.43	\$ 105,028,812.82	\$ 105,028,812.82	\$ 105,028,812.82	\$ 101,159,800.84		\$ 3,718,706.20	\$ 150,395.78	\$ 192,376,116.59	\$ 1,370,290.19	\$ 1,216,315.73	99.9%	100.0%		
Coahuila	\$ 152,803,896.24	\$ 412,051,033.68	\$ 412,051,033.68	\$ 412,051,033.68	\$ 395,620,451.06		\$ 26,431,482.62		\$ 384,999,294.18	\$ 1,633,255.47	\$ 946,417.44	100.0%	100.0%		
Veracruz	\$ 107,007,785.53	\$ 165,276,311.77	\$ 165,276,311.77	\$ 165,276,311.77	\$ 164,031,272.10		\$ 1,245,039.67		\$ 167,093,742.61	\$ 667,066.45	\$ 3,062,470.51	100.0%	100.0%		
Reynosa	\$ 12,916,491.88	\$ 55,849,159.70	\$ 55,849,159.70	\$ 55,849,159.70	\$ 48,865,516.19		\$ 6,983,643.51		\$ 48,865,516.19	\$ 2,883,736.39		100.0%	100.0%		
Guadaluajara	\$ 96,267,890.86	\$ 65,975,535.95	\$ 65,975,535.95	\$ 65,975,535.95	\$ 65,813,293.74		\$ 162,242.21		\$ 87,322,002.23	\$ 98,732.00	\$ 1,508,711.48	100.0%	100.0%		
Monterrey	\$ 209,193,015.46	\$ 210,752,455.03	\$ 210,752,455.03	\$ 210,752,455.03	\$ 209,210,510.95		\$ 1,532,944.08		\$ 211,914,723.58	\$ 98,590.17	\$ 2,695,212.63	100.0%	100.0%		
Chilpancingo	\$ 103,810,801.92	\$ 331,735,027.98	\$ 331,735,027.98	\$ 331,735,027.98	\$ 330,238,739.41	\$ 90,894.13	\$ 1,415,404.44		\$ 331,798,411.63	\$ 4,348,327.38	\$ 1,659,672.22	100.0%	100.0%		
Oaxaca	\$ 65,207,141.40	\$ 79,450,777.91	\$ 79,450,777.91	\$ 79,450,777.91	\$ 75,273,301.38		\$ 4,177,476.53		\$ 75,689,806.43	\$ 716,788.12	\$ 416,505.05	100.0%	100.0%		
Oficinas Centrales	\$ 2,500,000.00											0.0%	0.0%		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,186,815,000.00</b>	<b>\$ 2,861,666,025.16</b>	<b>\$ 2,861,666,025.16</b>	<b>\$ 2,861,666,025.16</b>	<b>\$ 2,801,297,297.63</b>	<b>\$ 80,884.13</b>	<b>\$ 80,137,537.62</b>	<b>\$ 150,395.78</b>	<b>\$ 2,844,385,120.75</b>	<b>\$ 15,771,827.90</b>	<b>\$ 47,460,015.27</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		

\$ 2,801,329,487.34

Nota: En el Monto Original Autorizado, no se incluyen los montos autorizados para ajuste de costos (\$80,000,000.00), emergencias técnicas (\$200,000,000.00), más \$250,000,000.00 autorizados el 14 de Septiembre del año en curso, por los Miembros del Comité Técnico y mantenimiento menor por administración (\$380,000,000.00). Para las emergencias al momento que se validan por Banderos se incluyen al programa y el monto correspondiente se suma en el Monto Autorizado Modificado y en el Monto Contratado.

El monto de Oficinas Centrales, correspondiendo al autorizado para la supervisión del suministro y colocación de defensa metálica de tres crestas (\$2,500,000.00), la cual se llevará a cabo por las Delegaciones Regionales.

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

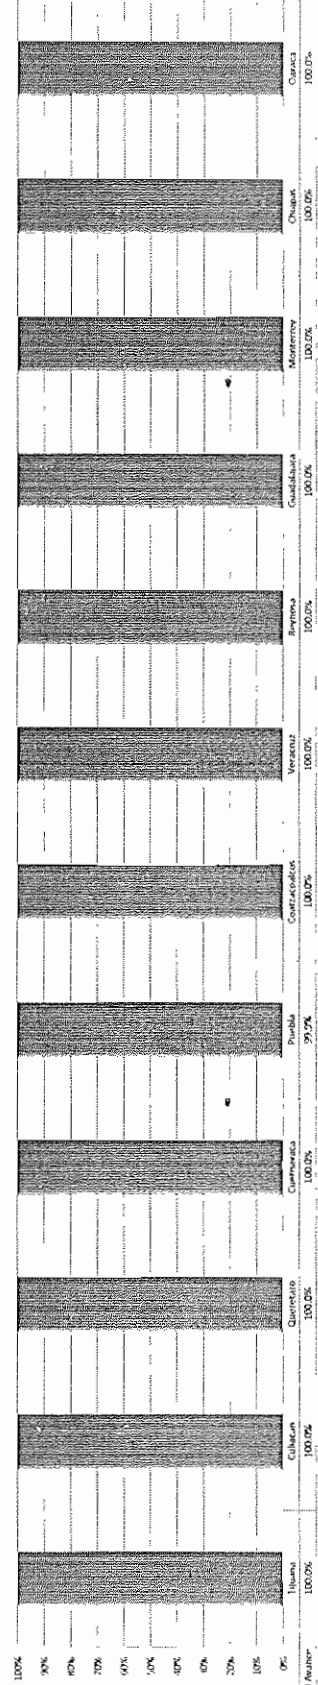

Nota: El ejercicio a Flujo de Efectivo corresponde a la suma (+) del Anticipo Otorgado más (+) Estimaciones más (+) Ajustes de Costos Pagados menos (-) Amortización de Anticipos.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Resumen de montos estimados acumulados por tramo carretero de los PROGRAMAS 2010 de la Red FONADIN

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Coligación / Tramo	Monto Mayor Supervisión	Monto Menor Supervisión	Monto Mayor Puentes	Monto Menor Puentes	Modernización	Supervisión	Inspecciones (Tradicionales)	Inspecciones (Especiales)	Emergencias Técnicas	Supervisión	Total
<b>TIJUANA</b>											
Tijuana - Ensenada	\$ 50,569,527.31	\$ 1,481,045.09	\$ 19,236,400.02	\$ 1,294,029.01	\$ 1,022,227.45	\$ 66,310.70	\$ 013,412.00	\$	\$ 20,960,017.32	\$ 1,399,051.72	\$ 115,134,634.29
La Rumorosa - Tecate	\$ 39,310,544.05	\$ 1,070,314.14	\$ 4,195,051.14	\$ 540,037.00	\$ 405,177.78	\$	\$ 333,027.50	\$	\$	\$	\$ 45,934,002.27
Libramiento Los Cabos	\$ 91,888,077.26	\$ 3,353,019.23	\$ 24,808,330.62	\$ 1,033,061.41	\$ 6,526,118.21	\$ 882,316.29	\$ 1,147,240.18	\$	\$ 29,308,017.20	\$ 1,299,261.72	\$ 166,502,020.24
<b>Total Tijuana</b>	\$ 181,768,151.62	\$ 6,904,378.46	\$ 48,240,781.78	\$ 2,867,117.42	\$ 13,954,523.44	\$ 1,548,943.28	\$ 1,593,680.68	\$	\$ 50,268,034.52	\$ 2,698,313.44	\$ 327,670,657.24
<b>CULIACAN</b>											
Estación Don- Nogales	\$ 92,002,561.26	\$ 769,172.01	\$ 24,649,256.00	\$ 1,653,071.45	\$ 2,418,943.85	\$	\$ 2,449,017.20	\$	\$	\$	\$ 91,102,719.86
Mazatlán - Culiacán	\$ 99,362,561.28	\$ 769,172.01	\$ 24,649,256.00	\$ 1,653,071.45	\$ 2,418,943.85	\$	\$ 2,449,017.20	\$	\$	\$	\$ 91,102,719.86
<b>Total Culiacán</b>	\$ 191,365,122.54	\$ 1,538,344.02	\$ 49,298,512.00	\$ 3,306,142.90	\$ 4,837,887.70	\$	\$ 4,898,034.40	\$	\$	\$	\$ 182,205,439.72
<b>QUERETARO</b>											
Libramiento Noroeste de Querétaro	\$ 13,842,079.61	\$ 659,091.44	\$ 4,539,301.61	\$ 504,000.00	\$ 1,000,218.64	\$	\$ 102,340.24	\$	\$	\$	\$ 21,024,037.74
Champey - Lechella	\$ 62,075,373.10	\$ 2,432,201.11	\$ 7,223,030.24	\$ 929,702.86	\$ 6,378,342.40	\$ 70,526.26	\$ 240,027.50	\$	\$	\$	\$ 113,296,914.02
México - Querétaro	\$ 28,120,052.09	\$ 2,578,205.03	\$ 23,430,234.00	\$ 3,369,000.31	\$ 14,281,099.21	\$ 1,090,000.00	\$ 1,200,229.02	\$	\$	\$	\$ 84,710,059.14
Querétaro - Inapitlán	\$ 62,204,239.01	\$ 3,639,709.12	\$ 8,195,529.07	\$ 1,169,502.96	\$ 791,029.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 111,416,127.03
<b>Total Querétaro</b>	\$ 206,446,723.81	\$ 13,914,225.70	\$ 43,994,079.92	\$ 6,003,235.73	\$ 29,387,887.25	\$ 791,029.00	\$ 2,479,162.76	\$	\$	\$	\$ 330,951,326.15
<b>GUERRERAVACA</b>											
México - Cuernavaca	\$ 1,201,000.36	\$ 227,599.35	\$ 10,354,702.48	\$ 1,000,224.01	\$ 1,209,054.40	\$ 92,229.56	\$ 179,200.00	\$	\$	\$	\$ 17,006,027.29
Libramiento Cuernavaca	\$ 31,530,724.79	\$ 2,560,267.03	\$ 2,523,404.11	\$ 2,007,001.20	\$ 895,249.42	\$ 807,532.40	\$ 134,402.25	\$	\$	\$	\$ 44,815,451.90
Cuernavaca - Acapulco	\$ 300,029,412.75	\$ 16,071,564.24	\$ 38,232,012.58	\$ 4,027,575.59	\$ 1,594,117.76	\$ 544,720.15	\$ 533,410.24	\$	\$ 120,002,940.40	\$ 7,977,567.72	\$ 380,744,022.27
Puente de Ixtla - Iguala	\$ 2,290,220.94	\$ 4,056,130.14	\$ 4,056,130.14	\$ 1,050,553.16	\$ 403,890.01	\$ 1,050,553.16	\$ 138,310.88	\$	\$ 13,010,373.01	\$ 1,019,756.02	\$ 32,138,068.52
La Pera - Cuavilla	\$ 765,499.52	\$ 4,148,074.19	\$ 4,148,074.19	\$ 1,569,321.23	\$ 1,569,321.23	\$ 127,117.70	\$	\$	\$	\$	\$ 6,038,000.63
Zacapoalco - Rancho Viejo	\$ 901,039.76	\$ 1,417,550.78	\$ 1,417,550.78	\$ 105,268.10	\$ 105,268.10	\$ 819.70	\$	\$	\$ 2,425,272.49	\$	\$ 3,930,272.49
Rancho Viejo - Tzuczo	\$ 947,500.00	\$ 1,250,120.00	\$ 1,250,120.00	\$ 1,250,120.00	\$ 120,659.40	\$	\$	\$	\$ 20,653,147.00	\$ 21,263,103.44	\$ 23,886,302.25
Varios Tramos	\$ 628,527,173.43	\$ 18,470,516.82	\$ 63,508,018.86	\$ 6,431,008.32	\$ 1,200,000.00	\$ 92,229.56	\$ 1,123,400.00	\$	\$ 102,266,407.47	\$ 11,182,467.22	\$ 722,407,135.62
<b>Total Cuernavaca</b>	\$ 638,527,173.43	\$ 18,470,516.82	\$ 63,508,018.86	\$ 6,431,008.32	\$ 1,200,000.00	\$ 92,229.56	\$ 1,123,400.00	\$	\$ 102,266,407.47	\$ 11,182,467.22	\$ 722,407,135.62
<b>PUEBLA</b>											
México- Puebla	\$ 34,703,564.86	\$ 2,054,265.03	\$ 11,733,885.40	\$ 1,308,029.95	\$ 2,000,014.28	\$ 1,896,374.24	\$ 420,232.38	\$	\$ 9,025,413.59	\$ 314,548.37	\$ 100,442,740.26
Puebla - Acapulco	\$ 7,519,784.21	\$ 8,141,256.03	\$ 8,141,256.03	\$ 1,050,021.78	\$ 2,477,427.37	\$ 1,203,041.01	\$ 217,460.00	\$	\$ 52,104,497.06	\$ 2,710,239.25	\$ 75,366,200.09
Acapulco - CD. Méndez	\$ 7,437,262.05	\$ 249,548.36	\$ 2,000,314.19	\$ 27,899,006.02	\$ 7,381,736.26	\$ 3,102,335.95	\$ 1,096,028.64	\$	\$ 58,215,308.64	\$ 3,224,597.62	\$ 191,139,000.54
<b>Total Puebla</b>	\$ 49,660,611.12	\$ 10,445,267.42	\$ 21,875,455.62	\$ 17,267,057.75	\$ 12,858,481.91	\$ 5,201,750.40	\$ 2,314,661.02	\$	\$ 112,345,219.25	\$ 6,049,385.24	\$ 277,037,910.01
<b>COAHUILCO DE ZARAGOZA</b>											
Champion - Compiesto	\$ 644,572.71	\$ 5,942,120.05	\$ 701,040.05	\$ 701,040.05	\$ 1,284,094.53	\$ 1,101,070.99	\$ 101,091.51	\$	\$	\$	\$ 9,037,200.34
La Tiesja - Cosoleacaque (Iste - Asuyaca)	\$ 2,476,000.05	\$ 9,756,770.00	\$ 794,720.76	\$ 1,082,415.12	\$ 2,049,232.81	\$ 762,301.71	\$	\$ 204,041,000.00	\$ 5,472,000.00	\$ 5,472,000.00	\$ 227,037,910.01
Asuyaca - Cosoleacaque	\$ 820,334.80	\$ 9,157,020.04	\$ 891,484.40	\$ 4,320,947.05	\$ 1,394,200.90	\$ 2,484,207.01	\$ 307,151.45	\$	\$ 1,074,207.02	\$ 107,001.05	\$ 24,900,540.04
Agua Dulce - Cardenas	\$ 35,400,310.05	\$ 1,444,500.13	\$ 7,489,942.10	\$ 990,092.23	\$ 4,895,200.22	\$ 1,200,306.00	\$	\$	\$	\$	\$ 51,776,997.19
Salina Cruz - La Ventosa	\$ 17,075,344.57	\$ 1,094,348.98	\$ 4,304,817.29	\$ 529,257.05	\$ 2,090,540.68	\$ 2,200,307.46	\$	\$	\$ 34,926,879.61	\$ 607,300.00	\$ 65,991,594.64
Puente El Zacañil	\$	\$	\$	\$ 226,052.10	\$ 514,026.00	\$ 1,101,070.99	\$	\$	\$	\$	\$ 9,230,040.12
Varios Tramos	\$ 644,572.71	\$ 5,942,120.05	\$ 701,040.05	\$ 701,040.05	\$ 1,284,094.53	\$ 1,101,070.99	\$ 101,091.51	\$	\$	\$	\$ 9,037,200.34
<b>Total Coahuilco de Zaragoza</b>	\$ 36,511,026.58	\$ 2,548,208.81	\$ 26,316,406.29	\$ 6,164,113.27	\$ 12,858,481.91	\$ 5,201,750.40	\$ 2,314,661.02	\$	\$ 6,049,385.24	\$ 6,049,385.24	\$ 385,020,451.06
<b>VERACRUZ</b>											
CD. Méndez - Córdoba	\$ 2,120,350.06	\$ 9,034,037.49	\$ 940,421.20	\$ 940,421.20	\$ 3,069,427.45	\$ 890,144.70	\$ 390,942.02	\$	\$ 460,107.90	\$	\$ 17,500,917.27
Córdoba - Veracruz	\$ 4,510,007.61	\$ 9,029,051.60	\$ 1,027,017.76	\$ 1,140,102.02	\$ 5,090,256.51	\$ 2,052,412.01	\$	\$ 500,102.04	\$ 23,726,015.49	\$ 1,294,204.13	\$ 45,356,030.40
La Tiesja - Cosoleacaque (La Tiesja - Iste)	\$ 27,655,132.40	\$ 923,408.00	\$ 11,213,507.19	\$ 1,140,102.02	\$ 2,052,412.01	\$	\$	\$ 027,409.05	\$ 17,070,200.07	\$ 970,711.93	\$ 77,574,006.13
Libramiento Puente Tampico	\$	\$ 2,022,400.00	\$ 516,465.32	\$ 891,420.00	\$ 1,302,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$ 4,074,799.20
Culiacán, Zamora - Tihuatlán	\$ 837,290.25	\$ 6,209,210.03	\$ 262,698.06	\$ 262,698.06	\$ 1,770,482.06	\$ 1,371,259.54	\$	\$	\$	\$	\$ 10,031,454.04
<b>Total Veracruz</b>	\$ 42,145,740.26	\$ 923,408.00	\$ 28,132,000.20	\$ 3,913,466.26	\$ 15,228,341.13	\$ 5,823,635.14	\$ 899,144.70	\$ 1,588,705.65	\$ 41,729,046.25	\$ 1,094,576.06	\$ 194,031,272.10





Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación / Tramo	Monto Mayor Supervisión	Monto Menor Supervisión	Monto Mayor Puentes	Monto Menor Puentes	Supervisión	Modernización	Inspecciones (Tradicionales)	Inspecciones (Especiales)	Emergencias Técnicas	Supervisión	Total
<b>REYNOSA</b>											
Matamoros - Reynosa	\$ 2,433,872.21	\$ 210,200.42	\$ 10,904,240.31	\$ 1,979,560.31	\$ 402,112.42		\$ 109,100.00		\$ 34,400,204.30	\$ 2,270,750.00	\$ 44,710,007.18
Puente Internacional Reynosa - Pharr	\$ 0,972,707.00	\$ 500,489.07	\$ 7,620,412.06	\$ 860,351.00							\$ 1,116,962.24
Puente Internacional Ignacio Zaragoza			\$ 2,320,020.14	\$ 344,022.00	\$ 240,076.27						\$ 3,010,420.77
<b>Total Reynosa</b>	\$ 3,406,579.21	\$ 710,689.49	\$ 13,244,672.47	\$ 3,140,262.31	\$ 642,188.69		\$ 130,100.00		\$ 34,400,204.30	\$ 2,270,750.00	\$ 48,090,516.19
<b>GUADALAJARA</b>											
Guadaluajara - Tepic	\$ 2,433,872.21	\$ 210,200.42	\$ 10,904,240.31	\$ 1,979,560.31	\$ 402,112.42		\$ 109,100.00		\$ 34,400,204.30	\$ 2,270,750.00	\$ 44,710,007.18
Palmarejo - Urupitan	\$ 0,972,707.00	\$ 500,489.07	\$ 7,620,412.06	\$ 860,351.00							\$ 1,116,962.24
Urupitan - Nuevo Itala			\$ 2,320,020.14	\$ 344,022.00	\$ 240,076.27						\$ 3,010,420.77
Nuevo Itala - Lazaro Cardenas	\$ 1,400,713.81	\$ 810,201.40	\$ 4,444,816.55	\$ 3,582,291.00							\$ 5,103,037.80
<b>Total Guadaluajara</b>	\$ 4,807,293.02	\$ 1,520,891.89	\$ 23,270,329.02	\$ 6,764,202.62	\$ 642,188.69		\$ 130,100.00		\$ 34,400,204.30	\$ 2,270,750.00	\$ 28,613,263.72
<b>MONTENREY</b>											
Monterrey - Nuevo Laredo	\$ 14,072,642.16	\$ 1,076,370.51	\$ 12,750,470.10	\$ 1,070,060.45	\$ 905,031.00		\$ 385,207.20	\$ 251,200.04	\$ 22,500,736.90	\$ 750,023.02	\$ 50,302,426.62
Torreón - Saltillo	\$ 2,433,872.21	\$ 210,200.42	\$ 10,904,240.31	\$ 1,979,560.31	\$ 402,112.42		\$ 109,100.00		\$ 34,400,204.30	\$ 2,270,750.00	\$ 44,710,007.18
Carmona - Ojo Caliente	\$ 0,972,707.00	\$ 500,489.07	\$ 7,620,412.06	\$ 860,351.00							\$ 1,116,962.24
Calderera - Reynosa	\$ 1,400,713.81	\$ 810,201.40	\$ 4,444,816.55	\$ 3,582,291.00							\$ 5,103,037.80
Comatz Palacios - Conrallios	\$ 91,130,021.02	\$ 2,025,620.40	\$ 4,420,710.70	\$ 270,051.54	\$ 570,051.54		\$ 112,357.94	\$ 141,071.04	\$ 8,225,892.56	\$ 306,017.00	\$ 195,331,817.06
Puerto Mexico - Cd. Obregon	\$ 100,100,200.00	\$ 3,104,908.01	\$ 5,000,000.00	\$ 4,081,000.00	\$ 4,081,000.00		\$ 1,744,223.06	\$ 1,418,716.40	\$ 31,200,000.00	\$ 1,273,322.74	\$ 200,210,183.00
<b>Total Monterrey</b>	\$ 119,509,955.38	\$ 4,617,778.81	\$ 27,670,919.96	\$ 2,724,262.62	\$ 1,607,143.12		\$ 604,767.16	\$ 1,562,981.44	\$ 31,200,736.90	\$ 1,273,322.74	\$ 200,210,183.00
<b>CHAPAS</b>											
Las Choapas - Raudales - Ococeque uita	\$ 120,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00		\$ 1,110,017.79	\$ 1,000,000.00	\$ 107,310,000.00	\$ 0,374,995.10	\$ 109,230,309.41
<b>Total Chapas</b>	\$ 120,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 11,000,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ 600,000.00		\$ 1,110,017.79	\$ 1,000,000.00	\$ 107,310,000.00	\$ 0,374,995.10	\$ 109,230,309.41
<b>OAXACA</b>											
Cd. Cuicnopalen - Oaxaca	\$ 20,150,705.54	\$ 1,032,077.77	\$ 25,982,050.00	\$ 3,140,900.50			\$ 612,000.20	\$ 1,500,370.14			\$ 25,773,000.28
<b>Total Oaxaca</b>	\$ 20,150,705.54	\$ 1,032,077.77	\$ 25,982,050.00	\$ 3,140,900.50			\$ 612,000.20	\$ 1,500,370.14			\$ 25,773,000.28
<b>Total General</b>	\$ 1,238,921,722.20	\$ 51,170,466.57	\$ 402,480,051.05	\$ 40,772,480.02	\$ 108,165,255.55	\$ 5,100,523.04	\$ 1,218,544.50	\$ 27,885,555.74	\$ 757,030,014.03	\$ 3,473,127.72	\$ 2,007,307,207.03

0198

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
CONTRATOS PENDIENTES DE FINQUITO 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Canceles Acumulados C	Monto Ca. Tránsito D	Reservaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia D-C-DE	Diferencia A-D
			Inicio	Fin											
134C	460014248 500004647 500004644	GRUPO COMERCIAL DE MOBILIDAD S.A. DE C.V.	2009/2010	30/09/2011	CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL DE LA ALICANTARILLA Y DEL PREFECC DEL KM 50+714 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	40,000,000.00 \$	40,000,240.33 \$	40,000,240.33 \$	40,000,240.33 \$	36,993,144.45		100,000.75 \$	3,546,023.17 \$	176,491.75 \$	
135A	460014243 500004671	PROFESIONISTAS EN CONTROL S.A. DE C.V.	2009/2010	09/02/2011	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE LA AMPLIACIÓN A TERCER CARRIL DE LA ALICANTARILLA Y DEL PREFECC DEL KM 50+714 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA	2,000,000.00 \$	1,178,050.55 \$	1,178,050.55 \$	1,178,050.55 \$	1,150,000.00		8,347.00		24,010.02 \$	
					SUBTOTAL PUEBLA	42,000,000.00 \$	41,841,893.88 \$	41,841,893.88 \$	41,841,893.88 \$	38,107,944.88	3	108,347.75	3,546,023.12 \$	150,262.78 \$	


México - Puebla

2

RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Sabido Concedido E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)		
Tlaxana	\$ 10,050,000.00	\$ 92,028,254.37	\$ 92,028,254.37	\$ 92,028,254.37	\$ 91,899,071.36	\$	\$ 730,183.01	\$	\$ 96,866,402.85	\$ 990,907.05	\$ 3,668,331.40	100.0%	100.0%		
Culiacán	\$ 96,000,000.00	\$ 50,388,003.89	\$ 59,389,003.89	\$ 59,389,003.89	\$ 59,382,561.25	\$	\$ 35,442.64	\$	\$ 65,433,610.69	\$	\$ 6,071,068.44	100.0%	100.0%		
Querétaro	\$ 259,398,551.84	\$ 228,530,389.86	\$ 228,530,389.86	\$ 228,530,389.86	\$ 227,009,860.81	\$	\$ 1,521,023.15	\$	\$ 228,365,844.80	\$ 128,074.96	\$ 1,356,477.99	100.0%	100.0%		
Guerrero	\$ 571,551,314.78	\$ 456,977,522.00	\$ 456,977,522.00	\$ 456,977,522.00	\$ 428,527,175.43	\$	\$ 27,350,347.47	\$	\$ 450,110,199.37	\$ 791,695.05	\$ 21,592,013.04	100.0%	100.0%		
Puebla	\$ 80,000,000.00	\$ 42,264,264.01	\$ 42,264,264.01	\$ 42,264,264.01	\$ 42,141,527.53	\$	\$ 122,737.08	\$	\$ 42,141,527.53	\$ 487,544.15	\$	100.0%	100.0%		
Coahuila	\$ 66,450,298.76	\$ 56,514,565.94	\$ 56,514,565.94	\$ 56,514,565.94	\$ 56,511,025.98	\$	\$ 3,539.96	\$	\$ 56,740,408.82	\$ 522,042.82	\$ 238,382.94	100.0%	100.0%		
Veracruz	\$ 20,098,391.85	\$ 43,168,375.03	\$ 43,168,375.03	\$ 43,168,375.03	\$ 43,145,740.38	\$	\$ 22,634.65	\$	\$ 43,064,920.30	\$ 576,505.05	\$ 519,088.02	100.0%	100.0%		
Reynosa															
Guadalajara	\$ 11,300,000.00	\$ 9,406,733.15	\$ 9,406,733.15	\$ 9,406,733.15	\$ 9,406,713.81	\$	\$ 19.34	\$	\$ 9,406,713.81	\$ 38,370.80	\$	100.0%	100.0%		
Monterrey	\$ 131,140,981.95	\$ 106,428,062.28	\$ 106,428,062.28	\$ 106,428,062.28	\$ 106,109,205.08	\$	\$ 316,797.20	\$	\$ 108,538,062.36	\$ 85,394.17	\$ 2,428,707.28	100.0%	100.0%		
Chiapas	\$ 81,342,489.82	\$ 135,751,978.99	\$ 135,751,978.99	\$ 135,751,978.99	\$ 135,659,920.13	\$	\$ 92,052.86	\$	\$ 138,819,005.60	\$ 690,713.42	\$ 1,159,079.47	100.0%	100.0%		
Oaxaca	\$ 28,250,000.00	\$ 43,123,056.11	\$ 43,123,056.11	\$ 43,123,056.11	\$ 39,150,378.54	\$	\$ 3,972,677.57	\$	\$ 39,150,378.54	\$ 575,792.59	\$	100.0%	100.0%		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,356,480,000.00</b>	<b>\$ 1,273,089,207.23</b>	<b>\$ 1,273,089,207.23</b>	<b>\$ 1,273,089,207.23</b>	<b>\$ 1,238,921,752.30</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 34,167,454.93</b>	<b>\$</b>	<b>\$ 1,276,254,982.67</b>	<b>\$ 4,886,841.95</b>	<b>\$ 37,333,230.37</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>		

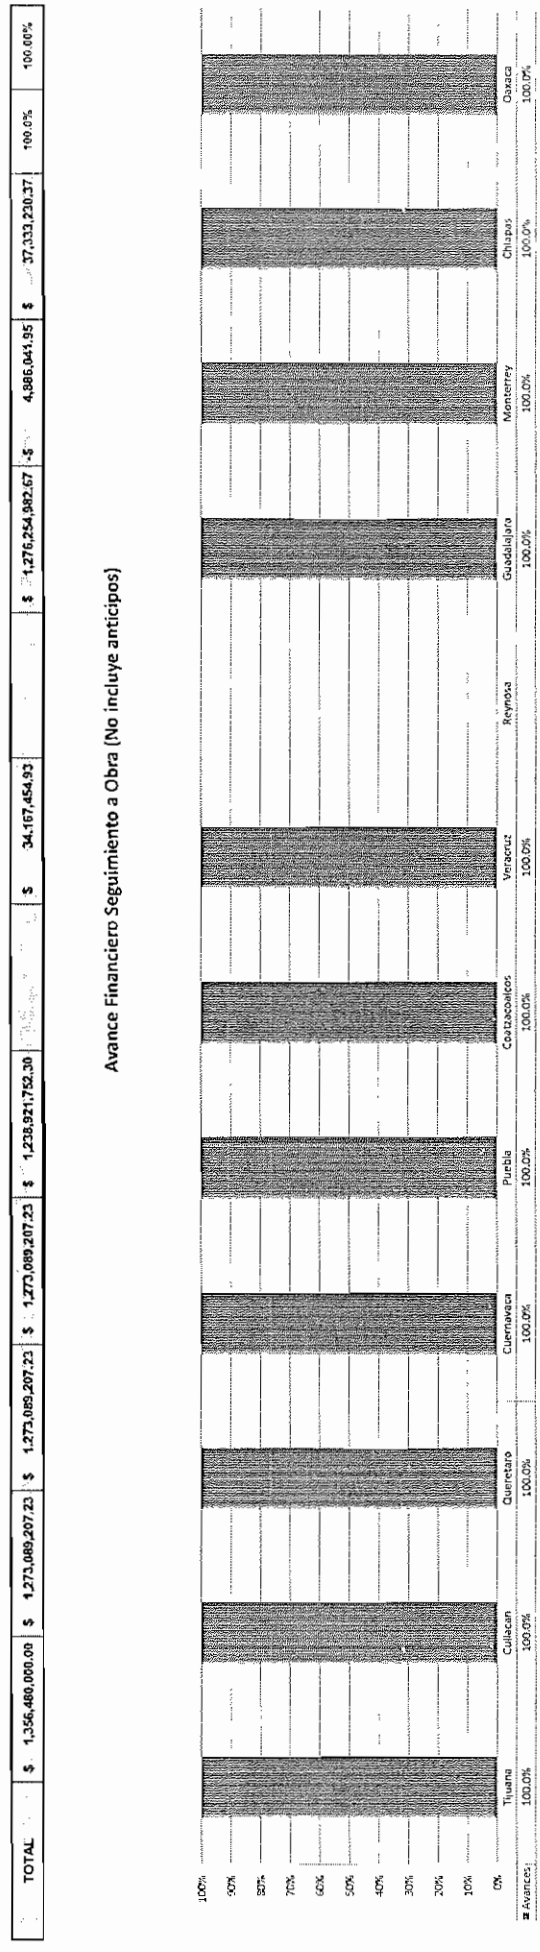



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONJUNTO  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Centro de Costos	Ejercicio	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Comprobado	Monto Pagar	Ejecución Autorizada	Monto Ejecutado	Saldo Cancelado	Plazo de Pago	Avance Realizado (%)	Avance Autorizado (%)
			Inicio	Fin										

14Y	40001370	CONCRETOS Y COLOCACION DE CUBIERTA DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	09/02/09	08/02/10	REPARACION Y COLOCACION DE CUBIERTA DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	4,000,000.00	2,891,195.10	2,891,195.10	2,891,195.10	2,891,195.10	-	-	100.00%	100.00%
33Y	40004730	OLIVAS	02/02/09	01/02/10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON BACHO DE CALA DE PAVIMENTO SUSTITUCION DE CUBIERTA Y CUBIERTA DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 41400 AL AM 41400 INGRESOS Y SERVICIOS CONJUNTO DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	31,000,000.00	154,140.01	31,350,000.00	100.00%	100.00%
36Y	40001070	SERVICIOS INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE CV	2/02/09	2/02/10	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	410,000.00	-	-	100.00%	100.00%
70Y	40004740	OLIVAS	02/02/09	30/02/10	REPARACION DEL PAVIMENTO DE LA ZONA DE CUBIERTA DE PAVIMENTO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	4,720,491.22	4,720,491.22	4,720,491.22	4,720,491.22	4,720,491.22	126,112.29	4,602,788.99	100.00%	100.00%
71Y	40001070	SERVICIOS INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE CV	01/02/09	01/02/10	ESTUDIO PROYECTO E INSTRUMENTACION DEL PAVIMENTO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 41400 AL AM 41400 INGRESOS Y SERVICIOS CONJUNTO DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	-	-	100.00%	100.00%
72Y	40001070	SERVICIOS INGENIERIA, SUPERVISION Y ASESORIA EN INGENIERIA S.A DE CV	01/02/09	01/02/10	ESTUDIO DE DISEÑO INTEGRAL DE LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	100.00%	100.00%

La Red Federal - Tránsito														
23Y	40001340	DESGASTE Y REPARACION DE PAVIMENTO	31/02/09	30/02/10	REPARACION Y COLOCACION DE MALLA DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00	100.00%	100.00%
23Y	40001070	CONSTRUCCIONES	01/02/09	01/02/10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	440,320.00	20,440,320.00	100.00%	100.00%
						<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>19,000,000.00</b>	<b>5,620,000.00</b>	<b>19,560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Fonction Des Regis. Lit.														
23Y	40001070	CONSTRUCCIONES	31/02/09	30/02/10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00	100.00%	100.00%
						<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>5,620,000.00</b>	<b>9,560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Compras - Construcción														
23Y	40001070	CONSTRUCCIONES	31/02/09	30/02/10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00	100.00%	100.00%
						<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>5,620,000.00</b>	<b>9,560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Mantenimiento de la Red Federal														
23Y	40001070	CONSTRUCCIONES	31/02/09	30/02/10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00	100.00%	100.00%
						<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>5,620,000.00</b>	<b>9,560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Mantenimiento de la Red Federal														
23Y	40001070	CONSTRUCCIONES	31/02/09	30/02/10	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHO EN LA CARRETERA FEDERAL DEL AM 17400 AL AM 17400 DE LA AUTOPISTA TULAJANA - ENSENADA	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	5,620,000.00	5,620,000.00	100.00%	100.00%
						<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>5,620,000.00</b>	<b>9,560,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

000 : 0201

Handwritten signature

CAMINOS Y PAVIMENTOS FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONDICIONALES  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with columns: No. Ejecuta, Contrato No, Licitadora, Periodo de Ejecucion, Concepto, Monto Original Autorizado, Monto Subvencionado, Monto Comprobado, Monto Programado, Estimado Acreditado, Monto de Tránsito, Subvenciones, Monto Comprobado, Monto de Tránsito, Monto de Obras, Monto de Obras. Includes sub-sections for 'Obras de Mantenimiento' and 'Obras de Reparación'.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.








RESUMEN DEL PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance financiero (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Comulgado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Tándem D	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados			
Tijuana	\$ 502,500.00	\$ 3,352,019.25	\$ 3,352,019.25	\$ 3,352,019.25	\$ 3,352,019.25	\$	\$ 0.02		\$ 3,352,019.23	-\$ 38,795.51		100.0%		
Culiacán	\$ 4,800,000.00	\$ 769,172.01	\$ 769,172.01	\$ 769,172.01	\$ 769,172.01				\$ 769,172.01			100.0%		
Querétaro	\$ 12,475,000.00	\$ 9,632,055.10	\$ 9,632,055.10	\$ 9,632,055.10	\$ 9,581,225.70				\$ 9,581,225.70	-\$ 22,025.40		100.0%		
Cuernavaca	\$ 28,032,500.00	\$ 19,698,408.19	\$ 19,698,408.19	\$ 19,698,408.19	\$ 19,479,518.52				\$ 19,631,598.32	-\$ 275,712.72	\$ 1,302,070.30	100.0%		
Puebla	\$ 4,000,000.00	\$ 2,603,914.19	\$ 2,603,914.19	\$ 2,603,914.19	\$ 2,603,914.19				\$ 2,603,914.19			100.0%		
Coahuila de Zaragoza	\$ 3,005,000.00	\$ 2,540,836.15	\$ 2,540,836.15	\$ 2,540,836.15	\$ 2,508,906.61				\$ 2,508,906.61	-\$ 134,380.37		100.0%		
Veracruz	\$ 400,000.00	\$ 923,488.96	\$ 923,488.96	\$ 923,488.96	\$ 923,488.96				\$ 923,488.96			100.0%		
Reynosa														
Guadalupe	\$ 585,000.00	\$ 819,912.34	\$ 819,912.34	\$ 819,912.34	\$ 819,861.49				\$ 819,861.49	-\$ 4,692.03		100.0%		
Monterrey	\$ 6,320,000.00	\$ 3,104,996.91	\$ 3,104,996.91	\$ 3,104,996.91	\$ 3,104,996.91				\$ 3,104,996.91	-\$ 3,491.19		100.0%		
Chapas	\$ 3,750,000.00	\$ 6,469,445.84	\$ 6,469,445.84	\$ 6,469,445.84	\$ 6,400,684.38				\$ 6,400,684.38	-\$ 61,546.99		100.0%		
Oaxaca	\$ 1,412,500.00	\$ 1,632,677.77	\$ 1,632,677.77	\$ 1,632,677.77	\$ 1,632,677.77				\$ 1,632,677.77	-\$ 6,670.98		100.0%		
Oficinas Centrales	\$ 2,500,000.00													
<b>TOTAL</b>	\$ 65,262,500.00	\$ 51,546,926.71	\$ 51,546,926.71	\$ 51,546,926.71	\$ 51,176,465.97	\$	\$ 370,460.74		\$ 51,328,545.77	-\$ 547,316.05	\$ 152,379.80	100.0%		

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

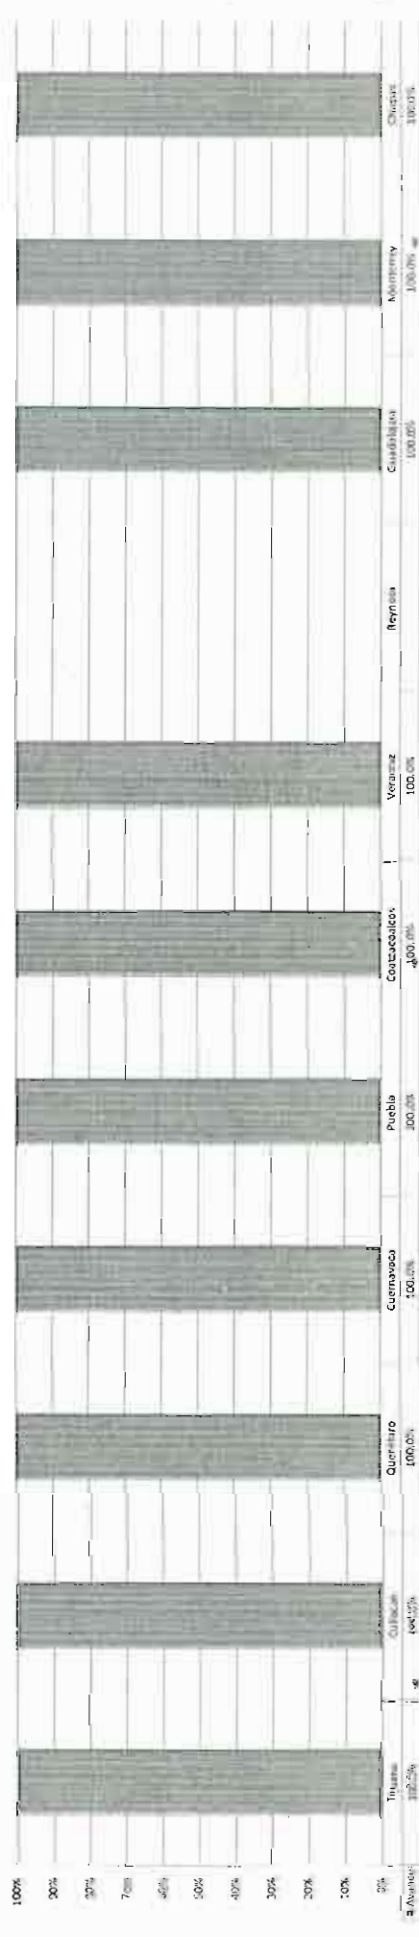

Handwritten signature

MINISTERIO PÚBLICO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS  
 DIRECCIÓN DE INFRASTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº. Contrato	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato	Concepto	Monto Contratado	Monto Autorizado	Monto Cuota Inicial	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto Ej. Transferido	Monto Ingresos Devueltos	Estado Cuota Inicial	Observaciones	Financiamiento	Avance
TAMAYO	400013483	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	200,000.00	101,480.16	101,480.16	101,480.16	101,480.16	-	-	101,480.16	-	100.0%	
	400014732	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	200,000.00	1,114,233.31	1,114,233.31	1,114,233.31	1,114,233.31	-	-	1,114,233.31	-	100.0%	
	400014816	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	20/06/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	200,000.00	178,671.45	178,671.45	178,671.45	178,671.45	-	-	178,671.45	-	100.0%	
LA ESPERANZA - TUMAYO	400013483	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	300,000.00	270,141.86	270,141.86	270,141.86	270,141.86	-	-	270,141.86	-	100.0%	
	400014732	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	300,000.00	1,600,232.20	1,600,232.20	1,600,232.20	1,600,232.20	-	-	1,600,232.20	-	100.0%	
	400014816	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	20/06/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	300,000.00	3,326,802.33	3,326,802.33	3,326,802.33	3,326,802.33	-	-	3,326,802.33	-	100.0%	
CHAMPAPA - LAMBAYEQUE	400013491	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	4,000,000.00	790,172.01	790,172.01	790,172.01	790,172.01	-	-	790,172.01	-	100.0%	
	400014732	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	4,000,000.00	2,641,172.36	2,641,172.36	2,641,172.36	2,641,172.36	-	-	2,641,172.36	-	100.0%	
	400014816	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	20/06/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	4,000,000.00	3,365,552.29	3,365,552.29	3,365,552.29	3,365,552.29	-	-	3,365,552.29	-	100.0%	
LAMBAYEQUE - TUMAYO	400013483	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	500,000.00	412,348.03	412,348.03	412,348.03	412,348.03	-	-	412,348.03	-	100.0%	
	400014732	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	01/03/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	500,000.00	1,104,171.13	1,104,171.13	1,104,171.13	1,104,171.13	-	-	1,104,171.13	-	100.0%	
	400014816	CONSTRUCIONES Y OBRAS PÚBLICAS S.A. SUCURSAL DE CHIMBOTE	20/06/2010 - 30/06/2010	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA SUBSTRUCIÓN Y COLONIZACIÓN DE BARRIO LA OBRERA EN LA AUTOPISTA TUMANA - CHIMBOTE	500,000.00	782,747.13	782,747.13	782,747.13	782,747.13	-	-	782,747.13	-	100.0%	

Handwritten signature or mark.



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA
PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Table with columns: No. Puntaje, Contratación, Empresa, Período del Contrato, Concepto, Monto Asignado Modificado, Monto Contrato, Monto Programa, Estimación Actualización, Monto En Trámite, Rendimiento, Saldo Contratado, Diferencia, Partidas y Subpartidas, Monto Asignado, Monto Puntaje. Rows include sections for Misiones, Guaymas, and Puebla.

Compania y proveedor
Fecha de Impresión

Handwritten signature





**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**


Fecha de corte: 20 de Septiembre de 2012

No. Petición	Contrato No.	Empresa	Periodo de Contrato (Inicio-Fin)	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aplicado Modificación	Monto Cedido por A	Monto Pagar por B	Estimado Acreditado C	Monto en Trámite D	Requisitos y Devolutivos	Monto Creado E	Diferencia De/Créd.	Ejecución y Flujo de Efectivo	Avance Físico Reportado (%)	Avance Reportado Contable Pagar
318MY	48001386 58004216	INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A DE CV	01/03/2010 - 23/11/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL KM 104+000 AL KM 108+300 DEL KM 103+400 AL 114+300 DEL KM 113+400 AL KM 118+200	2,760,000.00	2,109,750.35	2,166,783.35	2,108,793.20	2,083,299.20	-	45	23,029.95	\$	2,083,299.36	100.0%	
328MY	48001424	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE CV	07/05/2010 - 20/09/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL KM 0+000 AL KM 10+000	500,000.00	291,204.57	291,204.57	291,204.57	290,811.20	-	5	412.37	\$	290,811.20	100.0%	
338MY	48001428	RAMOS NEIRA S DE CV	17/05/2010 - 28/05/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION DEL KM 10+000 AL KM 107+000	470,000.00	208,519.01	208,519.01	208,519.01	207,852.51	-	5	667.50	\$	207,852.51	100.0%	
378MY	48001480 58004200 58004202	JAF SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A DE CV	30/08/2010 - 28/01/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DEL TORREKILN LOCALIZADO EN EL KM 14+000 DEL C.D. LOS CHOPAS - HUANQUEL - OCOYOACAUILLA	1,026,059.97	1,026,059.97	1,026,059.97	1,026,059.97	1,763,811.07	-	0	479.92	\$	43,994.00	100.0%	
388MY	48001478	INGENIERIA SUPERVISION Y CONSTRUCCION CIVIL S.A DE CV	26/07/2010 - 08/11/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE MICROCARPETA CUERPO UNDO DEL KM 10+000 AL KM 11+000 DEL KM 12+000 AL KM 12+700 Y TIRADEROS ASFALTADOS DEL KM 12+000 AL KM 12+200 DEL C.D. VAG CHOPAS - HUANQUEL - OCOYOACAUILLA	810,323.00	810,323.00	810,323.00	810,323.00	810,323.00	-	0	4,414.48	\$	810,323.00	100.0%	
888MY	48001476 58004208	CONSTRUCTORA SACHADONA S.A DE CV	23/08/2010 - 14/02/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE UNA RAMPA DE ACCESO PARA EL TRÁNSITO DE BUSES DEL C.D. LAS CHOPAS - HUANQUEL - OCOYOACAUILLA	1,146,469.25	1,146,469.25	1,146,469.25	1,146,469.25	1,146,469.25	-	14	10,463.68	\$	1,146,469.25	100.0%	
<b>DAMAZA</b>																
					3,730,000.00	6,494,443.34	6,494,443.34	6,494,443.34	6,494,443.34	6,494,443.34	-	67,148.08	\$	66,371.48	100.0%	
<b>PAZ DE LA CAJONILLA</b>																
					162,500.00	406,673.00	406,673.00	406,673.00	406,673.00	-	-	406,673.00	\$	406,673.00	100.0%	
338MY	48001420	PROYECTOS GEOTECNICOS Y CONSTRUCCION S.A DE CV	03/01/2010 - 30/09/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE ESTABILIZACION DEL CORREL UNICO EN EL KM 10+000 DEL C.D. LOS CHOPAS - HUANQUEL - OCOYOACAUILLA	162,500.00	406,673.00	406,673.00	406,673.00	406,673.00	-	-	406,673.00	\$	406,673.00	100.0%	
948MY	48001429 58004208	PACIFICA INGENIERIA S.A DE CV	05/07/2010 - 22/01/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 10+000 AL KM 11+000 DEL C.D. OCOYOACAUILLA	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	-	5	9,910.00	\$	1,220,000.00	100.0%	
					1,412,000.00	1,633,346.00	1,633,346.00	1,633,346.00	1,633,346.00	-	5	6,673.00	\$	1,633,346.00	100.0%	
<b>Distritos Conectados</b>																
308MY	Servicio e Cargo de los Subdelegados y Peritos				2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
					2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
					47,702,500.00	51,546,026.71	51,546,026.71	51,546,026.71	51,546,026.71	51,546,026.71	-	467,316.05	\$	51,078,710.66	100.0%	
<b>TOTAL</b>					<b>67,702,500.00</b>	<b>68,179,473.41</b>	<b>68,179,473.41</b>	<b>68,179,473.41</b>	<b>68,179,473.41</b>	<b>68,179,473.41</b>	<b>-</b>	<b>467,316.05</b>	<b>\$</b>	<b>67,702,500.00</b>	<b>100.0%</b>	<b></b>

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programario Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercicio a Flajo de Ejercicio	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)	Avance físico (%)		
Tijuana	\$ 10,288,855.00	\$ 24,808,254.78	\$ 24,808,254.78	\$ 24,808,254.78	\$ 24,808,130.82	\$	\$ 124.16		\$ 24,816,578.77		\$ 8,448.15	100.0%	100.0%		
Culiacán	\$ 24,025,297.00	\$ 24,549,250.35	\$ 24,549,250.35	\$ 24,549,250.35	\$ 24,549,250.09	\$	\$ 0.26		\$ 24,549,250.09	\$ 51,572.22		100.0%	100.0%		
Querétaro	\$ 47,945,453.98	\$ 42,949,852.88	\$ 42,949,852.88	\$ 42,949,852.88	\$ 42,948,007.92	\$	\$ 1,844.96		\$ 44,467,607.83		\$ 1,519,599.01	100.0%	100.0%		
Cuernavaca	\$ 68,634,147.90	\$ 64,268,522.79	\$ 64,268,522.79	\$ 64,268,522.79	\$ 63,588,015.50	\$	\$ 680,507.29		\$ 63,588,015.51	\$ 639,490.58		100.0%	100.0%		
Puebla	\$ 29,010,975.84	\$ 27,995,011.74	\$ 27,995,011.74	\$ 27,995,011.74	\$ 27,995,008.02	\$	\$ 3.72		\$ 29,014,861.15	\$ 486.44	\$ 1,019,853.11	100.0%	100.0%		
Coahuila	\$ 37,436,548.46	\$ 36,310,400.33	\$ 36,310,400.33	\$ 36,310,400.33	\$ 36,310,400.29	\$	\$ 0.04		\$ 36,994,923.38	\$ 39,300.31	\$ 694,523.09	100.0%	100.0%		
Veracruz	\$ 35,598,514.43	\$ 38,152,839.29	\$ 38,152,839.29	\$ 38,152,839.29	\$ 38,152,806.30	\$	\$ 32.99		\$ 40,086,347.38		\$ 1,033,541.68	100.0%	100.0%		
Reynosa	\$ 4,365,534.56	\$ 4,348,061.61	\$ 4,348,061.61	\$ 4,348,061.61	\$ 4,347,988.01	\$	\$ 73.60		\$ 4,347,988.01			100.0%	100.0%		
Guadaluajara	\$ 55,703,523.93	\$ 51,038,076.22	\$ 51,038,076.22	\$ 51,038,076.22	\$ 51,038,945.90	\$	\$ 1,750.32		\$ 52,077,827.95		\$ 1,040,982.04	100.0%	100.0%		
Monterrey	\$ 53,842,460.56	\$ 51,701,440.44	\$ 51,701,440.44	\$ 51,701,440.44	\$ 51,688,960.94	\$	\$ 12,579.50		\$ 51,915,643.70	\$ 952.37	\$ 226,762.76	100.0%	100.0%		
Chiapas	\$ 12,247,899.00	\$ 11,007,883.00	\$ 11,007,883.00	\$ 11,007,883.00	\$ 11,007,819.60	\$	\$ 63.40		\$ 11,408,412.35	\$ 393,860.06	\$ 400,592.75	100.0%	100.0%		
Oaxaca	\$ 26,942,912.19	\$ 26,116,462.97	\$ 26,116,462.97	\$ 26,116,462.97	\$ 25,992,869.96	\$	\$ 123,603.11		\$ 26,365,500.25	\$ 32,336.92	\$ 370,640.39	100.0%	100.0%		
<b>TOTAL</b>	\$ 415,549,832.85	\$ 403,246,856.40	\$ 403,246,856.40	\$ 403,246,856.40	\$ 402,426,091.05	\$	\$ 820,565.35		\$ 489,630,963.97	\$ 1,103,908.90	\$ 7,204,872.88	100.0%	100.0%		

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

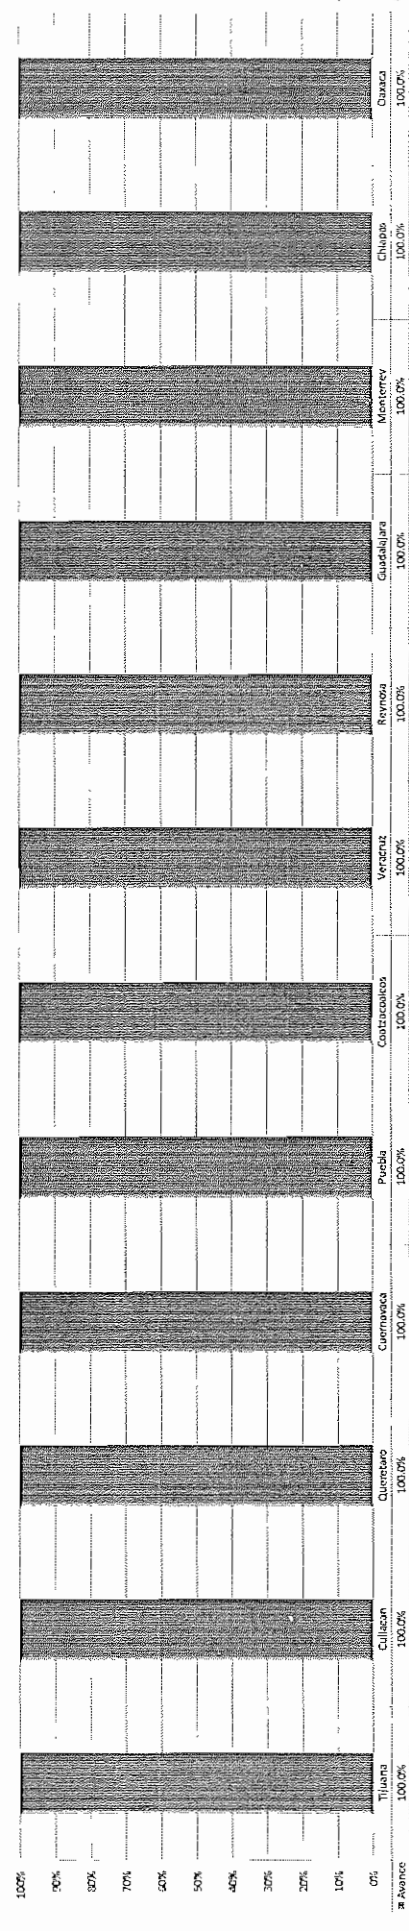

000 0210



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2016 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato (Inicio-Fin)	Corte cado	Monto Original Aprobado	Monto Aprobación al edificio	Monto Controlado	Monto Pagaado	Excesos Acreditados	Monto E.G. Tránsito	Subvenciones Devueltas	Saldo Comprobado	Diferencia D-C-D-E	Empleados al 31/03/16	Avance Anual (%)	Avance Global (%)							
<b>La Pasa - Guatula</b>																							
20M	400013402	MAE DE CARROLES DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DEL CAMINO DIRECTO LA PASA - GUATULA	4,156,707.40 \$	4,160,074.00 \$	4,160,074.00 \$	4,160,074.00 \$	4,160,074.00 \$	29,910.21 \$	0.00 \$	4,190,000.00 \$	33.27 \$	4,140,074.00 \$	100.00%	100.00%							
<b>Zapotitlan - Rancho Viejo</b>																							
21M	400013403	PROYECTO AUTONOMA CONSTRUCCION DE CARRETERA Y CONEXIONES DE CARRETERA S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DEL CAMINO DIRECTO ZAPOTITLAN-RANCHO VIEJO	5,616,154.24 \$	5,617,685.50 \$	5,617,685.50 \$	5,617,685.50 \$	5,617,685.50 \$	0.00 \$	0.00 \$	5,617,685.50 \$	0.00 \$	5,617,685.50 \$	100.00%	100.00%							
<b>Rancho Viejo - Tzacol</b>																							
22M	400013409	SURFING S.A. DE C.V.	15/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DEL CAMINO DIRECTO RANCHO VIEJO - TZACOL	1,735,329.75 \$	1,735,329.75 \$	1,735,329.75 \$	1,735,329.75 \$	1,735,329.75 \$	3,864.28 \$	0.00 \$	1,739,194.03 \$	161.52 \$	1,725,000.00 \$	100.00%	100.00%							
<b>PUEBLA</b>																							
<b>Mexico - Puebla</b>																							
23M	400013475	CONSTRUCTORA MAURICIO S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA TRAMO DEL KM 11+000 AL 13+000	4,382,679.13 \$	4,190,949.70 \$	4,190,949.70 \$	4,190,949.70 \$	4,190,949.70 \$	0.00 \$	0.00 \$	4,190,949.70 \$	0.00 \$	4,190,949.70 \$	100.00%	100.00%							
24M	400013479	DESARROLLO CARRETERO S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA TRAMO DEL KM 10+000 AL 12+000	7,628,882.84 \$	7,529,916.84 \$	7,529,916.84 \$	7,529,916.84 \$	7,529,916.84 \$	0.00 \$	0.00 \$	7,529,916.84 \$	0.00 \$	7,529,916.84 \$	100.00%	100.00%							
<b>Puebla - Acapulco</b>																							
25M	400013486	GRUPO CONSTRUCTORA PUEBLA MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA PUEBLA-ACAPULCO	7,972,489.10 \$	7,976,784.77 \$	7,976,784.77 \$	7,976,784.77 \$	7,976,784.77 \$	0.00 \$	0.00 \$	7,976,784.77 \$	0.00 \$	7,976,784.77 \$	100.00%	100.00%							
<b>Acapulco - Cd. Mexico</b>																							
26M	400013483	MAURICIO S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA PUEBLA-ACAPULCO TRAMO DEL KM 11+000 AL 12+000	9,937,448.77 \$	8,741,398.33 \$	8,741,398.33 \$	8,741,398.33 \$	8,741,398.33 \$	0.00 \$	0.00 \$	8,741,398.33 \$	0.00 \$	8,741,398.33 \$	100.00%	100.00%							
<b>QUATZACUALCOOS</b>																							
<b>Chamotlan - Campeche</b>																							
27M	400013455	MSC & CIR CUBAS CIVILES S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 15/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR	6,424,331.52 \$	6,642,119.07 \$	6,642,119.07 \$	6,642,119.07 \$	6,642,119.07 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,642,119.07 \$	0.00 \$	6,642,119.07 \$	100.00%	100.00%							
<b>La Tinaja - Chianhuac (Cerro Macabuzatlan)</b>																							
28M	400013404	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 15/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR	9,645,829.59 \$	9,759,779.59 \$	9,759,779.59 \$	9,759,779.59 \$	9,759,779.59 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,759,779.59 \$	0.00 \$	9,759,779.59 \$	100.00%	100.00%							
<b>Atzacol - Campeche</b>																							
29M	400013435	GRUPO OSC S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 15/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR	9,234,941.24 \$	9,197,626.06 \$	9,197,626.06 \$	9,197,626.06 \$	9,197,626.06 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,197,626.06 \$	0.00 \$	9,197,626.06 \$	100.00%	100.00%							
<b>Atzacol - Chianhuac</b>																							
30M	400013440	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 15/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR	9,218,519.99 \$	7,489,942.10 \$	7,489,942.10 \$	7,489,942.10 \$	7,489,942.10 \$	0.00 \$	0.00 \$	7,489,942.10 \$	0.00 \$	7,489,942.10 \$	100.00%	100.00%							
<b>Nalca Cruz - La Ventana</b>																							
31M	400013440	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 15/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR	4,012,209.11 \$	4,364,817.95 \$	4,364,817.95 \$	4,364,817.95 \$	4,364,817.95 \$	0.00 \$	0.00 \$	4,364,817.95 \$	0.00 \$	4,364,817.95 \$	100.00%	100.00%							
<b>YECUQUIL</b>																							
<b>Cd. Motozintla - Coahuila</b>																							
32M	400013441	GRUPO OSC S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 15/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA MEXICO-ACAPULCO	8,312,523.53 \$	9,084,657.49 \$	9,084,657.49 \$	9,084,657.49 \$	9,084,657.49 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,084,657.49 \$	0.00 \$	9,084,657.49 \$	100.00%	100.00%							
<b>Coahuila - Veracruz</b>																							
33M	400013442	SCPI ALBERT ARANDA S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA COAHUILA-VERACRUZ	9,740,445.20 \$	9,023,365.00 \$	9,023,365.00 \$	9,023,365.00 \$	9,023,365.00 \$	0.00 \$	0.00 \$	9,023,365.00 \$	0.00 \$	9,023,365.00 \$	100.00%	100.00%							
<b>La Tinaja - Cd. Jalisco</b>																							
34M	400013403	PROYECTOS Y SERVICIOS AL S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA LA TINAJA-OLA	10,141,219.95 \$	11,212,609.72 \$	11,212,609.72 \$	11,212,609.72 \$	11,212,609.72 \$	0.00 \$	0.00 \$	11,212,609.72 \$	0.00 \$	11,212,609.72 \$	100.00%	100.00%							
<b>Coahuila - Veracruz</b>																							
35M	400013444	TECNOLOGIA EN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AL S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DE LA AUTOPISTA OTEQUEZAMORA-INSAPAJAN	6,206,296.52 \$	6,209,219.43 \$	6,209,219.43 \$	6,209,219.43 \$	6,209,219.43 \$	0.00 \$	0.00 \$	6,209,219.43 \$	0.00 \$	6,209,219.43 \$	100.00%	100.00%							
<b>Licenciado Porfirio de Tlanabasco</b>																							
36M	400013445	PROYECTOS Y SERVICIOS AL S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/03/2011	MANTENIMIENTO MEJOR DEL EQUIPAMIENTO TURISTICO MUNICIPAL VERACRUZ	2,115,480.83 \$	2,022,490.39 \$	2,022,490.39 \$	2,022,490.39 \$	2,022,490.39 \$	0.00 \$	0.00 \$	2,022,490.39 \$	0.00 \$	2,022,490.39 \$	100.00%	100.00%							
<b>VERACRUZ</b>																							
<b>Subtotal Veracruz</b>																							
															33,959,514.93 \$	34,152,629.73 \$	34,152,629.73 \$	34,152,629.73 \$	34,152,629.73 \$	0.00 \$	34,152,629.73 \$	100.00%	100.00%




COMISION FEDERAL DE CAMBIOS Y PUNTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partido	Control No.	Cuenta	Periodo de Ejecucion Fin		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Comprobado	Ejercicio actualizado	Monto E. Trámite	Relaciones Dependientes	Saldo Comprobado E	Diferencia B/C/D/E	Ejercicio de Ejecucion	Monto Ingresos	Monto Pagaros
			Inicia	Fin											
<b>BATAVIA</b>															
<b>Mant. Menor - Batavia</b>															
318N	400013408	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - BATAVIA	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0	0	0	0	4,320,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL BATAVIA</b>															
<b>GUADALAJARA</b>															
<b>Mant. Menor - Guadalajara</b>															
320N	400013406	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	11,320,000.00	9,770,131.75	9,770,131.75	0	0	1,549,868.25	0	9,770,131.75	0	0
320N	400013407	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	8,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0	0	1,000,000.00	0	7,100,000.00	0	0
<b>Mant. Menor - Lázaro Cárdenas</b>															
400N	400013403	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - LAZAROCARDENAS	20,770,000.00	18,710,249.81	18,710,249.81	0	0	2,059,750.19	0	18,710,249.81	0	0
<b>Mant. Menor - Toluca</b>															
410N	400013401	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TOLUCA - NEZAHUALCOYOTL	4,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	0	0	2,000,000.00	0	2,320,000.00	0	0
<b>Mant. Menor - Toluca</b>															
420N	400013402	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TOLUCA - NEZAHUALCOYOTL	2,700,000.00	2,520,000.00	2,520,000.00	0	0	180,000.00	0	2,520,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL GUADALAJARA</b>															
<b>MONTERRREY</b>															
<b>Mant. Menor - Monterrey</b>															
430N	400013404	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LARDO DEL MAR	12,700,000.00	12,700,000.00	12,700,000.00	0	0	0	0	12,700,000.00	0	0
<b>Mant. Menor - Toluca</b>															
440N	400013407	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TOLUCA - NEZAHUALCOYOTL	8,170,000.00	7,910,000.00	7,910,000.00	0	0	260,000.00	0	7,910,000.00	0	0
<b>Mant. Menor - Toluca</b>															
450N	400013405	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TOLUCA - NEZAHUALCOYOTL	3,000,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	0	0	240,000.00	0	2,760,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL MONTERREY</b>															
<b>TIERRA NUEVA</b>															
<b>Mant. Menor - Tierra Nueva</b>															
460N	400013406	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TIERRA NUEVA - SAN ANTONIO	7,910,000.00	7,910,000.00	7,910,000.00	0	0	0	0	7,910,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL TIERRA NUEVA</b>															
<b>GUAYMAS</b>															
<b>Mant. Menor - Guaymas</b>															
470N	400013401	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA GUAYMAS - SAN ANTONIO	15,370,000.00	15,370,000.00	15,370,000.00	0	0	0	0	15,370,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL GUAYMAS</b>															
<b>LEON</b>															
<b>Mant. Menor - Leon</b>															
480N	400013402	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA LEON - SAN ANTONIO	11,250,000.00	11,250,000.00	11,250,000.00	0	0	0	0	11,250,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL LEON</b>															
<b>MIQUILAN DE DEUDA</b>															
<b>Mant. Menor - Miquilán de Deuda</b>															
490N	400013403	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MIQUILAN DE DEUDA - SAN ANTONIO	4,320,000.00	4,320,000.00	4,320,000.00	0	0	0	0	4,320,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL MIQUILAN DE DEUDA</b>															
<b>OTROS</b>															
<b>Mant. Menor - Otros</b>															
500N	400013404	60000000	01/02/2010	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA OTROS - SAN ANTONIO	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0	0	0	0	1,250,000.00	0	0
<b>SUBTOTAL OTROS</b>															
<b>TOTAL</b>															

Handwritten signature or mark.

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programa de Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Contratado E	Diferencia B + C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Reservaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance Financiero (%)		
Tijuana	\$ 2,314,022.60	\$ 1,872,443.59	\$ 1,872,443.59	\$ 1,872,443.59	\$ 1,835,661.41	\$ 36,782.18	\$	\$	\$ 1,835,661.41	\$ 46,746.74	\$	100.0%		
Culiacán	\$ 2,955,515.64	\$ 1,553,871.45	\$ 1,553,871.45	\$ 1,553,871.45	\$ 1,553,871.45	\$	\$	\$	\$ 1,553,871.45	\$ 4,530.93	\$	100.0%		
Querétaro	\$ 5,753,814.47	\$ 5,040,918.38	\$ 5,040,918.38	\$ 5,040,918.38	\$ 4,983,666.53	\$ 57,251.85	\$	\$	\$ 4,983,666.53	\$ 186,523.57	\$	100.0%		
Cuernavaca	\$ 6,236,097.75	\$ 6,473,199.93	\$ 6,473,199.93	\$ 6,473,199.93	\$ 6,431,888.32	\$ 41,311.61	\$	\$	\$ 6,431,888.32	\$ 37,007.16	\$	100.0%		
Puebla	\$ 3,481,317.10	\$ 3,311,193.13	\$ 3,311,193.13	\$ 3,311,193.13	\$ 3,311,193.13	\$	\$	\$	\$ 3,311,193.13	\$ 12,783.81	\$ 77,440.27	100.0%		
Coahuila de Zaragoza	\$ 4,759,519.16	\$ 4,166,523.04	\$ 4,166,523.04	\$ 4,166,523.04	\$ 4,164,113.87	\$ 2,409.17	\$	\$	\$ 4,166,523.04	\$ 49,436.26	\$ 31,305.68	100.0%		
Veracruz	\$ 4,271,921.72	\$ 3,913,466.10	\$ 3,913,466.10	\$ 3,913,466.10	\$ 3,913,466.05	\$ 0.05	\$	\$	\$ 3,913,466.05	\$ 7,924.01	\$	100.0%		
Reynosa	\$ 1,031,392.06	\$ 839,901.63	\$ 839,901.63	\$ 839,901.63	\$ 833,188.69	\$ 6,712.94	\$	\$	\$ 833,188.69	\$ 9,257.49	\$	100.0%		
Guadaluajara	\$ 6,084,422.88	\$ 4,445,088.13	\$ 4,445,088.13	\$ 4,445,088.13	\$ 4,444,818.55	\$ 269.58	\$	\$	\$ 4,444,818.55	\$ 9,024.84	\$	100.0%		
Monterrey	\$ 6,461,097.66	\$ 4,981,806.91	\$ 4,981,806.91	\$ 4,981,806.91	\$ 4,981,806.91	\$	\$	\$	\$ 4,981,806.91	\$ 1,021.38	\$ 36,602.19	100.0%		
Chihuahua	\$ 1,469,722.68	\$ 1,168,518.55	\$ 1,168,518.55	\$ 1,168,518.55	\$ 1,168,518.55	\$	\$	\$	\$ 1,168,518.55	\$	\$	100.0%		
Oaxaca	\$ 3,220,783.43	\$ 3,216,818.19	\$ 3,216,818.19	\$ 3,216,818.19	\$ 3,149,995.96	\$ 66,822.23	\$	\$	\$ 3,195,851.22	\$ 93,071.96	\$ 45,835.60	100.0%		
<b>TOTAL</b>	\$ 50,810,167.15	\$ 40,983,749.03	\$ 40,983,749.03	\$ 40,983,749.03	\$ 40,772,189.02	\$ 211,560.01	\$	\$	\$ 40,966,427.22	\$ 84,941.03	\$ 194,238.20	100.0%		

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

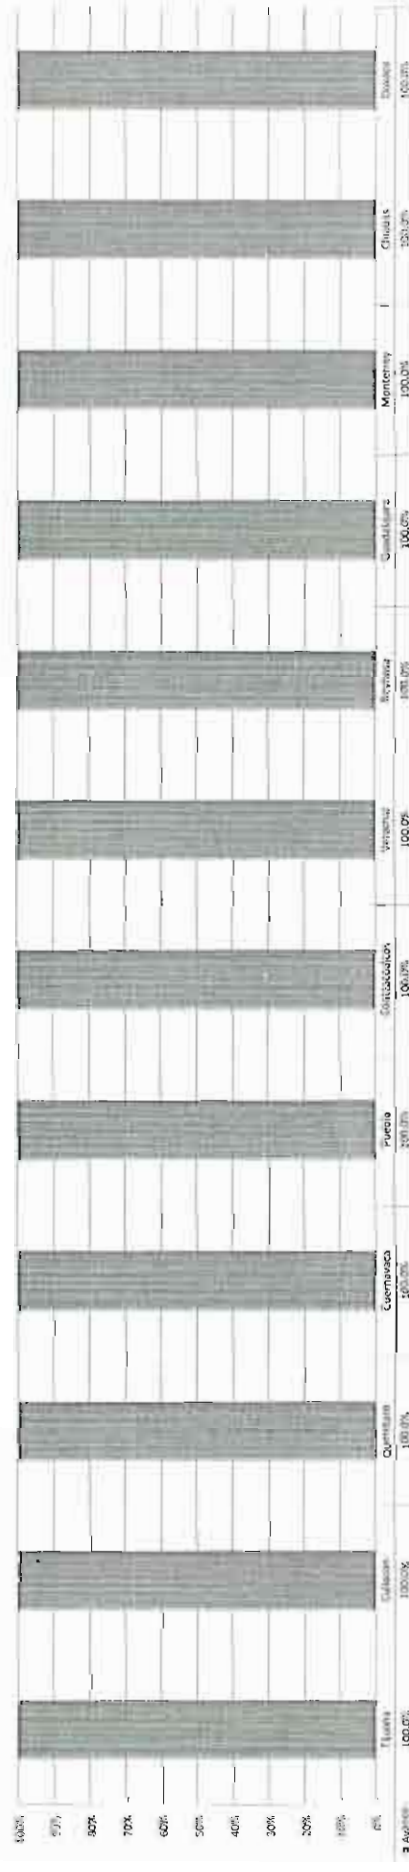

Handwritten signature or mark.

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COÓRDADOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Folio	Código No	Empresa	Periodo del Cambio		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Ampliado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Ejecución Autorizada C	Monto En Trámite D	Resumen de Devoluciones	Saldo Contratado E	Diferencia (B-C-D-E)	Folios de Fideicomiso del Facturo	Avance Reportado (en %)
			Inicio	Fin												
<b>TIJUANA</b>																
<b>Tramite - Ejecución</b>																
15MN	400013204	CLAPAH, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CAMINO DE LA OJINA TERMINAL DE MANTENIMIENTO MENOR Y OJINAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA TIJUANA-TECATEPEC	1,977,632.29	1,794,873.01	1,794,873.01	1,794,873.01	1,794,873.01	-	26,759.28	-	-	1,768,113.73	100.0%
<b>La Ramonera - Tecate</b>																
25MN	400014151	INOV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES UTEMA, S.A. DE C.V.	17/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA RAMONERA (TECATE)	467,802.19	377,919.08	377,919.08	377,919.08	377,919.08	-	11,887.11	-	-	366,031.97	100.0%
<b>Libramiento Los Galiles</b>																
35MN		SERVICIO A CARGO DE LA SUBDELEGACION TECNICA SUBDELEGACION TIJUANA				3,314,897.09	3,077,445.38	3,077,445.38	3,077,445.38	3,077,445.38	-	40,451.71	-	-	3,036,993.67	0.0%
<b>CUZACAN</b>																
<b>Ejecucion Des - Novalise</b>																
45MN	400013460	MONO INGENIERIA CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ESTACION DE NORMALIS, ESTACION DE JONICORA	2,053,616.64	1,533,871.46	1,533,871.46	1,533,871.46	1,533,871.46	-	4,744.18	-	-	1,529,127.28	100.0%
65MN					SUBTOTAL CUZACAN	2,053,616.64	1,533,871.46	1,533,871.46	1,533,871.46	1,533,871.46	-	4,744.18	-	-	1,529,127.28	100.0%
<b>QUERETARO</b>																
<b>Libramiento Noroeste de Queretaro</b>																
75MN	400013740	MANINGO, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	500,000.04	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	1,013.11	-	-	498,986.89	100.0%
85MN	400013245	HAUL PERFORMANCIA Y LOGISTICA, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA	911,034.42	920,700.09	920,700.09	920,700.09	920,700.09	-	0.00	-	-	920,700.09	100.0%
<b>Mexico - Cuernavaca</b>																
95MN	400013341	INOV INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES UTEMA, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	1,400,000.07	1,107,276.46	1,107,276.46	1,107,276.46	1,107,276.46	-	94,723.61	-	-	1,012,552.85	100.0%
105MN	400013344	ADISONIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	15/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	1,070,000.04	1,206,470.91	1,206,470.91	1,206,470.91	1,206,470.91	-	106,470.87	-	-	1,100,000.04	100.0%
<b>Queretaro - Toluca</b>																
115MN	400013303	CLAPAH, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA QUERETARO	1,142,700.00	1,102,602.49	1,102,602.49	1,102,602.49	1,102,602.49	-	7,097.51	-	-	1,095,504.98	100.0%
<b>CUERNAVACA</b>																
<b>Mexico - Cuernavaca</b>																
125MN	400013746	MOJALTEC SA DE CV	15/02/2010	01/03/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	1,178,007.40	1,120,200.52	1,120,200.52	1,120,200.52	1,120,200.52	-	4,111.63	-	-	1,081,220.91	100.0%
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																
145MN	400014251	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	15/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	2,278,546.27	1,746,091.20	1,746,091.20	1,746,091.20	1,746,091.20	-	19,071.84	-	-	1,727,019.36	100.0%
155MN	400013770	ALVARO ZOLA EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	15/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	1,204,152.52	1,204,152.52	1,204,152.52	1,204,152.52	1,204,152.52	-	3,300.88	-	-	1,200,851.64	100.0%
175MN	400014225	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/02/2010	15/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	1,204,152.52	1,204,152.52	1,204,152.52	1,204,152.52	1,204,152.52	-	3,300.88	-	-	1,200,851.64	100.0%
185MN					SUBTOTAL OTE RETARDO	3,034,414.67	2,547,819.34	2,547,819.34	2,547,819.34	2,547,819.34	-	109,827.57	-	-	2,437,991.77	100.0%

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2010 DE LA RED DEL FOMBO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Fianza	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio - Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Contratado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto Cu. Trámite	Diferencia BCL-DE	Saldo Cancelado	Relaciones - Cancelaciones	Ejercicio a Flujos de Efectivo	Porcentaje Financiero	Alcance de Cobertura
<b>Veracruz</b>															
133MN	408914216	JOSE LUIS SATURNINO AGUILAR SALINAS	1/06/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DEL LOMAMIENTO CUERPO DE AGUA DEL MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO LA PERMOCUANTA Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS	303,462.95 \$	491,474.76 \$	491,474.76 \$	491,474.76 \$	0.760.32 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	491,474.76 \$	100.0%	
191MN	408914146	JOSE LUIS SATURNINO AGUILAR SALINAS	1/06/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DEL C.D. PUENTE DE AGUA - AGUA, MANTENIMIENTO MENOR DEL C.D. ZACAPALCO - BANCHEO VIEJO Y MANTENIMIENTO MENOR DE 3 ESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO MENOR DEL C.D. MANCERQUE VIEJO - TANCOS	524,134.00 \$	600,913.10 \$	600,913.10 \$	600,913.10 \$	5,642.74 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	600,913.10 \$	100.0%	
213MN	408913330			SUBTOTAL GUERRERAS	827,596.95 \$	1,092,387.86 \$	1,092,387.86 \$	1,092,387.86 \$	5,802.06 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	1,092,387.86 \$	100.0%	
<b>PUEBLA</b>															
233MN	408913319	LABORTORIO DE SUPERVISION, S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA, TUNADO DEL KM 17+000 AL KM 13+000	629,807.14 \$	432,072.24 \$	432,072.24 \$	432,072.24 \$	7,209.44 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	432,072.24 \$	100.0%	
243MN	408913330			SUBTOTAL PUEBLA	629,807.14 \$	432,072.24 \$	432,072.24 \$	432,072.24 \$	7,209.44 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	432,072.24 \$	100.0%	
<b>Puebla - Anzoategui</b>															
253MN	408913362	CORPORATIVO OVALS CONSULTING S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DEL ACATZINGO	966,969.77 \$	966,242.30 \$	966,242.30 \$	966,242.30 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	966,242.30 \$	100.0%	17,440.27 \$
<b>Anzoategui - Col. Mendoza</b>															
263MN	408913374	LATITUDE TOPOGRAFIA Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE	1,091,021.18 \$	1,096,021.18 \$	1,096,021.18 \$	1,096,021.18 \$	9,477.37 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	1,096,021.18 \$	100.0%	
<b>COATZACOALCOS</b>															
273MN	408913374			SUBTOTAL ANZOATEGUI - COL. MENDOZA	1,091,021.18 \$	1,096,021.18 \$	1,096,021.18 \$	1,096,021.18 \$	9,477.37 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	1,096,021.18 \$	100.0%	
<b>Champotón - Campeche</b>															
273MN	408913374			SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE	710,000.00 \$	710,000.00 \$	710,000.00 \$	710,000.00 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	710,000.00 \$	100.0%	
<b>La Trinita - Cosoleacaque (Tramo Ixta-Ayupucan)</b>															
283MN	408913374			SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. SALA - ACAYUCAN	1,091,499.24 \$	790,000.00 \$	790,000.00 \$	790,000.00 \$	4,749.74 \$	0.000 \$	1,300.16 \$	0.000 \$	790,000.00 \$	100.0%	
<b>Acayucan - Cosoleacaque</b>															
293MN	408913354	CONSTRUCCIONES HOMBER, S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/05/2011	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA	1,100,154.00 \$	851,454.40 \$	851,454.40 \$	851,454.40 \$	9,012.00 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	851,454.40 \$	100.0%	
<b>Apas Dulce - Cárdenas</b>															
303MN	408913307	RAJA VICENTE OROGOZY COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/05/2011	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - Cárdenas	900,222.00 \$	900,000.00 \$	900,000.00 \$	900,000.00 \$	4,632.74 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	900,000.00 \$	100.0%	
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>															
313MN	408914096	CONSTRUCCIONES SILCE, S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 31/05/2011	SUPERVISION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SALINA CRUZ - LA VENTOSA	650,650.00 \$	650,400.00 \$	650,400.00 \$	650,400.00 \$	14,400.00 \$	0.000 \$	254.54 \$	0.000 \$	650,400.00 \$	100.0%	
<b>Puerto El Triunfal</b>															
343NK	408914075	EFERAN CASILLAS FIGUILLA	08/06/2010 - 26/09/2010	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - ZACATAL	271,133.26 \$	270,000.00 \$	270,000.00 \$	270,000.00 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	270,000.00 \$	100.0%	
<b>VERACRUZ</b>															
<b>Subtotal Veracruz</b>															
					4,720,419.18 \$	4,109,823.94 \$	4,109,823.94 \$	4,109,823.94 \$	49,809.26 \$	0.000 \$	2,499.17 \$	0.000 \$	4,109,823.94 \$	100.0%	33,399.00 \$
<b>Col. Mendoza - Córdoba</b>															
323MN	408913384	CONSTRUCCIONES ROMANOPOL, S.A. DE C.V.	01/02/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. MEXICO - CORDOBA	897,000.42 \$	940,471.34 \$	940,471.34 \$	940,471.34 \$	5,820.00 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	940,471.34 \$	100.0%	
<b>Córdoba - Veracruz</b>															
333MN	408913385	EFERAN CASILLAS FIGUILLA	01/02/2010 - 1/06/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CORDOBA - VERACRUZ	1,100,877.40 \$	1,057,701.70 \$	1,057,701.70 \$	1,057,701.70 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	0.000 \$	1,057,701.70 \$	100.0%	



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº. Periodo	Contenido No.	Empresa	Periodo de Contrato Inicial	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Eliminado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejecución a Flujo de Efectivo	Porcentaje Ejecución (F)	Ajuste de Cuenta Pagadora (G)
<b>La Tinaja - Cd. Iala</b>																
343MN	4584519877 500004030	CONSTRUCCIONES NOMADOPH, S.A. DE C.V.	01/02/2010	19/02/2011	\$ 1,210,042.21	\$ 1,146,102.02	\$ 1,146,102.02	\$ 1,146,102.02	\$ 1,146,102.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,146,102.02	100.0%	
<b>Guadalupe Zacoala - Tlaxiuhuan</b>																
353MN	4580918977 558094880	EFRAIN CAJILLAS ESCOBILLA	01/02/2010	19/02/2011	\$ 604,309.09	\$ 616,403.32	\$ 616,403.32	\$ 616,403.32	\$ 616,403.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 616,403.32	100.0%	
<b>Libramiento Peñaherrera de Tepezaltes</b>																
363MN	4580712910 558094887	INTEC DE SUPERVISION ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TAMPICO	01/02/2010	19/02/2011	\$ 252,970.06	\$ 252,995.06	\$ 252,995.06	\$ 252,995.06	\$ 252,995.06	\$ -	\$ 2,995.99	\$ -	\$ -	\$ 252,995.06	100.0%	
<b>REFORMA</b>																
<b>Mantenciones - Reynosa</b>																
373MN	4580912514	SIGUAMA ORTEGA	01/02/2010	19/02/2011	\$ 920,864.15	\$ 460,112.42	\$ 460,112.42	\$ 460,112.42	\$ 460,112.42	\$ -	\$ 2,772.76	\$ -	\$ -	\$ 460,112.42	100.0%	
<b>Puente Internacional Inmaculada Zaragoza - PARRIS</b>																
323NE	458004411 598094608	INGENIEROS TRUCCION, S.A. DE C.V.	15/04/2010	19/02/2011	\$ 240,840.34	\$ 240,789.23	\$ 240,789.23	\$ 240,789.23	\$ 240,789.23	\$ -	\$ 0.462179	\$ -	\$ -	\$ 240,789.23	100.0%	
<b>GUADALAJARA</b>																
<b>Coahuila - Toluca</b>																
383MN	4580012340	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISA DE C.V.	03/02/2010	19/02/2011	\$ 1,287,231.47	\$ 1,090,020.74	\$ 1,090,020.74	\$ 1,090,020.74	\$ 1,090,020.74	\$ -	\$ 4,501.54	\$ -	\$ -	\$ 1,090,020.74	100.0%	
393MN	4580012360	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISA DE C.V.	02/02/2010	19/02/2011	\$ 974,815.46	\$ 926,729.07	\$ 926,729.07	\$ 926,729.07	\$ 926,729.07	\$ -	\$ 4,616.44	\$ -	\$ -	\$ 926,729.07	100.0%	
<b>Nuevo Itabito - Luzero Candamuri</b>																
403MN	4580013160	VICTORIA NAVARRO ROCELLO ARTURO	03/02/2010	19/02/2011	\$ 242,124.11	\$ 203,050.08	\$ 203,050.08	\$ 203,050.08	\$ 203,050.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 203,050.08	100.0%	
<b>Morelos - Nuevo Itabito</b>																
413MN	4580012926	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISA DE C.V.	02/02/2010	19/02/2011	\$ 664,127.06	\$ 645,022.69	\$ 645,022.69	\$ 645,022.69	\$ 645,022.69	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 645,022.69	100.0%	
<b>Pueblito - Uruapan</b>																
423MN	4580013320	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANISA DE C.V.	02/02/2010	19/02/2011	\$ 932,335.70	\$ 809,021.54	\$ 809,021.54	\$ 809,021.54	\$ 809,021.54	\$ -	\$ 477.06	\$ -	\$ -	\$ 809,021.54	100.0%	
<b>MONTERREY</b>																
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																
433MN	4580012466	HG CONSTRUCCIONES Y SUPERVISOR, S.A. DE C.V.	01/02/2010	19/02/2011	\$ 1,519,084.20	\$ 1,070,000.45	\$ 1,070,000.45	\$ 1,070,000.45	\$ 1,070,000.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,070,000.45	100.0%	
<b>Toluca - Saltillo</b>																
443MN	4580915482	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/02/2010	19/02/2011	\$ 661,248.02	\$ 603,876.74	\$ 603,876.74	\$ 603,876.74	\$ 603,876.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 603,876.74	100.0%	
<b>Cuernavaca - Cto. Caliente</b>																
453MN	449012967	GRUPO EMPRESARIAL JYFA, S.A. DE C.V.	01/02/2010	19/02/2011	\$ 391,091.00	\$ 300,221.00	\$ 300,221.00	\$ 300,221.00	\$ 300,221.00	\$ -	\$ 300.76	\$ -	\$ -	\$ 300,221.00	100.0%	





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA


PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR 2010 DE LA RED DEL FOND NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Cuenta	Concepto No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Controlado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Controlado E	Diferencia D-C-D-E	Ejercido e Flujo de Efectivo	Avance Realizado (F%)	Ajustes de Retorno Costos Pagados
			Inicio	Fin													
<b>Guatemala - Cobaltinos</b>																	
485MN	416611446	RAM INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	01/02/2010	14/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 11 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GOMEZ PEDRO CORRALITOS DEL KM 39+000 AL KM 100+000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	100.0%	
475MN	416611446	RAM INGENIERIA Y SISTEMAS S.A. DE C.V.	01/02/2010	14/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 36 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GOMEZ PEDRO CORRALITOS DEL KM 100+000 AL KM 167+000	1,282,107.19	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	100.0%	
<b>Puerto Mexico - Carbonera</b>																	
485MN	416611506	GRUPO EMPRESARIAL JYPA S.A. DE C.V.	01/02/2010	14/02/2011	SUPERVISION TECNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MENOR DE 6 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CARBONERA DEL KM 20+000 AL KM 25+000	682,304.96	678,861.54	678,861.54	678,861.54	678,861.54		624.00			678,861.54	100.0%	
<b>CHAPAS</b>																	
<b>Las Chispas - Reutilitas - Ocozonilla</b>																	
485MN	416611520	RAUL VICENTE OROCOYO COMPANIA S.A. DE C.V.	01/02/2010	14/02/2011	SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 2 ESTRUCTURAS DEL KM 0+000 AL KM 107+000	717,664.01	1,108,518.55	1,108,518.55	1,108,518.55	1,108,518.55					1,108,518.55	100.0%	
<b>OAXACA</b>																	
<b>Cuicatlan - Oaxaca</b>																	
515MN	416611991	RODRIK INGENIERIA S.A DE C.V.	01/02/2010	14/02/2011	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 12+000 DEL CARRILLO MANTENIMIENTO MENOR DE 2 ESTRUCTURAS DEL C. GUANAGUALAN-OAXACA	1,705,201.64	1,620,307.35	1,620,307.35	1,620,307.35	1,602,544.72		60,622.00			1,602,544.72	100.0%	
525MN	416611979	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	14/02/2011	SUPERVISION TECNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 120+000 AL KM 140+000 DEL CARRILLO MANTENIMIENTO MENOR EN 80 ESTRUCTURAS DEL C. D. GUANAGUALAN-OAXACA	1,456,551.06	1,567,450.94	1,567,450.94	1,567,450.94	1,567,450.94		41,729.87			1,567,450.94	100.0%	45,875.46
<b>TOTAL</b>																	
						3,650,827.56	4,085,748.03	4,085,748.03	4,085,748.03	4,077,090.92		14,941.03			4,069,657.92	100.0%	104,250.00

000 0218

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado D	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Revoluciones Devolutivas	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	
Tijuana														
Culliacán														
Querétaro	\$ 25,600,000.00	\$ 19,704,462.48	\$ 19,704,462.48	\$ 19,704,462.48	\$ 19,376,124.84		\$ 328,337.64		\$ 19,376,124.84			100.0%	100.0%	
Cuernavaca	\$ 17,500,000.00	\$ 18,074,229.64	\$ 18,074,229.64	\$ 18,074,229.64	\$ 17,856,616.50		\$ 217,613.14		\$ 17,856,616.50	\$ 756,281.19		100.0%	100.0%	
Puebla	\$ 41,500,000.00	\$ 43,114,136.18	\$ 43,114,136.18	\$ 43,114,136.18	\$ 39,400,057.30		\$ 3,588,623.12	\$ 125,455.76	\$ 30,400,057.30	\$ 586,008.73		99.7%	100.0%	
Coahuila	\$ 14,680,000.00	\$ 13,327,685.46	\$ 13,327,685.46	\$ 13,327,685.46	\$ 13,327,540.22		\$ 145.24		\$ 11,645,125.10	\$ 4,329.00		100.0%	100.0%	
Veracruz	\$ 15,000,000.00	\$ 6,762,618.57	\$ 6,762,618.57	\$ 6,762,618.57	\$ 6,762,618.57				\$ 6,762,618.57			100.0%	100.0%	
Reynosa														
Guadalupe	\$ 4,750,000.00	\$ 3,740,906.44	\$ 3,740,906.44	\$ 3,740,906.44	\$ 3,582,241.66		\$ 158,664.78		\$ 3,582,241.66	\$ 46,643.56		100.0%	100.0%	
Monterrey		\$ 905,631.80	\$ 905,631.80	\$ 905,631.80	\$ 905,631.80				\$ 905,631.80			100.0%	100.0%	
Chapas		\$ 6,976,262.66	\$ 6,976,262.66	\$ 6,976,262.66	\$ 6,974,424.66		\$ 1,838.00		\$ 6,974,424.66	\$ 523,914.32		100.0%	100.0%	
Oaxaca														
<b>TOTAL</b>	\$ 119,030,000.00	\$ 112,605,933.23	\$ 112,605,933.23	\$ 112,605,933.23	\$ 106,185,255.55		\$ 4,285,221.92	\$ 125,455.76	\$ 106,602,840.43	\$ 1,926,374.05		99.9%	100.0%	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

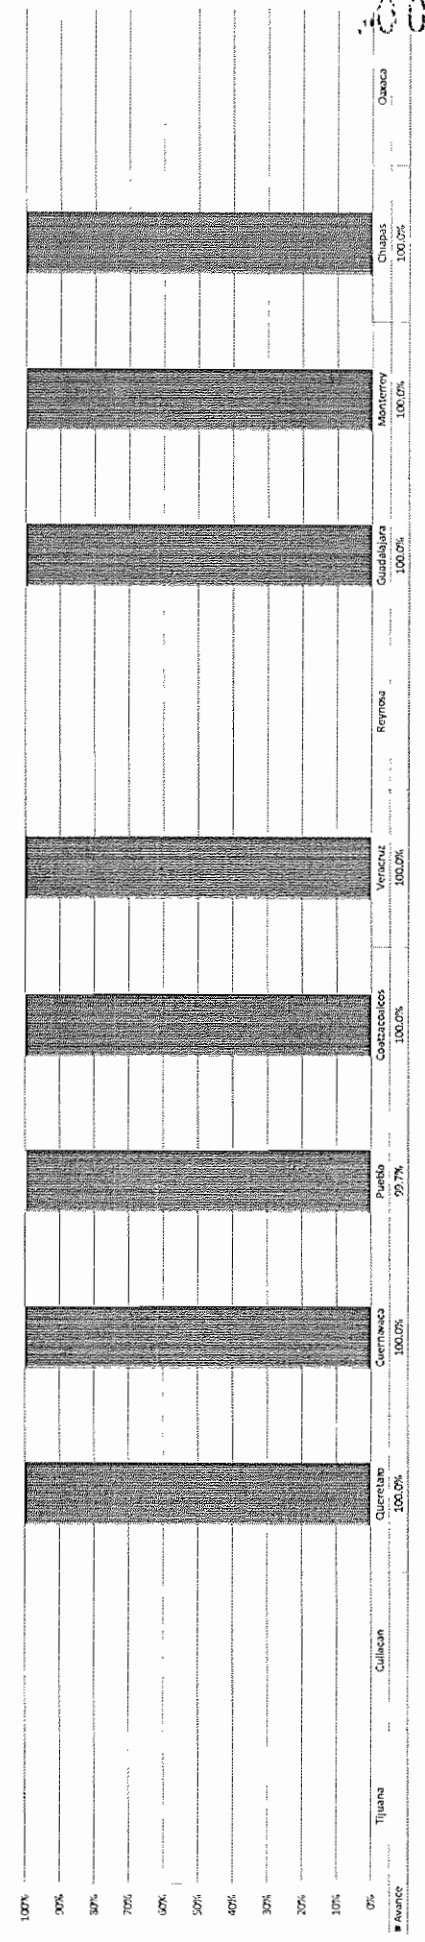

021  
1849

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puntaje	Código No.	Empresa	Principio del Contrato	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Reautorizado	Monto Contratado	Monto Pagarable	Estimado Cumplido	Relaciones Derivadas	Sólo Cancelado	Diferencia DC-DE	Estado de Pago	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
<b>QUERÉTARO</b>																
Chamapa - I. Acahualtán																
IME	400014085	CONSORCIO INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	01/07/2010	01/07/2010	INSPECCIÓN DETALLADA, ESTUDIO Y PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PIV DE LOS PUENTES DE LA CARRETERA FEDERAL DE LOS CARRETEROS, CHAMAPA - LUCIÉBATA, (Otra Centralizada)	8,000,000.00 \$	8,000,000.00 \$	8,000,000.00 \$	8,000,000.00 \$	8,000,000.00 \$	-	-	-	1,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>MEXICO - Querétaro (Palmitas - Palmitas)</b>																
AME	400014085	MEDIANA DE PUENTES S.A. DE C.V.	06/07/2010	06/07/2010	INSPECCIÓN DETALLADA, ESTUDIO Y PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PIV ENTRONQUE COTOPETEC KM. 50+000, P.V. COLONIA S.A. DE C.V. P.V. Y B. DE INGENIERIA INDUSTRIAL KM. 61+000 DE LA AUTOPISTA MÉXICO QUERÉTARO, TRAMO TEPALCAPA-PALMITAS (Otra Centralizada)	3,000,000.00 \$	2,572,704.00 \$	2,572,704.00 \$	2,572,704.00 \$	2,572,704.00 \$	-	323,297.04 \$	-	2,249,406.96	100.0%	100.0%
IME	400014089	MEDIANA DE PUENTES S.A. DE C.V.	24/09/2010	21/09/2010	INSPECCIÓN DETALLADA Y PROYECTO DE REPARACIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ENTRONQUE TEPALCAPA - PALMITAS, TRAMO TEPALCAPA - PALMITAS (Otra Centralizada)	4,500,000.00 \$	3,344,409.50 \$	3,344,409.50 \$	3,344,409.50 \$	3,344,409.50 \$	-	-	-	3,344,409.50	100.0%	100.0%
<b>Mexico - Querétaro (Palmitas - Querétaro)</b>																
IME	400014204	CONSORCIO INTEGRAL EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	09/07/2010	09/07/2010	INSPECCIÓN DETALLADA, ESTUDIO Y PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PIV ENTRONQUE TOLUCA A Y D, KM. 161+400, P.V. ENTRONQUE PACHUCA A Y D, KM. 161+700, ENTRONQUE TOLUCA A Y B, KM. 161+800, P.V. ENTRONQUE TOLUCA A Y B, KM. 161+800, P.V. Y PUENTE SOBRE AGUAS NEGRAS A Y B, KM. 161+800, TRAMO PALMITAS - QUERÉTARO (Otra Centralizada)	4,500,000.00 \$	3,717,920.04 \$	3,717,920.04 \$	3,717,920.04 \$	3,717,920.04 \$	-	-	-	3,717,920.04	100.0%	100.0%
IME	400014087	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	09/07/2010	09/07/2010	INSPECCIÓN DETALLADA, ESTUDIO Y PROYECTO DE REPARACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS PIV ENTRONQUE TOLUCA A Y B, KM. 161+400, P.V. ENTRONQUE TOLUCA A Y B, KM. 161+800, P.V. ENTRONQUE TOLUCA A Y B, KM. 161+800, P.V. Y PUENTE SOBRE AGUAS NEGRAS A Y B, KM. 161+800, TRAMO PALMITAS - QUERÉTARO (Otra Centralizada)	6,500,000.00 \$	3,816,556.08 \$	3,816,556.08 \$	3,816,556.08 \$	3,816,556.08 \$	-	-	-	3,816,556.08	100.0%	100.0%
<b>GUERRA VACA</b>																
Libramiento Guerrero																
IME	400014204	FRYCAJNET DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	10/12/2010	10/09/2011	SUBSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE SUPERESTRUCTURA DEL P.V. VILLAVIEJA T. UNICADO UN. LL. KM. 91+000 DEL LIBRAMIENTO GUERRA VACA	3,000,000.00 \$	3,000,000.00 \$	3,000,000.00 \$	3,000,000.00 \$	3,000,000.00 \$	-	16,220.00 \$	-	3,000,000.00	100.0%	100.0%
<b>Mexico - Guerrero</b>																
IME	400014204	PROYECTOS Y SISTEMAS TORIAT, S.A.	10/09/2010	10/09/2010	ESTUDIO PARA DEFENSA LOS RETORNOS A DERECHO DE LA AUTOPISTA GUERRA VACA	812,169.40 \$	812,169.40 \$	812,169.40 \$	812,169.40 \$	812,169.40 \$	-	-	-	812,169.40	100.0%	100.0%
<b>Guerrero - Acapulco</b>																
IME	400014085	GEOMAX, S.A. DE C.V.	09/10/2010	09/10/2010	INSPECCIÓN DETALLADA DE LOS TUNELIS, LOS QUERÉNTOS, ADARQUEZ, TIERRA COLORADA Y MEXICALCO, TRAMO DE LA AUTOPISTA GUERRA VACA (Otra Centralizada)	3,306,000.00 \$	3,306,000.00 \$	3,306,000.00 \$	3,306,000.00 \$	3,306,000.00 \$	-	-	-	3,306,000.00	100.0%	100.0%
IME	400014271	TECNOSOLLO, S.A. DE C.V.	10/07/2010	20/06/2011	MONITOREO DE INCLINOMETROS Y PUNTOS DE CONTROL DE LA LADRA MARÍN DERECHA DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA GUERRA VACA - MEXICALCO (Otra Centralizada)	1,000,000.00 \$	615,467.05 \$	615,467.05 \$	615,467.05 \$	615,467.05 \$	-	-	-	615,467.05	100.0%	100.0%

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

No. Pórtul	Centro Ac.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Anticipado	Monto Contratado	Monto Programado	Estimado Cumplido	Monto En Trámite	Reservaciones - Derivaciones	Saldo Contratado	Diferencia D.C. D.C.	Efectivo a Flujos de Efectivo	Avance físico Presupuesto (%)	Avance físico (%)
			Inicio	Fin													
16M	480014650	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS	12/07/2010	22/11/2010	REPARACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE "TRES TUMES" UBICADO EN EL KM 3+400 DEL C.D. PUENTE DE ATLA - EJUALA	1,000,000.00	1,027,867.40	1,027,867.40	1,027,867.40	1,027,867.40	-	-	1,027,867.40	-	1,027,867.40	100.0%	100.0%
<b>Puente de Atla - Ejuala</b>																	
17M	480014214	CONSTRUTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE CV	06/05/2010	31/10/2010	REPARACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL PUENTE "TRES TUMES" UBICADO EN EL KM 3+400 DEL C.D. PUENTE DE ATLA - EJUALA	7,000,000.00	8,114,520.55	8,114,520.55	8,114,520.55	8,094,058.43	-	206,000.20	100,940.12	-	8,094,058.43	100.0%	100.0%
17M	480014214	CONSTRUTORA DE OBRAS CIVILES S.A. DE CV	24/04/2010	20/06/2010	MANTENIMIENTO MAYOR DEL PUENTE AMACUZAC, UBICADO EN EL KM 11+200 DEL CAMINO DIRECTO PUENTE DE ATLA - EJUALA	9,000,000.00	1,218,256.23	1,218,256.23	1,218,256.23	1,120,817.00	-	97,439.23	96,438.30	-	1,120,817.00	100.0%	100.0%
<b>SUBTOTAL GUERREREO</b>																	
						17,000,000.00	19,352,644.18	19,352,644.18	19,352,644.18	18,288,126.83	-	206,000.20	207,378.42	-	18,288,126.83	100.0%	100.0%

**México - Puebla**

13M	480013430	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS S.A. DE CV	20/05/2010	12/11/2012	CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION A TERCER CARRIL DE LA ALDAMPARILLA Y DEL REFUGIO DEL KM 9+774 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA.	60,000,000.00	60,000,240.33	60,000,240.33	60,000,240.33	36,890,164.45	-	23,110,075.88	123,665.12	-	36,910,104.45	100.0%	100.0%
14M	480014819	TCC GEOTECNICA SA DE CV	06/06/2010	04/06/2011	MANTENIMIENTO DE LOS INSERTEMENTOS DE CONTROL EN LOS PUENTES DEL PUENTE "TAPACOYA"	1,500,000.00	1,306,443.94	1,306,443.94	1,306,443.94	1,306,443.94	-	-	-	1,306,443.94	100.0%	100.0%	
31M	480014246	SERGIOS PROYECTORA EN INGENIERIA S.A. DE CV	03/06/2010	09/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA AMPLIACION A TERCER CARRIL DE UN PIV EN EL KM 7+256 DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA.	1,054,448.01	1,054,448.01	1,054,448.01	1,054,448.01	1,054,448.01	-	-	-	-	1,054,448.01	100.0%	100.0%
						41,554,448.01	42,311,136.28	42,311,136.28	42,311,136.28	39,492,856.39	-	2,818,279.89	223,665.12	-	39,492,856.39	100.0%	100.0%
						45,111,136.28	45,111,136.28	45,111,136.28	45,111,136.28	39,492,856.39	-	5,618,279.89	223,665.12	-	39,492,856.39	100.0%	100.0%

**Col. Mex. - Aguascalientes**

42M	480013008	PUENTE INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE CV	18/02/2011	24/12/2011	INSPECCION SUBCANTARIA Y PROYECTO DE PROTECCION DE LA CIMENTACION DEL PUENTE AUTOPISTA CD. BIA - AGUASCALIENTES	1,002,415.14	1,002,415.14	1,002,415.14	1,002,415.14	1,002,415.12	-	-	0.02	-	1,002,415.12	100.0%	100.0%
-----	-----------	--	------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	------	---	--------------	--------	--------

**Aguascalientes - Comahuatlan**

18M	480014515	GRUPO OCC SA DE CV	27/06/2010	24/06/2010	REHABILITACION DE LAS LORAS DE CONCRETO EN EL KM 2+306 DEL KM 7P DE LA AUTOPISTA AGUASCALIENTES - COMAHUATLAN, INCLUYENDO DESMOS Y OBRAS DE ORIENTACION	7,100,000.00	4,320,902.27	4,320,902.27	4,320,902.27	4,328,947.05	-	-	160.27	-	4,328,947.05	100.0%	100.0%
-----	-----------	--------------------	------------	------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---	--------	---	--------------	--------	--------

**Puente Zacatal**

18M	480014206	CIRO LIZARDI SA DE CV	18/05/2010	14/06/2010	VERIFICACION DEL POTENCIAL ELECTROD Y REVISION DE LOS ANCHOS DE LA CIMENTACION DEL PUENTE EL ZACATAL	5,000,000.00	4,624,203.26	4,624,203.26	4,624,203.26	4,624,203.26	-	-	-	-	4,624,203.26	100.0%	100.0%
17M	480014832	CONSTRUTORA Y PROYECTORA S. DE CV	01/07/2010	27/11/2010	PROYECTO DE PROTECCION ANTICORROSIONA DEL PUENTE ZACATAL UBICADO EN EL KM 16+400 DE LA CARRETERA FEDERAL AGUASCALIENTES - CD. DEL GRUPO EN EL PUENTE ZACATAL	2,000,000.00	2,461,914.77	2,461,914.77	2,461,914.77	2,461,914.77	-	-	-	-	2,461,914.77	100.0%	100.0%
						13,227,895.48	13,227,895.48	13,227,895.48	13,227,895.48	13,227,895.48	-	-	160.27	-	13,227,895.48	100.0%	100.0%

**Veracruz**

31M	480014800	CUARTI INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE CV	18/07/2010	20/08/2010	COMPLEMENTO AL ESTUDIO DE CIMENTACION DE LOS PUENTES A LA S/D DEL URBANIZATO PUENTE DE TAMPOCO	901,423.90	901,423.90	901,423.90	901,423.90	901,423.90	-	-	-	-	901,423.90	100.0%	100.0%
-----	-----------	--	------------	------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	---	------------	--------	--------

**Col. Mex. - Durango**

18M		PAVIMENTA CEMENTADA			RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL AGUASCALIENTES - DURANGO EN EL KM 1+000 DEL C.D. PUENTE DE ATLA - EJUALA	1,000,000.00										0.0%	0.0%
18M		PAVIMENTA CEMENTADA			RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL AGUASCALIENTES - DURANGO EN EL KM 1+000 DEL C.D. PUENTE DE ATLA - EJUALA	1,000,000.00										0.0%	0.0%
31M		PAVIMENTA CEMENTADA			RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL AGUASCALIENTES - DURANGO EN EL KM 1+000 DEL C.D. PUENTE DE ATLA - EJUALA	1,000,000.00										0.0%	0.0%

No. Puesto	Centro No	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Periodo del Contrato Final	Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Continuada A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Resoluciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejecutado y Flujo de Efectivo	Avance Financiero (F)	Avance Físico (G)

Caraboba - Veracruz

37ME	480011476	PAVOTEC S.A. DE C.V.	24/07/2011	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	750,000.00	740,310.22	740,310.22	740,310.22	740,310.22		165,994.70		541,745.44	100.0%	100.0%	
38ME	480011480	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTR	19/02/2011	09/09/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	40,043.02			1,000,000.00	100.0%	100.0%	
39ME	480011481	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	10/02/2011	09/09/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00				1,200,000.00	100.0%	100.0%	
40ME	480011482	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTR	10/02/2011	09/09/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00				1,000,000.00	100.0%	100.0%	
41ME	480011483	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	24/07/2011	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	1,500,000.00	1,492,000.07	1,492,000.07	1,492,000.07	1,492,000.07					1,492,000.07	100.0%	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>						<b>5,150,000.00</b>	<b>5,142,310.27</b>	<b>5,142,310.27</b>	<b>5,142,310.27</b>	<b>5,142,310.27</b>	<b>40,043.02</b>	<b>165,994.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,576,038.92</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	

La Trinita - Ika

32ME	480011478	PAVOTEC S.A. DE C.V.	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
33ME	480011479	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
34ME	480011480	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
35ME	480011481	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
36ME	480011482	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
37ME	480011483	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>						<b>15,000,000.00</b>	<b>14,920,000.41</b>	<b>14,920,000.41</b>	<b>14,920,000.41</b>	<b>14,920,000.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,920,000.41</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Panorama - Uruapan

38ME	480011483	PAVOTEC S.A. DE C.V.	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
39ME	480011484	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
40ME	480011485	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
41ME	480011486	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
42ME	480011487	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
43ME	480011488	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
44ME	480011489	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
45ME	480011490	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>						<b>25,000,000.00</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Nuevo Parí - Luzero Ciudades

39ME	480011491	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
40ME	480011492	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
41ME	480011493	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
42ME	480011494	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
43ME	480011495	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
44ME	480011496	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
45ME	480011497	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
46ME	480011498	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
47ME	480011499	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
48ME	480011500	CONSTRUCCION Y PROYECTOS S.C.L	01/07/2010	23/04/2011	REPARACION Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 174+000 DEL C.D. NUEVA ITALIA - LAJUNO (Otra Centralizadora)	2,500,000.00	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07	2,492,000.07				2,492,000.07	100.0%	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>						<b>25,000,000.00</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,920,000.41</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


Fecha: 05/05/2010 de 10:45:00 AM

No. Partida	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Programado D	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejército a Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
			Inicio	Fin													
<b>MONTENEGRO</b>																	
Montenegro, Nuevo Lirio																	
35ME	400001005	SURONEX INGENIERIA S.A. DE C.V.	10/02/2011	10/02/2011	INSPECCION SUBVIGILANCIA Y PROYECTO DE PROTECCION DE LA CIMENTACION DEL PUENTE RD JALISCO, PERCADO LN EL KM 14+300 DE LA CARRETERA FEDERAL TAMPICO - SAN ANTONIO (Otra Centralización)	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906,031.00	100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>						\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ 906,031.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 906,031.00	100.0%	100.0%
<b>CHIHUAHUA</b>																	
La Chihuahua - Ciudad Juarez - Compucauhtli																	
34ME	400001004	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS BRIFA S.A	28/02/2010	02/11/2010	SUBSTITUCION DEL SISTEMA DE PISO DEL PUENTE CHIHUAHUA - BARRILES - OCCIDENTAL	\$ 110,056,000.00	\$ 117,400,051.23	\$ 117,400,051.23	\$ 117,400,051.23	\$ 103,163,255.35	\$ -	\$ -	\$ 4,236,795.88	\$ -	\$ 166,022,800.43	100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>						\$ 110,056,000.00	\$ 117,400,051.23	\$ 117,400,051.23	\$ 117,400,051.23	\$ 103,163,255.35	\$ -	\$ -	\$ 4,236,795.88	\$ -	\$ 166,022,800.43	100.0%	100.0%

000 0223 188

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra							Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Tamlto D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Reservaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)
Tijuana												0.0%
Colima												0.0%
Queretaro	\$ 600,000.00	\$ 70,607.91	\$ 70,607.91	\$ 70,607.91	\$ 70,607.91	\$ 70,607.91	\$ 87.55		\$ 70,607.91			100.0%
Queretaro	\$ 1,898,485.60	\$ 1,898,485.60	\$ 1,898,485.60	\$ 1,898,485.60	\$ 1,898,485.60	\$ 1,898,485.60	0.04		\$ 1,898,485.60			100.0%
Puebla	\$ 2,000,000.00	\$ 2,108,203.35	\$ 2,108,203.35	\$ 2,108,203.35	\$ 2,083,353.26	\$ 2,083,353.26	0.07	\$ 24,850.02	\$ 2,083,353.26	\$ 8,347.68		98.8%
Coahuila	\$ 360,000.00	\$ 478,857.53	\$ 478,857.53	\$ 478,857.53	\$ 478,857.52	\$ 478,857.52	0.01		\$ 478,857.52	\$ 4,520.57		100.0%
Veracruz												0.0%
Reynosa												0.0%
Guadalupe												0.0%
Monterrey												0.0%
Chihuahua	\$ 668,307.14	\$ 668,307.14	\$ 668,307.14	\$ 668,307.14	\$ 668,307.14	\$ 668,307.14			\$ 668,307.14			100.0%
Oaxaca												0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,960,000.00</b>	<b>\$ 5,224,461.53</b>	<b>\$ 5,224,461.53</b>	<b>\$ 5,224,461.53</b>	<b>\$ 5,199,523.84</b>	<b>\$ 5,199,523.84</b>	<b>87.67</b>	<b>\$ 24,850.02</b>	<b>\$ 5,199,523.84</b>	<b>\$ 12,877.25</b>		<b>99.5%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

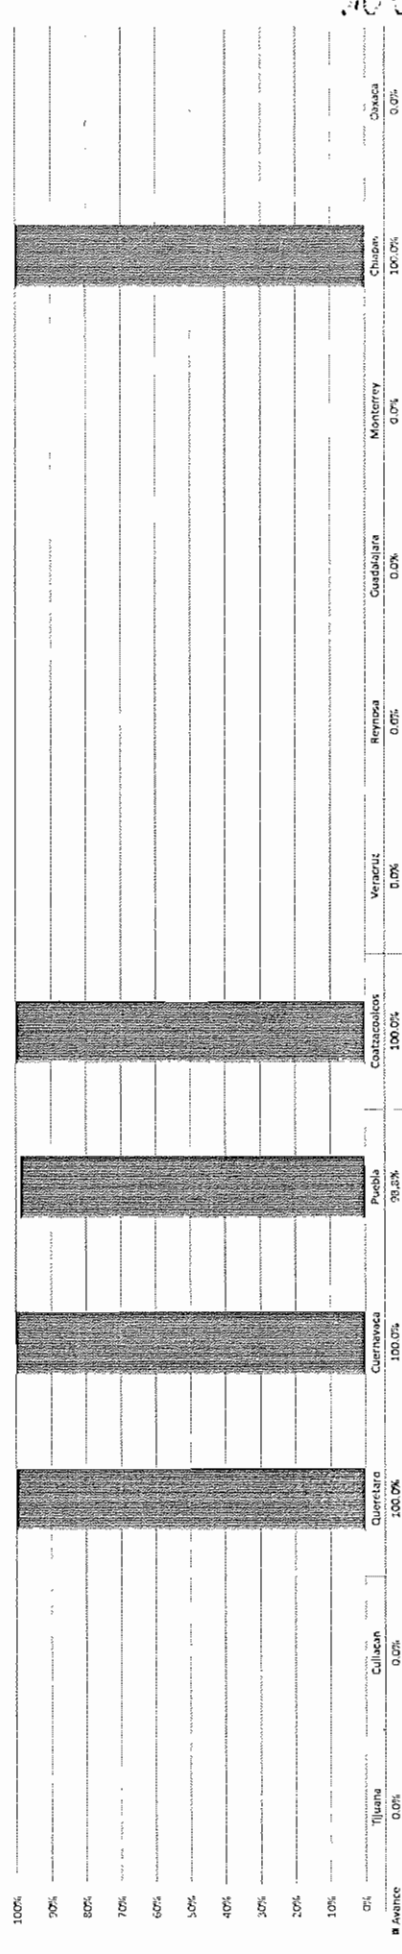

Handwritten signature



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**




**PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2016 DE LA RED DEL FOND NO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2017

No. Puesto	Código No.	Empresa	Periodo de Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto Cn Tama D	Reparaciones - Deducciones	Saldo Calificado E	Diferencia B+C-D-E	Empleada Fija de Efectivo	Porcentaje F+G
<b>QUERETARO</b>															
<b>Chamapa - Lechitza</b>															
258ME2000	45801120209 548004415 548004408	CLAYTON S.A DE C.V.	01/06/2016 12/31/2016	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION DE JUNTAS DE DILATACION EN 25 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMAPA - LECHITZA. (MANTENIMIENTO MAYOR) PIV KM 0+285.00 KM 1+360.00 (PUNTE ANGELO KM. 7+480. PIV LADO DE GUADALUPA KM. 1+000. PIV KM 7+100. PIV KM 5+000. PIV KM. 8+000. PIV 10+500. PIV MAJUN I KM. 13+700. PIV MAJUN II KM. 13+750. PUENTE SOBRE APOTO "A" Y "B" KM 14+800. PUENTE MEDIAN "A" Y "B" KM. 20+300. PIV CHAMAPA I KM. 20+800. PIV ENTRONQUE CHAMAPA II KM. 27+200. PIV ENTRONQUE CHAMAPA III KM. 27+500) (Parámetro del Ejercicio 2009)	\$ 70,907.91	\$ 70,907.91	\$ 70,907.91	\$ 70,907.91	\$ 70,907.91	\$ -	\$ 47.95	\$ -	\$ -	\$ 70,907.91	100.0%
<b>GUERNAVACA</b>															
<b>Libramiento Cuernavaca</b>															
295ME	4580112008 5480044113 548004405	RODRIGUEZ AMARAL Y URBANA S.A DE C.V	01/12/2010 20/02/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL "PIV POLIVORAN F. CHILANCA EN EL KM 9+500 DEL LIBRAMIENTO CUERNAVACA	\$ 497,532.40	\$ 497,532.40	\$ 497,532.40	\$ 497,532.40	\$ 497,532.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 497,532.40	100.0%
<b>Puerto de Ixtla - Ixtla</b>															
115ME	4580112030 5480044113 548004405	FLOREND CRUZ JAVIER	12/04/2010 16/02/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL "PIV POLIVORAN F. CHILANCA EN EL KM 9+500 DEL LIBRAMIENTO CUERNAVACA	\$ 566,000.00	\$ 566,000.00	\$ 566,000.00	\$ 566,000.00	\$ 566,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 566,000.00	100.0%
125ME	4580112030 5480044113 548004405	RODRIGUEZ AMARAL Y URBANA S.A DE C.V	01/12/2010 20/02/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA SUPERESTRUCTURA DEL "PIV POLIVORAN F. CHILANCA EN EL KM 9+500 DEL LIBRAMIENTO CUERNAVACA	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	100.0%
<b>PUZUELA</b>															
<b>Mexico - Puebla</b>															
123ME	4580112030 5480044113 548004405	PROFESIONALES EN GEOLOGIA S.A DE C.V	20/01/2010 09/02/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA TERCER CARRE DE LA ALCANTARILLA Y DEL PERFECTO DEL KM 0+114 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUZUELA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,170,260.65	\$ 1,170,260.65	\$ 1,170,260.65	\$ 1,152,000.52	\$ -	\$ 8,247.60	\$ -	\$ 24,850.07	\$ 1,152,000.52	62.6%
113MP099	4580112030 5480044113 548004409	RODRIGUEZ AMARAL Y URBANA S.A DE C.V	03/02/2009 14/02/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 19+548 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUZUELA (Parámetro del Ejercicio 2009)	\$ 313,311.01	\$ 313,311.01	\$ 313,311.01	\$ 313,311.01	\$ 313,311.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 313,311.01	100.0%
123MP099	4580112030 5480044113 548004405	CORPORATIVO DE ADMINISTRACION Y CONSTRUCCION CARRETERA S.A DE C.V	06/02/2009 10/02/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION Y AMPLIACION DE ALCANTARILLA EN EL KM 2+470 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUZUELA (Parámetro del Ejercicio 2009)	\$ 373,042.21	\$ 373,042.21	\$ 373,042.21	\$ 373,042.21	\$ 373,042.20	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ -	\$ 373,042.20	100.0%
133MP099	4580112030 5480044113 548004405	COOPERACION TECNICO ADMINISTRATIVA DEL OBRA S.A.C.V. E. ADMINISTRADOR DE CONTROL S.A DE C.V	03/02/2009 14/02/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: AMPLIACION DE UN PIV UBICADO EN EL KM 18+742 C/E 8 SUR DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUZUELA (Parámetro del Ejercicio 2009)	\$ 242,000.00	\$ 242,000.00	\$ 242,000.00	\$ 242,000.00	\$ 242,000.02	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ 242,000.02	101.0%
<b>COAHUILA DE ZARAGOZA</b>															
<b>Amuzac - Coahuiltepec</b>															
130ME	45801120209 548004408	CI RAM CASSELL S.C.A.CAMLA	02/01/2010 14/02/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACION DE LAS LOSAS DE CONCRETO HIDRALCIDO DEL PUENTE "CARRERA 101 DE LA AUTOPISTA "AVANCAN COHUILTEPEC" INCLUYENDO DESMOS Y BARRANDAS DE ORIENTACION	\$ 360,000.00	\$ 470,007.03	\$ 470,007.03	\$ 470,007.03	\$ 470,007.52	\$ -	\$ 4,529.97	\$ -	\$ -	\$ 470,007.52	100.0%
<b>CHAMPAS</b>															
<b>Los Chopsas - Raudales - Ocozacoatlán</b>															
243ME	4580112030 548004409	JAF SUPERVISION Y SERVICIOS EN INGENIERIA S.A DE C.V	10/07/2010 24/12/2010	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: SUSTITUCION DEL SISTEMA DE PASO DEL PUENTE ARROYO GRANDE KM 7+640 DEL C.D. LAS CHOPAS-RAUDALES-OCOZACATLAN	\$ 690,307.14	\$ 690,307.14	\$ 690,307.14	\$ 690,307.14	\$ 690,307.14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 690,307.14	100.0%
<b>TOTAL</b>															
					\$ 2,895,850.00	\$ 2,185,952.28	\$ 2,185,952.28	\$ 2,185,952.28	\$ 2,185,952.26	\$ -	\$ 8,247.60	\$ -	\$ 24,850.07	\$ 2,185,952.26	80.0%

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra							Seguimiento al Avance Presupuestal					
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Ejecido a Flujo de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Avances de Costos Pagados	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
Tijuana	\$ 8,715,378.00	\$ 6,568,612.80	\$ 6,568,612.80	\$ 6,568,612.80	\$ 6,526,110.21		\$ 42,400.00		\$ 6,526,116.21			100.0%	100.0%
Culiacán	\$ 2,744,865.49	\$ 2,418,843.85	\$ 2,418,843.85	\$ 2,418,843.85	\$ 2,418,843.85				\$ 2,418,843.85			100.0%	100.0%
Querétaro	\$ 25,879,532.82	\$ 23,312,805.10	\$ 23,312,805.10	\$ 23,312,805.10	\$ 23,312,805.10				\$ 23,654,633.00		\$ 3,111,277.06	100.0%	100.0%
Quintana Roo	\$ 7,076,754.00	\$ 6,453,051.75	\$ 6,453,051.75	\$ 6,453,051.75	\$ 6,388,305.46		\$ 64,746.20		\$ 6,391,347.81	\$ 61,074.35	\$ 3,042,235	100.0%	100.0%
Puebla	\$ 8,521,761.37	\$ 7,981,766.58	\$ 7,981,766.58	\$ 7,981,766.58	\$ 7,981,766.58		0.02		\$ 8,098,845.73	\$ 113,071.27	\$ 107,070.17	100.0%	100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 13,756,093.86	\$ 12,125,701.24	\$ 12,125,701.24	\$ 12,125,701.24	\$ 12,104,486.71		\$ 17,214.53		\$ 12,134,688.54	\$ 42,986.50	\$ 26,101.83	100.0%	100.0%
Veracruz	\$ 10,823,754.51	\$ 15,228,342.98	\$ 15,228,342.98	\$ 15,228,342.98	\$ 15,228,341.13		1.85		\$ 15,563,243.31	\$ 1,897.04	\$ 3,336,002.18	100.0%	100.0%
Reynosa	\$ 7,401,445.70	\$ 6,806,603.94	\$ 6,806,603.94	\$ 6,806,603.94	\$ 6,800,237.51		\$ 366.43		\$ 6,806,237.51	\$ 11,402.04		100.0%	100.0%
Guadaluajara	\$ 15,497,803.71	\$ 14,606,950.26	\$ 14,606,950.26	\$ 14,606,950.26	\$ 14,605,451.92		\$ 1,507.34		\$ 15,073,281.36		\$ 467,331.64	100.0%	100.0%
Monterrey	\$ 7,447,430.55	\$ 6,766,258.15	\$ 6,766,258.15	\$ 6,766,258.15	\$ 6,766,195.45		\$ 62.70		\$ 6,780,105.86	\$ 14,916.63		100.0%	100.0%
Chilpancingo	\$ 2,437,859.72	\$ 1,857,241.54	\$ 1,857,241.54	\$ 1,857,241.54	\$ 1,857,241.36		\$ 0.18		\$ 1,857,241.36			100.0%	100.0%
Oaxaca	\$ 2,518,732.68	\$ 2,514,584.63	\$ 2,514,584.63	\$ 2,514,584.63	\$ 2,514,583.85		\$ 0.78		\$ 2,514,583.85			100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 118,850,000.00</b>	<b>\$ 106,640,771.91</b>	<b>\$ 106,640,771.91</b>	<b>\$ 106,640,771.91</b>	<b>\$ 106,514,375.11</b>		<b>\$ 126,396.80</b>		<b>\$ 107,775,256.04</b>	<b>\$ 215,608.47</b>	<b>\$ 1,269,982.93</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

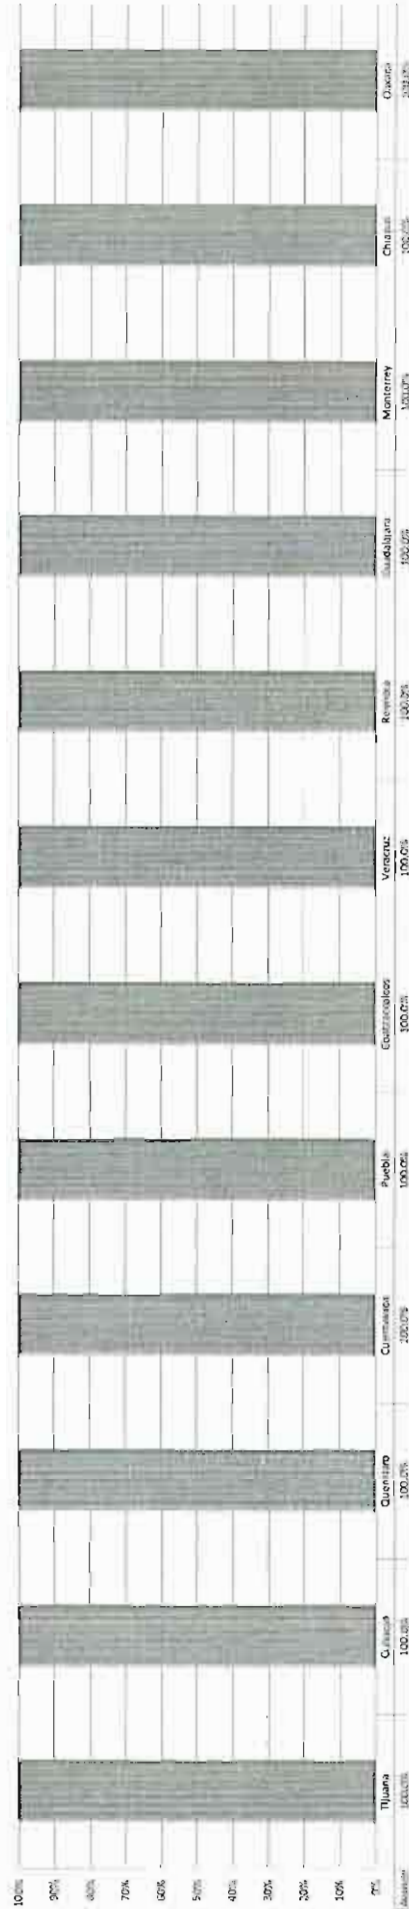

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Centro de No. Cuenta	Empresa	Período de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Cobrado	Monto Ejecutado	Entidad Acreditada	Monto Ejecutado	Reactivación - Desactivación	Saldo Cancelado	Fecha de Bajas	Ejecución - Faltas de Ejecución	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Aplicación de Cuentas Pagables
			Inicio	Fin														
<b>TIJUANA</b>																		
<b>Tijuana - Francisco</b>																		
1NE	40001500	GRUPO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	30/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA Tijuana - Rosarito	4,488,116.20	4,488,116.20	4,488,116.20	4,488,116.20	4,488,116.20	4,488,116.20		10.22		4,488,116.20	100.0%	100.0%	
<b>La Rumorosa - Tijuana</b>																		
2NE	40001420	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES S.A. DE C.V.	01/02/2010	30/06/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA RUMOROSA - Tijuana	1,675,002.40	1,675,002.40	1,675,002.40	1,675,002.40	1,675,002.40	1,675,002.40		42.8603		1,675,002.40	100.0%	100.0%	
<b>Laboratorio de Cobas</b>																		
3NE	40001344	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES S.A. DE C.V.	01/02/2010	01/02/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL CARRILLO DE LOS CABOS	405,401.21	405,401.21	405,401.21	405,401.21	405,401.21	405,401.21		13.43		405,401.21	100.0%	100.0%	
<b>QUERETARO</b>																		
<b>Estación Dora Nogales</b>																		
4NE	40001370	CONSTRUCCIONES Y CONSERVACIONES S.A. DE C.V.	01/02/2010	30/11/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ESTACION DORA NOGALES	2,418,843.85	2,418,843.85	2,418,843.85	2,418,843.85	2,418,843.85	2,418,843.85				2,418,843.85	100.0%	100.0%	
<b>QUERETARO</b>																		
<b>Laboratorio Normas de Climatización</b>																		
5NE	40001380	INDUSTRIAL EXPO SÓLO 21 S.A. DE C.V.	01/02/2010	31/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LABORATORIO NORMAS DE CLIMATIZACION	1,094,518.64	1,094,518.64	1,094,518.64	1,094,518.64	1,094,518.64	1,094,518.64				1,094,518.64	100.0%	100.0%	99,970.00
<b>Cherchigo - Lechuga</b>																		
6NE	40001320	GRUPO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	31/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHERCHIGO - LECHUGA	3,246,018.19	3,246,018.19	3,246,018.19	3,246,018.19	3,246,018.19	3,246,018.19				3,246,018.19	100.0%	100.0%	20,791.13
<b>México - Cuernavaca</b>																		
7NE	40001338	ADRIANA S.A. DE C.V.	01/02/2010	31/01/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO	14,201,000.21	14,201,000.21	14,201,000.21	14,201,000.21	14,201,000.21	14,201,000.21				14,201,000.21	100.0%	100.0%	
<b>Quereteco - Irapuato</b>																		
8NE	40001366	CONTRAP S.A. DE C.V.	01/02/2010	31/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA QUERETECO - IRAPUATO	4,122,700.96	4,122,700.96	4,122,700.96	4,122,700.96	4,122,700.96	4,122,700.96				4,122,700.96	100.0%	100.0%	
<b>QUERETARO</b>																		
<b>México - Cuernavaca</b>																		
9NE	40001354	GRUPO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/11/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - CUERNAVACA	1,209,004.47	1,209,004.47	1,209,004.47	1,209,004.47	1,209,004.47	1,209,004.47		0.01		1,209,004.47	100.0%	100.0%	
<b>Laboratorio Cuernavaca</b>																		
10NE	40001354	GRUPO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/11/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL LABORATORIO CUERNAVACA	905,995.64	905,995.64	905,995.64	905,995.64	905,995.64	905,995.64		4.22		905,995.64	100.0%	100.0%	
<b>Cuernavaca - Ajacuba</b>																		
11NE	40001358	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/11/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - AJACUBA	1,994,317.79	1,994,317.79	1,994,317.79	1,994,317.79	1,994,317.79	1,994,317.79				1,994,317.79	100.0%	100.0%	2,942.31
<b>La Piedad - Cuernavaca</b>																		
12NE	40001364	GRUPO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/11/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO LA PIEDAD - CUERNAVACA	1,009,420.66	1,009,420.66	1,009,420.66	1,009,420.66	1,009,420.66	1,009,420.66		117.73		1,009,420.66	100.0%	100.0%	
<b>Puebla de la Higuera - Puebla</b>																		
13NE	40001370	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/06/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO PUEBLA DE LA HIGUERA	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00	403,000.00				403,000.00	100.0%	100.0%	
<b>Zacatecas - Rancho Viejo</b>																		
14NE	40001370	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/06/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO EL ZACATECAS - RANCHO VIEJO	129,217.18	129,217.18	129,217.18	129,217.18	129,217.18	129,217.18				129,217.18	100.0%	100.0%	
<b>Rancho Viejo - Tlaxcala</b>																		
15NE	40001370	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	27/06/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO RANCHO VIEJO - TLAXCALA	171,217.71	171,217.71	171,217.71	171,217.71	171,217.71	171,217.71				171,217.71	100.0%	100.0%	
<b>PUEBLA</b>																		
<b>México - Puebla</b>																		
16NE	40001388	GRUPO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	31/01/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	2,090,011.26	2,090,011.26	2,090,011.26	2,090,011.26	2,090,011.26	2,090,011.26				2,090,011.26	100.0%	100.0%	62,100.50
<b>Puebla - Acapulco</b>																		
17NE	40001390	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	01/02/2010	31/01/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUEBLA - ACAPULCO	2,477,407.20	2,477,407.20	2,477,407.20	2,477,407.20	2,477,407.20	2,477,407.20		0.02		2,477,407.20	100.0%	100.0%	



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

No. Puesto	Cuenta No.	Empresa	Periodo del Contrato	Código	Descripción	Monto Original	Monto Aprobado Modificado	Monto Corriente A	Monto Programa B	Estimado Acreditado C	Monto E.C. Transferido D	Reintegraciones Devoluciones	Saldo Comprobado E	Diferencia B-C+D-E	Ejecución a Mayo de Febrero	Monto Aprobado (U.S.)	Monto Ejecutado (U.S.)	Agencia de Colaboración
<b>Mant. Ing. - Cd. Mendoza</b>																		
1886	45001332A	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	TERMINOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0	2,100,000.00	0	2,100,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>COMIZAPALCOZ</b>																		
<b>Chimantón - Campanita</b>																		
1946	45001332B	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	775,500.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00	775,500.00	0	775,500.00	0	775,500.00	100.0%	100.0%	1
<b>La Trinita - Chacabuco (Tramita y Aprobado)</b>																		
2906	45001332C	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0	2,000,000.00	0	2,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>San Juan - Campanita</b>																		
2907	45001332D	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0	1,200,000.00	0	1,200,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Isolina Cruz - La Ventana</b>																		
2908	45001332E	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0	5,000,000.00	0	5,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Puerto Zambor</b>																		
2909	45001332F	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>VEGAZUCO</b>																		
<b>Cd. Mendoza - Campanita</b>																		
2910	45001332G	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Ordoñez - Mariposa</b>																		
2911	45001332H	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0	3,000,000.00	0	3,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>La Trinita - Cd. Iruya</b>																		
2912	45001332I	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Campanita - Campanita - Campanita</b>																		
2913	45001332J	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Libramiento Mariposa - Campanita</b>																		
2914	45001332K	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>REPOSERA</b>																		
<b>Campanita - Campanita</b>																		
2915	45001332L	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Campanita - Campanita</b>																		
2916	45001332M	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Puerto Internacional Epitacio Zángano</b>																		
2917	45001332N	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>Puerto Internacional Epitacio Zángano - Puerto</b>																		
2918	45001332O	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1
<b>GUADALAJARA</b>																		
<b>Campanita - Tiroso</b>																		
2919	45001332P	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	01/05/2010	31/05/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA DE LA AUTORIZADA AUTORIZADA SUBREGIONAL BUENA VISTA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00	100.0%	100.0%	1





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Asignación de recursos - 10 de septiembre de 2011

No. Proyecto	Centro de No. Federal	Empresa	Periodo de Contrato Inicio	Fin	Concepto	Monto Original Asignado	Monto Aprobado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Programado B	Cantidad Acreditada C	Monto Liquidado D	Reintegraciones - Devoluciones	Saldo Cuantificado E	Porcentaje de Ejecución	Monto Reintegrado (%)	Monto Aprobado (%)	Alcance de Cobertura (%)	
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																		
31NE	450013455	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE 12 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 27+000 AL KM 115+000	1,209,914.00	1,002,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00	1,002,000.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
32NE	45001346	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE 26 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 0+000 AL KM 70+000 TRAMO PLAN DE AYALA DEL LADO DEL KM 30+000 TRAMO LA DOBLE Y MANTENIDOS	2,066,329.13	1,802,897.51	1,802,897.51	1,802,897.51	1,802,897.51	1,802,897.51	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
<b>Coahuila - Reynosa</b>																		
41NE	45001347	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR EN 11 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 27+000 AL KM 115+000	294,927.00	305,909.00	305,909.00	305,909.00	305,909.00	305,909.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
42NE	45001348	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR EN 11 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 35+000 AL KM 117+000	1,238,920.00	1,168,298.00	1,168,298.00	1,168,298.00	1,168,298.00	1,168,298.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
<b>Puerto Mexico - Carrizosa</b>																		
43NE	45001349	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE 14 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 35+000 AL KM 117+000	2,153,452.44	2,081,002.33	2,081,002.33	2,081,002.33	2,081,002.33	2,081,002.33	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
<b>Chiapas</b>																		
44NE	45001350	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE 13 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 0+000 AL KM 21+000	346,000.00	320,420.00	320,420.00	320,420.00	320,420.00	320,420.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
<b>Oaxaca</b>																		
45NE	45001351	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR DE 13 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 0+000 AL KM 21+000	2,457,999.72	1,897,247.54	1,897,247.54	1,897,247.54	1,897,247.54	1,897,247.54	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
<b>Colima - Ocotlán</b>																		
46NE	45001352	CONSTRUTORA MANOVAR S.A. DE C.V.	01/03/2010	20/07/2010	MANTENIMIENTO MENOR EN 12 CONSTRUCCIONES DE LA AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DEL LADO DEL KM 0+000 AL KM 21+000	2,510,322.00	2,314,064.00	2,314,064.00	2,314,064.00	2,314,064.00	2,314,064.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
<b>TOTAL</b>																		
						14,809,879.71	14,809,879.71	14,809,879.71	14,809,879.71	14,809,879.71	14,809,879.71	0.00	0.00	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	

300

0229




CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)	Avance físico (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejército a Falso de Efectivo	Retenciones y Devoluciones			Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 5,700,000.00	\$ 7,328,783.44	\$ 7,328,783.44	\$ 7,328,783.44	\$ 6,188,151.46		\$ 1,160,631.98		\$ 6,400,277.86	-\$	22,076.03		100.0%
Culiacán													
Querétaro	\$ 800,000.00	\$ 791,036.09	\$ 791,036.09	\$ 791,036.09	\$ 791,036.09				\$ 791,036.09				100.0%
Guerrero	\$ 3,081,185.08	\$ 3,081,185.08	\$ 3,081,185.08	\$ 3,081,185.08	\$ 3,002,734.27		\$ 78,450.81			-\$	8,372.01		100.0%
Puebla	\$ 3,500,000.00	\$ 3,102,422.24	\$ 3,102,422.24	\$ 3,102,422.24	\$ 3,102,355.55		\$ 68.29		\$ 3,114,256.13		\$ 11,943.18		100.0%
Coahuila	\$ 8,750,000.00	\$ 8,343,124.00	\$ 8,343,124.00	\$ 8,343,124.00	\$ 8,342,900.42		\$ 133.59		\$ 8,342,960.42				100.0%
Veracruz	\$ 6,000,000.00	\$ 5,825,700.09	\$ 5,825,700.09	\$ 5,825,700.09	\$ 5,825,636.14		\$ 64.95		\$ 5,825,635.14	\$	0.00		100.0%
Reynosa													
Guadalupe													
Monterrey													
Chihuahua													
Oaxaca	\$ 850,000.00	\$ 666,724.85	\$ 666,724.85	\$ 666,724.85	\$ 662,352.41		\$ 14,372.44		\$ 652,352.41	-\$	8,015.67		100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 25,600,000.00	\$ 29,138,975.79	\$ 29,138,975.79	\$ 29,138,975.79	\$ 27,885,255.74		\$ 1,253,720.05		\$ 25,126,591.05	-\$	30,313.71	\$ 11,943.18	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

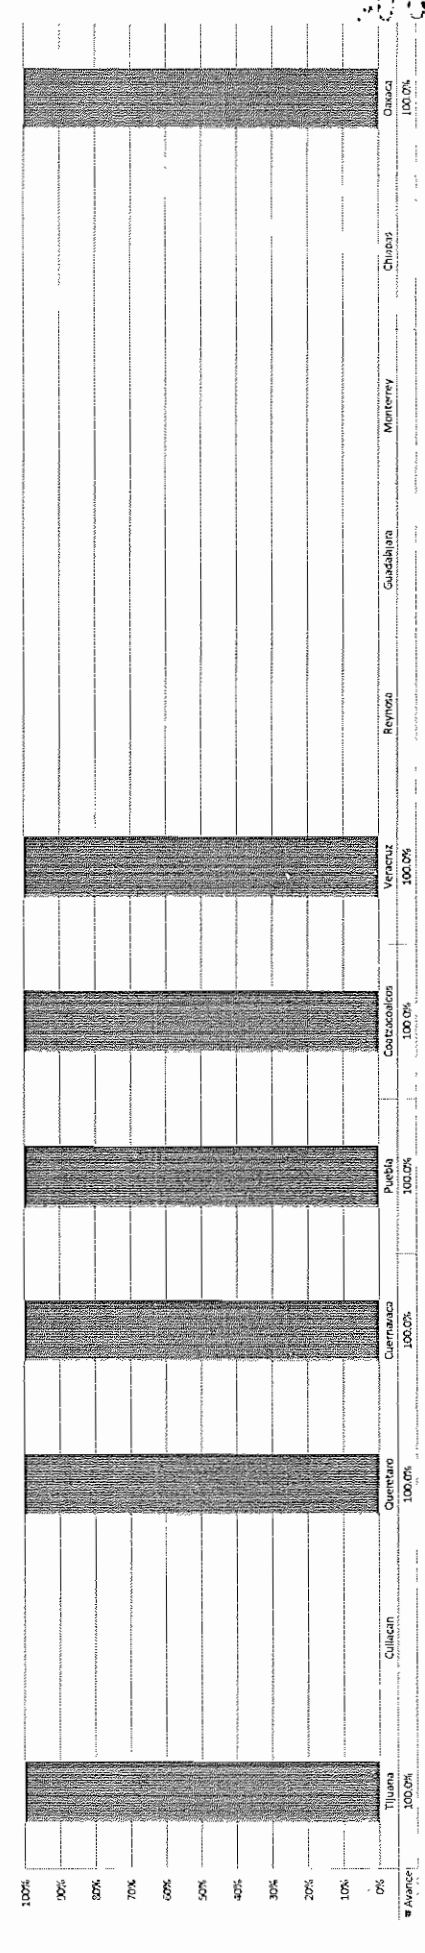

MINISTERIO FEDERAL DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
PROGRAMA DE MODERNIZACION 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NO. Proyecto	Clave de Proyecto	Nombre del Proyecto	Presupuesto	Costo Total	Montos Autorizados	Montos Pagaros	Estimados a Pagar	Montos Pagaros	Reserva de Disponibilidad	Saldo Disponible	Utilización del Presupuesto	Clave de Proyecto de Ejecución	Avance de Inversión (%)	Avance de Obras (%)
<b>TIJUANA</b>														
<b>Tijuana - Financiado</b>														
180	40001020	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA FEDERAL PARA EL TRÁFICO DE CAMIONES EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	31/05/2010	1,700,000.00	918,616.43	318,616.43	918,616.43	918,616.43	0.00	0.00	100.00%	918,616.43	100.00%	100.00%
240	40001020	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA FEDERAL PARA EL TRÁFICO DE CAMIONES EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	30/05/2010	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	0.00	100.00%	2,700,000.00	100.00%	100.00%
340	40001020	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA FEDERAL PARA EL TRÁFICO DE CAMIONES EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	09/05/2010	5,500,000.00	960,000.00	395,071.91	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	100.00%	960,000.00	100.00%	100.00%
170011	40001020	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CARRETERA FEDERAL PARA EL TRÁFICO DE CAMIONES EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	31/05/2011	3,217,000.00	3,217,000.00	3,217,000.00	3,217,000.00	3,217,000.00	0.00	0.00	100.00%	3,217,000.00	100.00%	100.00%
<b>SECRETARÍA</b>														
<b>Quintana Roo - Inversión</b>														
440	40001020	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	01/02/2010	600,000.00	701,000.00	701,000.00	701,000.00	701,000.00	0.00	0.00	100.00%	701,000.00	100.00%	100.00%
<b>CIJERRAVACA</b>														
<b>México - Compraventa</b>														
800009	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	18/05/2010	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%	100.00%
<b>Compraventa - Acapulco</b>														
1700	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	01/11/2010	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	100.00%
<b>PUEBLA</b>														
<b>México - Puntos</b>														
140	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	03/05/2010	2,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	100.00%	1,800,000.00	100.00%	100.00%
<b>Puntos - Acapulco</b>														
640	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	24/11/2010	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	100.00%
<b>GOATZUCALCO</b>														
<b>Acapulco - Compraventa</b>														
140	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	17/05/2010	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	100.00%	2,000,000.00	100.00%	100.00%
<b>Compraventa - Compraventa</b>														
140	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	02/05/2010	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	100.00%
<b>Puntos - Puntos</b>														
140	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	09/05/2010	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	100.00%
<b>Acapulco - Compraventa</b>														
140	40001020	CONSTRUCCION DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA ZONA DE LA PLAZA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA SUR	02/05/2010	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00%	1,500,000.00	100.00%	100.00%



CAMINOS Y PUNTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MODERNIZACION 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Fideicomiso	Comercio No.	Concesionario	Periodo de Construcción	Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Adversado Revertido	Monto Cancelado	Monto Progra. Inicial	Entregado Al Ejecutor	Monto En Trámite	Revoluciones + Donaciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.-E	Ejecución a Fines de Ejercicio	Avance Físico (%)	Avance de Costos (%)
Salida Cruz - La Victoria																
11M0	40001477	LACRATORIO Y ASERCIÓN EN CONTROL DE CALIDAD DE LA CARRETERA FEDERAL DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V. Y SU CONTROLADORA Y ASERCIÓN S.A. DE C.V.	02/05/2010 - 20/11/2010	SUMINISTRO E INSTALACION DE 7 PLANTAS DE AGUAS RESIDUALES DESTINADAS A LA SANEAMIENTO SANITARIO EN LA PLAZA DE LA PLAZA DE CENTRO No. 30 INTERSECCION DEL CAMINO DIRECTO DALINA CRUZ - LA VICTORIA	2,500,000.00	2,200,287.44	2,200,287.44	2,200,287.44	2,200,287.44	2,200,287.44				2,200,287.44	100.0%	100.0%
<b>SUBTOTAL CORAZONALCATOR</b>																
<b>VEPACRUZ</b>																
Corchibo - Verterop																
12M0	40001291	HEROTECMA CALIDAD DE AGUA - VERTEOP S.C.	16/03/2010 - 12/06/2010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALIDAD PARA EL CAMINO C-119 "CANTALANAC" DE LA AUTOPISTA, CORDOBA - VERTEOP	1,500,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00	1,497,000.00				1,497,000.00	100.0%	100.0%
La Trinita - Iba																
13M0	40001290	HEROTECMA CALIDAD DE AGUA - VERTEOP S.C.	16/03/2010 - 11/05/2010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALIDAD PARA LA PLAZA DE CENTRO DEL CARRERA "A" Y OTRA PARA EL CENTRO ADMINISTRATIVO DE LA PLAZA DE CENTRO No. 30 INTERSECCION DE LA AUTOPISTA LA TRINIDAD - IBA	3,000,000.00	2,901,464.96	2,901,464.96	2,901,464.96	2,901,464.96	2,901,464.96				2,901,464.96	100.0%	100.0%
Callejón Zimera - Thualén																
14M0	40001295	LABORATORIO Y ASERCIÓN EN CONTROL DE CALIDAD DE AGUA - VERTEOP S.A. DE C.V.	10/02/2010 - 12/06/2010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE CALIDAD PARA EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA PLAZA DE CENTRO C-177 "TOTONOXEL" DE LA AUTOPISTA LA TRINIDAD - IBA	1,500,000.00	1,376,226.54	1,376,226.54	1,376,226.54	1,376,226.54	1,376,226.54	0.00			1,376,226.54	100.0%	100.0%
<b>SUBTOTAL VERTEOP</b>																
<b>DAMAZA</b>																
Cuenmpalán - Onices																
15M0	40001426	CONSTRUCCION BRTA, CM S.A. DE C.V.	03/05/2010 - 30/05/2010	AMPLIACION DE LA CARRETA ASFALTICA, GORRE ACCIDENTALES DE ACCESO A LA PLAZA DE CENTRO No. 30 INTERSECCION DEL CAMINO DALINA CRUZ - LA VICTORIA	410,000.00	600,724.05	600,724.05	600,724.05	602,302.41			14,577.36		600,724.05	100.0%	100.0%
16M0	40001427	CONSTRUCCION BRTA, CM S.A. DE C.V.	03/05/2010 - 30/05/2010	AMPLIACION DE LA CARRETA ASFALTICA, GORRE ACCIDENTALES DE ACCESO A LA PLAZA DE CENTRO No. 30 INTERSECCION DEL CAMINO DALINA CRUZ - LA VICTORIA	410,000.00	600,724.05	600,724.05	600,724.05	602,302.41			14,577.36		600,724.05	100.0%	100.0%
<b>SUBTOTAL DAMAZA</b>																
<b>TOTAL</b>																

0232


197



Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance Financiero (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado	Estimado Acumulado	Monto En Trámite	Saldo Cancelado	Diferencia B - C - D - E	Ejecido a Flujos de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pugnados			
Tijuana	\$ 222,500.00	\$ 80,316.79	\$ 80,316.79	\$ 80,316.79	\$ 80,316.79				\$ 80,316.79	\$ 4,217.85			100.0%	
Culiacán														
Querétaro														
Cuernavaca	\$ 92,029.59	\$ 92,029.59	\$ 92,029.59	\$ 92,029.59	\$ 92,029.59				\$ 92,029.59				100.0%	
Puebla														
Coleccionables	\$ 147,023.72	\$ 147,023.72	\$ 147,023.72	\$ 147,023.72	\$ 147,023.72				\$ 147,023.72				100.0%	
Veracruz	\$ 899,144.70	\$ 899,144.70	\$ 899,144.70	\$ 899,144.70	\$ 899,144.70				\$ 899,144.70	\$ 4,142.47			100.0%	
Reynosa														
Guadalajara														
Monterrey														
Chihuahua														
Oaxaca														
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 222,500.00</b>	<b>\$ 1,218,514.80</b>	<b>\$ 1,218,514.80</b>	<b>\$ 1,218,514.80</b>	<b>\$ 1,218,514.80</b>				<b>\$ 1,218,514.80</b>	<b>\$ 75.38</b>			<b>100.0%</b>	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

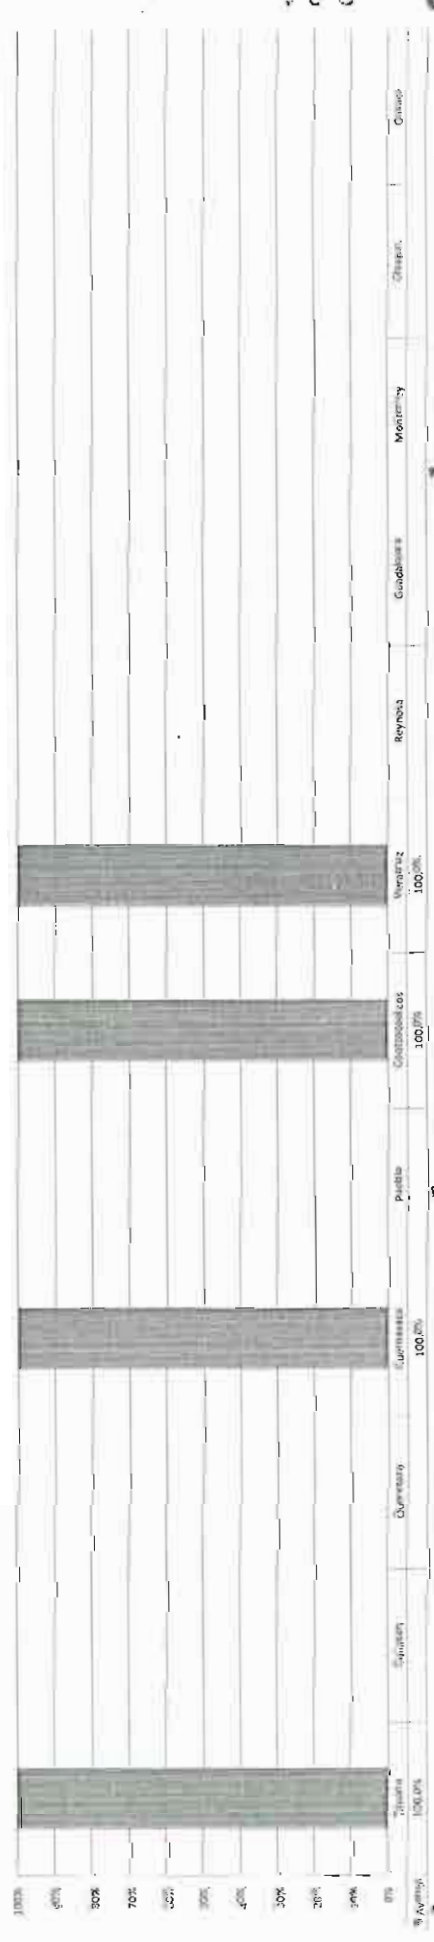

0233

198


Handwritten signature



Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Ejecutado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ciercio a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	
Tijuana	\$ 608,770.04	\$ 1,147,340.16	\$ 1,147,340.16	\$ 1,147,340.16	\$ 1,147,340.16				\$ 1,147,340.16			100.0%	N/A	
Culiacán	\$ 2,257,800.82	\$ 2,449,017.20	\$ 2,449,017.20	\$ 2,449,017.20	\$ 2,449,017.20				\$ 2,449,017.20			100.0%	N/A	
Querétaro	\$ 2,176,125.74	\$ 2,870,182.78	\$ 2,870,182.78	\$ 2,870,182.78	\$ 2,870,182.78				\$ 2,870,182.78			100.0%	N/A	
Coahuila	\$ 1,578,441.82	\$ 1,106,369.25	\$ 1,106,369.25	\$ 1,106,369.25	\$ 1,123,400.83		\$ 72,956.42		\$ 1,123,400.83	\$ 40.89		100.0%	N/A	
Puebla	\$ 1,144,851.12	\$ 1,006,028.64	\$ 1,006,028.64	\$ 1,006,028.64	\$ 1,006,028.64				\$ 1,006,028.64			100.0%	N/A	
Coahuila	\$ 2,725,836.00	\$ 2,682,064.36	\$ 2,682,064.36	\$ 2,682,064.36	\$ 2,682,064.34		\$ 0.02		\$ 2,682,064.34			100.0%	N/A	
Veracruz	\$ 1,667,303.02	\$ 1,588,702.65	\$ 1,588,702.65	\$ 1,588,702.65	\$ 1,588,702.63		\$ 0.02		\$ 1,588,702.63			100.0%	N/A	
Royasa	\$ 118,119.56	\$ 139,109.88	\$ 139,109.88	\$ 139,109.88	\$ 139,109.88				\$ 139,109.88			100.0%	N/A	
Guadalajara	\$ 1,787,250.34	\$ 1,917,260.41	\$ 1,917,260.41	\$ 1,917,260.41	\$ 1,917,260.41				\$ 1,917,260.41			100.0%	N/A	
Morelos	\$ 1,481,038.74	\$ 1,744,223.88	\$ 1,744,223.88	\$ 1,744,223.88	\$ 1,744,223.88				\$ 1,744,223.88			100.0%	N/A	
Chiapas	\$ 1,113,040.70	\$ 1,110,817.75	\$ 1,110,817.75	\$ 1,110,817.75	\$ 1,110,817.75				\$ 1,110,817.75	\$ 0.00		100.0%	N/A	
Oaxaca	\$ 613,313.10	\$ 612,083.25	\$ 612,083.25	\$ 612,083.25	\$ 612,083.25				\$ 612,083.25			100.0%	N/A	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,250,000.00</b>	<b>\$ 18,592,200.21</b>	<b>\$ 18,592,200.21</b>	<b>\$ 18,592,200.21</b>	<b>\$ 18,592,200.21</b>		<b>\$ 72,956.40</b>		<b>\$ 18,499,240.75</b>	<b>\$ 40.89</b>		<b>100.0%</b>	<b>N/A</b>	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

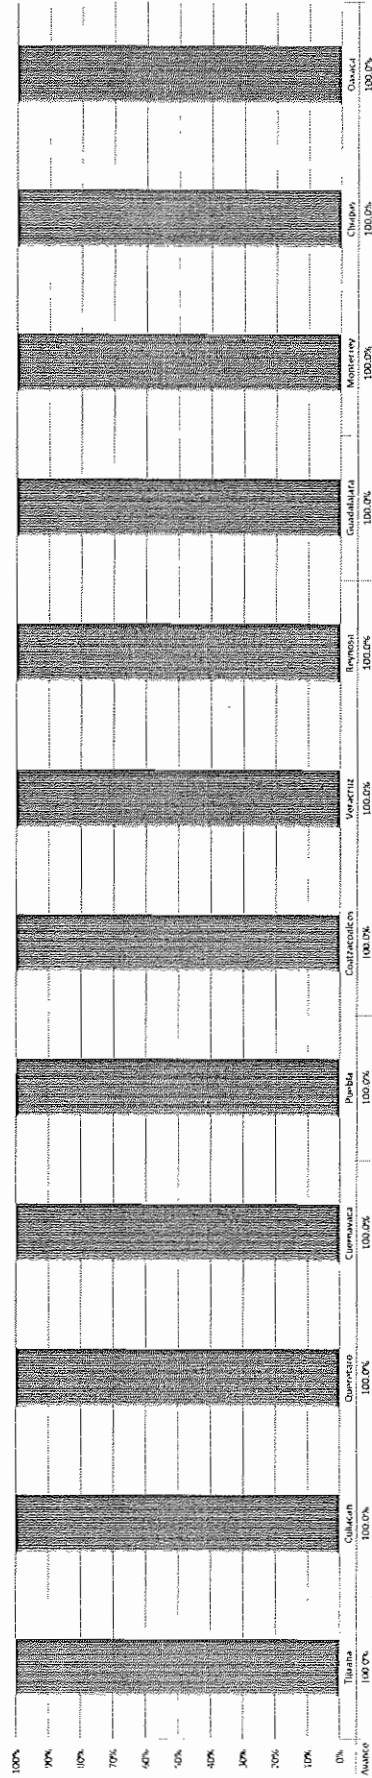

2

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Inicial	Contrata No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto C. Tumbos	Rebajas - Dedicaciones	Saldo Cancelado	Diferencia D-C	Cancelado a Pagar (B) - (C)	Avance Realizado (%)	Análisis Pico (E)
			Inicio	Fin												
<b>TJUJANA</b>																
<b>Tlaxiama - Emancada</b>																
11ET-10	460014200 (1)	ASOCIACION CIVIL EN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DE CV	08/06/2010	04/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, TLUJANA - CINCUENARIA (PS)	\$ 401,600.70	\$ 401,600.70	\$ 401,600.70	\$ 401,600.70	\$ -	\$ -	\$ 401,600.70	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
12ET-10	460014206 (2)	ALVAZ Y OJALLEN INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE CV	09/04/2010	04/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, LA INGENIERIA - TEGATE (2S)	\$ 177,196.34	\$ 177,196.34	\$ 177,196.34	\$ 177,196.34	\$ -	\$ -	\$ 177,196.34	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>SUBTOTAL TJUJANA</b>						\$ 578,797.04	\$ 578,797.04	\$ 578,797.04	\$ 578,797.04	\$ -	\$ -	\$ 578,797.04	\$ -	\$ -	100.0%	0.0%
<b>CULIACAÁN</b>																
<b>Estacion Don. Nojays</b>																
13ET-10	460014306	COPEX INGENIERIA S.A. DE CV	07/06/2010	07/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA ESTACION DON. NOJAYS	\$ 2,440,017.20	\$ 2,440,017.20	\$ 2,440,017.20	\$ 2,440,017.20	\$ -	\$ -	\$ 2,440,017.20	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>SUBTOTAL CULIACAÁN</b>						\$ 2,440,017.20	\$ 2,440,017.20	\$ 2,440,017.20	\$ 2,440,017.20	\$ -	\$ -	\$ 2,440,017.20	\$ -	\$ -	100.0%	0.0%
<b>Chamapa - Ixtachila</b>																
14ET-10	460014204 (1)	COOPERATIVO DE CONSTRUCTORES Y VENDEDORES S.C.L.	04/01/2010	04/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, CHAMAPA - IXTACHILA (RM)	\$ 348,677.60	\$ 348,677.60	\$ 348,677.60	\$ 348,677.60	\$ -	\$ -	\$ 348,677.60	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
15ET-10	460014204 (2)	CONSORCIO DE CONSTRUCTORES Y VENDEDORES S.C.L.	09/01/2010	04/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, QUILICHAHO - PAMPANO (200)	\$ 806,670.30	\$ 806,670.30	\$ 806,670.30	\$ 806,670.30	\$ -	\$ -	\$ 806,670.30	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Libramiento Marcolante de Cuernavaca</b>						\$ 1,155,347.90	\$ 1,155,347.90	\$ 1,155,347.90	\$ 1,155,347.90	\$ -	\$ -	\$ 1,155,347.90	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
16ET-10	460014204 (3)	CONSORCIO DE CONSTRUCTORES Y VENDEDORES S.C.L.	09/01/2010	04/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, CUERNAVACA - LIBRAMIENTO MARCOLANTE (20)	\$ 146,372.02	\$ 146,372.02	\$ 146,372.02	\$ 146,372.02	\$ -	\$ -	\$ 146,372.02	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Motaco - Quetzotlan</b>						\$ 2,941,927.78	\$ 2,941,927.78	\$ 2,941,927.78	\$ 2,941,927.78	\$ -	\$ -	\$ 2,941,927.78	\$ -	\$ -	100.0%	0.0%
17ET-10	460014204 (4)	CONSORCIO DE CONSTRUCTORES Y VENDEDORES S.C.L.	09/01/2010	09/01/2011	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, MOTACO - QUETZOTLAN (10)	\$ 611,375.96	\$ 611,375.96	\$ 611,375.96	\$ 611,375.96	\$ -	\$ -	\$ 611,375.96	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA</b>						\$ 2,977,320.82	\$ 2,977,320.82	\$ 2,977,320.82	\$ 2,977,320.82	\$ -	\$ -	\$ 2,977,320.82	\$ -	\$ -	100.0%	0.0%
<b>Motaco - Cuernavaca</b>																
18ET-10	460014202 (1)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	21/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, MOTACO - CUERNAVACA (2)	\$ 204,229.12	\$ 179,203.00	\$ 179,203.00	\$ 179,203.00	\$ -	\$ -	\$ 179,203.00	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
19ET-10	460014202 (2)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	26/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, CUERNAVACA (3)	\$ 177,196.34	\$ 134,482.26	\$ 134,482.26	\$ 134,482.26	\$ -	\$ -	\$ 134,482.26	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Subtotal Cuernavaca</b>						\$ 381,425.46	\$ 313,685.26	\$ 313,685.26	\$ 313,685.26	\$ -	\$ -	\$ 313,685.26	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>La Perla - Cuauhtlan</b>																
20ET-10	460014202 (3)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	20/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, CUERNAVACA - AGUASCALIENTES (20)	\$ 709,717.30	\$ 527,640.00	\$ 527,640.00	\$ 527,640.00	\$ -	\$ -	\$ 527,640.00	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
21ET-10	460014202 (4)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	20/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, LA PERLA - CUAUHTLAN (2)	\$ 249,782.19	\$ 182,729.76	\$ 182,729.76	\$ 182,729.76	\$ -	\$ -	\$ 182,729.76	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Subtotal La Perla - Cuauhtlan</b>						\$ 959,500.49	\$ 710,369.76	\$ 710,369.76	\$ 710,369.76	\$ -	\$ -	\$ 710,369.76	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Puente de Mts. - Ixtachila</b>																
22ET-10	460014202 (5)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	20/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, PUEBLO DE IXTA - IXTACHILA (2)	\$ 186,260.40	\$ 141,257.75	\$ 141,257.75	\$ 141,257.75	\$ -	\$ -	\$ 141,257.75	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Subtotal Puente de Mts. - Ixtachila</b>						\$ 186,260.40	\$ 141,257.75	\$ 141,257.75	\$ 141,257.75	\$ -	\$ -	\$ 141,257.75	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Zacapala - Rancho Viejo</b>																
23ET-10	460014202 (6)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	20/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, ZACAPALA - RANCHO VIEJO (2)	\$ 9,056.12	\$ 9,056.12	\$ 9,056.12	\$ 9,056.12	\$ -	\$ -	\$ 9,056.12	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Subtotal Zacapala - Rancho Viejo</b>						\$ 9,056.12	\$ 9,056.12	\$ 9,056.12	\$ 9,056.12	\$ -	\$ -	\$ 9,056.12	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Rancho Viejo - Taczo</b>																
24ET-10	460014202 (7)	INGENIEROS CONSULTORES E INMOBILIARIA, SA DE CV	20/04/2010	20/12/2010	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADA EN LA AUTOPISTA, RANCHO VIEJO - TACZO (4)	\$ 18,172.24	\$ 13,191.00	\$ 13,191.00	\$ 13,191.00	\$ -	\$ -	\$ 13,191.00	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>Subtotal Rancho Viejo - Taczo</b>						\$ 18,172.24	\$ 13,191.00	\$ 13,191.00	\$ 13,191.00	\$ -	\$ -	\$ 13,191.00	\$ -	\$ -	100.0%	N/A
<b>SUBTOTAL GENERAL</b>						\$ 11,155,347.90	\$ 10,155,347.90	\$ 10,155,347.90	\$ 10,155,347.90	\$ -	\$ -	\$ 10,155,347.90	\$ -	\$ -	100.0%	0.0%

Handwritten signature or mark.



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRACCIONALES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puntada	Contrato No.	Empresa	Periodo de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Ajustado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estado Acumulado C	Monto Ed. Tercio D	Relaciones - Devoluciones	Subsidio Cancelado E	Diversas D-C-D-C	Ejecución en efectivo	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
			Inicia	Fin													
<b>Masico - Pabón</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 08 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA (88)	\$ 455,219.00	\$ 455,219.00	\$ 455,219.00	\$ 455,219.00	\$ 455,219.00	\$	\$	\$	\$	\$ 455,219.00	100.0%	100.0%
<b>Puebla - Acapulco</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA PUEBLA - ACAPULCO (10)	\$ 227,153.00	\$ 217,409.00	\$ 217,409.00	\$ 217,409.00	\$ 217,409.00	\$	\$	\$	\$	\$ 217,409.00	100.0%	100.0%
<b>Acapulco - Cd. Mendoza</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA ACAPULCO - CD. MENDOZA (10)	\$ 472,479.24	\$ 462,202.20	\$ 462,202.20	\$ 462,202.20	\$ 462,202.20	\$	\$	\$	\$	\$ 462,202.20	100.0%	100.0%
<b>CD. Tlaxiaco - Cd. Mendoza</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA CD. TLAXIACO - CD. MENDOZA (10)	\$ 3,335,033.32	\$ 3,070,028.04	\$ 3,070,028.04	\$ 3,070,028.04	\$ 3,070,028.04	\$	\$	\$	\$	\$ 3,070,028.04	100.0%	100.0%
<b>CD. Tlaxiaco - Cd. Mendoza</b>																	
1907/2010	400014006	INTEFER INGENIERIA S.A. DE C.V.	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA CD. TLAXIACO - CD. MENDOZA (10)	\$ 70,777.14	\$ 70,301.71	\$ 70,301.71	\$ 70,301.71	\$ 70,301.71	\$	\$	\$	\$	\$ 70,301.71	100.0%	100.0%
<b>Champón - Campeche</b>																	
2007/2010	400014007	HEPHE INGENIERIA S.A. DE C.V.	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 20 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA CHAMPÓN - CAMPEC (20)	\$ 104,400.00	\$ 101,001.01	\$ 101,001.01	\$ 101,001.01	\$ 101,001.01	\$	\$	\$	\$	\$ 101,001.01	100.0%	100.0%
<b>Atzacantan - Coahuila de Zaragoza</b>																	
1907/2010	400014006	SERVIS INGENIERIA S.A. DE C.V.	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 08 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA AGUANAYAN - COAHUILA DE ZARAGOZA (8)	\$ 300,000.00	\$ 307,101.46	\$ 307,101.46	\$ 307,101.46	\$ 307,101.46	\$	\$	\$	\$	\$ 307,101.46	100.0%	100.0%
<b>Atzacantan - Coahuila de Zaragoza</b>																	
1907/2010	400014006	SERVIS INGENIERIA S.A. DE C.V.	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 08 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA AGUANAYAN - COAHUILA DE ZARAGOZA (8)	\$ 310,471.14	\$ 311,008.42	\$ 311,008.42	\$ 311,008.42	\$ 311,008.42	\$	\$	\$	\$	\$ 311,008.42	100.0%	100.0%
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>																	
2007/2010	400014007	HEPHE INGENIERIA S.A. DE C.V.	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 20 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA SALINA CRUZ - LA VENTOSA (20)	\$ 1,211,000.00	\$ 1,100,101.27	\$ 1,100,101.27	\$ 1,100,101.27	\$ 1,100,101.27	\$	\$	\$	\$	\$ 1,100,101.27	100.0%	100.0%
<b>VERACRUZ</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 08 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA CD. MENDOZA - COORDINA (8)	\$ 289,700.00	\$ 308,042.32	\$ 308,042.32	\$ 308,042.32	\$ 308,042.32	\$	\$	\$	\$	\$ 308,042.32	100.0%	100.0%
<b>Coahuila - Veracruz</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA CD. MENDOZA - COORDINA (10)	\$ 472,479.24	\$ 462,202.20	\$ 462,202.20	\$ 462,202.20	\$ 462,202.20	\$	\$	\$	\$	\$ 462,202.20	100.0%	100.0%
<b>La Tuxtepec - Cd. Ixcotel</b>																	
2007/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 20 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA LA TUXTEPEC - CD. IXCOTEL (20)	\$ 650,162.00	\$ 657,000.00	\$ 657,000.00	\$ 657,000.00	\$ 657,000.00	\$	\$	\$	\$	\$ 657,000.00	100.0%	100.0%
<b>Guatemala - Zacatecas</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 20 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA GUATEMALA - ZACATECAS (20)	\$ 90,101.20	\$ 95,577.82	\$ 95,577.82	\$ 95,577.82	\$ 95,577.82	\$	\$	\$	\$	\$ 95,577.82	100.0%	100.0%
<b>Libramiento - Zacatecas</b>																	
1907/2010	400014006	ALVARO ZUBELLEN INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	04/04/2011	04/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA LIBRAMIENTO - ZACATECAS (10)	\$ 46,400.00	\$ 42,200.00	\$ 42,200.00	\$ 42,200.00	\$ 42,200.00	\$	\$	\$	\$	\$ 42,200.00	100.0%	100.0%
<b>REYNOSA</b>																	
2004/2010	400014007	RAM INGENIERIA CONSULTORES S.A. DEC V	31/12/2010	31/12/2010	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS TRACCIONALES UNICADA EN LA AUTOPISTA REYNOSA - MATAMOROS (10)	\$ 116,100.00	\$ 130,100.00	\$ 130,100.00	\$ 130,100.00	\$ 130,100.00	\$	\$	\$	\$	\$ 130,100.00	100.0%	100.0%

00

0237

202

Handwritten signature



PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Contrato No. Póliza	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto En Trámite	Revisiones - Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia DOCAF	Ejercidos a Nivel de (Millones)	Avances Financ. Programado (%)	Avances Financ. Ejecutados (%)	
		Inicio	Fin														
<b>QUADALAJARA</b>																	
<b>Parícutin - Uruapan</b>																	
31ET-10	450014276 (1)	HEVY INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/06/2010	06/06/2010	\$ 300,444,000	\$ 364,710,700	\$ 374,770,700	\$ 274,177,100	\$ 374,379,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,270,271	100.0%	100.0%	N/A
<b>Uruapan - Nueva Italia</b>																	
31ET-10	450014276 (4)	HEVY INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/06/2010	06/06/2010	\$ 327,100,320	\$ 364,065,610	\$ 364,065,610	\$ 364,065,610	\$ 364,065,610	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 264,065,610	100.0%	100.0%	N/A
<b>Nueva Italia - Toluca - Cuernavaca</b>																	
31ET-10	450014276 (2)	HEVY INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/06/2010	06/06/2010	\$ 640,107,200	\$ 651,442,800	\$ 651,442,800	\$ 651,442,800	\$ 651,442,800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 651,442,800	100.0%	100.0%	N/A
<b>Quedadajara - Tepic</b>																	
31ET-10	450014276 (1)	HEVY INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/06/2010	06/06/2010	\$ 631,533,000	\$ 678,654,700	\$ 678,654,700	\$ 678,654,700	\$ 678,654,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 678,654,700	100.0%	100.0%	N/A
<b>MONTERRREY</b>																	
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																	
31ET-10	450014276 (1)	OMI INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30/04/2010	31/12/2010	\$ 327,100,320	\$ 361,327,360	\$ 361,327,360	\$ 361,327,360	\$ 361,327,360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 361,327,360	100.0%	100.0%	N/A
<b>Toluca - Saltillo</b>																	
31ET-10	450014276 (2)	OMI INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30/04/2010	31/12/2010	\$ 272,660,000	\$ 321,022,000	\$ 321,022,000	\$ 321,022,000	\$ 321,022,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 321,022,000	100.0%	100.0%	N/A
<b>Cobahua - Ojo Caliente</b>																	
31ET-10	450014276 (3)	OMI INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30/04/2010	31/12/2010	\$ 118,120,720	\$ 138,109,060	\$ 138,109,060	\$ 138,109,060	\$ 138,109,060	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 138,109,060	100.0%	100.0%	N/A
<b>Donner Palace - Coahuila</b>																	
31ET-10	450014276 (1)	OMI INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30/04/2010	31/12/2010	\$ 372,520,000	\$ 430,731,100	\$ 430,731,100	\$ 430,731,100	\$ 430,731,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 430,731,100	100.0%	100.0%	N/A
<b>Catereña - Bayreuth</b>																	
31ET-10	450014276 (2)	OMI INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30/04/2010	31/12/2010	\$ 206,250,000	\$ 247,771,700	\$ 247,771,700	\$ 247,771,700	\$ 247,771,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 247,771,700	100.0%	100.0%	N/A
<b>Puerto Mexico - Coahuila</b>																	
31ET-10	450014276 (4)	OMI INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	30/04/2010	31/12/2010	\$ 95,660,200	\$ 112,367,260	\$ 112,367,260	\$ 112,367,260	\$ 112,367,260	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 112,367,260	100.0%	100.0%	N/A
<b>CHILPAS</b>																	
<b>Las Chabas - Rautshin - Ocozacoacoatlán</b>																	
31ET-10	450014276 (1)	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES S.L.	19/01/2010	04/04/2011	\$ 1,110,017,700	\$ 1,110,017,700	\$ 1,110,017,700	\$ 1,110,017,700	\$ 1,110,017,700	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,110,017,700	100.0%	100.0%	N/A
<b>OAXACA</b>																	
<b>Cd. Cuernavaca - Oaxaca</b>																	
31ET-10	450014276 (2)	COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES Y PROMOTORES S.L.	19/01/2010	04/04/2011	\$ 612,063,200	\$ 612,063,200	\$ 612,063,200	\$ 612,063,200	\$ 612,063,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612,063,200	100.0%	100.0%	N/A
<b>TOTAL</b>																	
					\$ 17,250,000.00	\$ 18,562,300.21	\$ 18,562,300.21	\$ 18,562,300.21	\$ 18,562,300.21	\$ 18,562,300.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,482,240.76	100.0%	100.0%	0.0%


0238  
203

Handwritten signature

Fecha de corte: 31 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal						
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
Tijuana													
Culiacán													
Querétaro													
Cuernavaca													
Puebla													
Coahuila de Zaragoza	\$ 1,000,000.00	\$ 919,216.63	\$ 919,216.63	\$ 919,216.63	\$ 919,216.63				\$ 919,216.63			100.0%	N/A
Veracruz	\$ 3,869,903.67	\$ 3,869,903.67	\$ 3,869,903.67	\$ 3,869,903.67	\$ 3,869,903.64		\$ 0.03		\$ 3,869,903.64			100.0%	N/A
Rioyudo													
Guadalajara													
Monterrey	\$ 2,500,000.00	\$ 1,418,716.40	\$ 1,418,716.40	\$ 1,418,716.40	\$ 1,418,716.40				\$ 1,418,716.40			100.0%	N/A
Chihuahua	\$ 1,250,000.00	\$ 1,096,920.91	\$ 1,096,920.91	\$ 1,096,920.91	\$ 1,096,920.91				\$ 1,096,920.91			100.0%	N/A
Oaxaca	\$ 1,500,000.00	\$ 1,568,370.14	\$ 1,568,370.14	\$ 1,568,370.14	\$ 1,568,370.14				\$ 1,568,370.14			100.0%	N/A
<b>TOTAL</b>	\$ 12,500,000.00	\$ 9,473,127.75	\$ 9,473,127.75	\$ 9,473,127.75	\$ 9,473,127.72		\$ 0.03		\$ 9,473,127.72			100.0%	N/A

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

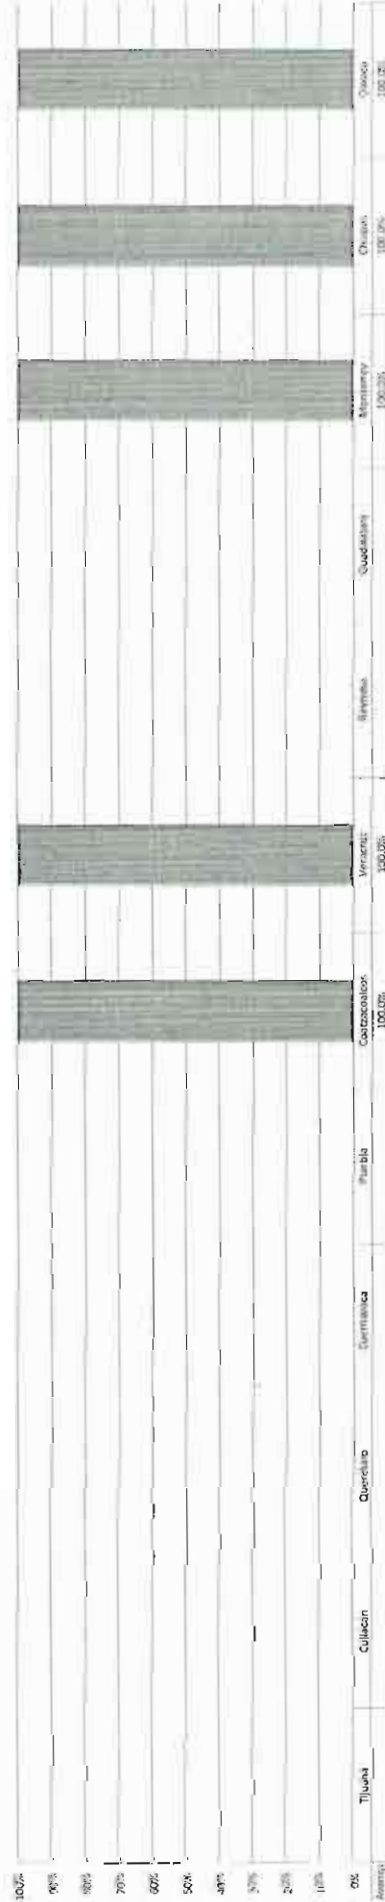

000 0239

204

Handwritten signature

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Ingreso	Código No. Ingreso	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto en Trámite D	Reconstrucción Derivados	Saldo Contratado E	Diferencia B-E-D-E	Líquido a Flujo de Efectivo	Avance Mensual (%)	Avance Global (%)
			Inicio	Fin													
C.G. MENDOZA - Córdoba																	
18E-19	450014310 (1)	PROYECTOS DE RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	12/01/2010	08/11/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	175.578,24	175.578,24	175.578,24	175.578,24					175.578,24	100,0%	100,0%
28E-19	450014310 (2)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	12/01/2010	08/11/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	175.578,24	175.578,24	175.578,24	175.578,24					175.578,24	100,0%	100,0%
38E-19	450014310 (3)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	12/01/2010	08/11/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	175.578,24	175.578,24	175.578,24	175.578,24					175.578,24	100,0%	100,0%
48E-19	450014310 (4)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	12/01/2010	08/11/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	175.578,24	175.578,24	175.578,24	175.578,24					175.578,24	100,0%	100,0%
C.G. MENDOZA - Córdoba																	
58E-19	450014310 (5)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	09/05/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00	100,0%	100,0%
68E-19	450014310 (6)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	09/05/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00					250.000,00	100,0%	100,0%
Córdoba - Veracruz																	
78E-19	450014310 (7)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
88E-19	450014310 (8)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
98E-19	450014310 (9)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
L.L. Toluca - Colima																	
108E-19	450014310 (10)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
118E-19	450014310 (11)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
128E-19	450014310 (12)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
138E-19	450014310 (13)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
148E-19	450014310 (14)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
158E-19	450014310 (15)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
168E-19	450014310 (16)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
178E-19	450014310 (17)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%
188E-19	450014310 (18)	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	06/06/2010	24/01/2011	RECONSTRUCCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE MARTIN DE SARRIENA EN LA AUTOPISTA CAJAMAQUERA - SALAMANCA	250.000,00	147.175,76	147.175,76	147.175,76	147.175,76					147.175,76	100,0%	100,0%



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE EST RUCTURAS ESPECIALES 2015 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Concepto	Monto Aprobado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Eliminado Acumulado C	Monto En Trámite D	Rotaciones y Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia (B+C-D)	Estado a Fines de Ejercicio	Avance Numérico (%)	Avance Físico (%)
21E-10	450014209 (7)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/07/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
22E-10	450014209 (8)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
23E-10	450014209 (9)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
24E-10	450014209 (10)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
25E-10	450014209 (11)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
26E-10	450014209 (12)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
27E-10	450014209 (13)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
28E-10	450014209 (14)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
29E-10	450014209 (15)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
30E-10	450014209 (16)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/05/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO HORONDO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA LA TINAJA CD. S.L.A.	250,000.00	148,292.64	148,292.64	148,292.64	148,292.64				148,292.64	100.0%	N/A
<b>MONTAÑEZ</b>															
Montañez - Montezuma					3,380,893.97	3,380,893.97	3,380,893.97	3,380,893.97	3,380,893.97				3,380,893.97	100.0%	100.0%
30E-10	450014204 (1)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA MONTEHERMOSO LAURELES	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
31E-10	450014204 (2)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA MONTEHERMOSO LAURELES	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
32E-10	450014204 (3)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA MONTEHERMOSO LAURELES	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
33E-10	450014204 (4)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA MONTEHERMOSO LAURELES	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
34E-10	450014204 (5)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA MONTEHERMOSO LAURELES	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
35E-10	450014204 (6)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA MONTEHERMOSO LAURELES	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
<b>Cadereyta - Reynosa</b>															
36E-10	450014204 (7)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SAN CARLOS REYNOSA	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
<b>Tehuacan - Saltillo</b>															
37E-10	450014204 (8)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SALADO CPO. A UBICADO EN LA AUTOPISTA SALTILO TEBUACAN	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
38E-10	450014204 (9)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO LOS SALTILO TEBUACAN	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
<b>Puerto Madero - Carboneras</b>															
39E-10	450014204 (10)	SEMPER INGENIERIA S.A. DE C.V.	06/11/2010	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO SAN CARLOS MADERO CARBONERAS	250,000.00	141,871.64	141,871.64	141,871.64	141,871.64				141,871.64	100.0%	N/A
TOTAL					2,380,893.97	2,380,893.97	2,380,893.97	2,380,893.97	2,380,893.97				2,380,893.97	100.0%	100.0%

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE EST RUCTURAS ESPECIALES 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


No. Periodo	Comprobante No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Comprobado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones Derivaciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B+C-D-E	Clasificación de Efectivo	Avance Físico (%)	Avance Financiero (%)
			Inicio	Fin													
<b>Luz Chicompa - Raudales, Oaxaca</b>																	
41E-10	450014297 (1)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	06/05/2010	24/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE FEDERAL	\$ 250,000.00	\$ 130,000.19	\$ 130,000.19	\$ 130,000.19	\$ 130,000.19			\$ -	\$ -	\$ 130,000.19	100.0%	100.0%
41E-10	450014297 (2)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	06/05/2010	24/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE CASALAN DE CARRIZAL	\$ 250,000.00	\$ 276,006.15	\$ 276,006.15	\$ 276,006.15	\$ 276,006.15			\$ -	\$ -	\$ 276,006.15	100.0%	100.0%
42E-10	450014297 (3)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	06/05/2010	24/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE ABEL CARRIZAL	\$ 250,000.00	\$ 247,501.00	\$ 247,501.00	\$ 247,501.00	\$ 247,501.00			\$ -	\$ -	\$ 247,501.00	100.0%	100.0%
43E-10	450014297 (4)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	06/05/2010	24/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE GIMNAS	\$ 250,000.00	\$ 90,054.93	\$ 90,054.93	\$ 90,054.93	\$ 90,054.93			\$ -	\$ -	\$ 90,054.93	100.0%	100.0%
44E-10	450014297 (5)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	06/05/2010	24/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE HIKI - PAK	\$ 250,000.00	\$ 80,154.50	\$ 80,154.50	\$ 80,154.50	\$ 80,154.50			\$ -	\$ -	\$ 80,154.50	100.0%	100.0%
<b>SUBTOTAL OAXACA</b>						<b>\$ 1,250,000.00</b>	<b>\$ 3,299,828.81</b>	<b>\$ 1,086,328.81</b>	<b>\$ 1,086,328.81</b>	<b>\$ 3,299,828.81</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,299,828.81</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>Oaxaca</b>																	
<b>Cd. Cuernavaca - Oaxaca</b>																	
49E-10	450014347 (1)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	10/05/2010	20/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE LOMA COLORADA	\$ 250,000.00	\$ 176,774.11	\$ 176,774.11	\$ 176,774.11	\$ 176,774.11			\$ -	\$ -	\$ 176,774.11	100.0%	100.0%
49E-10	450014347 (2)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	10/05/2010	20/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO CALAPA	\$ 250,000.00	\$ 304,896.42	\$ 304,896.42	\$ 304,896.42	\$ 304,896.42			\$ -	\$ -	\$ 304,896.42	100.0%	100.0%
47E-10	450014347 (3)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	10/05/2010	20/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO CARRIZAL	\$ 250,000.00	\$ 223,877.47	\$ 223,877.47	\$ 223,877.47	\$ 223,877.47			\$ -	\$ -	\$ 223,877.47	100.0%	100.0%
48E-10	450014347 (4)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	10/05/2010	20/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE SANTA LUCA	\$ 250,000.00	\$ 293,340.60	\$ 293,340.60	\$ 293,340.60	\$ 293,340.60			\$ -	\$ -	\$ 293,340.60	100.0%	100.0%
49E-10	450014347 (5)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	10/05/2010	20/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE EL OTATE	\$ 250,000.00	\$ 294,476.05	\$ 294,476.05	\$ 294,476.05	\$ 294,476.05			\$ -	\$ -	\$ 294,476.05	100.0%	100.0%
50E-10	450014347 (6)	EURO ESTUDIOS SA DE CV	10/05/2010	20/07/2011	INSPECCION VISUAL EN ESTRUCTURAS DE TIPO ESPECIAL EN EL PUENTE RIO ZAHUATLAN	\$ 250,000.00	\$ 270,800.00	\$ 270,800.00	\$ 270,800.00	\$ 270,800.00			\$ -	\$ -	\$ 270,800.00	100.0%	100.0%
<b>SUBTOTAL OAXACA</b>						<b>\$ 1,250,000.00</b>	<b>\$ 1,369,370.55</b>	<b>\$ 1,086,328.81</b>	<b>\$ 1,086,328.81</b>	<b>\$ 1,369,370.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,369,370.55</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$ 12,500,000.00</b>	<b>\$ 9,473,127.76</b>	<b>\$ 9,473,127.76</b>	<b>\$ 9,473,127.76</b>	<b>\$ 9,473,127.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,473,127.76</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>



Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal						
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Asumiendo B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Contratado E	Diferencia D-C-D-E	Ejercido a Flajo de Efectivo	Reteniones - Devoluciones	Avance Financiero (%)	Avance físico (%)
Tijuana	\$ 29,512,335.38	\$ 29,512,335.38	\$ 29,512,335.38	\$ 29,512,335.38	\$ 20,368,017.33		\$ 144,316.05		\$ 29,388,017.33	\$ -	91.05%	100.0%
Culiacán												
Querétaro												
Cuernavaca	\$ 164,359,117.26	\$ 164,359,117.26	\$ 164,359,117.26	\$ 164,359,117.26	\$ 162,866,467.47		\$ 1,492,649.79		\$ 163,894,297.65	\$ -	151.49%	100.0%
Puebla	\$ 58,227,184.54	\$ 58,227,184.54	\$ 58,227,184.54	\$ 58,227,184.54	\$ 58,219,908.64		\$ 7,275.90		\$ 58,219,908.64	\$ -	101.43%	100.0%
Coahuila	\$ 288,228,104.74	\$ 288,228,104.74	\$ 288,228,104.74	\$ 288,228,104.74	\$ 241,851,994.03		\$ 26,376,110.71		\$ 241,032,834.83	\$ -	82.02%	100.0%
Veracruz	\$ 42,949,153.64	\$ 42,949,153.64	\$ 42,949,153.64	\$ 42,949,153.64	\$ 41,726,948.52		\$ 1,222,305.12		\$ 42,001,686.25	\$ -	81.18%	100.0%
Yucatán	\$ 41,436,692.64	\$ 41,436,692.64	\$ 41,436,692.64	\$ 41,436,692.64	\$ 34,460,204.30		\$ 6,976,488.34		\$ 34,460,204.30	\$ -	2.85%	100.0%
Guadalajara												
Monterrey	\$ 32,429,995.52	\$ 32,429,995.52	\$ 32,429,995.52	\$ 32,429,995.52	\$ 31,226,490.84		\$ 1,203,504.68		\$ 31,226,490.84	\$ -	22.43%	100.0%
Chiapas	\$ 158,318,510.89	\$ 158,318,510.89	\$ 158,318,510.89	\$ 158,318,510.89	\$ 157,319,083.80		\$ 999,426.99		\$ 157,319,083.80	\$ -	2.84%	100.0%
Oaxaca												
<b>TOTAL</b>	\$ 795,461,094.61	\$ 795,461,094.61	\$ 795,461,094.61	\$ 795,461,094.61	\$ 757,039,014.93		\$ 38,422,079.68		\$ 758,422,523.64	\$ -	6.03%	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

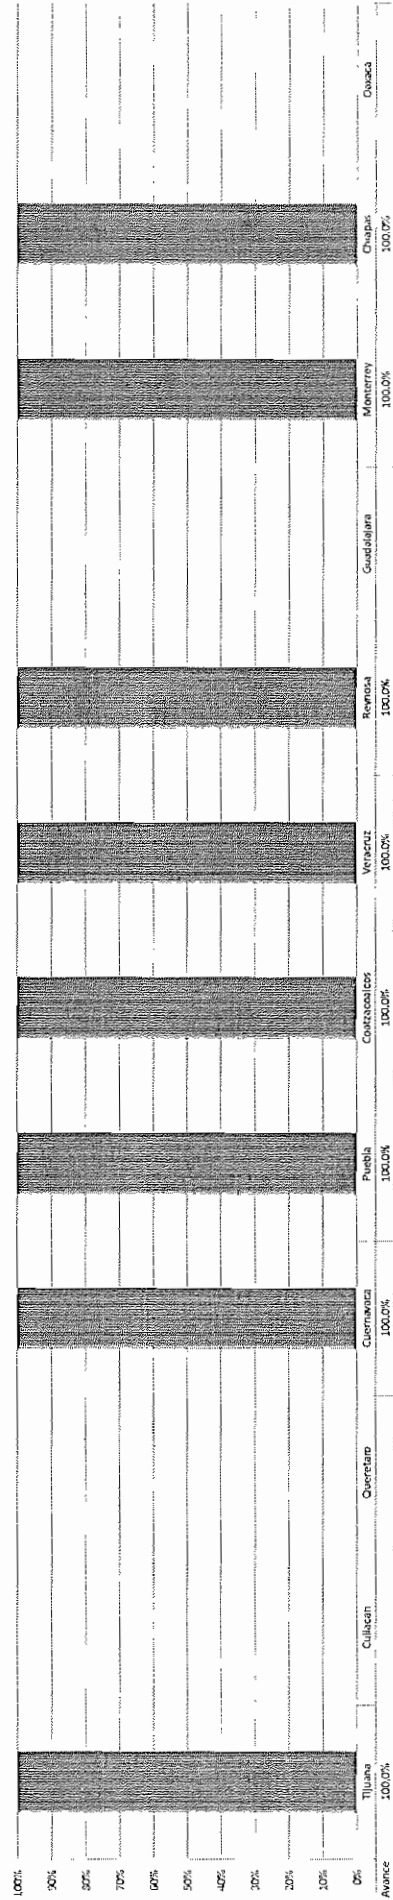

000 0273 208



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVIDOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Cuentas No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio-Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estado Actualizado C	Monto En Trámite D	Reservaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio o Fijación de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance Básico (%)	Alícuota de Cuentas Pagadas
<b>TIHUANA - Cuzco</b>																	
ET-016-2010	400014000 500004118 500004119	COCCOMAL S.A. DE C.V.	09/05/2010 15/12/2010	TRAMADO POR EMERGENCIA TECNICA EN LA REPARACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM. 39+000 AL KM. 41+000 PARA LA REALIZACION DEL TALLADO DEL CORTIJE. UBICADO ENTRE LOS KM. 39+000 AL 39+440 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	25,612,233.26	25,612,233.26	25,612,233.26	25,612,233.26	25,606,017.20	-	91,356.06	144,316.56	-	20,398,817.33	100.00%	100.00%	-
<b>SUBTOTAL TIHUANA</b>																	
					25,612,233.26	25,612,233.26	25,612,233.26	25,612,233.26	25,246,817.20	-	91,356.06	144,316.56	-	20,398,817.33	100.00%	100.00%	-
<b>CUERNAVACA</b>																	
ET-002-2010	400014000 500004118 500004119	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	04/02/2010 14/02/2010	TRAMADO PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA EN EL TALLADO DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 146+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	6,407,020.87	6,407,020.87	6,407,020.87	6,407,020.87	6,407,020.40	-	1,002	20.47	-	6,407,020.40	100.00%	100.00%	-
ET-004-2010	400014000	PROYECTO CIVIL INTEGRAL S.A. DE C.V.	10/09/2009 15/01/2010	ACTUALIZACION DEL LISTADO Y PROYECTO PARA LA REALIZACION DEL TALLADO DEL CORTIJE UBICADO ENTRE LOS KM. 203+000 AL 204+440 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	176,150.00	-	-	-	-	176,150.00	100.00%	100.00%	-
ET-005-2010	400014000	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	09/07/2010 29/02/2011	TRAMADO PARA LA ATENCION POR EMERGENCIA TECNICA EN EL TALLADO DEL CORTIJE UBICADO EN EL KM. 210+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	12,743,088.00	12,743,088.00	12,743,088.00	12,743,088.00	12,740,037.64	-	-	3,050.36	-	12,740,037.64	100.00%	100.00%	-
ET-014-2010	400014000 500004118 500004119	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPL S.A. DE C.V.	04/02/2010 09/12/2010	TRAMADO PARA LA ATENCION POR EMERGENCIA TECNICA EN EL TALLADO DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 249+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	3,662,320.00	3,662,320.00	3,662,320.00	3,662,320.00	3,662,320.00	-	-	401.10	-	3,662,320.00	100.00%	100.00%	-
ET-016-2010	400014000	INDUMINICHERA S.A. DE C.V.	10/08/2010 04/11/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DEL CORTIJE DEL KM. 249+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	540,000.00	-	-	-	-	540,000.00	100.00%	100.00%	-
ET-031-2010	400014000	TGC OCEOTECNA S.A. DE C.V.	01/06/2010 15/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE CUERPO BACION DE LOS CORTIJE COMPLETADOS ENTRE LOS KM. 312+000 AL KM. 316+000 AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	2,184,000.43	2,184,000.43	2,184,000.43	2,184,000.43	2,184,000.43	-	-	-	-	2,184,000.43	100.00%	100.00%	-
ET-006-2010	400014000	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	01/06/2010 31/02/2011	ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DE LOS CORTIJE UBICADOS EN LOS KM. 312+000 AL KM. 316+000 AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	30,201,201.00	30,201,201.00	30,201,201.00	30,201,201.00	30,201,201.00	-	-	-	-	30,201,201.00	100.00%	100.00%	-
ET-037-2010	400014000	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPL S.A. DE C.V.	01/06/2010 30/06/2011	TRAMADO PARA LA ATENCION POR EMERGENCIA TECNICA EN EL TALLADO DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 349+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	12,716,070.82	12,716,070.82	12,716,070.82	12,716,070.82	12,709,000.49	-	-	5,064.33	-	12,709,000.49	100.00%	100.00%	-
ET-008-2010	400014000	TGC OCEOTECNA S.A. DE C.V.	01/06/2010 15/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE LA ESTABILIZACION DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 303+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	626,027.69	626,027.69	626,027.69	626,027.69	626,027.69	-	-	-	-	626,027.69	100.00%	100.00%	-
ET-036-2010	400014000	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS ASISTENCIALES S.A. DE C.V.	09/05/2010 08/02/2011	ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL TALLADO DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 303+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	14,070,321.37	14,070,321.37	14,070,321.37	14,070,321.37	14,070,321.37	-	-	-	-	14,070,321.37	100.00%	100.00%	-
ET-046-2010	400014000	TGC OCEOTECNA S.A. DE C.V.	08/02/2010 14/12/2010	ACTUALIZACION DEL LISTADO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 303+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	446,000.33	446,000.33	446,000.33	446,000.33	446,000.33	-	-	-	-	446,000.33	100.00%	100.00%	-
ET-041-2010	400014000	COCCOMAL S.A. DE C.V.	09/05/2010 15/12/2010	ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DEL TALLADO DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 349+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	23,082,350.81	23,082,350.81	23,082,350.81	23,082,350.81	23,080,009.29	-	-	2,341.52	-	23,079,969.43	100.00%	100.00%	-
ET-045-2010	400014000	TGC OCEOTECNA S.A. DE C.V.	09/05/2010 15/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACION DEL CORTIJE QUE SE UBICA EN EL KM. 349+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	626,027.69	626,027.69	626,027.69	626,027.69	626,027.69	-	-	-	-	626,027.69	100.00%	100.00%	-
ET-048-2010	400014000	TGC INGENIERIA S.A. DE C.V.	10/02/2010 14/12/2010	ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DE LOS CORTIJE QUE SE UBICAN EN EL KM. 349+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO.	6,411,200.42	6,411,200.42	6,411,200.42	6,411,200.42	6,407,270.60	-	-	3,929.82	-	6,403,270.60	100.00%	100.00%	-

0244

No. Partida	Concepto No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Reservaciones - Dedicaciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Cantidad y Flujo de Efectivo	Avance físico (%)	Alícuota de Costos Pagados	
<b>Puentes de Infra-Estructura</b>																		
CT-665-2010	450011430	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2009/2010	15/04/2011	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL TALUD DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM 44+000 DEL CARRILLO QUE CONDUCE AL CANTÓN DEL PUENTE DE BELLA - IGUALA		13,108,107.40	13,108,107.40	13,108,107.40	13,106,603.00		102,504.40	2,504.40		13,109,107.40	100.00%		
CT-665-2010	450011431	INDUM INGENIERIA S.A. DE C.V.	2009/2010	20/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM 49+000 DEL CAMINO DIRECTO AL PUENTE DE BELLA - IGUALA		644,570.00	644,570.00	644,570.00	644,570.00					644,570.00	100.00%		
<b>Rancho Viejo - Tanco</b>																		
CT-672-2010	450011491	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	19/02/2010	15/01/2011	TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM 6+000 DEL DERECHO DEL C. D. RANCHO VIEJO - TANCO		9,977,755.00	9,977,755.00	9,977,755.00	9,470,883.50		506,871.50	506,871.50		9,470,883.50	100.00%		
CT-676-2010	450011500	VEL CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V.	16/02/2010	15/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM 6+000 DEL DERECHO DEL C. D. RANCHO VIEJO - TANCO		560,000.00	560,000.00	560,000.00	549,950.00		50.00	50.00		549,950.00	100.00%		
CT-676-2010	450011492	CONSTRADORA LAGOS S.A. DE C.V.	10/02/2010	11/02/2011	TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM 6+000 DEL DERECHO DEL C. D. RANCHO VIEJO - TANCO		10,246,500.00	10,246,500.00	10,246,500.00	15,303,000.00			3,473.00		10,250,000.00	100.00%		
CT-682-2010	450015001	VEL CORPORATION MEXICO S.A. DE C.V.	16/02/2010	15/12/2010	ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM 9+000 DEL DERECHO DEL C. D. RANCHO VIEJO - TANCO		659,000.00	659,000.00	659,000.00	646,235.26		12,764.74	12,764.74		646,235.26	100.00%		
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA</b>																		
						\$ -	\$ 164,259,172.20	\$ 164,259,172.20	\$ 164,259,172.20	\$ 162,866,867.47	\$ -	\$ 1,392,304.73	\$ 1,392,304.73	\$ -	\$ 165,651,476.93	100.00%	\$ 1,392,304.73	
<b>PUEBLA</b>																		
<b>Mexico - Puebla</b>																		
ET-602-2010	450011494	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	16/02/2010	29/04/2010	RECONSTRUCCIÓN POR EMERGENCIA TÉCNICA DEL TRAMO CARRETERO MEDIANTE LOS TRABAJOS DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA EN EL KM 14+000 DEL DERECHO DEL C. D. RANCHO VIEJO - TANCO		6,025,413.90	6,025,413.90	6,025,413.90	6,025,413.90					6,025,413.90	100.00%		
<b>Acapulco - Cd. Mmidozta</b>																		
ET-671-2010	450011497	VA MILDORON INGENIERIA Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V.	25/02/2010	30/09/2010	HABILITACION TEMPORAL DE LA AUTOPISTA ACAPULCO - CD. MEMOZA DEL KM. 21+000 MEDIANTE TRABAJOS DE RECONSTRUCCION Y REINCLASACIONES LOCALES		4,330,234.00	4,330,234.00	4,330,234.00	4,330,234.00			81.57		4,330,234.00	100.00%		
ET-682-2010	450011492	URBANIZACIONES DEL SUR S.A. DE C.V.	20/02/2010	15/11/2010	HABILITACION TEMPORAL DE LA AUTOPISTA ACAPULCO - CD. MEMOZA DEL KM. 21+000 AL KM. 25+000 MEDIANTE TRABAJOS DE BACHEO REGLADO Y REINCLASACIONES LOCALES		6,046,620.26	6,046,620.26	6,046,620.26	6,046,620.26			29.93		6,046,620.26	100.00%		
ET-682-2010	450011496	TECNOLOGUEO S.A. DE C.V.	20/02/2010	20/01/2011	ESTABILIZACION DE LOS TALUDES DEL KM. 22+170, 229+999, 229+999, 229+999 Y 25+000 QUE SE UBICAN EN EL DERECHO DE LA AUTOPISTA ACAPULCO - CD. MEMOZA		16,929,201.71	16,929,201.71	16,929,201.71	16,922,135.21		7,066.50	7,066.50		16,922,135.21	100.00%		
ET-682-2010	450011497	CONSTRUCCION Y DESARROLLO DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	01/02/2010	30/12/2010	ESTABILIZACION DE LOS TALUDES DEL KM. 23+120 Y 23+220 QUE SE UBICAN EN EL DERECHO DE LA AUTOPISTA ACAPULCO - CD. MEMOZA		21,032,207.20	21,032,207.20	21,032,207.20	21,032,206.37		81.83	81.83		21,032,206.37	100.00%		
						\$ -	\$ 34,227,145.84	\$ 34,227,145.84	\$ 34,227,145.84	\$ 34,218,869.84	\$ -	\$ 8,356.00	\$ 8,356.00	\$ -	\$ 34,227,145.84	100.00%	\$ 8,356.00	
<b>CD. Ixtla - Atzacatlan</b>																		
ET-645-2010	450011432	CONSTRUCCIONES SANTA GLARA S.A. DE C.V.	01/12/2010	15/01/2011	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL TRAMO CARRETERO ENTRE EL KM. 14+200 QUE SE UBICA EN EL DERECHO DE LA AUTOPISTA CD. IXTLA - ATZACATLAN		2,167,709.11	2,167,709.11	2,167,709.11	1,776,112.82		391,596.29	391,596.29		1,776,112.82	100.00%		
ET-644-2010	450011433	CONSTRUCCIONES MORANEC S.A. DE C.V.	12/02/2010	15/02/2010	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DE LA OBRAS DE DRENAJE EN EL KM. 12+100 QUE SE UBICAN EN EL DERECHO DE LA AUTOPISTA CD. IXTLA - ATZACATLAN		4,540,704.02	4,540,704.02	4,540,704.02	3,237,600.29		1,303,103.73	1,303,103.73		3,237,600.29	100.00%		
ET-650-2010	450011438	CONSTRUCCIONES SANTA GLARA S.A. DE C.V.	06/02/2010	15/01/2011	TRABAJO PARA LA ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KM. 102+000 DEL DERECHO DE LA AUTOPISTA CD. IXTLA - ATZACATLAN		26,951,019.70	26,951,019.70	26,951,019.70	24,998,110.37		1,952,909.33	1,952,909.33		24,998,110.37	100.00%		
ET-652-2010	450011434	CONSTRUCCIONES SANTA GLARA S.A. DE C.V.	01/12/2010	15/01/2011	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DE LA OBRAS DE DRENAJE EN EL KM. 140+000 QUE SE UBICAN EN EL DERECHO DE LA AUTOPISTA CD. IXTLA - ATZACATLAN		56,106,719.26	56,106,719.26	56,106,719.26	52,544,208.26		3,562,510.99	3,562,510.99		52,544,208.26	100.00%		

CAMINOS Y FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONCEJOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE EMERGENCIAS TECNICAS 2016 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Cuenta No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Acreditado Modificado	Monto Compromiso A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Comprobado C	Diferencia B-C-D-E	Elemento o Base de Trámite	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
			Inicio	Fin													
CT-005-2016	400015203 300004424	CONSTRUCCIONES SANTA CLARA, S.A. DE C.V.	01/10/2016	15/01/2017	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DE LA OBRA DE DRENAJE TIPO EN EL KM 31+000-3200 AMBROS GUERRERO DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	\$ 66,600,000.00	100.00%	100.00%
CT-004-2016	400015207 300004449	CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	01/10/2016	31/10/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DE LA OBRA DE DRENAJE TIPO EN EL KM 31+000-3200 AMBROS GUERRERO DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	\$ 28,847,838.96	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015208 300004452	TECNICAS EN RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	01/10/2016	31/10/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DE LA OBRA DE DRENAJE TIPO EN EL KM 31+000-3200 AMBROS GUERRERO DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	\$ 43,890,233.76	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015207 300004449	RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	09/06/2016	31/10/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN. POR EL DERRUMBE DEL PUENTE EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	\$ 1,974,267.62	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015208 300004452	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	09/06/2016	06/02/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN. POR EL DERRUMBE DEL PUENTE EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	\$ 20,710,000.00	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015207 300004449	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	01/03/2011	31/03/2011	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE TEMPORAL EN LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN. EN EL KM 36+000 POR EL DERRUMBE DEL PUENTE EN EL KM 36+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	\$ 1,732,000.00	100.00%	100.00%
CT-004-2016	400015208 300004452	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	09/06/2016	09/06/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN. POR EL DERRUMBE DEL PUENTE EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	\$ 2,462,211.02	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015207 300004449	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20/07/2011	20/07/2011	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE TEMPORAL EN LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN. EN EL KM 36+000 POR EL DERRUMBE DEL PUENTE EN EL KM 36+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	\$ 425,476.16	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015207 300004449	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	09/06/2016	09/06/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN. POR EL DERRUMBE DEL PUENTE EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	\$ 1,630,440.04	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL COATZACOALCOS</b>																	

VERACRUZ

CT-005-2016	400015208 300004452	GRUPO EMPRESARIAL DE LA OBRA DE C.V.	20/10/2010	10/01/2011	TRABAJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA TECNICA POR EL DERRUMBE DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	\$ 12,023,177.26	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015207 300004449	GRUPO EMPRESARIAL DE LA OBRA DE C.V.	20/10/2010	20/02/2011	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	\$ 650,070.02	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015208 300004452	RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	01/10/2011	01/10/2011	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	\$ 2,249,020.48	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015208 300004452	RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	09/06/2016	09/06/2016	RECONSTRUCCION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	\$ 5,265,976.21	100.00%	100.00%
CT-005-2016	400015207 300004449	RECONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	20/04/2011	20/04/2011	ESTUDIO Y PROYECTO TEMPORAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR INTERIOR (PM) "SAN DOMINGO" UNIDAD EN EL KM 37+000 DE LA AUTOPISTA CD. DEL ACAYACAN.	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	\$ 748,664.00	100.00%	100.00%
<b>SUBTOTAL COATZACOALCOS</b>																	

000 0246

211

PROGRAMA DE EMERGENCIAS TECNICAS 2010 DE LA RED DEL FOND NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Revoluciones / Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio e Fijado de Ejercicio	Avance financiero (%)	Avance Inicial (%)	Alícuota de Costos Pagados	
			Inicio	Fin															
La Tinaja - Col. Iba																			
ET-096-2010	459011444	MGS CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECANICAS S.A DE C.V	05/01/2011	10/06/2011	TRABAJOS PARA ATENDER LA EMERGENCIA CAUSADA POR EL HURACAN "MATHINK" DEL KM 103+000 AL KM 114+000 DE LA AUTOPISTA LA TINAJA - CD IBA.	\$ 14,901,460.04	\$ 14,901,460.04	\$ 14,901,460.04	\$ 14,901,460.04	\$ 14,901,460.04	\$ -	\$ -	\$ 0.22	\$ -	\$ 10,252,275.61	100.00%	100.00%	\$ 790,275.99	
ET-096-2010	459011937	FUERTE INGENIEROS CONSULTORES S.A DE C.V	09/05/2011	09/11/2011	ESTUDIO TOPOGRAFICO DE LA CUENCA DE INGENIEROS DE REFORMA DEL TRAMO DE LA AUTOPISTA LA TINAJA - IBA.	\$ 2,984,746.25	\$ 2,984,746.25	\$ 2,984,746.25	\$ 2,984,746.25	\$ 2,984,746.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,984,746.25	100.00%	100.00%	\$ -	
<b>SUBTOTAL VEDARUZ</b>						\$ 42,848,153.54	\$ 42,848,153.54	\$ 42,848,153.54	\$ 42,848,153.54	\$ 42,848,153.54	\$ -	\$ -	\$ 1,272,268.12	\$ -	\$ 42,848,153.54	100.00%	100.00%	\$ 274,637.23	
REYNOSA																			
Matamoros - Reynosa																			
ET-096-2010	459011424	CONSTRUCTORA Y CAPELLANAS S.A DE C.V	20/10/2010	20/01/2011	RECONSTRUCCION DEL TERRAPLEN Y PAVIMENTO TRAMO DEL KM 57+000 AL KM 59+000 CUERPO "D" DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - REYNOSA.	\$ 17,230,644.30	\$ 17,230,644.30	\$ 17,230,644.30	\$ 17,230,644.30	\$ 17,230,644.30	\$ -	\$ -	\$ 1,150,782.00	\$ -	\$ 10,070,342.30	100.00%	100.00%	\$ -	
ET-096-2010	459011425	MATERIALES Y CONSTRUCCIONES DEL NORTE S.A DE C.V	20/10/2010	20/01/2011	RECONSTRUCCION DEL TERRAPLEN Y PAVIMENTO TRAMO DEL KM 57+000 AL KM 59+000 CUERPO "D" DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - REYNOSA.	\$ 23,700,106.54	\$ 23,700,106.54	\$ 23,700,106.54	\$ 23,700,106.54	\$ 23,700,106.54	\$ -	\$ -	\$ 0.510,760.54	\$ -	\$ 17,652,202.00	100.00%	100.00%	\$ -	
ET-096-2010	459011429	CONGRESO TORRE Y CONSTRUCTORES ESCANTEL S.A DE C.V	22/09/2010	09/01/2011	PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL TERRAPLEN Y PAVIMENTO TRAMO DEL KM 57+000 AL KM 61+000 CUERPO DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - REYNOSA.	\$ 428,460.00	\$ 428,460.00	\$ 428,460.00	\$ 428,460.00	\$ 428,460.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 428,460.00	100.00%	100.00%	\$ -	
<b>SUBTOTAL REYNOSA</b>						\$ 41,359,209.24	\$ 41,359,209.24	\$ 41,359,209.24	\$ 41,359,209.24	\$ 41,359,209.24	\$ -	\$ -	\$ 2,684,539.78	\$ -	\$ 34,460,204.30	100.00%	100.00%	\$ -	
MONTERREY																			
Monterrey - Nuevo Laredo																			
ET-010-2010	459011493	SELVINO JUAREZ CRUZ	08/07/2010	10/06/2010	REPARACION POR EMERGENCIA TECNICA CAUSADA POR EL HURACAN "ALEX" A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 142+000 AL KM 145+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO.	\$ 4,862,815.87	\$ 4,862,815.87	\$ 4,862,815.87	\$ 4,862,815.87	\$ 4,862,815.87	\$ -	\$ -	\$ 20,320.15	\$ -	\$ 4,842,495.72	100.00%	100.00%	\$ -	
ET-099-2010	459011473	COMPAÑIA COMERCIAL DELTA S.A DE C.V	10/06/2010	02/07/2010	PROYECTO Y ESTUDIO PARA REPARAR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN ALEXEN TRES CARRILES DE BORDO EN EL TRAMO DEL KM 144+250 EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL 142+000 AL KM 145+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO.	\$ 866,442.00	\$ 866,442.00	\$ 866,442.00	\$ 866,442.00	\$ 866,442.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 866,442.00	100.00%	100.00%	\$ -	
ET-094-2010	459011451	SELVINO JUAREZ CRUZ	07/06/2010	31/05/2010	REPARACION POR EMERGENCIA TECNICA CAUSADA POR EL HURACAN "ALEX" EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL TRAMO DEL KM 144+000 AL KM 145+000 DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO.	\$ 81,091,012.71	\$ 81,091,012.71	\$ 81,091,012.71	\$ 81,091,012.71	\$ 81,091,012.71	\$ -	\$ -	\$ 1,175,169.26	\$ -	\$ 81,015,843.45	100.00%	100.00%	\$ -	
<b>SUBTOTAL MONTERREY</b>						\$ 41,040,269.58	\$ 41,040,269.58	\$ 41,040,269.58	\$ 41,040,269.58	\$ 41,040,269.58	\$ -	\$ -	\$ 2,684,539.78	\$ -	\$ 34,460,204.30	100.00%	100.00%	\$ -	
Tehuacan - Sanillo																			
ET-096-2010	459011491	OPICORTEL S.A DE C.V	04/01/2010	31/07/2010	TRABAJOS PARA LA ATENCION POR EMERGENCIA TECNICA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN "ALEX" EN EL TRAMO PLAN DE AYALA - EL PORVENIR.	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ -	\$ -	\$ 0.27	\$ -	\$ 2,360,742.29	100.00%	100.00%	\$ -	
<b>SUBTOTAL TEHUACAN</b>						\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ 2,360,742.56	\$ -	\$ -	\$ 0.27	\$ -	\$ 2,360,742.29	100.00%	100.00%	\$ -	
Puerto Morelos - Carboneras																			
ET-011-2010	459011494	IMPRESA 2000 S.C. DE CV	10/07/2010	17/07/2010	REPARACION POR EMERGENCIA TECNICA DE LOS DAÑOS OCASIONADOS POR EL HURACAN "ALEX" EN EL TRAMO DEL KM 229+000 AL KM 234+000 DE LA AUTOPISTA PUERTO MORELOS - CARBONERAS.	\$ 462,000.72	\$ 462,000.72	\$ 462,000.72	\$ 462,000.72	\$ 462,000.72	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ 462,000.72	100.00%	100.00%	\$ -	

*[Handwritten signature]*



No Periodo	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Ejercicio Acumulado C	Monto en Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia D-C-E	Ejercicio Fijo de Efectivo	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	Avance de Control Pago	
																		Fin
CT-09-2010	49001498	TORCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	15/07/2010	REPARACION POR EMERGENCIA TECNICA DEL PUENTE DE BACHO SUPERFICIAL, TRABAJO DE BACHO SUPERFICIAL, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE GUARDIAN DE CONCRETO Y LOSAS DE LOS PUENTES CHORROS Y CHORROS DE BACHO SUPERFICIAL, REPARACION DE BACHO SUPERFICIAL, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CARMONA, CAMDONERA.	\$ 2,712,815.00	\$ 2,712,815.00	\$ 2,712,815.00	\$ 2,712,815.00	\$ 2,712,815.00	\$ -	\$ 7,375.84	\$ -	\$ -	\$ 2,712,815.00	100.00%	100.00%		
UT-09-2010	49001490	CANDELANO GARCIA SODA	15/07/2010	REPARACION POR EMERGENCIA TECNICA DE LOS DANOS CAUSADOS POR EL HURACAN ALEX CONSISTENTES EN: METALICA, BARRERA CENTRAL DE CONCRETO, MALLA TREFE TORXON Y BARRERA DE CONCRETO, REPARACION DE LOSAS DE 20x400 AL KM 20+400 DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CARMONA.	\$ 3,121,130.30	\$ 3,121,130.30	\$ 3,121,130.30	\$ 3,121,130.30	\$ 3,121,130.30	\$ -	\$ 3,690.42	\$ -	\$ -	\$ 3,121,130.30	100.00%	100.00%		
<b>SUBTOTAL MONTERREY</b>																		
					\$ -	\$ 32,439,940.32	\$ 32,429,894.52	\$ 32,439,940.32	\$ 31,226,469.84	\$ -	\$ -	\$ 22,431.09	\$ 1,233,068.00	\$ -	\$ 31,226,469.84	100.00%	100.00%	\$ -

CHAPAS

Las Chapas - Rendiline - Ocotrococeatis


CT-09-2010	49001493 59000446	CONSTRUCCIONES Y DEL SUR S.A. DE C.V. (CONTRATO RECONSTRUCCION)	20/11/2010	TRABAJOS POR EMERGENCIA TECNICA DEL EXISTENTE CUERPO UNICO DEL KM 14+000 AL KM 14+191 DEL C.D. LAS CHOYAPAS - CHAPAS - RAUDALES - OCOYOQUINTA. EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO ES DE \$47,880,823.25; DEBIDO A LA REVISION DEL CONTRATO, LA DIFERENCIA ENTRE DICHO MONTO Y EL EJERCIDO POR EL NUEVO CONTRATO PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS	\$ 4,270,305.77	\$ 4,270,305.77	\$ 4,270,305.77	\$ 4,270,305.77	\$ 4,270,305.77	\$ -	\$ 2,296,003.24	\$ -	\$ -	\$ 4,270,305.77	100.00%	100.00%		
UT-09-2010	49001494 59000446	CONSTRUCCIONES SANTA CLARA S.A. DE C.V.	01/11/2011	CONCLUSION DE LOS TRABAJOS POR EMERGENCIA TECNICA DE REHABILITACION DEL PAVIMENTO EXISTENTE CUERPO UNICO DEL C.D. LAS CHOYAPAS - CHAPAS - RAUDALES - OCOYOQUINTA.	\$ 63,584,233.00	\$ 63,584,233.00	\$ 63,584,233.00	\$ 63,584,233.00	\$ 63,584,233.00	\$ -	\$ 3,970.15	\$ 458.77	\$ -	\$ 63,584,233.00	99.99%	99.99%		
CT-09-2010	49001495 59000447	ENLINO Y ORGANIZACION S.A. DE C.V.	27/02/2010	RECONSTRUCCION DEL TERAPIUM UNICO EN LOS KM 10+100 AL KM 10+500 DEL C.D. LAS CHOYAPAS - CHAPAS - RAUDALES - OCOYOQUINTA.	\$ 54,414,729.84	\$ 54,414,729.84	\$ 54,414,729.84	\$ 53,094,072.34	\$ 53,094,072.34	\$ -	\$ 155,680.27	\$ 419,652.50	\$ -	\$ 53,094,072.34	100.00%	100.00%		
CT-09-2010	49001496	OMNIA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	12/06/2010	TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL CORTE UNICO EN EL KM 14+000 DEL C.D. LAS CHOYAPAS - CHAPAS - RAUDALES - OCOYOQUINTA.	\$ 8,800,857.00	\$ 8,800,857.00	\$ 8,800,857.00	\$ 8,800,857.00	\$ 8,800,857.00	\$ -	\$ 251,571.05	\$ -	\$ -	\$ 8,800,857.00	100.00%	100.00%		
CT-09-2010	49001498	TGC OLEOTOMA S.A. DE C.V.	27/02/2010	REPARACION DE EMERGENCIA POR LA BARRERA DEL CORTE UNICO EN EL KM 10+500 AL KM 14+000 DEL C.D. LAS CHOYAPAS - CHAPAS - RAUDALES - OCOYOQUINTA. A TRAVES DE UN EMERGENCIA TECNICA PAVIMENTA.	\$ 942,800.00	\$ 942,800.00	\$ 942,800.00	\$ 942,800.00	\$ 942,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 942,800.00	100.00%	100.00%		
CT-09-2010	49001499	COCOMAL S.A. DE C.V.	11/06/2010	TRABAJOS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA TECNICA DE REHABILITACION DE LA RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN LOS KM 20+000 AL KM 20+600, KM 61+000 AL KM 66+000 Y DEL KM 91+000 AL KM 91+600 DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CARMONA, CAMDONERA.	\$ 20,519,414.00	\$ 20,519,414.00	\$ 20,519,414.00	\$ 20,519,414.00	\$ 20,519,414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870,117.52	\$ -	\$ 20,519,414.00	100.00%	100.00%	
CT-09-2010		PARTIDA CANCELADA		ESTUDIOS DE EMERGENCIA Y PROYECTO DE RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE BACHO SUPERFICIAL PARA LA RANCHA TECNICA EN EL CAMINO BACHO LAS CHOYAPAS - CHAPAS - RAUDALES - OCOYOQUINTA. EL MONTO ORIGINAL CONTRATADO ES DE \$47,880,823.25; DEBIDO A LA REVISION DEL CONTRATO, LA DIFERENCIA ENTRE DICHO MONTO Y EL EJERCIDO POR EL NUEVO CONTRATO PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>SUBTOTAL CHAPAS</b>					\$ 158,318,510.86	\$ 158,318,510.86	\$ 158,318,510.86	\$ 157,219,025.28	\$ 157,219,025.28	\$ -	\$ 2,444,753.51	\$ 999,478.80	\$ -	\$ 157,219,025.28	100.00%	100.00%	\$ 1,077,830.00	
<b>TOTAL</b>					\$ 795,461,894.61	\$ 795,461,894.61	\$ 795,461,894.61	\$ 787,039,514.83	\$ 787,039,514.83	\$ -	\$ 4,833,633.77	\$ 38,422,678.48	\$ -	\$ 795,461,894.61	100.00%	100.00%	\$ 1,077,830.00	

P

Fecha de corte: 30 de Septiembre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Rotaciones - Devoluciones		Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 1,399,801.73	\$ 1,399,801.73	\$ 1,399,801.73	\$ 1,399,801.73	\$ 1,399,801.73				\$ 1,399,801.73			100.0%
Culiacán												
Querétaro												
Cuernavaca	\$ 11,326,256.53	\$ 11,326,256.53	\$ 11,326,256.53	\$ 11,326,256.53	\$ 11,182,487.23	\$ 143,769.30			\$ 11,182,487.23	\$ 2,375.35		100.0%
Puebla	\$ 3,224,687.62	\$ 3,224,687.62	\$ 3,224,687.62	\$ 3,224,687.62	\$ 3,224,687.62				\$ 3,224,687.62			100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 6,267,830.54	\$ 6,267,830.54	\$ 6,267,830.54	\$ 6,267,830.54	\$ 6,267,830.52		0.02		\$ 6,267,830.52	\$ 9,986.00		100.0%
Veracruz	\$ 1,994,576.09	\$ 1,994,576.09	\$ 1,994,576.09	\$ 1,994,576.09	\$ 1,994,576.08		0.01		\$ 1,994,576.08	\$ 3,694.30		100.0%
Morelos	\$ 2,278,789.80	\$ 2,278,789.80	\$ 2,278,789.80	\$ 2,278,789.80	\$ 2,278,789.80				\$ 2,278,789.80	\$ 8,346.18		100.0%
Guadaluajara												
Monterrey	\$ 1,273,322.74	\$ 1,273,322.74	\$ 1,273,322.74	\$ 1,273,322.74	\$ 1,273,322.74				\$ 1,273,322.74	\$ 126.09		100.0%
Chiapas	\$ 6,374,995.13	\$ 6,374,995.13	\$ 6,374,995.13	\$ 6,374,995.13	\$ 6,374,995.13	\$ 80,884.13			\$ 6,374,995.13	\$ 99,218.88		98.8%
Oaxaca												
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 34,474,405.96</b>	<b>\$ 34,474,405.96</b>	<b>\$ 34,474,405.96</b>	<b>\$ 33,996,490.85</b>	<b>\$ 33,996,490.85</b>	<b>\$ 80,884.13</b>	<b>\$ 397,030.98</b>		<b>\$ 33,996,490.85</b>	<b>-\$ 123,726.65</b>		<b>99.8%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

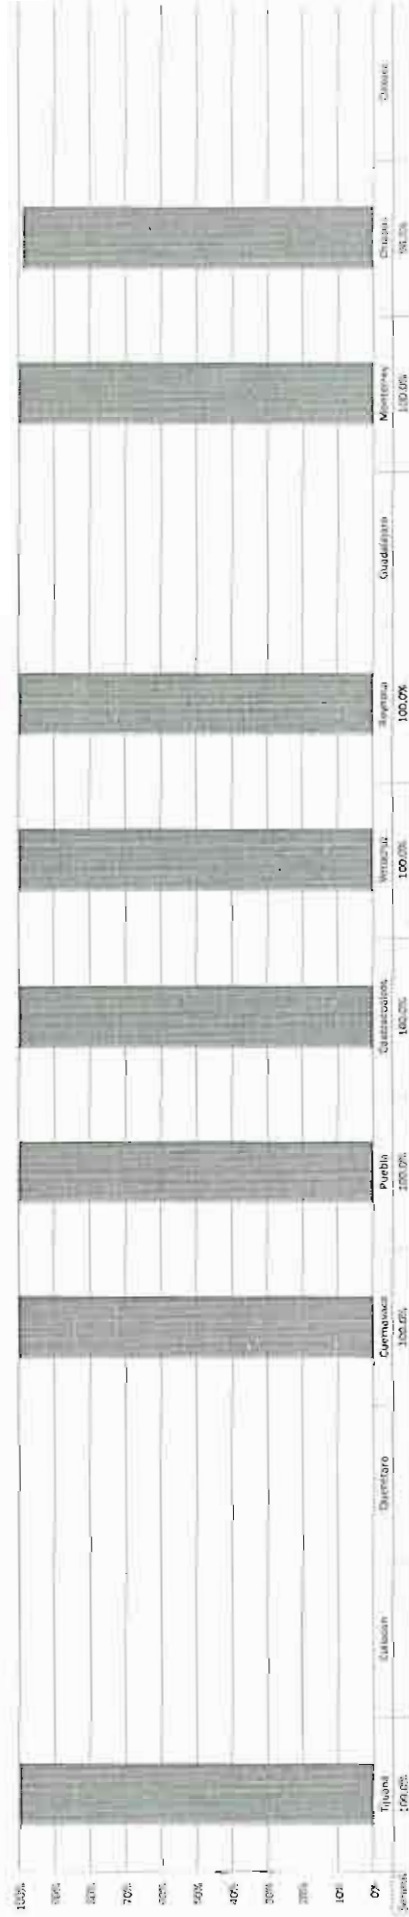








PROGRAMA DE SUPERVISION DE LAS EMERGENCIAS TÉCNICAS 2010 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Concepto No.	Empresa	Actividad del Contrato	Concepto	Monto Aprobado	Monto Comprometido	Monto Ejecutado	Cuentas acumuladas	Monto Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Saldo Cancelado	Saldo Ejecutado	Diferencia	Directorio de Ingresos y Servicios Conexos	Fecha
<b>RE FV0021</b>															
<b>Matamoros - Reynosa</b>															
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	29/11/2010	0195/2011	1,366,199.21	1,706,200.27	1,000,240.07	1,300,200.00	0.00	0.21%	0.00	1,300,200.00	1,000,240.07	100.0%	29/11/2010
<b>MSNV/0002</b>															
<b>Mercurari - Nuevo Laredo</b>															
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	09/01/2010	0095/2010	203,258.02	203,258.02	203,258.02	203,258.02	100.00	100.00	0.00	203,258.02	203,258.02	100.0%	09/01/2010
<b>Toluca - Nalco</b>															
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	03/01/2010	0085/2010	535,760.00	535,760.00	535,760.00	535,760.00	100.00	100.00	0.00	535,760.00	535,760.00	100.0%	03/01/2010
<b>Toluca - Nalco</b>															
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	03/01/2010	0085/2010	118,231.66	118,231.66	118,231.66	118,231.66	100.00	100.00	0.00	118,231.66	118,231.66	100.0%	03/01/2010
<b>Pueblo Mexico - Guadalupe</b>															
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	03/01/2010	0085/2010	306,017.00	306,017.00	306,017.00	306,017.00	100.00	100.00	0.00	306,017.00	306,017.00	100.0%	03/01/2010
<b>Chihuahua</b>															
<b>Las Chovallas - Ruidoso - Cuernavaca</b>															
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	20/11/2010	1160/2011	2,003,749.24	2,003,749.24	2,003,749.24	2,003,749.24	100.00	100.00	0.00	2,003,749.24	2,003,749.24	100.0%	20/11/2010
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	27/11/2010	2760/2011	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	1,220,000.00	100.00	100.00	0.00	1,220,000.00	1,220,000.00	100.0%	27/11/2010
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	15/01/2010	0200/2011	977,103.99	977,103.99	977,103.99	977,103.99	100.00	100.00	0.00	977,103.99	977,103.99	100.0%	15/01/2010
400014000	400014000	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONEXOS S.A. DE C.V.	11/06/2011	1160/2011	1,917,300.00	1,917,300.00	1,917,300.00	1,917,300.00	100.00	100.00	0.00	1,917,300.00	1,917,300.00	100.0%	11/06/2011
<b>TOTAL</b>															
<b>TOTAL</b>															





---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 5**



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**RESUMEN GENERAL DE LOS PROGRAMAS 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**




fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance Financiero de las obras (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado	Estimado Acumulado C	Menos En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Ejercicio de Ejecución	Retenciones-Devoluciones	Alícuota de Costos Pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico de las obras (%)			
Tijuana	\$ 356,332,251.54	\$ 316,370,596.05	\$ 316,370,596.05	\$ 316,370,596.05	\$ 315,404,152.08	\$ 454,527.86	\$ 511,916.11	\$ 369,972.08	\$ 369,972.08	\$ 43,126,590.30	\$ 43,126,590.30	99.8%	99.8%			
Culiacán	\$ 141,946,180.00	\$ 122,723,321.64	\$ 122,723,321.64	\$ 122,723,321.64	\$ 122,686,387.00	\$ 36,934.64	\$ 201,904.26	\$ 6,991,029.49	\$ 6,991,029.49	\$ 100.0%	\$ 100.0%	100.0%	100.0%			
Queretaro	\$ 665,668,321.00	\$ 683,791,777.28	\$ 683,791,777.28	\$ 683,791,777.28	\$ 682,980,802.06	\$ 83,486.19	\$ 44,075.51	\$ 1,367,833.44	\$ 1,367,833.44	\$ 41,939,515.07	\$ 41,939,515.07	99.9%	100.0%			
Cuernavaca	\$ 323,597,757.44	\$ 485,398,004.18	\$ 485,398,004.18	\$ 485,910,693.17	\$ 466,829,897.74	\$ 3,627,175.91	\$ 6,205,202.69	\$ 3,221,205.28	\$ 3,221,205.28	\$ 11,574,172.33	\$ 11,574,172.33	97.0%	97.6%			
Puebla	\$ 212,307,046.61	\$ 732,900,574.81	\$ 673,731,276.94	\$ 602,928,152.17	\$ 557,567,924.06	\$ 15,910,744.40	\$ 23,156,192.99	\$ 13,464,692.83	\$ 13,464,692.83	\$ 11,600,404.43	\$ 11,600,404.43	83.1%	88.5%			
Coahuila	\$ 85,341,022.00	\$ 212,871,765.80	\$ 212,871,765.80	\$ 212,152,556.87	\$ 197,217,199.69	\$ 4,424,569.99	\$ 3,081,262.38	\$ 3,354,235.19	\$ 3,354,235.19	\$ 2,096,002.20	\$ 2,096,002.20	95.9%	96.0%			
Veracruz	\$ 130,616,410.75	\$ 173,659,394.57	\$ 159,659,394.57	\$ 159,659,394.57	\$ 159,402,031.14	\$ 38,100.68	\$ 219,262.77	\$ 2,272,332.38	\$ 2,272,332.38	\$ 6,935,320.77	\$ 6,935,320.77	99.9%	98.0%			
Reynosa	\$ 28,467,500.00	\$ 23,792,524.51	\$ 23,792,524.51	\$ 23,792,524.51	\$ 23,737,946.14	\$ 54,576.37	\$ 21,097.17	\$ 422,015.09	\$ 422,015.09	\$ 100.0%	\$ 100.0%	100.0%	100.0%			
Guadalajara	\$ 96,076,568.66	\$ 213,189,776.46	\$ 213,189,776.46	\$ 213,189,776.46	\$ 184,375,025.27	\$ 28,814,750.19	\$ 59,143.71	\$ 3,685,409.07	\$ 3,685,409.07	\$ 100.0%	\$ 100.0%	100.0%	100.0%			
Monterrey	\$ 313,640,521.00	\$ 389,717,219.94	\$ 389,717,219.94	\$ 389,717,219.94	\$ 388,595,316.94	\$ 82,163.25	\$ 1,059,739.65	\$ 912,110.13	\$ 912,110.13	\$ 22,338,859.79	\$ 22,338,859.79	100.0%	100.0%			
Chilapas	\$ 116,141,176.00	\$ 162,247,992.82	\$ 162,247,992.82	\$ 162,247,992.82	\$ 132,945,280.21	\$ 16,733.20	\$ 934,746.64	\$ 2,320,153.36	\$ 2,320,153.36	\$ 2,639,594.87	\$ 2,639,594.87	98.4%	100.0%			
Oaxaca	\$ 369,587,945.00	\$ 291,388,772.67	\$ 291,388,772.67	\$ 291,388,772.67	\$ 291,056,990.43	\$ 208,952.54	\$ 122,829.70	\$ 2,362,620.51	\$ 2,362,620.51	\$ 26,117,640.17	\$ 26,117,640.17	100.0%	100.0%			
Oficinas Centrales	\$ 8,000,000.00											0.0%	0.0%			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,049,924,700.00</b>	<b>\$ 4,009,057,740.73</b>	<b>\$ 3,934,882,442.88</b>	<b>\$ 3,895,189,558.83</b>	<b>\$ 3,722,788,955.88</b>	<b>\$ 31,464,827.47</b>	<b>\$ 72,070,286.51</b>	<b>\$ 34,855,488.99</b>	<b>\$ 29,958,900.65</b>	<b>\$ 181,678,553.58</b>	<b>\$ 181,678,553.58</b>	<b>96.4%</b>	<b>97.5%</b>			

Nota: En éste informe, se incluyen las partidas correspondientes a los recursos adicionales por \$600,000,000.00, autorizados mediante el oficio no. GOT/152100/4372011, del 26 de septiembre de 2011.

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

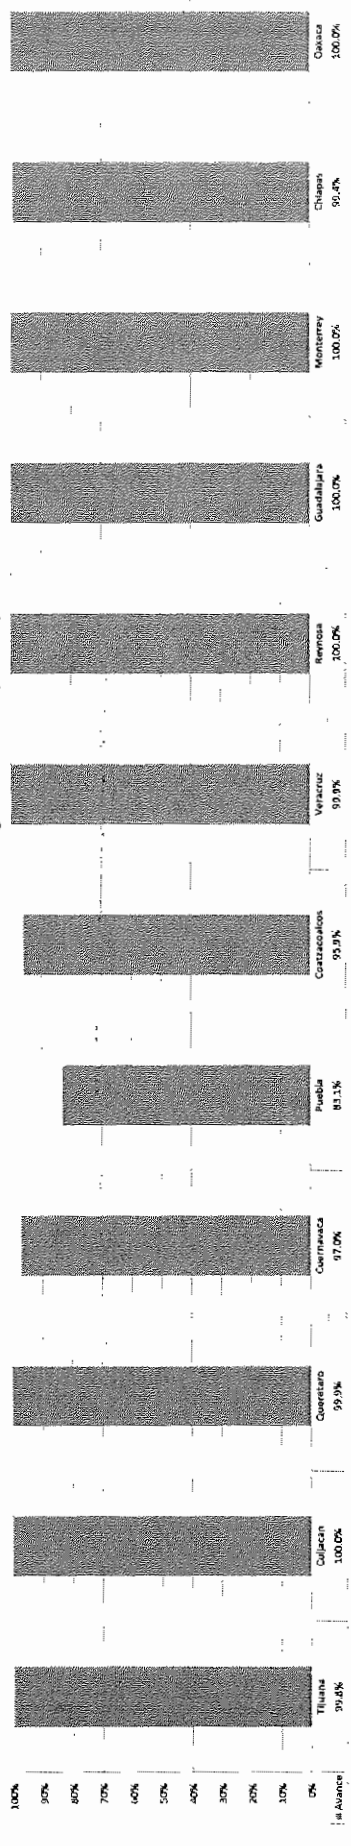

Nota: El ejercicio a Ejercicio de Efectivo corresponde a la suma (+) del Anticipo Otorgado más (+) Estimaciones más (+) Ajustes de Costos Pagados menos (-) Amortización de Anticipos.

000 0254

Handwritten signature or mark.



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CDNEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

Resumen de montos estimados acumulados por tramo cametero de los PROGRAMAS 2011 de la Red FONADIN

Designación / Tramo	Manillo Mayor	Supervisión	Manillo Menor	Supervisión	Manillo Mayor Puentes	Supervisión	Manillo Menor Puentes	Modernización	Supervisión	Inspeccionales (Tradicionales)	Inspeccionales (Especiales)	Emergencia Técnica	Supervisión	Total
<b>TJUCAPAN</b>														
Tijucapan - Fronterado	\$ 257,201,319.90	\$ 6,150,840.00	\$ 17,070,004.32	\$ 1,200,543.07			\$ 4,853,546.36	\$ 4,762,866.00		\$ 708,901.76	\$ 2,002,012.20			\$ 278,743,013.28
La Rincónera - Tecela	\$ 3,457,105.32	\$ 146,406.32	\$ 5,420,127.84	\$ 945,700.56			\$ 2,516,265.73	\$ 1,854,421.50		\$ 325,721.08	\$ 203,318.26			\$ 14,850,256.40
Libramiento Los Cabos	\$ 16,910,906.41	\$ 949,833.34	\$ 1,422,023.95				\$ 446,220.24			\$ 86,028.50				\$ 21,801,803.50
<b>Total Tlaxcala</b>	\$ 280,568,053.63	\$ 69,246,378.24	\$ 24,834,228.81	\$ 2,211,609.95			\$ 8,851,864.33	\$ 6,417,226.56		\$ 1,110,722.80	\$ 2,467,838.54			\$ 313,404,192.88
<b>CUICATLAN</b>														
Estación Don Nogales	\$ 66,253,202.44	\$ 1,900,900.37	\$ 21,320,376.03	\$ 1,743,144.38			\$ 2,261,354.78	\$ 0,750,587.78	\$ 555,052.26					\$ 122,086,387.80
<b>Total Cuicatlán</b>	\$ 66,253,202.44	\$ 1,900,900.37	\$ 21,320,376.03	\$ 1,743,144.38			\$ 2,261,354.78	\$ 0,750,587.78	\$ 555,052.26					\$ 122,086,387.80
<b>QUERETARO</b>														
Libramiento Noroeste de Querétaro	\$ 31,073,171.03	\$ 1,200,750.32	\$ 5,147,410.02	\$ 677,132.72			\$ 2,200,526.46			\$ 145,120.57				\$ 40,012,356.01
Chamajay - Lechería	\$ 70,344,714.23	\$ 3,045,676.11	\$ 7,071,371.30	\$ 1,066,190.96			\$ 3,522,461.02			\$ 257,414.88	\$ 190,010.20	\$ 11,000,600.48	\$ 1,002,127.43	\$ 101,676,416.25
Mexico - Querétaro	\$ 624,666,784.27	\$ 19,200,144.81	\$ 30,874,604.03	\$ 2,543,238.81			\$ 10,973,843.68	\$ 862,477.30		\$ 1,762,418.04				\$ 690,736,312.90
Querétaro - Irapuato	\$ 23,476,001.96	\$ 1,203,072.00	\$ 8,002,281.51	\$ 662,204.08	\$ 1,746,000.10		\$ 4,247,371.51			\$ 1,076,003.04				\$ 41,652,705.20
<b>Total Querétaro</b>	\$ 748,344,276.81	\$ 25,414,846.14	\$ 32,655,664.00	\$ 6,389,633.58	\$ 1,746,000.10		\$ 30,188,071.06	\$ 862,477.30		\$ 3,275,616.23	\$ 190,010.20	\$ 11,066,600.40	\$ 1,002,127.43	\$ 812,840,302.90
<b>CUERNAVACA</b>														
Masaso - Cuernavaca	\$ 48,651,021.03	\$ 3,205,144.29	\$ 11,022,889.80	\$ 1,212,511.20			\$ 1,407,390.09			\$ 277,002.44	\$ 200,433.00			\$ 60,086,483.22
Libramiento Cuernavaca	\$ 2,006,130.00	\$ 627,207.35	\$ 4,900,210.00	\$ 414,000.00			\$ 642,670.57			\$ 351,643.02				\$ 4,048,293.34
Cuernavaca - Acapulco	\$ 240,079,068.07	\$ 10,773,346.92	\$ 40,801,520.10	\$ 4,140,000.00			\$ 4,900,210.70			\$ 1,201,810.54	\$ 2,064,731.54	\$ 44,807,010.51	\$ 4,000,003.01	\$ 319,380,487.53
Puente de Ixtla - Ixtla	\$ 4,880,230.76	\$ 510,700.97	\$ 2,824,300.23	\$ 655,078.67			\$ 852,811.55			\$ 286,481.07				\$ 10,034,048.85
La Peña - Cuautla	\$ 4,032,046.67	\$ 527,397.34	\$ 1,432,046.67	\$ 527,397.34			\$ 1,432,334.15			\$ 360,270.41				\$ 7,240,047.77
Zacapoalco - Rancho Viejo	\$ 1,731,300.91	\$ 300,400.13	\$ 1,095,167.67	\$ 204,306.71			\$ 173,040.33			\$ 41,002.00		\$ 11,066,206.12	\$ 1,315,100.35	\$ 10,374,182.20
Rancho Viejo - Taxco	\$ 1,758,076.20		\$ 1,095,167.67	\$ 204,306.71			\$ 211,840.27			\$ 20,715.48				\$ 4,100,336.33
<b>Total Cuernavaca</b>	\$ 290,398,146.80	\$ 10,978,536.60	\$ 68,029,308.10	\$ 7,434,603.74	\$ 2,874,306.23		\$ 10,215,260.74			\$ 2,743,003.62	\$ 2,765,163.44	\$ 56,311,005.03	\$ 5,384,248.00	\$ 468,120,807.74
<b>PUERLA</b>														
Masaso - Puebla	\$ 111,064,880.26	\$ 5,304,013.82	\$ 22,120,206.07	\$ 1,435,088.15	\$ 10,881,203.13		\$ 4,103,320.67			\$ 944,540.24	\$ 370,034.01	\$ 15,002,502.07	\$ 1,331,170.90	\$ 176,083,713.05
Puebla - Acatzingo	\$ 27,009,867.06	\$ 1,015,407.00	\$ 7,443,226.41	\$ 684,627.67			\$ 3,094,340.96	\$ 689,102.80		\$ 352,775.74				\$ 42,206,051.00
Acatzingo - CD. Mendoza	\$ 231,077,602.22	\$ 4,971,063.02	\$ 6,499,787.80	\$ 969,134.90			\$ 3,427,170.43	\$ 901,288.70		\$ 650,130.70	\$ 1,300,229.11	\$ 81,008,047.05	\$ 4,624,010.44	\$ 330,875,358.81
<b>Total Puebla</b>	\$ 378,151,749.54	\$ 11,337,386.42	\$ 36,062,219.27	\$ 3,089,239.81	\$ 10,891,335.13		\$ 11,524,840.23	\$ 2,504,382.40		\$ 1,898,446.78	\$ 1,689,183.82	\$ 87,961,209.12	\$ 5,965,089.04	\$ 537,367,324.00
<b>QUERETAROCALCOS</b>														
Champolón - Campesino	\$ 1,275,000.00	\$ 60,551.04	\$ 5,023,079.20	\$ 774,302.31			\$ 1,900,226.08			\$ 106,087.24				\$ 9,079,273.69
La Tlajilla - Cosoleacaque (Isla - Acapulco)	\$ 49,022,073.01	\$ 1,570,206.41	\$ 12,272,513.72	\$ 1,933,227.20	\$ 2,148,002.12		\$ 2,801,110.51			\$ 604,429.60				\$ 67,663,304.40
Acapulco - Cosoleacaque	\$ 1,129,801.04	\$ 92,551.03	\$ 9,798,910.42	\$ 1,028,878.89	\$ 652,997.54		\$ 2,783,711.83			\$ 291,962.03				\$ 14,942,270.68
Agua Dulce - Cárdenas	\$ 11,863,023.64	\$ 627,632.00	\$ 10,695,837.17	\$ 1,051,488.12			\$ 4,008,280.17			\$ 308,810.25				\$ 26,000,714.43
Salina Cruz - La Ventosa	\$ 4,432,230.47	\$ 244,769.36	\$ 6,668,198.21	\$ 711,204.83			\$ 2,705,014.78			\$ 1,050,947.67		\$ 50,371,235.17	\$ 3,027,044.05	\$ 74,420,058.02
Puerto El Zarcón	\$ 60,300,000.00	\$ 2,384,832.48	\$ 42,550,381.89	\$ 4,491,073.38	\$ 6,340,308.28		\$ 15,419,320.32			\$ 2,427,576.38		\$ 50,371,235.17	\$ 3,027,044.05	\$ 106,368,811.91
<b>Total Queretaro Calcos</b>	\$ 175,622,127.32	\$ 8,778,574.61	\$ 75,190,729.61	\$ 10,869,106.82	\$ 15,084,623.02		\$ 27,836,752.96			\$ 3,787,746.92		\$ 103,744,715.51	\$ 6,354,164.12	\$ 233,348,341.28
<b>VERACRUZ</b>														
CD. Mendoza - Córdoba	\$ 1,100,000.00	\$ 104,000.19	\$ 10,120,073.63	\$ 953,270.49			\$ 3,900,524.17			\$ 500,005.76				\$ 17,160,488.44
Córdoba - Veracruz	\$ 26,077,667.45	\$ 1,777,276.04	\$ 13,802,819.57	\$ 1,388,264.47			\$ 4,722,040.20	\$ 3,018,820.83		\$ 820,700.38				\$ 55,269,486.24
La Tlajilla - Cosoleacaque (La Tlajilla - Isla)	\$ 33,589,867.51	\$ 1,231,870.30	\$ 14,067,659.12	\$ 1,063,833.24	\$ 10,200,202.41		\$ 7,200,246.45			\$ 1,116,128.20				\$ 70,214,686.46
Guadalupe Zimora - Tlaxiáldan	\$ 4,432,230.47	\$ 244,769.36	\$ 6,668,198.21	\$ 711,204.83			\$ 2,705,014.78			\$ 261,549.70		\$ 501,925.74		\$ 13,350,249.00
Libramiento Puente Tampico	\$ 66,163,674.06	\$ 3,249,887.83	\$ 48,374,589.84	\$ 4,293,873.53	\$ 10,286,202.41		\$ 19,868,243.68	\$ 3,018,820.83		\$ 62,910.22				\$ 4,294,181.20
<b>Total Veracruz</b>	\$ 145,363,441.49	\$ 9,665,813.12	\$ 82,032,457.73	\$ 10,269,763.92	\$ 20,581,232.05		\$ 37,838,273.26	\$ 6,037,641.66		\$ 1,944,368.51		\$ 50,371,235.17	\$ 3,027,044.05	\$ 159,402,031.14
<b>REYNOSA</b>														
Méridanos - Reynosa	\$ 1,100,000.00	\$ 104,000.19	\$ 10,120,073.63	\$ 953,270.49			\$ 3,900,524.17			\$ 500,005.76				\$ 17,160,488.44
Puente Internacional Reynosa- Pharr	\$ 26,077,667.45	\$ 1,777,276.04	\$ 13,802,819.57	\$ 1,388,264.47			\$ 4,722,040.20	\$ 3,018,820.83		\$ 820,700.38				\$ 55,269,486.24
Puente Internacional Iguazú Zaragoza	\$ 4,432,230.47	\$ 244,769.36	\$ 6,668,198.21	\$ 711,204.83			\$ 2,705,014.78			\$ 261,549.70		\$ 501,925.74		\$ 13,350,249.00
<b>Total Reynosa</b>	\$ 34,570,907.92	\$ 3,326,045.59	\$ 30,591,091.41	\$ 3,052,739.79			\$ 11,327,579.15	\$ 6,037,641.66		\$ 1,582,255.84		\$ 50,371,235.17	\$ 3,027,044.05	\$ 86,146,223.72

Handwritten signature or mark



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

Resumen de montos estimados acumulados por tramo carreteros de los PROGRAMAS 2011 de la Red FONADIN

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2017

Delegación / Tramo	Monto Mayor	Supervisión	Monto Menor	Supervisión	Monto Mayor Puentes	Supervisión	Modernización	Supervisión	Inspecciones (Tradicionales)	Inspecciones (Especializadas)	Emergencias Técnicas	Supervisión	Total
<b>GUADALAJARA</b>													
Guadalupe - Tepic	\$ 7,030,640.00	\$ 107,451.00	\$ 14,100,000.00	\$ 1,577,400.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			\$ 340,000.00		\$ 17,001,500.00	\$ 257,402.51	\$ 42,048,202.46
Atzacurao - Uruapan	\$ 20,007,605.76	\$ 805,501.40	\$ 10,202,002.00	\$ 1,240,007.00	\$ 3,100,000.00	\$ 3,100,000.00			\$ 257,000.00	\$ 474,533.33			\$ 43,145,140.25
Uruapan - Nueva Italia	\$ 1,501,500.00	\$ 104,050.10	\$ 6,000,119.72	\$ 890,709.72	\$ 3,000,000.00	\$ 3,000,000.00			\$ 207,330.10	\$ 700,002.50			\$ 15,312,657.34
Nueva Italia - Lazaro Cardenas	\$ 01,027,428.74	\$ 1,440,040.30	\$ 11,400,107.51	\$ 1,377,330.40	\$ 40,440,541.00	\$ 2,407,304.12	\$ 8,117,414.00		\$ 940,000.37	\$ 632,714.04			\$ 62,006,037.02
Varios Tramos	\$ 30,000,000.00	\$ 1,371,000.71	\$ 53,141,000.00	\$ 4,700,000.00	\$ 40,440,541.00	\$ 2,407,304.12	\$ 10,400,000.00		\$ 1,110,074.16	\$ 4,000,142.10	\$ 17,001,500.00	\$ 307,300.51	\$ 104,370,000.27
<b>MONTERREY</b>													
Monterrey - Nuevo Laredo	\$ 7,001,000.00	\$ 343,200.01	\$ 10,440,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			\$ 204,103.34				\$ 21,145,003.29
Torreon - Saltillo	\$ 05,200,203.47	\$ 1,004,302.40	\$ 11,700,000.00	\$ 1,276,740.40	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 604,000.00		\$ 101,072.00				\$ 02,831,004.74
Puerto Mexico - Carbonera	\$ 97,001,403.00	\$ 2,071,270.70	\$ 7,001,000.00	\$ 700,701.01	\$ 477,011.02	\$ 342,340.20			\$ 00,000.00				\$ 00,433,000.20
Carbonera - Ojo Caliente	\$ 34,047,013.42	\$ 1,242,414.35	\$ 2,700,000.00	\$ 400,100.20	\$ 344,000.19	\$ 344,000.19			\$ 07,000.32				\$ 40,704,000.00
Cederales - Reynosa	\$ 01,027,428.74	\$ 1,440,040.30	\$ 11,400,107.51	\$ 1,377,330.40	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00			\$ 000,000.00				\$ 00,000,000.00
Gomez Palacio - Corralitos	\$ 03,000,000.00	\$ 1,701,000.71	\$ 12,420,000.00	\$ 1,304,470.33	\$ 1,210,000.00	\$ 1,210,000.00			\$ 512,200.01				\$ 00,000,000.00
Durango - Mazatlan	\$ 200,270,224.34	\$ 0,000,000.00	\$ 700,000,000.00	\$ 7,321,400.00	\$ 12,000,000.00	\$ 12,000,000.00	\$ 1,000,000.00		\$ 1,074,000.00				\$ 200,000,000.00
<b>CHIAPAS</b>													
San Cristobal - Motozintla	\$ 47,000,000.00	\$ 2,101,000.00	\$ 10,700,000.00	\$ 1,207,140.07	\$ 500,000.00	\$ 2,701,700.11			\$ 1,022,700.70			\$ 50,271,430.00	\$ 132,045,200.21
Total Chiapas	\$ 47,000,000.00	\$ 2,101,000.00	\$ 10,700,000.00	\$ 1,207,140.07	\$ 500,000.00	\$ 2,701,700.11			\$ 1,022,700.70			\$ 50,271,430.00	\$ 132,045,200.21
<b>OAXACA</b>													
Cd. Cuictepec - Oaxaca	\$ 200,000,000.00	\$ 6,402,111.30	\$ 200,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,710,000.00		\$ 070,000.00	\$ 3,127,207.01	\$ 0,100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 201,000,000.00
Total Oaxaca	\$ 200,000,000.00	\$ 6,402,111.30	\$ 200,000,000.00	\$ 3,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 1,710,000.00		\$ 070,000.00	\$ 3,127,207.01	\$ 0,100,000.00	\$ 200,000.00	\$ 201,000,000.00
<b>OFICINAS CENTRALES</b>													
Gerencia De Calidad Técnica	\$ 2,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400,000.00
Total Oficinas Centrales	\$ 2,400,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 2,400,000.00
<b>Total General</b>	\$ 2,400,000.00	\$ 92,021,721.85	\$ 472,001,214.74	\$ 45,640,000.00	\$ 85,050,776.20	\$ 0,647,076.40	\$ 147,500,000.00	\$ 733,140.34	\$ 16,752,305.10	\$ 13,000,724.17	\$ 200,000,000.00	\$ 20,000,121.43	\$ 3,722,700,000.00

000 0258






**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Instr. de cont. 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejido a Flujo de Efectivo	Reservaciones - Devoluciones	Alícuota de Costos Pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)		
Tlaxcala	\$ 203,429,000.00	\$ 280,535,377.04	\$ 280,535,377.04	\$ 280,535,377.04	\$ 250,560,052.03		\$ 454,408.30	\$ 511,010.11	\$ 302,427,910.86	\$ 276,707.70	\$ 42,858,587.23	99.8%	99.8%		
Culiacán	\$ 94,350,000.00	\$ 85,248,535.77	\$ 85,248,535.77	\$ 85,248,535.77	\$ 85,233,202.44		\$ 15,243.33		\$ 90,836,806.92	\$ 62,520.60	\$ 5,893,004.38	100.0%	100.0%		
Querétaro	\$ 736,000,000.00	\$ 746,410,801.40	\$ 746,410,801.40	\$ 746,410,801.40	\$ 740,343,270.61		\$ 76,067.50	\$ 3.38	\$ 787,100,371.44	\$ 1,138,215.24	\$ 37,700,100.83	100.0%	100.0%		
Cuernavaca	\$ 228,610,000.00	\$ 305,378,880.11	\$ 305,378,880.11	\$ 305,378,880.11	\$ 200,388,186.80		\$ 2,803,277.50	\$ 5,413,087.08	\$ 301,117,885.75	\$ 3,101,384.32	\$ 10,720,099.05	96.0%	98.1%		
Puebla	\$ 144,300,000.00	\$ 503,600,000.28	\$ 486,424,675.28	\$ 307,810,603.44	\$ 370,256,925.10		\$ 208,337.51	\$ 0.66	\$ 380,404,031.77	\$ 11,619,250.23	\$ 10,154,006.07	70.4%	86.1%		
Coahuila	\$ 15,480,000.00	\$ 68,782,330.34	\$ 68,782,330.34	\$ 68,175,501.80	\$ 60,305,066.08		\$ 116,181.20	\$ 3,681,202.38	\$ 60,881,101.34	\$ 742,850.60	\$ 376,005.29	87.8%	94.3%		
Veracruz	\$ 50,800,000.00	\$ 68,155,602.05	\$ 68,155,602.05	\$ 68,155,602.05	\$ 68,155,674.48		\$ 17.57		\$ 73,253,006.03	\$ 760,580.64	\$ 5,897,422.45	100.0%	100.0%		
Reynosa												0.0%	0.0%		
Guadalajara	\$ 10,700,000.00	\$ 48,747,105.20	\$ 48,747,105.20	\$ 48,747,105.20	\$ 35,050,880.35		\$ 12,767,308.85		\$ 35,050,880.35			100.0%	100.0%		
Monterrey	\$ 223,500,000.00	\$ 280,781,061.38	\$ 280,781,061.38	\$ 280,781,061.38	\$ 280,275,224.54		\$ 505,836.84		\$ 301,518,607.13	\$ 887,815.00	\$ 21,241,472.50	100.0%	100.0%		
Chiapas	\$ 73,900,000.00	\$ 47,844,617.82	\$ 47,844,617.82	\$ 47,844,617.82	\$ 47,530,886.32		\$ 313,720.50		\$ 40,523,305.72	\$ 3,103.00	\$ 1,892,567.40	100.0%	100.0%		
Oaxaca	\$ 314,800,000.00	\$ 238,827,900.03	\$ 238,827,900.03	\$ 238,827,900.03	\$ 238,822,184.22		\$ 5,722.81		\$ 285,837,320.02	\$ 1,004,100.14	\$ 27,015,143.40	100.0%	100.0%		
Olefinas Centrales												0.0%	0.0%		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,103,868,000.00</b>	<b>\$ 2,857,351,588.52</b>	<b>\$ 2,820,148,194.51</b>	<b>\$ 2,550,933,838.33</b>	<b>\$ 2,485,833,653.57</b>	<b>\$ 20,074,438.24</b>	<b>\$ 17,377,231.08</b>	<b>\$ 16,648,488.43</b>	<b>\$ 2,648,966,272.73</b>	<b>\$ 20,404,832.47</b>	<b>\$ 182,834,610.16</b>	<b>95.5%</b>	<b>97.1%</b>		

**Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)**

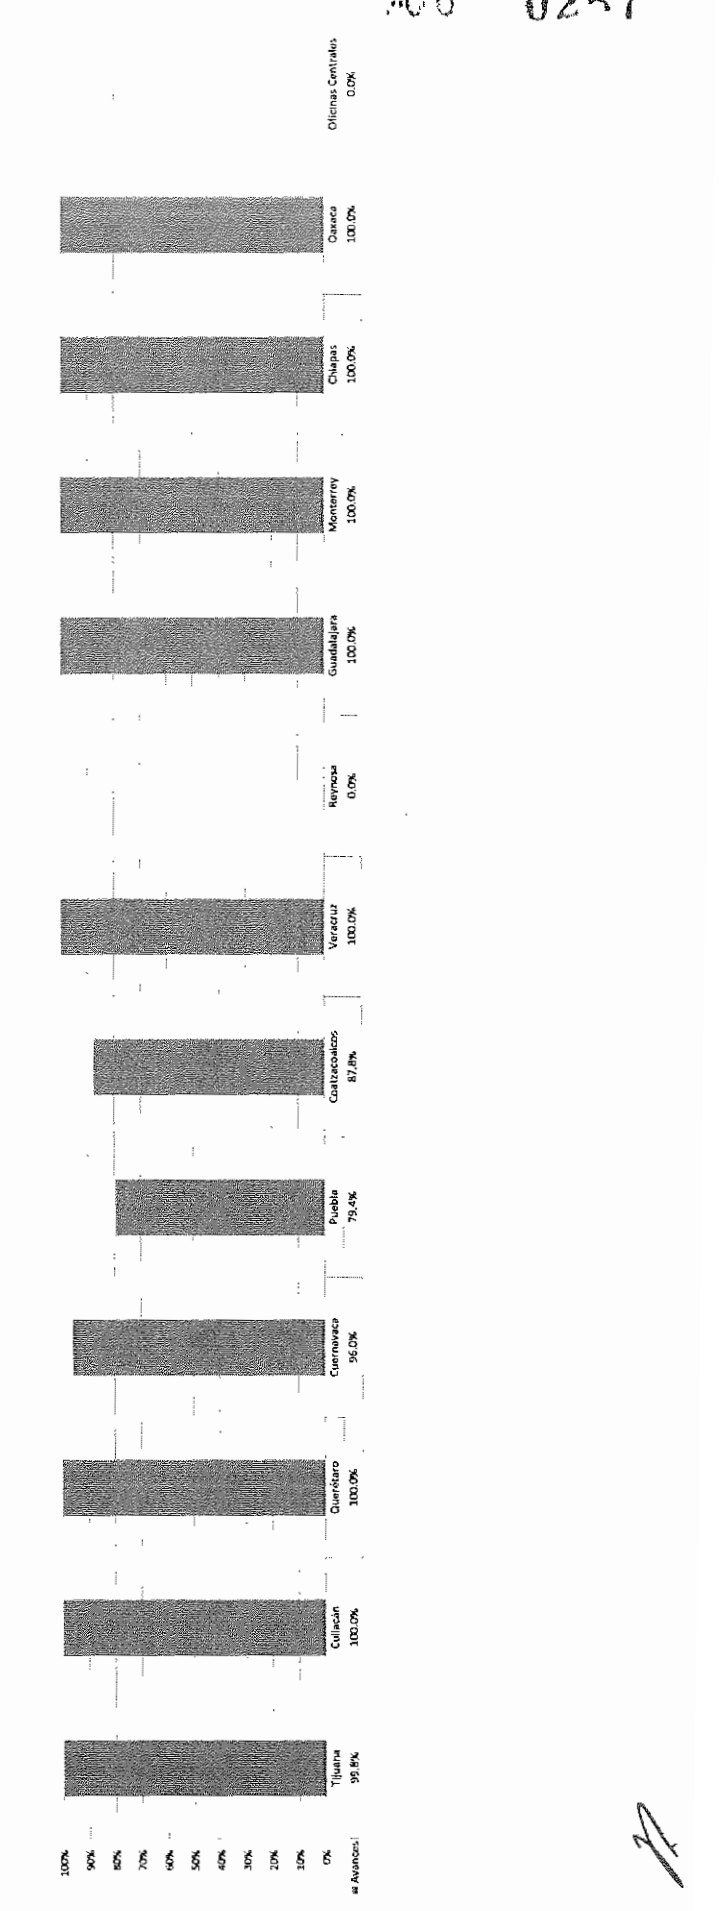

00 0257

*[Handwritten signature]*





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Contrato No.	Empresa	Fecha de Contrato Inicio	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado	Monto Ejecutado A	Monto Programado B	Estrimado Autorizado C	Monto Ejec. y Trámite D	Subvenciones Desembolsadas	Saldo Ejecutado E	Estrimado Ejecutado	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Avance de Costos Físicos

<b>Toluca - Externas</b>																
18Y	40001008 50000074 50000074	GLUYAS CONSULTORES S.A DE C.V. E INGENIERIA TECNOLÓGICA S.A DE C.V.	07/02/2011	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 10+000 AL 14+000 DE LA AUTOPISTA Toluca - ENERANDA.	201,000,000.00	236,882,460.81	236,882,460.81	220,882,460.81	220,882,460.81	220,882,460.81	118,842.40	437,223.72	270,667,722.00	100.0%	100.0%	\$ 49,600,404.19
19C	40001116 50000080 50000080	ACTIVOS S.L.L.CORDES S.A DE C.V. E INGENIERIA TECNOLÓGICA S.A DE C.V.	07/02/2011	SUMINISTRO Y APLICACION DE HECOS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS REPARACION DE PAVIMENTOS "ASP EN LA MODALIDAD DE TRAMO ESTACION DON - NOVALES" ENERANDA. (Obras Complementarias)	1,800,000.00	1,912,800.20	1,912,800.20	1,812,800.20	1,812,800.20	1,812,800.20	-	-	1,908,000.70	100.0%	100.0%	\$ 209,803.34
24C	40001640 50000081 50000081	ROMEGA GIBENO Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.	01/02/2011	CONSTRUCCION DE BANDAS TRANSVERSALES DE ALERTA EN ACCIDENTES EXTERNOS EN CARRETERAS ENERANDA EN TRAMO ESTACION DON - NOVALES. (Obras Complementarias)	900,000.00	891,200.00	891,200.00	891,200.00	891,200.00	891,200.00	-	-	891,200.00	100.0%	100.0%	\$ -
30C	40001682 50000082 50000082	FORNAS METALICAS S.A DE C.V.	13/01/2011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURENAS METALICAS DE TRES CRISTALES EN TRAMOS ESTACION DON - NOVALES AL KM 10+000 ENERANDA. (Obras Complementarias)	7,400,000.00	4,334,624.84	4,334,624.84	4,334,624.84	4,334,624.84	4,334,624.84	1,779.19	-	4,332,845.66	100.0%	100.0%	\$ -

<b>La Baramba - Tránsito</b>																	
8C	40001728	INGENIERIA GLOTECOROS L INFRASTRUCTURA S.A DE C.V.	10/02/2012	ESTUDIO Y PROYECTO PARA RECONSTRUCION DEL PAVIMENTO EN TRAMO ESTACION DON - NOVALES DE LA AUTOPISTA LA BARAMBA - Toluca.	10,000,000.00	1,731,056.74	1,731,056.74	1,731,056.74	1,731,056.74	1,731,056.74	40,450.70	1,771,507.44	1,710,146.00	70.4%	70.4%	\$ 196,457.40	
40C	40001808 50000080 50000080	ADITIVOS SELLADORES E IMPERMEABILIZANTES S.A DE C.V.	07/02/2011	SUMINISTRO Y APLICACION DE HECOS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS REPARACION DE PAVIMENTOS DEL KM 10+000 AL 14+000 ENERANDA. (Obras Complementarias)	2,400,000.00	2,228,024.09	2,228,024.09	2,228,024.09	2,228,024.09	2,228,024.09	41,760.40	-	2,228,024.09	100.0%	100.0%	\$ -	
<b>Estacion Don - Novalles</b>																	
24Y	40001646	CAJO NUEVO INGENIERIA S.A DE C.V.	10/02/2011	REPARACION DE GRASA DE OIL DON DE LOS ESPERADORES EN TRAMO ESTACION DON - NOVALES ENERANDA.	14,000,000.00	14,300,000.04	14,300,000.04	14,300,000.04	14,300,000.04	14,300,000.04	74,895.17	403.17	16,113,877.21	100.0%	100.0%	\$ 1,013,914.44	
54C	40001882 50000082 50000082	FORNAS METALICAS S.A DE C.V.	13/01/2011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DURENAS METALICAS DE TRES CRISTALES EN TRAMOS ESTACION DON - NOVALES ENERANDA. (Obras Complementarias)	4,600,000.00	4,624,987.70	4,624,987.70	4,624,987.70	4,624,987.70	4,624,987.70	-	15,002.22	-	4,600,000.00	100.0%	100.0%	\$ -
<b>CULLACAM</b>																	
<b>Estacion Don - Novalles</b>																	
34Y	40001813 50000082 50000082	GRUPO DE EMPRESAS PLANIFICADA S.A DE C.V.	01/02/2011	MANTENIMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PIEDRA, BACHEO PROFUNDO, CARPETA CON TRAMADO EN TRAMO ESTACION DON - NOVALES ENERANDA.	50,000,000.00	53,737,603.84	53,737,603.84	53,737,603.84	53,737,603.84	53,737,603.84	62,326.65	6.64	62,115,336.67	100.0%	100.0%	\$ 4,377,692.82	
10C	40001873	INDUSTRIAL DEL CENTRO S.A DE C.V.	20/02/2011	ESTUDIO Y PROYECTO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRAFICO EN EL KM 0+000 DEL TRAMO ESTACION DON - NOVALES ENERANDA.	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	975,000.00	-	-	975,000.00	100.0%	100.0%	\$ -	
64C	40001886 50000080 50000080	ACTIVOS S.L.L.CORDES S.A DE C.V. E INGENIERIA TECNOLÓGICA S.A DE C.V.	07/02/2011	SUMINISTRO Y APLICACION DE HECOS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS REPARACION DE PAVIMENTOS EN TRAMOS ESTACION DON - NOVALES ENERANDA. (Obras Complementarias)	2,801,000.00	3,186,472.12	3,186,472.12	3,186,472.12	3,186,472.12	3,186,472.12	-	-	3,273,031.82	100.0%	100.0%	\$ 117,469.70	
74C	40001888 50000080 50000080	ACTIVOS S.L.L.CORDES S.A DE C.V. E INGENIERIA TECNOLÓGICA S.A DE C.V.	07/02/2011	SUMINISTRO Y APLICACION DE HECOS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS EN TRAMOS ESTACION DON - NOVALES ENERANDA. (Obras Complementarias)	3,600,000.00	2,421,769.67	2,421,769.67	2,421,769.67	2,421,769.67	2,421,769.67	-	-	2,499,813.89	100.0%	100.0%	\$ 77,244.13	
84C	40001889 50000080 50000080	ACTIVOS S.L.L.CORDES S.A DE C.V. E INGENIERIA TECNOLÓGICA S.A DE C.V.	07/02/2011	SUMINISTRO Y APLICACION DE HECOS SELLADOR DE CARPETAS ASFALTICAS IMPERMEABILIZANTE Y REPARACION DE PAVIMENTOS EN TRAMOS ESTACION DON - NOVALES ENERANDA. (Obras Complementarias)	8,100,000.00	5,909,281.15	5,909,281.15	5,909,281.15	5,909,281.15	5,909,281.15	-	-	6,237,149.25	100.0%	100.0%	\$ 300,068.21	

*[Handwritten signature]*







PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2014 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Parte	Código No.	Empresa	Partidas del Contrato	Cometido	Monto Contratado	Monto Ejecutado	Monto Ej. Trámite	Subvenciones	Saldo Contratado	Plazo de Pago	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Apertura de Cuenta
444Y	40001787	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DE QUIMBERO, S.A. DE C.V.	1312011	06/04/2012	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	266,000.70
333C	40001842	FOHARA METALICAS, S.A. DE C.V.	1406001	24/07/2011	5,694,896.63	5,694,896.63	5,694,896.63	5,694,896.63	0.00	0.00	100.0%	100.0%	266,000.70
346C	40001744	RECA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	02/01/2011	24/05/2012	18,562,207.49	18,562,207.49	18,562,207.49	18,562,207.49	0.00	0.00	94.0%	94.0%	266,000.70
405C	40001749	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y CONSULTA, S.A. DE C.V.	02/01/2012	13/05/2012	13,872,101.18	13,872,101.18	13,872,101.18	13,872,101.18	0.00	0.00	70.0%	70.0%	266,000.70
<b>Manejo de Trámites</b>													
30P	40001627	AGERENIA DE PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	20/05/2011	24/05/2011	1,008,076.20	1,008,076.20	1,008,076.20	1,008,076.20	0.00	0.00	100.0%	100.0%	266,000.70
<b>PUCULA</b>													
<b>Módulo Pucula</b>													
374Y	40001641	PANCO S.A. DE C.V.	30/05/2011	09/11/2011	31,782,444.44	31,782,444.44	31,782,444.44	31,782,444.44	0.00	0.00	100.0%	100.0%	3,162,000.75
184Y	40001632	PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	13/05/2011	08/11/2011	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	0.00	100.0%	100.0%	3,162,000.75
424Y	40001747	CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	09/01/2012	20/06/2012	42,239,529.15	42,239,529.15	42,239,529.15	42,239,529.15	0.00	0.00	70.0%	70.0%	3,162,000.75
423C	40001842	FOHARA METALICAS, S.A. DE C.V.	14/05/2011	24/11/2011	2,547,703.80	2,547,703.80	2,547,703.80	2,547,703.80	0.00	0.00	100.0%	100.0%	3,162,000.75
7EP	40001630	CECOSA, S.A. DE C.V. / PROYECTOS Y CONSULTA, S.A. DE C.V.	03/07/2011	08/06/2012	17,466,400.24	17,466,400.24	17,466,400.24	17,466,400.24	0.00	0.00	91.2%	91.2%	3,162,000.75
<b>Pucula - Aguilón</b>													
194Y	40001630	PANCO S.A. DE C.V.	13/05/2011	08/11/2011	25,070,689.64	25,070,689.64	25,070,689.64	25,070,689.64	0.00	0.00	100.0%	100.0%	4,807,544.27
168C	40001842	FOHARA METALICAS, S.A. DE C.V.	14/05/2011	13/06/2011	1,037,897.95	1,037,897.95	1,037,897.95	1,037,897.95	0.00	0.00	100.0%	100.0%	4,807,544.27
<b>Acuñados Ciudad Mendoza</b>													
414Y	40001824	OGONAL, S.A. DE C.V.	16/11/2011	18/12/2012	247,297,035.82	247,297,035.82	102,782,841.15	264,000.79	144,514,194.67	0.00	77.0%	82.7%	4,807,544.27
246C	40001680	ZETA CORPORACION DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/07/2011	27/05/2012	97,326,979.68	97,326,979.68	1,046,819.63	9,600,007.72	86,720,170.33	0.00	91.0%	97.0%	4,807,544.27
485C	40001827	PROYECTOS Y CONSULTAS, S.A. DE C.V.	01/05/2012	26/11/2012	4,113,486.89	4,113,486.89	317,782.58	0.00	3,795,704.31	0.00	0.0%	7.0%	4,807,544.27
482C	40001848	CONSTRUCTORA NICOLA, S.A. DE C.V.	01/05/2012	28/11/2012	2,713,886.13	2,713,886.13	115,863.19	0.00	2,598,022.94	0.00	0.0%	0.0%	4,807,544.27
11EP	40001627	PROYECTOS Y CONSULTAS, S.A. DE C.V.	13/05/2011	13/05/2011	1,149,896.14	1,149,896.14	1,096.24	1,096.24	1,148,800.00	0.00	100.0%	100.0%	4,807,544.27

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.







CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA


No. Póliza	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Modificado	Monto Cancelado	Monto Programado	Extensión Autorizada	Monto a Trámite	Restricciones - Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia	Expendido a Favor de Ejecución	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Asesores de Gestión
440C	40001018A 50001018B 50001018C	AUTOMOS DEL AGRIER S.A. DE C.V.	06/03/2011 - 02/03/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR DE FENDIMIENTOS, BARRIDO Y RECONSTRUCCIÓN EN LA AUTOPISTA LA TRINCHA (Otra Centralizada)	2,140,272.00	2,140,272.00	2,140,272.00	2,140,272.00	2,140,272.00	2,140,272.00	-	2,140,272.00	-	2,140,272.00	100.0%	100.0%	402,127.11
249C	40001018D	SIRPINE SA DE CV	10/07/2011 - 30/07/2011	MANEJO Y COLOCACION DE SEMALETOS VERTICAL Y DEFENSA METALICA DEL AM 101-001 AL KM 219+000 INCLUIDO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LA AUTOPISTA SANTIAGO JARINÁ - TESHUATÁN	4,402,747.49	4,402,747.49	4,402,747.49	4,402,747.49	4,402,747.49	4,402,747.49	17.07	4,402,747.49	-	4,402,747.49	100.0%	100.0%	276,440.00
<b>GUADALAJARA</b>																	
<b>Guadalupe - Tlaxiaco</b>																	
249C	40001018E (4)	KOMOLDESANO Y CONSTRUCCION, S.A DE C.V.	07/06/2011 - 07/06/2011	CONSTRUCCION DE BANCOS VERTICALES DE ALBERCA EN LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TESHUATÁN	7,030,040.00	7,030,040.00	7,030,040.00	7,030,040.00	7,030,040.00	7,030,040.00	-	7,030,040.00	-	7,030,040.00	100.0%	100.0%	7,030,040.00
<b>Pánuco - Tampacán</b>																	
518Y	40001018F (17)	CONSTRUCCION FELIXA HERRERA GARCIA CONSTRUCTORA LUMEL, S.A DE C.V.	01/02/2011 - 24/02/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	39,654,872.63	39,654,872.63	39,654,872.63	39,654,872.63	39,654,872.63	39,654,872.63	-	12,796,006.87	-	20,858,865.76	100.0%	100.0%	2,160,000.00
<b>Unión - Nueva Esada</b>																	
249C	40001018G (16)	COMAU METALICA, S.A DE C.V.	14/03/2011 - 13/03/2011	MANEJO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRUCES EN TRAMOS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LA AUTOPISTA DEL CAMINO NEVATLALTA	1,961,982.57	1,961,982.57	1,961,982.57	1,961,982.57	1,961,982.57	1,961,982.57	-	407.96	-	1,961,574.61	100.0%	100.0%	1,961,574.61
<b>MONTENITO</b>																	
<b>Montenito - Nuevos Arboles</b>																	
208Y	40001018H	SILVINO JIMENEZ SA DE CV	07/04/2011 - 24/07/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	2,946,007.56	2,946,007.56	2,946,007.56	2,946,007.56	2,946,007.56	2,946,007.56	-	2,946,007.56	-	2,946,007.56	100.0%	100.0%	2,946,007.56
306C	40001018I (17)	FONAR METALICA, S.A DE C.V.	14/03/2011 - 14/03/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	4,145,463.10	4,145,463.10	4,145,463.10	4,145,463.10	4,145,463.10	4,145,463.10	-	4,145,463.10	-	4,145,463.10	100.0%	100.0%	4,145,463.10
<b>Mérida - Tzucucil</b>																	
208Y	40001018J (20)	INDUSTRIAL DE ASFALTOS Y PAVIMENTOS S.A DE C.V.	07/04/2011 - 27/02/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	53,576,324.59	53,576,324.59	53,576,324.59	53,576,324.59	53,576,324.59	53,576,324.59	-	0.41	-	53,576,324.18	100.0%	100.0%	5,900,294.77
62P	40001018K	INDENIUM PAVIMENTOS	02/03/2011 - 26/02/2011	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO PRELIMINAR DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LA AUTOPISTA	1,960,760.27	1,960,760.27	1,960,760.27	1,960,760.27	1,960,760.27	1,960,760.27	-	1,960,760.27	-	1,960,760.27	100.0%	100.0%	1,960,760.27
316C	40001018L (14)	COMAU METALICA, S.A DE C.V.	14/03/2011 - 13/03/2011	MANEJO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRUCES EN TRAMOS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LA AUTOPISTA	9,260,179.82	9,260,179.82	9,260,179.82	9,260,179.82	9,260,179.82	9,260,179.82	-	9,260,179.82	-	9,260,179.82	100.0%	100.0%	9,260,179.82
<b>Puerto México - Cárdenas</b>																	
278Y	40001018M (20)	HUMANA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	04/03/2011 - 31/07/2011	ANÁLISIS DE TALUDES DEL AM 200+000 AL KM 201+000 DEL CULMINO INDIENADO AUTOPISTA PUERTO MEXICO - LA CAROLINA	3,036,908.92	3,036,908.92	3,036,908.92	3,036,908.92	3,036,908.92	3,036,908.92	-	3,036,908.92	-	3,036,908.92	100.0%	100.0%	3,036,908.92
208Y	40001018N (20)	LIBERA SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	07/04/2011 - 26/02/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	33,120,837.87	33,120,837.87	33,120,837.87	33,120,837.87	33,120,837.87	33,120,837.87	-	33,120,837.87	-	33,120,837.87	100.0%	100.0%	3,178,477.89
208Y	40001018O (20)	HABILL, S.A DE C.V.	11/04/2011 - 26/02/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	20,317,668.02	20,317,668.02	20,317,668.02	20,317,668.02	20,317,668.02	20,317,668.02	-	20,317,668.02	-	20,317,668.02	100.0%	100.0%	2,031,569.03
132P	40001018P	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES TUDON, S.A.	14/07/2011 - 13/10/2011	PROYECTO DE ASOCIACION DE BANCOS DE EMERGENCIA UBICADA EN EL KM 229+000 DEL CULMINO INDIENADO AUTOPISTA PUERTO MEXICO - LA CAROLINA	606,000.26	606,000.26	606,000.26	606,000.26	606,000.26	606,000.26	-	606,000.26	-	606,000.26	100.0%	100.0%	606,000.26
<b>Cárdenas - Río Cárdenas</b>																	
308Y	40001018Q (20)	LIBERA SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	07/04/2011 - 14/03/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	16,560,416.94	16,560,416.94	16,560,416.94	16,560,416.94	16,560,416.94	16,560,416.94	-	16,560,416.94	-	16,560,416.94	100.0%	100.0%	1,112,465.96
318Y	40001018R (20)	LIBERA SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	07/04/2011 - 26/02/2011	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BLENDO POLIURETANO HIBRIDO HORIZONTAL Y HORIZONTALIZANTE, IMPERMEABILIZANTE Y REPARADOR EN LA AUTOPISTA	18,346,803.20	18,346,803.20	18,346,803.20	18,346,803.20	18,346,803.20	18,346,803.20	-	18,346,803.20	-	18,346,803.20	100.0%	100.0%	2,160,000.00



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A.	Programado Acumulado B.	Estimado Acumulado C.	Monto En Trámite D.	Saldo Cancelado E.	Diferencia B + C - D - E	Ejercicio a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance Financiero (%)		
Tijuana	\$ 13,796,390.00	\$ 10,246,451.74	\$ 10,246,451.74	\$ 10,246,451.74	\$ 10,246,378.24	\$ 73.50	\$		\$ 10,514,401.31	\$ 13,871.08	\$ 268,023.07	100.0%		
Culiacán	\$ 3,250,000.00	\$ 1,807,130.93	\$ 1,807,130.93	\$ 1,807,130.93	\$ 1,800,990.37	\$ 150.56			\$ 1,806,990.37	\$ 264,033.84		100.0%		
Querétaro	\$ 34,800,000.00	\$ 26,341,809.67	\$ 26,341,809.67	\$ 25,658,396.15	\$ 25,613,646.14	\$ 677.69	\$ 44,072.12		\$ 25,613,646.14	\$ 890.33		97.2%		
Cuernavaca	\$ 10,935,500.00	\$ 20,689,356.61	\$ 20,689,356.61	\$ 20,676,443.82	\$ 19,978,530.80	\$ 234,149.23	\$ 463,763.49		\$ 19,978,530.80	\$ 66,774.24		97.6%		
Puebla	\$ 6,085,000.00	\$ 16,925,650.48	\$ 15,941,726.62	\$ 13,755,151.97	\$ 11,537,365.42	\$ 1,612,848.05	\$ 44,915.41		\$ 11,537,365.42	\$ 18,740.20		75.9%		
Coahuila de Zaragoza	\$ 439,000.00	\$ 2,726,937.43	\$ 2,728,937.43	\$ 2,616,441.64	\$ 2,284,932.48	\$ 20.62			\$ 2,284,932.48	\$ 5,454.07		83.7%		
Veracruz	\$ 2,185,000.00	\$ 3,408,188.47	\$ 3,408,188.47	\$ 3,408,188.47	\$ 3,359,067.83	\$ 38,013.64	\$ 11,107.00		\$ 3,359,067.83	\$ 2,320.74		99.7%		
Reynosa												0.0%		
Guadalajara		\$ 1,685,420.36	\$ 1,685,420.36	\$ 1,685,420.36	\$ 1,137,690.71	\$ 547,729.65			\$ 1,137,690.71			100.0%		
Monterrey	\$ 10,042,500.00	\$ 9,065,404.51	\$ 9,065,404.51	\$ 9,065,404.51	\$ 9,003,176.37	\$ 62.89			\$ 9,029,794.64	\$ 33,414.46	\$ 26,616.27	99.3%		
Chiapas	\$ 3,680,000.00	\$ 2,101,640.10	\$ 2,101,640.10	\$ 2,101,640.10	\$ 2,101,640.10	\$			\$ 2,101,640.10			100.0%		
Oaxaca	\$ 15,250,000.00	\$ 5,452,374.15	\$ 5,452,374.15	\$ 5,452,374.15	\$ 5,452,311.39	\$ 62.76			\$ 5,596,390.00	\$ 50,065.01	\$ 144,078.61	100.0%		
Oficinas Centrales	\$ 8,000,000.00											0.0%		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 108,463,300.00</b>	<b>\$ 100,462,388.45</b>	<b>\$ 99,478,442.59</b>	<b>\$ 96,473,083.74</b>	<b>\$ 92,521,721.85</b>	<b>\$ 1,381,003.83</b>	<b>\$ 563,858.02</b>		<b>\$ 92,980,439.80</b>	<b>\$ 453,894.31</b>	<b>\$ 438,717.95</b>	<b>94.4%</b>		

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

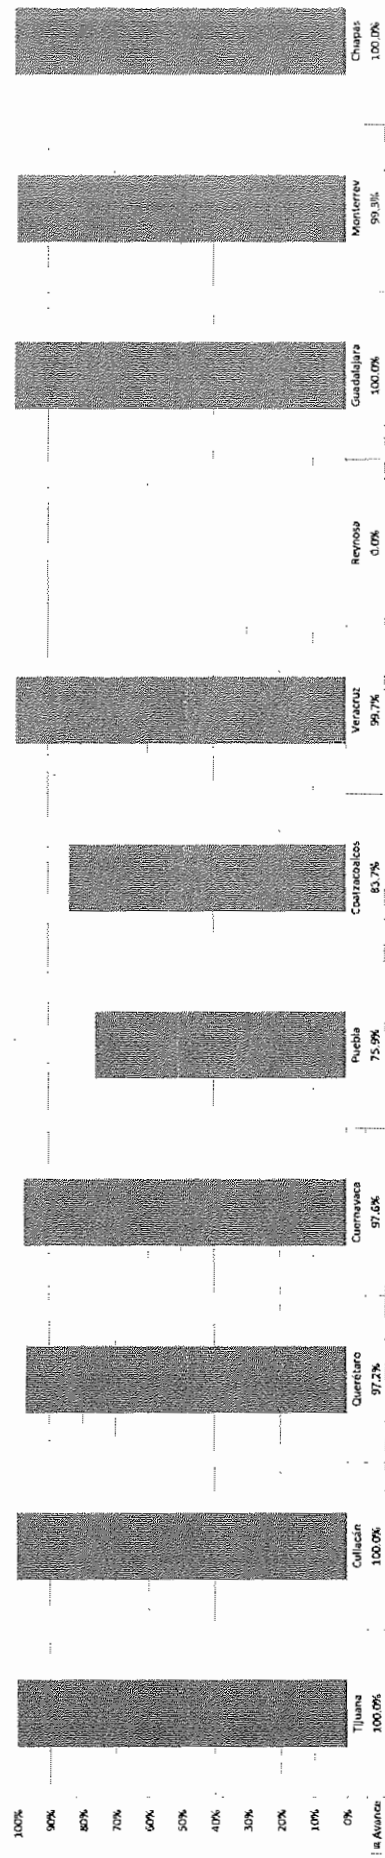

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. partida	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Cálculos Acumulados C	Monto Co. Tránsito O	Retenciones - Devoluciones	30000 Contratado E	Diferencia (E-C)-O	Ejecución - Ejemplo del Ejecutivo	Avance financiero (%)	
			Inicio	Fin													
<b>TLAJUAMA</b>																	
<b>Titular: -Estradas</b>																	
138Y	450010200	PAQUEN INGENIERIA S.A. DE C.V.	01/01/2011	01/03/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM. 9+500 AL KM. 30+000 AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA TLUJAMA - ENSENADA	13,666,000.00	9,772,200.01	9,772,200.01	0,772,200.01	0,772,200.01					0,000,000.00	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	1/05/2011	3/06/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM. 30+000 AL KM. 39+500 AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA TLUJAMA - ENSENADA		140,200.00	140,200.00	140,200.00	140,200.00		1.30			140,200.00	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					107,461.04	107,461.04	107,461.04	107,461.04		17.70			107,461.04	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					104,944.00	104,944.00	104,944.00	104,944.00		11.80			104,944.00	100.0%	
<b>LA BARRONERA - Toluca</b>																	
138C	450010206	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	1/05/2011	3/06/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ALUMBRADO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.		146,465.29	146,465.29	146,465.29	146,465.29		36.04			146,465.29	100.0%	
<b>Llano de San Juan del Guabo</b>																	
208Y	450010146	RODADQUIL CONSULTORES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	1/04/2011	7/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM. 10+000 AL KM. 10+200 DEL SENTIDO NOROCCIDENTAL	70,000.00	944,280.33	944,280.33	944,280.33	944,280.33		13,871.04			944,280.33	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	1/05/2011	3/06/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD DE ALUMBRADO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.		104,000.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00		11.70			104,000.00	100.0%	
<b>CUAJARCAM</b>																	
<b>Extraccion Don - Nogales</b>																	
238Y	450010141	PROFESIONISTAS LTDA. DE C.V.	01/01/2011	1/05/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PIEDRA, BACHILLO PROPIA, CARPETAS DE MEDIDA, ASFALTO DE 3 CM. Y CARPETAS DE ESPESOR EN TRAMOS POR DUEÑOS DEL TRAMO ESTACION DON - NAVOJOA, DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	3,294,000.00	877,317.80	877,317.80	877,317.80	877,317.80		264,603.84			877,317.80	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		27.34			102,400.00	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					135,000.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00		27.64			135,000.00	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		27.64			102,400.00	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		27.36			102,400.00	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		27.70			102,400.00	100.0%	
<b>CUAJARCAM</b>																	
<b>Chamela - Toluca</b>																	
438Y	450010226	AEC Y ASOCIADOS, S.A.	01/01/2011	1/05/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PIEDRA, BACHILLO PROPIA, CARPETAS DE MEDIDA, ASFALTO DE 3 CM. Y CARPETAS DE ESPESOR EN TRAMOS POR DUEÑOS DEL TRAMO ESTACION DON - NAVOJOA, DE LA CARRETERA FEDERAL EN EL ESTADO DE SONORA.	4,000,000.00	3,202,743.21	3,202,743.21	3,202,743.21	3,202,743.21		3,709,743.21			3,709,743.21	100.0%	
138C	450010209	COMATEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.					102,400.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		27.16			102,400.00	100.0%	
<b>Llano de San Juan del Guabo</b>																	
438Y	450010184	GESTION SIEMPRE CON SU TIEMPO GONSA TEGUI PARRA GONSA PARRA S.A. DE C.V.	1/01/2011	31/12/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL PAVIMENTO DEL KM. 6+000 AL KM. 30+000 AMBOS SENTIDOS DE LA AUTOPISTA TLUJAMA - ENSENADA		1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00					1,000,000.00	100.0%	



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Censado	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Licitado Acreditado	Monto En Trámite	Relaciones Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.D.J.	Ejecido a Flujos de Efectivo	Avance financiero (%)	Alistas de Cuentas Pagadas
			Inicio	Fin													
133C	450018296 (13)	COMSITEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	10/05/2011	31/03/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SOLIDIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,430.34			\$ 271.90	\$	\$ 104,430.34	100.0%	
<b>México - Quetzaco</b>																	
53MY	450018165 500004859	COMVAP, S.A. DE C.V.	27/05/2011	31/12/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL CARRILLO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 10+000 AL KM 14+000 AMBOS CUERPOS Y SEMALETAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL	\$ 74,500,000.00	\$ 11,110,356.70	\$ 11,110,356.70	\$ 10,431,140.18	\$ 10,300,727.79			\$	\$ 41,217.48	\$ 10,300,727.79	60.6%	
63MY	450018166 500004860	AUDIOSATONADO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	22/05/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL CARRILLO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 10+000 AL KM 14+000 AMBOS CUERPOS Y SEMALETAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL	\$ 3,400,000.00	\$ 3,708,450.70	\$ 3,708,450.70	\$ 3,708,450.70	\$ 3,708,450.70			\$	\$	\$ 3,708,450.70	100.0%	
73MY	450018173 500004872	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	10/04/2011	15/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA BACHEO ASFALTO, REHABILITACIONES Y REPARACIONES DE LA CARRETERA FEDERAL KM 10+000 AL KM 14+000 AMBOS CUERPOS Y SEMALETAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL	\$ 900,000.00	\$ 1,355,200.04	\$ 1,355,200.04	\$ 1,355,200.04	\$ 1,355,200.04		\$ 2,719.16	\$	\$	\$ 1,355,200.04	100.0%	
83MY	450018174 500004873	ASISOMA PROTECTOS AUDITORIA, S.A. DE C.V.	01/05/2011	14/12/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUSTITUCION DE MERCOCARPETA DEL CARRILLO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 10+000 AL KM 14+000 AMBOS CUERPOS Y SEMALETAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL	\$ 1,000,000.00	\$ 1,701,848.00	\$ 1,701,848.00	\$ 1,701,848.00	\$ 1,701,848.00			\$	\$	\$ 1,701,848.00	100.0%	
403MY	450017048	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	04/12/2011	02/09/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA PAVELADO DE LOSAS DE CONCRETO, INCLUIDE SELLADO Y CODO DE GRANITO, EN EL CARRILLO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 10+000 AL KM 14+000 AMBOS CUERPOS Y SEMALETAMIENTO HORIZONTAL VERTICAL	\$	\$ 1,701,848.02	\$ 1,701,848.02	\$ 1,701,848.02	\$ 1,748,110.15		\$ 3,019.49	\$	\$ 2,854.94	\$ 1,749,110.10	94.0%	
133C	450018299 500004882 (3)	COMSITEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	10/05/2011	03/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SOLIDIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD	\$	\$ 204,000.00	\$ 204,000.00	\$ 204,000.00	\$ 204,739.46			\$ 221.50	\$	\$ 204,739.46	100.0%	
<b>Quetzaco - Iturbide</b>																	
93MY	450018028	EFRAIN CASILLAS ESCAMILLA	20/03/2011	07/07/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA ASFALTO DEL KM 20+000 AL KM 10+1200 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA QUETZACO - ITURBIDE	\$ 500,000.00	\$ 400,067.40	\$ 400,067.40	\$ 400,067.40	\$ 400,057.40			\$	\$	\$ 400,057.40	100.0%	
903MY	450017032	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	08/11/2011	22/01/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA TRABAJOS DE PAVELADO Y BACHEO EN EL CARRILLO DE LA CARRETERA FEDERAL ENTRE LOS KM 0+100 Y 7+000 AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA, INCLUIDE SEMALETAMIENTO HORIZONTAL (PINTURA Y SPALETES)	\$	\$ 443,171.03	\$ 443,171.03	\$ 443,171.03	\$ 443,171.03			\$	\$	\$ 443,171.03	100.0%	
133C	450018299 (19)	COMSITEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	10/05/2011	06/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SOLIDIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD	\$	\$ 104,443.00	\$ 104,443.00	\$ 104,443.00	\$ 104,443.41			\$ 0.40	\$	\$ 104,443.41	100.0%	
113AC	450018299 (10)	COMSITEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	10/05/2011	03/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SOLIDIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD	\$	\$ 107,483.04	\$ 107,483.04	\$ 107,483.04	\$ 107,483.00			\$ 12.70	\$	\$ 107,483.00	100.0%	
<b>CUERNAVACA</b>																	
<b>México - Cuernavaca</b>																	
103MY	450018273 500004814	LAUBRA (CORO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14/05/2011	07/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE MICROCARPETA DE LA CAJETA DEL TILAPANCAL AL KM 20+000 DEL KM 50+000 AL KM 60+000 DEL CARRILLO DE LA CARRETERA FEDERAL KM 10+000 AL KM 14+000 AMBOS CUERPOS DE LA AUTOPISTA MEXICO - CUERNAVACA	\$ 2,401,000.00	\$ 3,000,100.11	\$ 3,000,100.11	\$ 3,000,100.11	\$ 3,000,100.11		\$ 22,483.00	\$	\$	\$ 3,000,100.11	100.0%	
133C	450018299 500004882 (2)	COMSITEL SUPERVISION, S.A. DE C.V.	10/05/2011	03/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SOLIDIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD	\$	\$ 204,000.00	\$ 204,000.00	\$ 204,000.00	\$ 204,504.17			\$ 8.79	\$	\$ 204,504.17	100.0%	



*[Handwritten signature]*





**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Actualización: 18 de Diciembre de 2012

No. Póliza	Comprobante - Asignación	Empresa	Periodo de Contrato		Causales	Monto Original Autorizado	Monto Reautorizado	Monto Comenzado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto E. Trámite	Reservaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia DC/CE	Ejecutado al final del Ejercicio	Avance Baseado en el Ejercicio (%)	
			Inicio	Fin													
125MY	460010601	CIMA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/02/2011	29/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 18+450 AL KM 18+500 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ 1,700,000.00	\$ 1,457,110.07	\$ 1,457,110.07	\$ 1,412,115.07	\$ 1,432,115.07				\$ 1,400,110.07	100.0%		
126MY	460010671	GESTION DE INGRESOS Y CONSULTORIA PARA LA OBRERA DE PULIDO, S.A. DE C.V.	01/02/2011	29/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ 3,000,000.00	\$ 3,340,060.24	\$ 3,340,060.24	\$ 3,340,060.24	\$ 3,340,060.24	\$ -	\$ 12,700.14			\$ 3,400,000.24	100.0%	
133MY	460010676	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011	29/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 16+000 AL KM 16+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ 1,270,000.00	\$ 1,060,015.04	\$ 1,060,015.04	\$ 1,106,016.04	\$ 1,106,016.04					\$ 1,106,016.04	100.0%	
143MY	460010634	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	29/10/2011	09/06/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ 441,000.00	\$ 603,070.70	\$ 603,070.70	\$ 603,070.70	\$ 603,070.70			\$ 146,036.61		\$ 506,037.09	100.0%	
153MY	460010638	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	29/10/2011	29/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 16+000 AL KM 16+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ 838,000.00	\$ 807,110.22	\$ 807,110.22	\$ 807,110.22	\$ 807,110.22			\$ 761,777.65		\$ 800,000.00	100.0%	
160MY	460010624	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011	29/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ 175,000.00	\$ 200,070.06	\$ 200,070.06	\$ 200,070.06	\$ 200,070.06					\$ 200,070.06	100.0%	
300MY	460010710	LABORATORIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/06/2011	29/07/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 18+450 AL KM 18+500 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 1,091,700.00	\$ 1,091,700.00	\$ 1,091,700.00	\$ 1,091,700.00					\$ 1,091,700.00	100.0%	
423MY	460010745	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	16/11/2011	10/07/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 18+450 AL KM 18+500 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 1,703,126.37	\$ 1,703,126.37	\$ 1,703,126.37	\$ 1,703,126.37					\$ 1,703,126.37	100.0%	
402MY	460010708	FOCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	28/11/2011	29/08/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 1,270,200.32	\$ 1,270,200.32	\$ 1,270,200.32	\$ 1,270,200.32			7.16		\$ 1,270,200.32	100.0%	
475MY	460010709	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	29/11/2011	29/06/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 601,043.00	\$ 601,043.00	\$ 601,043.00	\$ 601,043.00	\$ -	\$ 31,422.14			\$ 601,043.00	100.0%	
404MY	460010706	SOLOCOSOT, S.A. DE C.V.	29/11/2011	10/04/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 602,644.00	\$ 602,644.00	\$ 602,644.00	\$ 602,644.00					\$ 602,644.00	100.0%	
450MY	460010709	CONSEJO DE SUPERVISION Y AUDITIA, S.A. DE C.V.	16/01/2011	09/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 204,800.00	\$ 204,800.00	\$ 204,800.00	\$ 204,800.00			0.79		\$ 204,800.00	100.0%	
300SC	460010707	RESULTADOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	13/07/2011	09/10/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00	\$ 1,320,000.00					\$ 1,320,000.00	100.0%	
405SC	460010748	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	12/12/2011	29/09/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRERA ESTABILIZACION DEL TRAMO EN EL KM 20+000 AL KM 20+050 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO	\$ -	\$ 1,379,675.00	\$ 1,379,675.00	\$ 1,379,675.00	\$ 1,379,675.00					\$ 1,379,675.00	100.0%	
					<b>SUBTOTAL CANCELADO</b>	\$ 10,875,000.00	\$ 20,805,358.61	\$ 20,805,358.61	\$ 20,805,358.61	\$ 20,805,358.61	\$ -	\$ 65,714.28	\$ 20,148,224.33		\$ 20,805,358.61	100.0%	
					<b>SUBTOTAL EJECUTADO</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
					<b>SUBTOTAL</b>	\$ 10,875,000.00	\$ 20,805,358.61	\$ 20,805,358.61	\$ 20,805,358.61	\$ 20,805,358.61	\$ -	\$ 65,714.28	\$ 20,148,224.33		\$ 20,805,358.61	100.0%	

México - Puebla



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Ejecución: 31 de Diciembre de 2011

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Aprobado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto Cn. Tránsito D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercido a Fines de Ejercicio	Avance Monto Ejecutado Por	Alícuota de Costos Ingresos
			Inicio	Fin													
423MY	460017244	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES MEDICINA S.A DE CV	03/07/2011	10/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA.	\$ 2,292,251.11	\$ 2,292,251.11	\$ 2,292,251.11	\$ 2,292,251.11	\$ 2,170,195.95	\$ 189,055.16	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ 2,170,195.95	95.5%	
183SC	460017232 460004402 (4)	COMBITES SUPERVISION, S.A DE CV	10/07/2011	03/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SITIO CENTRAL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 113,000.29	\$ 113,000.29	\$ 113,000.29	\$ 113,000.29	\$ 113,000.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 113,000.29	100.0%	
193MY	460016444	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISION, S.A DE CV	01/06/2011	20/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUATEMALA.	\$ 1,320,000.00	\$ 1,240,370.36	\$ 1,240,370.36	\$ 1,240,370.36	\$ 1,210,020.07	\$ -	\$ -	\$ 87,490.01	\$ -	\$ 1,210,020.07	100.0%	
183SC	460016289 (19)	COMBITES SUPERVISION, S.A DE CV	10/07/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SITIO CENTRAL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 101,004.00	\$ 101,004.00	\$ 101,004.00	\$ 101,004.00	\$ 101,004.00	\$ -	\$ -	\$ 0.70	\$ -	\$ 101,004.00	100.0%	
413MY	460018076 460004976	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES MEDICINA S.A DE CV	11/11/2011	20/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUATEMALA.	\$ 7,440,868.20	\$ 7,440,868.20	\$ 7,440,868.20	\$ 7,440,868.20	\$ 5,917,953.02	\$ 1,142,147.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,817,405.80	64.7%	
423SC	460018186	COMBITES SUPERVISION, S.A DE CV	01/06/2011	01/06/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUATEMALA.	\$ 1,210,208.71	\$ 1,210,208.71	\$ 1,210,208.71	\$ 499,598.07	\$ -	\$ 381,549.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,816.40	\$ -	
COATZACOCHUCO					<b>SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUATEMALA.</b>	\$ 8,651,076.40	\$ 8,651,076.40	\$ 8,651,076.40	\$ 8,651,076.40	\$ 6,937,906.02	\$ 1,512,147.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,864,211.20	56.1%	
183SC	460018296 (21)	LABORATORIO DE INVESTIGACIONES MEDICINA S.A DE CV	10/07/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SITIO CENTRAL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 90,667.90	\$ 90,667.90	\$ 90,667.90	\$ 90,667.90	\$ 60,351.04	\$ -	\$ -	\$ 6.68	\$ -	\$ 60,351.04	66.6%	
423MY	460017149 460004671	RAIL VOLCANI UROXCO Y CIA S.A DE CV	10/07/2011	03/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUATEMALA.	\$ 2,014,282.74	\$ 2,014,282.74	\$ 2,014,282.74	\$ 1,801,762.11	\$ 1,570,296.41	\$ 333,608.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,570,296.41	78.0%	
183SC	460018296 (22)	COMBITES SUPERVISION, S.A DE CV	10/07/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SITIO CENTRAL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ 30,504.00	\$ -	\$ -	\$ 0.07	\$ -	\$ 30,504.00	100.0%	
223MY	460018101	PROYECTO CIVIL INTERNACIONAL S.A DE CV	10/07/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO Y REPOSICION DE CARPETA DEL 50% DEL CARRILLO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUATEMALA.	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ 433,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 433,300.00	100.0%	
183SC	460018296 (19)	COMBITES SUPERVISION, S.A DE CV	10/07/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL SITIO CENTRAL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 101,007.90	\$ 101,007.90	\$ 101,007.90	\$ 101,007.90	\$ 101,007.90	\$ -	\$ -	\$ 9.89	\$ -	\$ 101,007.90	100.0%	
VERACRUZ					<b>SUMATORIAL CONTRATACIONES</b>	\$ 499,600.90	\$ 499,600.90	\$ 499,600.90	\$ 499,600.90	\$ 333,608.74	\$ 333,608.74	\$ -	\$ 20.02	\$ -	\$ 333,608.74	67.0%	



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA REO DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

13/03/2012 - 11 de Diciembre de 2012

No. Póliza	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Capitalizado	Monto Programado	Estimado Acreditado	Monto En Trámite	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.D.C.	Ejercido al Ejepto de Efectivo	Avance financiero (%)	Alcance de Cobertura Programada
			Inicio	Fin												
<b>Col. Merida - Córdoba</b>																
19SC	400010200 (P)	COMETEC SUPERVISION, S.A. DE C.V.	18/05/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 0.70	\$ -	\$ 10,000.00	100.0%	
<b>Coahuila - Veracruz</b>																
23MY	400010207	CONSTRUCCIONES NOMANUEH, S.A. DE C.V.	24/07/2011	03/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 1,304,100.00	\$ 1,304,100.00	\$ 1,304,100.00	\$ 1,304,100.00	\$ -	\$ 1,072.50	\$ 0.03	\$ -	\$ 1,304,100.00	100.0%	
19SC	400010206 (P)	COMETEC SUPERVISION, S.A. DE C.V.	18/05/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 80,507.00	\$ 80,507.00	\$ 80,507.00	\$ 80,507.00	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -	\$ 80,507.00	100.0%	
<b>La Tuzac - Ciudad Juárez</b>																
24MY	400010202	PACCOA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	10/02/2011	27/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 700,000.00	\$ 711,148.44	\$ -	\$ -	\$ 37,000.15	\$ -	\$ 711,148.44	100.0%	
37SC	400010202 000004877	ONALO CONSTRUCCIONALES, S.A. DE C.V.	10/09/2011	13/02/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 504,507.01	\$ 504,507.01	\$ 504,507.01	\$ 504,507.01	\$ -	\$ 2,000.27	\$ -	\$ -	\$ 504,507.01	100.0%	
19SC	400010200 000004882 (P)	COMETEC SUPERVISION, S.A. DE C.V.	18/05/2011	03/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 247,324.80	\$ 247,324.80	\$ 247,324.80	\$ 206,211.01	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ 11,107.00	\$ 206,211.01	80.0%	
<b>Coahuila - Tlaxcala</b>																
38SC	400010204	ONALO CONSTRUCCIONALES, S.A. DE C.V.	01/06/2011	14/07/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 244,700.00	\$ 244,700.00	\$ 244,700.00	\$ 244,700.00	\$ -	\$ 1,100.27	\$ -	\$ -	\$ 244,700.00	100.0%	
<b>Guadalajara</b>																
<b>Coahuila - Tlaxcala</b>																
19SC	400010200 (P)	COMETEC SUPERVISION, S.A. DE C.V.	18/05/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 107,400.04	\$ 107,400.04	\$ 107,400.04	\$ 107,400.00	\$ -	\$ -	\$ 12.76	\$ -	\$ 107,400.00	100.0%	
<b>Pachuca - Veracruz</b>																
61MY	400010200	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/12/2011	03/02/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 1,413,201.02	\$ 1,413,201.02	\$ 1,413,201.02	\$ 800,041.40	\$ -	\$ -	\$ 547,710.33	\$ -	\$ 800,041.40	100.0%	
<b>Uruapan - Morelia - Jalisco</b>																
19SC	400010200 (P)	COMETEC SUPERVISION, S.A. DE C.V.	18/05/2011	30/09/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD CARRETERA (PSC), MEDIANTE ACCIONES DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y VERIFICACION DE CALIDAD.	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ 104,000.00	\$ -	\$ -	\$ 0.74	\$ -	\$ 104,000.00	100.0%	
<b>TOTAL GENERAL</b>																
						\$ 3,408,198.07	\$ 3,408,198.07	\$ 3,408,198.07	\$ 3,239,070.01	\$ -	\$ 2,228.74	\$ 38,033.08	\$ -	\$ 3,280,070.83	97.7%	

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Norma del Comité de Vigilancia No. 011-2011

No. Partida	Concepto No.	Empresa	Inicio del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Monto Ejecutado C	Monto Ejecutado en Efectivo	Avance Financiero (%)	Alícuota de Cobertura
			Inicio	Fin									
<b>MONTENEGRO - Nueva Luperón</b>													
253MY	40001004	INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - SELLADO DE JUNTAS EN LOCOS DE CARRILES TO HIDRALUCO, KM 133+750 AL KM 133+750+100 Y SELLADO DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	13/05/2011	\$ 752,000.00	\$ 740,724.80	\$ 740,724.80	\$ 240,724.80	\$ 740,724.80	\$ 740,724.80	\$ 740,724.80	100.0%	
153C	40001029	COMERCIAL SUPERVISION Y VERIFICACION DE CALIDAD	1/05/2011	30/05/2011	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%	
<b>Nantico - Totonicapán</b>													
263MY	40001045	INGENIERIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	11/11/2011	\$ 3,000,000.00	\$ 1,500,724.24	\$ 1,500,724.24	\$ 1,480,724.24	\$ 1,500,724.24	\$ 1,500,724.24	\$ 1,500,724.24	100.0%	
153C	40001029	COMERCIAL SUPERVISION Y VERIFICACION DE CALIDAD	10/05/2011	30/05/2011	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%	
<b>Puerto Barrios - Cobanense</b>													
273MY	40001041	SERVICIOS TECNICO Y CONSULTORIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	14/05/2011	\$ 200,000.00	\$ 243,249.02	\$ 243,249.02	\$ 243,249.02	\$ 243,249.02	\$ 243,249.02	\$ 243,249.02	100.0%	
283MY	40001040	PROFESIONISTAS EN SUPERVISION Y VERIFICACION DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	04/11/2011	\$ 1,395,000.00	\$ 1,344,529.92	\$ 1,344,529.92	\$ 1,344,529.92	\$ 1,344,529.92	\$ 1,344,529.92	\$ 1,344,529.92	100.0%	
293MY	40001029	COMERCIAL SUPERVISION Y VERIFICACION DE CALIDAD	11/05/2011	04/11/2011	\$ 1,017,000.00	\$ 987,486.70	\$ 987,486.70	\$ 987,486.70	\$ 987,486.70	\$ 987,486.70	\$ 987,486.70	100.0%	
<b>Cobanense - Ok - Cobanense</b>													
303MY	40001046	SERVICIOS TECNICO Y CONSULTORIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	27/05/2011	\$ 740,000.00	\$ 664,700.78	\$ 664,700.78	\$ 664,700.78	\$ 664,700.78	\$ 664,700.78	\$ 664,700.78	100.0%	
313MY	40001047	SERVICIOS TECNICO Y CONSULTORIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	07/05/2011	\$ 910,000.00	\$ 407,784.67	\$ 407,784.67	\$ 407,784.67	\$ 407,784.67	\$ 407,784.67	\$ 407,784.67	100.0%	
<b>Cobanense - Huepeque</b>													
443MY	40001047	SERVICIOS TECNICO Y CONSULTORIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	02/05/2011	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%	
443MY	60001044	SERVICIOS TECNICO Y CONSULTORIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	02/05/2011	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%	
<b>Cobanense - Cobanense</b>													
323MY	40001045	SERVICIOS TECNICO Y CONSULTORIA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA DEL TRAMO LA CUCHILLA - MATAMOROS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN CANTONERA DE LA AUTOPISTA CARRETERA CAJALUTAN-VALLE DE LA PASADURA	01/05/2011	02/05/2011	\$ 2,245,000.00	\$ 1,650,300.14	\$ 1,650,300.14	\$ 1,650,300.14	\$ 1,650,300.14	\$ 1,650,300.14	\$ 1,650,300.14	100.0%	
153C	40001029	COMERCIAL SUPERVISION Y VERIFICACION DE CALIDAD	10/05/2011	30/05/2011	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.0%	
<b>TOTAL</b>													
						\$ 6,652,000.00	\$ 3,856,460.10	\$ 3,856,460.10	\$ 3,856,460.10	\$ 3,856,460.10	\$ 3,856,460.10	59.3%	

03 0271

Handwritten signature or mark.





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Modelo de contrato de obra Civil 2011-01-02

No. Contrato No. Puntaje	Contratante No.	Empresa	Periodo de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Culminado Acumulado	Monto En Tratamiento	Reservaciones - Depreciaciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.O.C.	Herencia a Flujo de efectivo	Monto Financiero (%)	Alcance de Cobertura Puntaje
			Inicio	Fin													
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
15SC	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
<b>TOTAL OBRAS</b>																	
						\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%	

OBRAS

No. Contrato No. Puntaje	Contratante No.	Empresa	Periodo de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Culminado Acumulado	Monto En Tratamiento	Reservaciones - Depreciaciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.O.C.	Herencia a Flujo de efectivo	Monto Financiero (%)	Alcance de Cobertura Puntaje
			Inicio	Fin													
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
313MY	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
15SC	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
15SC	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
15SC	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	07/05/2011	20/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA EN ENTRE LOS CRUZES Y EL DUL, 40+000 AL KM. 41+000 CONSTRUIDA COMO LA ZONA PANAMONDA DEL C.D. LAS CHIMPAZAS - HONDURAS - COCOPONAUTA	\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%		
<b>TOTAL OBRAS</b>																	
						\$ 2,740,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,080,000.00			\$	\$	100.0%	

OBRAS CENTRALES

No. Contrato No. Puntaje	Contratante No.	Empresa	Periodo de Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Culminado Acumulado	Monto En Tratamiento	Reservaciones - Depreciaciones	Saldo Cancelado	Diferencia D.C.O.C.	Herencia a Flujo de efectivo	Monto Financiero (%)	Alcance de Cobertura Puntaje
			Inicio	Fin													
15SC	460010246	CONSTRUCION CONTROL S.A.	19/05/2011	20/05/2011	LOS MONEDOS DE CADA POSICION EN EL CONTRATO ESTAN DISTRIBUIDOS SEGUN LA DELEGACION Y FRAMO QUE CORRESPONDA.	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			\$	\$	100.0%		
<b>TOTAL OBRAS</b>																	
						\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00			\$	\$	100.0%	





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA


RESUMEN DEL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal					
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Saldo Conocido E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Cuentas Pagadas	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
Tijuana	\$ 26,300,000.00	\$ 24,824,273.54	\$ 24,824,273.54	\$ 24,824,273.54	\$ 24,824,235.81	\$ 37.73		\$ 24,824,235.81			100.0%	100.0%
Culiacán	\$ 30,000,000.00	\$ 21,329,378.38	\$ 21,329,378.38	\$ 21,329,378.38	\$ 21,329,378.03	0.35		\$ 22,475,802.08		\$ 1,146,424.05	100.0%	100.0%
Querétaro	\$ 53,000,000.00	\$ 52,656,413.35	\$ 52,656,413.35	\$ 52,656,413.35	\$ 52,655,864.66	548.69		\$ 55,449,666.66		\$ 2,793,204.00	100.0%	100.0%
Cuernavaca	\$ 63,800,000.00	\$ 68,030,347.96	\$ 68,030,347.96	\$ 68,030,347.96	\$ 68,028,399.10	1,948.86		\$ 68,765,420.37	\$ 1,544.49	\$ 737,021.87	100.0%	100.0%
Puebla	\$ 36,100,000.00	\$ 38,062,985.99	\$ 38,062,985.99	\$ 38,062,985.99	\$ 38,057,920.37	65.62		\$ 39,352,290.21	0.00	\$ 1,289,369.84	100.0%	100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 43,800,000.00	\$ 42,550,392.86	\$ 42,550,392.86	\$ 42,550,392.86	\$ 42,550,381.69	11.17		\$ 43,781,658.28	\$ 6,917.40	\$ 1,231,276.59	100.0%	100.0%
Veracruz	\$ 40,000,000.00	\$ 46,234,339.29	\$ 46,234,339.29	\$ 46,234,339.29	\$ 46,234,269.84	69.45		\$ 47,861,263.52	\$ 126,595.29	\$ 1,626,993.04	100.0%	100.0%
Reynosa	\$ 4,700,000.00	\$ 4,215,993.57	\$ 4,215,993.57	\$ 4,215,993.57	\$ 4,215,849.55	144.02		\$ 4,215,849.55			100.0%	100.0%
Guadaluajara	\$ 60,000,000.00	\$ 53,735,360.25	\$ 53,735,360.25	\$ 53,735,360.25	\$ 53,141,626.66	593,733.59		\$ 56,162,640.08	\$ 55,855.96	\$ 3,021,013.42	100.0%	100.0%
Monterrey	\$ 60,700,000.00	\$ 76,575,285.71	\$ 76,575,285.71	\$ 76,575,285.71	\$ 76,575,031.63	254.08		\$ 77,587,766.46		\$ 1,012,734.83	100.0%	100.0%
Chiapas	\$ 25,000,000.00	\$ 30,153,736.37	\$ 30,153,736.37	\$ 30,153,736.37	\$ 18,757,510.11	11,436,226.26		\$ 19,604,597.59	\$ 166,512.52	\$ 847,087.47	100.0%	100.0%
Oaxaca	\$ 28,500,000.00	\$ 26,315,770.96	\$ 26,315,770.96	\$ 26,315,770.96	\$ 26,315,747.29	23.67		\$ 27,238,866.58	\$ 385,968.84	\$ 923,119.20	100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 473,800,000.00	\$ 484,724,278.23	\$ 484,724,278.23	\$ 484,724,278.23	\$ 472,691,214.74	\$ 12,033,063.49		\$ 487,319,459.78	\$ 743,398.50	\$ 14,628,245.04	100.0%	100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

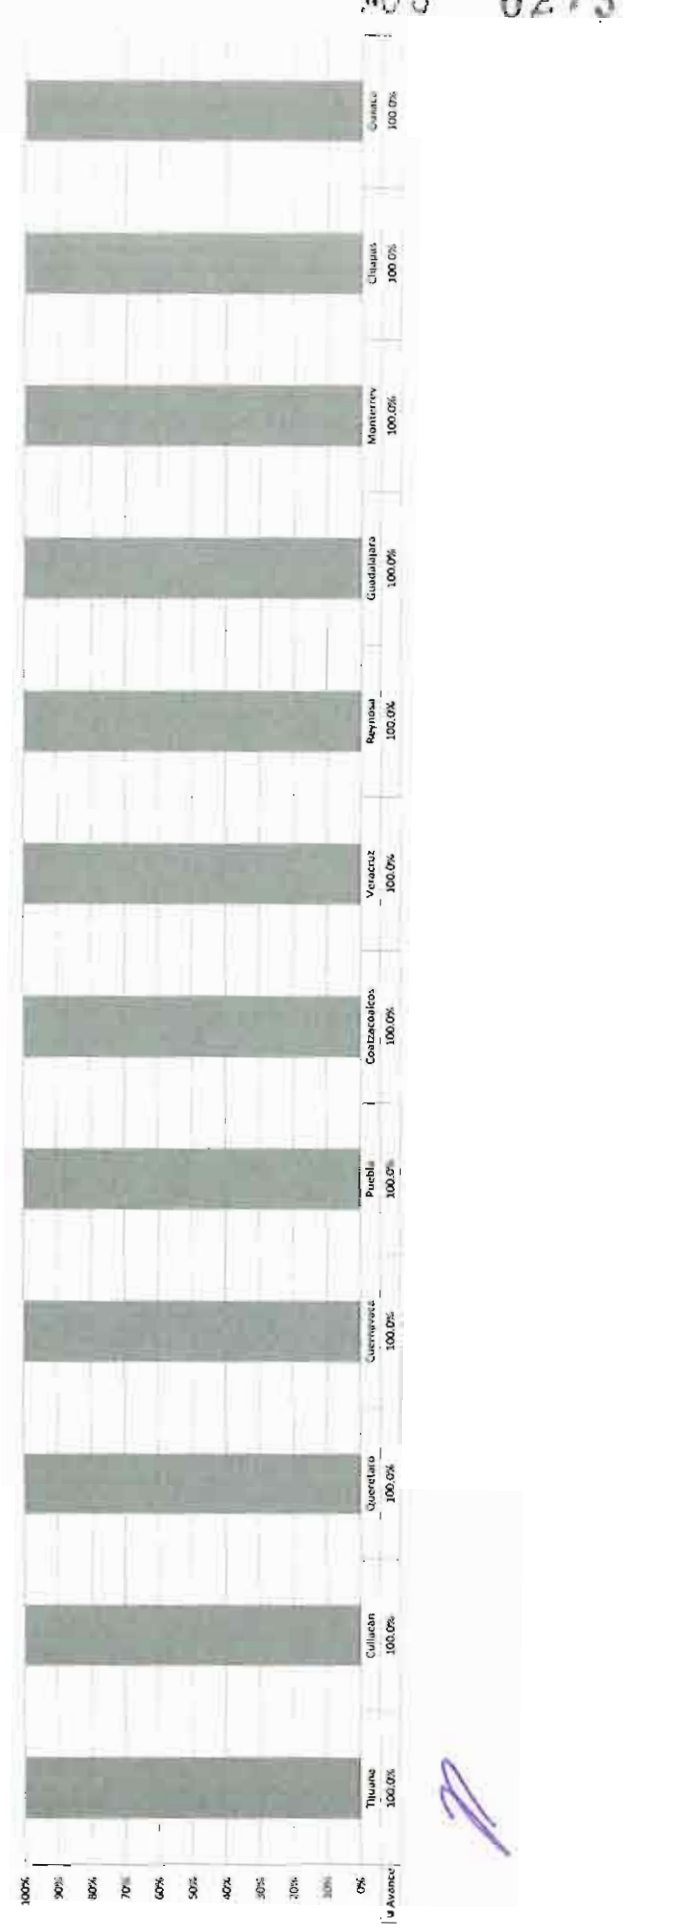

Handwritten signature or mark.

000 0273



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MEMOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

14 de febrero de 2011, 11:46 AM, 01/01/2011

No. Puesto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Anticipado Solicitado	Monto Comprometido A	Monto Programado B	Cálculo Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Comisiones E	Ratio Cancelado C	Diferencia D-C	Ejercicio Plazo al Ejercicio	Avance (Numerario) (%)	Avance Físico (%)	Ajuste de Costos Programados
			Inicio	Fin														
<b>7. GUANAJUATO</b>																		
<b>Y. Ruta - Camarero</b>																		
10M	40001027	CONSTRUCCION DEL MONO Y SUELO PARA EL PASAJE DE LA AUTOPISTA (CUBIERTA) S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA (CUBIERTA) S.A. DE C.V.	17,000,000.00	17,076,803.43	17,976,000.00	17,976,000.00	17,976,000.00	17,976,000.00	0.00	111.5	76,803.43	17,976,000.00	100.0%	100.0%	
20M	40001024	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA (CUBIERTA) S.A. DE C.V.	7,000,000.00	6,420,107.04	6,420,107.04	6,420,107.04	6,420,107.04	6,420,107.04	0.00	91.7	-579,892.96	6,420,107.04	100.0%	100.0%	
<b>8. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
30M	40001029	CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	1,800,000.00	1,422,002.57	1,422,002.57	1,422,002.57	1,422,002.57	1,422,002.57	0.00	78.9	-377,997.43	1,422,002.57	100.0%	100.0%	
<b>9. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
40M	40001022	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	100.0	0.00	7,100,000.00	100.0%	100.0%	
50M	40001021	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	7,000,000.00	6,977,919.29	6,977,919.29	6,977,919.29	6,977,919.29	6,977,919.29	0.00	99.8	-22,080.71	6,977,919.29	100.0%	100.0%	
60M	40001023	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	7,100,000.00	0.00	100.0	0.00	7,100,000.00	100.0%	100.0%	
<b>10. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
70M	40001006	GRUPO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	6,000,000.00	5,147,406.92	5,147,406.92	5,147,406.92	5,147,406.92	5,147,406.92	0.00	85.8	-852,593.08	5,147,406.92	100.0%	100.0%	
80M	40001007	GRUPO DE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	6,000,000.00	7,601,522.04	7,601,522.04	7,601,522.04	7,601,522.04	7,601,522.04	0.00	126.7	1,601,522.04	7,601,522.04	100.0%	100.0%	
<b>11. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
90M	40001025	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	30,000,000.00	19,312,802.90	19,312,802.90	19,312,802.90	19,312,802.90	19,312,802.90	0.00	64.4	-10,687,197.10	19,312,802.90	100.0%	100.0%	
100M	40001026	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	11,500,000.00	0.00	100.0	0.00	11,500,000.00	100.0%	100.0%	
<b>12. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
110M	40001028	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERETARO - PUEBLA	10,000,000.00	9,602,251.72	9,602,251.72	9,602,251.72	9,602,251.72	9,602,251.72	0.00	96.0	-397,748.28	9,602,251.72	100.0%	100.0%	
<b>13. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
120M	40001029	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERETARO - PUEBLA	10,000,000.00	11,024,310.17	11,024,310.17	11,024,310.17	11,024,310.17	11,024,310.17	0.00	110.2	1,024,310.17	11,024,310.17	100.0%	100.0%	
<b>14. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
130M	40001004	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL URBANIZADO DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	7,000,000.00	2,000,166.20	2,000,166.20	2,000,166.20	2,000,166.20	2,000,166.20	0.00	28.6	-4,999,833.80	2,000,166.20	100.0%	100.0%	
<b>15. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
140M	40001024	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERETARO - PUEBLA	10,000,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	103.0	300,000.00	10,300,000.00	100.0%	100.0%	
150M	40001027	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERETARO - PUEBLA	10,000,000.00	12,431,300.84	12,431,300.84	12,431,300.84	12,431,300.84	12,431,300.84	0.00	124.3	2,431,300.84	12,431,300.84	100.0%	100.0%	
160M	40001028	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERETARO - PUEBLA	10,000,000.00	11,306,246.69	11,306,246.69	11,306,246.69	11,306,246.69	11,306,246.69	0.00	113.1	1,306,246.69	11,306,246.69	100.0%	100.0%	
170M	40001029	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERETARO - PUEBLA	10,000,000.00	8,897,748.07	8,897,748.07	8,897,748.07	8,897,748.07	8,897,748.07	0.00	89.0	-1,102,251.93	8,897,748.07	100.0%	100.0%	
<b>16. GUANAJUATO - Toluca</b>																		
180M	40001006	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	100.0	0.00	4,800,000.00	100.0%	100.0%	
190M	40001007	CONSTRUCCION ANEXA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DEL PASAJE DE LA AUTOPISTA S.A. DE C.V.	4,200,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	4,620,000.00	0.00	110.0	420,000.00	4,620,000.00	100.0%	100.0%	

2



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proceso	Centro de Costos	Empresa	Periodo del Contrato	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Efectivo Autorizado C	Monto En Trámite D	Remisiones - Devoluciones	Saldo Contratado E	Diferencia D-C-D-E	Estado a Fines de Ejercicio	Amort. (Financiamiento) (%)	Amort. (Fondo) (%)	Alcance de Cobertura	
<b>Zapopan - Rancho Viejo</b>																		
218N	48001609	HEC S DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	01/07/2011	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	1,700,000.00	1,701,404.07	1,701,404.07	1,701,404.07	1,701,404.07	1,701,404.07	-	36.06	-	1,701,404.07	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Sancti Spiritus - Tancitaro</b>																		
228N	48001609	HEC S DE INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	01/07/2011	MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2,100,000.00	1,958,198.87	1,958,198.87	1,958,198.87	1,958,198.87	1,958,198.87	-	1.20	-	1,958,198.87	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>PUEBLA</b>																		
<b>México - Puebla</b>																		
238N	48001609	CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	12,619,060.62	12,619,060.62	12,619,060.62	12,619,060.62	12,619,060.62	12,619,060.62	-	11.38	-	12,619,060.62	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
248N	48001609	CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	9,624,103.12	9,624,103.12	9,624,103.12	9,624,103.12	9,624,103.12	9,624,103.12	-	9.19	-	9,624,103.12	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Puebla - Aguaferrada</b>																		
258N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6,000,000.00	7,442,074.40	7,442,074.40	7,442,074.40	7,442,074.40	7,442,074.40	-	48.00	-	7,442,074.40	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Aguaferrada - Col. Mexicana</b>																		
268N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	9,400,000.00	8,400,787.89	8,400,787.89	8,400,787.89	8,400,787.89	8,400,787.89	-	-	-	8,400,787.89	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Coahuila - Guadalupe</b>																		
278N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6,000,000.00	6,023,970.22	6,023,970.22	6,023,970.22	6,023,970.22	6,023,970.22	-	0.02	-	6,023,970.22	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>La Tlaxiela - Coahuila - (Financiamiento)</b>																		
288N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10,000,000.00	12,275,613.72	12,275,613.72	12,275,613.72	12,275,613.72	12,275,613.72	-	9.97	-	12,275,613.72	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Aguaferrada - Coahuila - (Financiamiento)</b>																		
298N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	10,000,000.00	8,709,021.97	8,709,021.97	8,709,021.97	8,709,021.97	8,709,021.97	-	11.10	-	8,709,021.97	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Sancti Spiritus - Coahuila</b>																		
308N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	12,000,000.00	10,985,897.77	10,985,897.77	10,985,897.77	10,985,897.77	10,985,897.77	-	-	-	10,985,897.77	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Nuevo Laredo - La Ventosa</b>																		
318N	48001609	TECNOLOGIA EN RECURSOS HUMANOS Y SISTEMAS DE INFORMACION S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6,000,000.00	4,667,121.18	4,667,121.18	4,667,121.18	4,667,121.18	4,667,121.18	-	-	-	4,667,121.18	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Veracruz</b>																		
<b>Col. Mendocino - Córdoba</b>																		
328N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6,000,000.00	10,708,008.20	10,708,008.20	10,708,008.20	10,708,008.20	10,708,008.20	-	9.40	-	10,708,008.20	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Coahuila - Veracruz</b>																		
338N	48001609	MELI CONSTRUCCIONES CIVILES Y SISTEMAS DE INFORMACION S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	11,600,000.00	12,862,815.87	12,862,815.87	12,862,815.87	12,862,815.87	12,862,815.87	-	97.42	-	12,862,815.87	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>La Tlaxiela - Col. Méjico</b>																		
348N	48001609	GRUPO CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	12,600,000.00	14,007,728.17	14,007,728.17	14,007,728.17	14,007,728.17	14,007,728.17	-	69.00	-	14,007,728.17	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Coahuila - Veracruz</b>																		
358N	48001609	PROYECTOS Y SISTEMAS DE INFORMACION S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	6,000,000.00	6,668,180.21	6,668,180.21	6,668,180.21	6,668,180.21	6,668,180.21	-	-	-	6,668,180.21	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>Sancti Spiritus - Tancitaro</b>																		
368N	48001609	CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	2,000,000.00	2,275,860.71	2,275,860.71	2,275,860.71	2,275,860.71	2,275,860.71	-	-	-	2,275,860.71	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>México - Méjico</b>																		
378N	48001609	CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	4,700,000.00	4,215,903.07	4,215,903.07	4,215,903.07	4,215,903.07	4,215,903.07	-	14.02	-	4,215,903.07	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	
<b>México - Méjico</b>																		
388N	48001609	CONSTRUCTORA MAUREL S.A. DE CV	01/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DEL NOROCCIDENTE DE LA ZONA DE LA SIERRA DE SAN JUAN DE LOS RIOS	4,700,000.00	4,215,903.07	4,215,903.07	4,215,903.07	4,215,903.07	4,215,903.07	-	14.02	-	4,215,903.07	100.0%	100.0%	Alcance de Cobertura	

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Perfil	Contrato No.	Empresa	Modalidad del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A.	Monto Programado B.	Ejercicio Autorizado C.	Monto Ej. y Fideicomiso D.	Mantenimiento - Desaglomeración	Servicio Cancelado E.	Diferencia DAC-DLE	Ejercicio a Fideicomiso de Ejercicio	Amortización Residual (F)	Amortización por Programa (G)
			Inicio	Fin													
<b>GUADALAJARA</b>																	
<b>Operatividad - Toluca</b>																	
344H	430018150	SOY Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANIL, S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TOLUCA DEL KM 0+000 AL KM 8+000	17,000,000.00	7,662,021.02	7,662,021.02	7,662,021.02	7,662,021.02	-	7,662,021.02	7,662,021.02	-	6,090,144.43	100.0%	3,106,122.04
344H	430018151	CONSTRUCTORA SIMBA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TOLUCA DEL KM 8+000 AL KM 15+400	17,000,000.00	9,603,076.93	9,603,076.93	9,603,076.93	9,603,076.93	-	9,603,076.93	9,603,076.93	-	8,114,270.02	100.0%	3,116,044.89
<b>Nombre Ruta - Lázaro Cárdenas</b>																	
404H	430018156	RECOMENDOS LIZARDI Y EQUIPOS PARA SOLVITA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA SOLVITA - LAZARO CARDENAS	21,500,000.00	20,948,088.77	20,948,088.77	20,948,088.77	20,948,088.77	-	20,948,088.77	20,948,088.77	-	21,867,109.16	100.0%	1,943,192.20
<b>Uruapan - Nueva Italia</b>																	
414H	430018157	CONTRATISTAS CIVILES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA URUAPAN - NUEVA ITALIA	12,000,000.00	8,227,978.37	8,227,978.37	8,227,978.37	8,227,978.37	-	8,227,978.37	8,227,978.37	-	9,136,274.01	100.0%	491,124.29
<b>PALMIRAS - Uruapan</b>																	
434H	430018154	GRUPO CONSTRUCTORA MEXICANA DEL COMPLEJO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA URUAPAN - PALMIRAS	10,000,000.00	10,202,862.89	10,202,862.89	10,202,862.89	10,202,862.89	-	10,202,862.89	10,202,862.89	-	10,202,862.89	100.0%	501,048.89
<b>MONTERRREY</b>																	
<b>Montecitorio - Nuevo Laredo</b>																	
444H	430018155	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MONTERRREY - NUEVO LAREDO DEL KM 0+000 AL KM 10+000	12,000,000.00	10,446,033.31	10,446,033.31	10,446,033.31	10,446,033.31	-	10,446,033.31	10,446,033.31	-	10,818,038.99	100.0%	372,980.39
<b>Coahuila - Saltillo</b>																	
444H	430018158	CONSTRUCTORA MAYNAN DEL SAN PEDRO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA SAN PEDRO - COAHUILA DEL KM 0+000 AL KM 3+000	11,500,000.00	11,700,202.90	11,700,202.90	11,700,202.90	11,700,202.90	-	11,700,202.90	11,700,202.90	-	12,257,231.46	100.0%	501,048.89
<b>Coahuila - Obispos</b>																	
454H	430018158	CONSTRUCION ELOS OMBRA INSUREC	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA COAHUILA - OBISPOS DEL KM 0+000 AL KM 21+000	4,300,000.00	3,700,324.40	3,700,324.40	3,700,324.40	3,700,324.40	-	3,700,324.40	3,700,324.40	-	3,700,324.40	100.0%	138,700.47
<b>Coahuila - Pánuco - Coahuila</b>																	
464H	430018152	CONSTRUCION DEL LA MACDONALDA D.C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA PANUCO - COAHUILA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	13,000,000.00	12,426,187.46	12,426,187.46	12,426,187.46	12,426,187.46	-	12,426,187.46	12,426,187.46	-	12,426,187.46	100.0%	501,048.89
<b>Coahuila - Saltillo - Coahuila</b>																	
474H	430018159	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA SALTILO - COAHUILA DEL KM 0+000 AL KM 20+000	11,600,000.00	11,495,140.26	11,495,140.26	11,495,140.26	11,495,140.26	-	11,495,140.26	11,495,140.26	-	11,994,410.36	100.0%	499,270.10
<b>Puerto Mexico - Coahuila</b>																	
484H	430018156	TORCA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - COAHUILA DEL KM 0+000 AL KM 20+000	7,300,000.00	7,301,827.62	7,301,827.62	7,301,827.62	7,301,827.62	-	7,301,827.62	7,301,827.62	-	7,301,827.62	100.0%	138,700.47
<b>Durango - Mexicali</b>																	
544H	430018158	CONSTRUCTORA MAYNAN DEL SAN PEDRO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DURANGO - MEXICALI DEL KM 0+000 AL KM 10+000	19,000,000.00	19,305,444.28	19,305,444.28	19,305,444.28	19,305,444.28	-	19,305,444.28	19,305,444.28	-	19,305,444.28	100.0%	307,444.28
<b>Chiapas</b>																	
644H	430018158	CONSTRUCTORA MAYNAN DEL SAN PEDRO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CHIAPAS DEL KM 0+000 AL KM 20+000	26,000,000.00	26,102,728.37	26,102,728.37	26,102,728.37	26,102,728.37	-	26,102,728.37	26,102,728.37	-	26,102,728.37	100.0%	102,728.37
<b>Chiapas - Huehuetenango - Coahuila</b>																	
644H	430018158	CONSTRUCTORA TONINA S.A. Central de Nevochillo	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CHIAPAS - HUEHUETENANGO - COAHUILA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	26,000,000.00	11,666,044.02	11,666,044.02	11,666,044.02	11,666,044.02	-	11,666,044.02	11,666,044.02	-	11,666,044.02	100.0%	444,044.02
644H	430018158	LATE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CHIAPAS - HUEHUETENANGO - COAHUILA DEL KM 10+000 AL KM 20+000	26,000,000.00	12,002,740.91	12,002,740.91	12,002,740.91	12,002,740.91	-	12,002,740.91	12,002,740.91	-	12,002,740.91	100.0%	444,044.02
644H	430018158	CONSTRUCIONES CONSTRUCTORA LAGO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CHIAPAS - HUEHUETENANGO - COAHUILA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	26,000,000.00	6,886,929.54	6,886,929.54	6,886,929.54	6,886,929.54	-	6,886,929.54	6,886,929.54	-	6,886,929.54	100.0%	444,044.02
<b>OAXACA</b>																	
<b>Coahuila - Oaxaca</b>																	
644H	430018157	INGENIERIA ELSOTIVA SIGLO XXI S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA COAHUILA - OAXACA DEL KM 0+000 AL KM 10+000	20,000,000.00	12,316,969.86	12,316,969.86	12,316,969.86	12,316,969.86	-	12,316,969.86	12,316,969.86	-	12,316,969.86	100.0%	444,044.02
644H	430018157	GARSA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA COAHUILA - OAXACA DEL KM 10+000 AL KM 20+000	26,000,000.00	13,662,205.11	13,662,205.11	13,662,205.11	13,662,205.11	-	13,662,205.11	13,662,205.11	-	14,416,471.74	100.0%	751,266.63
<b>Yucatán</b>																	
644H	430018157	CONSTRUCTORA MAYNAN DEL SAN PEDRO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA YUCATAN DEL KM 0+000 AL KM 10+000	26,000,000.00	26,102,728.37	26,102,728.37	26,102,728.37	26,102,728.37	-	26,102,728.37	26,102,728.37	-	26,102,728.37	100.0%	102,728.37
<b>Yucatán</b>																	
644H	430018157	CONSTRUCTORA MAYNAN DEL SAN PEDRO S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA YUCATAN DEL KM 10+000 AL KM 20+000	26,000,000.00	26,102,728.37	26,102,728.37	26,102,728.37	26,102,728.37	-	26,102,728.37	26,102,728.37	-	26,102,728.37	100.0%	102,728.37

Handwritten mark



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA




PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	
Tijuana	\$ 3,180,000.00	\$ 2,211,609.95	\$ 2,211,609.95	\$ 2,211,609.95	\$ 2,211,609.95			\$ 2,211,609.95	-\$ 67,479.15		100.0%
Culliacán	\$ 3,600,000.00	\$ 1,743,144.38	\$ 1,743,144.38	\$ 1,743,144.38	\$ 1,743,144.38			\$ 1,743,144.38	0.02		100.0%
Querétaro	\$ 6,360,000.00	\$ 5,369,493.59	\$ 5,369,493.59	\$ 5,369,493.59	\$ 5,369,493.59			\$ 5,369,493.59	-\$ 6,992.67		100.0%
Cuernavaca	\$ 7,650,000.00	\$ 7,676,591.56	\$ 7,676,591.56	\$ 7,676,591.56	\$ 7,435,688.75	\$ 189,191.81	\$ 51,711.00	\$ 7,435,688.75	-\$ 43,594.55		99.3%
Puebla	\$ 4,570,000.00	\$ 3,465,949.38	\$ 3,465,949.38	\$ 3,465,949.38	\$ 3,269,220.81	\$ 176,728.57		\$ 3,269,220.81			100.0%
Coahuacalcos	\$ 5,220,000.00	\$ 4,493,337.05	\$ 4,493,337.05	\$ 4,493,337.05	\$ 4,491,073.36	\$ 2,263.69		\$ 4,491,073.36	-\$ 30,597.19		100.0%
Veracruz	\$ 4,800,000.00	\$ 4,281,587.63	\$ 4,281,587.63	\$ 4,281,587.63	\$ 4,281,587.63			\$ 4,281,587.63	-\$ 4,477.86	\$ 6,507.32	100.0%
Reynosa	\$ 560,000.00	\$ 480,002.48	\$ 480,002.48	\$ 480,002.48	\$ 480,002.48			\$ 480,002.48			100.0%
Guadalajara	\$ 7,200,000.00	\$ 5,100,883.94	\$ 5,100,883.94	\$ 5,100,883.94	\$ 4,760,693.11	\$ 340,190.83		\$ 4,760,693.11	-\$ 3,287.75		100.0%
Monterrey	\$ 7,290,000.00	\$ 7,321,406.87	\$ 7,321,406.87	\$ 7,321,406.87	\$ 7,321,406.87			\$ 7,321,406.87	-\$ 10,701.77	\$ 58,036.10	100.0%
Chiapas	\$ 3,000,000.00	\$ 1,224,894.29	\$ 1,224,894.29	\$ 1,224,894.29	\$ 1,207,143.07	\$ 17,751.22		\$ 1,207,143.07			100.0%
Oaxaca	\$ 3,420,000.00	\$ 3,312,745.75	\$ 3,312,745.75	\$ 3,312,745.75	\$ 3,055,541.11	\$ 134,374.94	\$ 122,829.70	\$ 3,090,839.98		\$ 35,298.87	96.3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56,830,000.00</b>	<b>\$ 46,681,626.87</b>	<b>\$ 46,681,626.87</b>	<b>\$ 46,681,626.87</b>	<b>\$ 45,646,585.11</b>	<b>\$ 660,501.06</b>	<b>\$ 174,540.70</b>	<b>\$ 45,746,427.40</b>	<b>-\$ 167,430.96</b>	<b>\$ 99,842.29</b>	<b>99.6%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

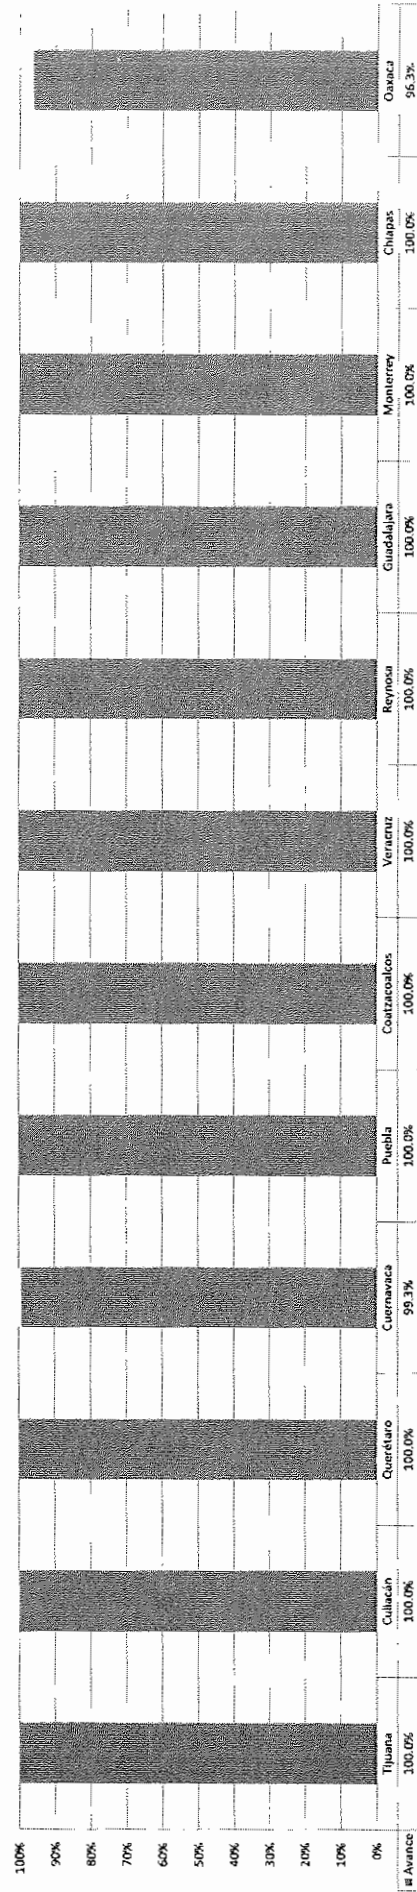

000 0277





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A.	Monto Programado D.	Estimado Acumulado C.	Moneda En Trámite D.	Relaciones - Devoluciones	Saldo Comprobado E.	Diferencia D-C+D-E	Ejercido/Fujo de Efectivo	Avance financiero (%)	Alcance de Cobros Pagadero
<b>TIJUANA</b>																
<b>Yumac - Estancia</b>																
13MN	450010802 550004504	CLAPAH, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA Tijuana - Ensenada	2,040,000.00 \$	1,206,043.07 \$	1,206,043.07 \$	1,206,043.07 \$	1,206,043.07 \$		- \$	25,302.37 \$		1,200,040.07 \$	100.0%	
<b>La Rumorosa - Tequite</b>																
23MN	450011520 550004506	PROFESORONITAL SA DE CV CONTROL S.A. DE C.V.	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y DEL MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA RUMOROSA - TEQUITE	900,000.00 \$	644,706.06 \$	644,706.06 \$	644,706.06 \$	644,706.06 \$		- \$	42,114.78 \$		594,706.06 \$	100.0%	
<b>Llano de los Cabos</b>																
33SA	AUTOPISTA CARRETERA FEDERAL DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS PARA EL OPERADOR DE MENOR Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LIBRAMIENTO LOS CABOS - BUENAVISTA															
<b>GUAYMAS</b>																
<b>Estación Don - Nogales</b>																
65MN	450011619	ROJAGULAR CONSULTORES Y CONSTRUC S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ESTACIÓN DON - NOGALES, ESTADO DE SONORA.	2,000,000.00 \$	1,743,144.38 \$	1,743,144.38 \$	1,743,144.38 \$	1,743,144.38 \$		- \$	0.02 \$		1,743,144.38 \$	100.0%	
<b>QUERETARO</b>																
<b>Llano de los Cabos</b>																
73MN	450011804	COOPERATIVO MCA, S.A. DE C.V. A GRUPO IAFER, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA QUERETARO	900,000.00 \$	837,182.72 \$	837,182.72 \$	837,182.72 \$	837,182.72 \$		- \$			837,182.72 \$	100.0%	
<b>Chamapa - Lechería</b>																
83MN	450011586	RAUL VICENTE ORDOZCO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMAPA - LECHERÍA.	1,000,000.00 \$	1,000,109.89 \$	1,000,109.89 \$	1,000,109.89 \$	1,000,109.89 \$		- \$			1,000,109.89 \$	100.0%	
<b>México - Querétaro</b>																
93MN	450011633 550004505	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA, TRAMO PALMILLAS - QUERETARO	3,000,000.00 \$	1,307,177.73 \$	1,307,177.73 \$	1,307,177.73 \$	1,307,177.73 \$		- \$	2,209.02 \$		1,307,177.73 \$	100.0%	
103MN	450011615	CONARBI TORRES Y CONSTRUCIONES, S.A. DE C.V. CIVILES, S.A. DE C.V. & BLOHAM, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO TRAMO TEPALCAPA - PALMILLAS.	1,146,799.08 \$	1,146,799.08 \$	1,146,799.08 \$	1,146,799.08 \$	1,146,799.08 \$		- \$	2,734.16 \$		1,146,799.08 \$	100.0%	
<b>Queretaro - Irapuato</b>																
113MN	450010392	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA QUERETARO - IRAPUATO.	1,200,000.00 \$	902,204.06 \$	902,204.06 \$	902,204.06 \$	902,204.06 \$		- \$	2,647.47 \$		902,204.06 \$	100.0%	
<b>GUERRAVACA</b>																
<b>México - Cuernavaca</b>																
123MN	450010783 550004475	GESTION URBANA Y CONSULTORIA PARA OBRAS PUBLICAS S.A. DE C.V.	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO-CUERNAVACA DEL KM 19+600 AL KM 17+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS.	1,200,000.00 \$	1,200,410.88 \$	1,200,410.88 \$	1,200,410.88 \$	1,200,410.88 \$		- \$	7,125.94 \$		1,200,410.88 \$	100.0%	
<b>Llano de los Cabos</b>																
133MN	450010895 550004476 (1)	JOSE LUIS SANTIAGO AGUILAR LAYLMA	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO CUERNAVACA.	300,000.00 \$	940,977.00 \$	940,977.00 \$	940,977.00 \$	940,977.00 \$		- \$	22,280.71 \$		507,387.30 \$	100.0%	
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																
143MN	450010673	COO INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 17+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS	1,200,000.00 \$	1,201,411.60 \$	1,201,411.60 \$	1,201,411.60 \$	1,201,411.60 \$		- \$	0,009.62 \$		1,201,411.60 \$	100.0%	
153MN	450010782 550004474	CONSTRUCCION E INGENIERIA MONTES, S.A. INGENIERIA MONTES, S.A. DE C.V. A CLAPAH, S.A. DE C.V.	01/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA-ACAPULCO, DEL KM 17+000 AL KM 23+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS	4,000,000.00 \$	1,346,486.04 \$	1,346,486.04 \$	1,346,486.04 \$	1,346,486.04 \$		- \$	7,701.67 \$		817,120.00 \$	98.2%	

001 0278

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de Cierre: 15 de Octubre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Subastado Modificado	Monto Contratado A.	Monto Programado D.	Entregado Acumulado E.	Monto La Trámite D.	Subastas Deducciones	Monto Cancelado E.	Diferencia D.C.C.C.	Ejecución de Efectivo	Avance Financiero (%)	Aporte de Contos Pagados	
163MM	450015205	ALVAREZ GUILLERMO INGENIERIA CONSULTORES, S.A D.C.V.	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ACAPULCO. TRAMOS: DEL KM 238+000 AL KM 251+205; DEL KM 270+000 AL KM 371+000; DEL KM 371+000 AL KM 388+000; Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LAS ESTRUCTURAS	500,000.00	529,136.90	529,136.90	1,027,007.00	1,000,000.00		10,045.50	50,026.20	\$	1,000,000.00	100.0%		
198MM	450015206	FLODONIO CRUZ JAVIER	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL C.D. PUENTE DE TEXLA (HUALA).	500,000.00	529,136.90	529,136.90	1,027,007.00	1,000,000.00		10,045.50	50,026.20	\$	1,000,000.00	100.0%		
203MM	450015205	JOSÉ LUIS SATURNINO ACQUIAR BANCHEA	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL C.D. LA PIEDRA CUATLA	500,000.00	549,077.00	549,077.00	327,267.24	300,400.00		3,170.36	22,289.72	\$	527,267.24	100.0%		
215MM	450015206	FLODONIO CRUZ JAVIER	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL C.D. ZACAPALDO - RANCHO VIEJO	200,000.00	317,490.12	317,490.12	317,490.12	300,400.00			11,045.50	\$	300,400.00	100.0%		
223MM	450015208	FLODONIO CRUZ JAVIER	14/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL C.D. RANCHO VIEJO - TAXCO	250,000.00	211,007.41	211,007.41	211,007.41	204,300.00			7,000.70	\$	204,300.00	100.0%		
<b>SUBTOTAL GUERRAVACA</b>																	
					2,650,000.00	2,676,843.32	2,676,843.32	7,076,681.65	7,050,600.00	7,050,600.00		43,844.08	180,165.81	\$	7,050,600.00	99.3%	
<b>México - Puebla</b>																	
231MM	450015206	SILDRAM, S.A. DE C.V.	17/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA, TRAMO DEL KM 17+000 AL KM 125+000.	2,500,000.00	1,400,002.00	1,400,002.00	1,400,002.00	1,435,400.00			53,324.48	\$	1,435,400.00	100.0%		
251MM	450016206	GRUPO VIAL DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	02/02/2011 02/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUEBLA - ACATEPEC	980,000.00	940,070.07	940,070.07	940,070.07	854,027.07			62,049.00	\$	854,027.07	100.0%		
263MM	450016204	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	20/02/2011 14/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ACATEPEC - GUERRAVACA	1,000,000.00	1,020,100.00	1,020,100.00	1,020,100.00	800,134.00			51,065.00	\$	800,134.00	100.0%		
					4,480,000.00	3,460,174.07	3,460,174.07	3,460,174.07	3,289,934.00			176,729.57	\$	3,289,934.00	100.0%		
<b>Puebla - Acapulco</b>																	
279MM	450016204	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	01/02/2011 31/07/2012	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMPOTÓN - CAMPECHE	780,000.00	776,516.89	776,516.89	776,516.89	774,302.20			1,274.51	\$	774,302.20	100.0%		
283MM	450015035	SAL VICENTE OROZCO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 31/07/2012	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. HUALA - ACATEPEC	1,300,000.00	1,053,227.20	1,053,227.20	1,053,227.20	1,029,227.20			6,490.50	\$	1,029,227.20	100.0%		
203MM	450015018	SAL VICENTE OROZCO Y COMPAÑIA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 31/07/2012	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA	1,200,000.00	1,028,876.60	1,028,876.60	1,028,876.60	1,028,876.60			12,110.20	\$	1,028,876.60	100.0%		
					1,440,000.00	1,001,408.12	1,001,408.12	1,001,408.12	1,001,408.12			899.13	\$	1,001,408.12	100.0%		
<b>Agua Dulce - Cárdenas</b>																	
318MM	450015037	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	01/02/2011 31/07/2012	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO SAN RAFAEL - LA VENTOSA	600,000.00	594,068.95	594,068.95	594,068.95	590,000.00			2,448.12	\$	590,000.00	100.0%		
					4,480,000.00	4,402,337.08	4,402,337.08	4,402,337.08	4,402,337.08			30,897.19	\$	4,402,337.08	100.0%		
<b>VERACRUZ</b>																	
					2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00			0.00	\$	2,200,000.00	100.0%		

CD. Mercedes - Córdoba



CAMINOS Y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2011

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Estimado Asumido C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia D-C+E	Derecho a Flujo de Efectivo	Monto financiero Pagado	Alícuotas de Costos
3298M	4500019674	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. MENDOZA CORDOBA	800,000.00	952,270.46	952,270.46	952,270.46	952,270.46		0	952,270.46		952,270.46	100.0%	
<b>Córdoba - Veracruz</b>																
3338M	4500019696	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CORDOBA VERACRUZ	1,320,000.00	1,268,264.47	1,268,264.47	1,138,264.47	1,268,264.47		0			1,268,264.47	100.0%	
<b>La Tinaja - Cd. Iba</b>																
3458M	4500019687	PROFESIONISTAS EN CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA TINAJA IBA	1,500,000.00	1,083,603.24	1,083,603.24	1,083,603.24	1,083,603.24		0			1,083,603.24	100.0%	
<b>Guilveraz-Zamora - Tlaxiellán</b>																
3538M	4500019699	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GUILVERAZ-ZAMORA-TLAXIELLAN	720,000.00	711,204.52	711,204.52	711,204.52	711,204.52		0			711,204.52	100.0%	
<b>Laramiento Poniente de Tampico</b>																
3658M	4500019681	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PONIENTE TAMPOCO	280,000.00	245,104.92	245,104.92	245,104.92	245,104.92		0			245,104.92	100.0%	
<b>REYNOSA</b>																
<b>Matamoros - Reynosa</b>																
3748M	4500019684	ARGOS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	01/02/2011 31/01/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MATAMOROS-REYNOSA	500,000.00	304,704.45	304,704.45	304,704.45	304,704.45		0			304,704.45	100.0%	
<b>GUADALAJARA</b>																
<b>Guadaluajara - Tepic</b>																
3838M	4500019551	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GUADAJARA TEPIC. TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 94+000	2,040,000.00	1,132,617.06	1,132,617.06	1,132,617.06	992,139.66		0	108,079.03		952,139.66	100.0%	
3938M	4500019689	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GUADAJARA TEPIC. TRAMO DEL KM 94+000 AL KM 165+000	2,040,000.00	794,842.10	794,842.10	794,842.10	605,300.30		0	139,511.80		625,300.30	100.0%	
<b>Nueva Italia - Lazero Cardenas</b>																
4038M	4500019020	ING. ROGELIO ARTURO VICTORIA MIVIANO	01/02/2011 20/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA NUEVA ITALIA LAZARO CARDENAS	2,000,000.00	1,637,798.46	1,637,798.46	1,637,798.46	1,637,798.46		0			1,637,798.46	100.0%	
<b>Uruapan - Nueva Italia</b>																
4138M	4500019627	ILCCON, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA URUAPAN NUEVA ITALIA	1,440,000.00	806,789.72	806,789.72	806,789.72	806,789.72		0	3,207.79		806,789.72	100.0%	
<b>Patzcuaro - Uruapan</b>																
4238M	4500019411	ECOD ACOMAR CONSULTORES, S.A. DE C.V. E. SUCC. S.A. DE C.V.	01/02/2011 20/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PATZCUARO URUAPAN	1,200,000.00	1,248,037.95	1,248,037.95	1,248,037.95	1,248,037.95		0			1,248,037.95	100.0%	
<b>MONTERREY</b>																
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																
4338M	4500019583	HO CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO DEL KM 27+700 AL KM 183+000	1,000,000.00	1,095,048.48	1,095,048.48	1,095,048.48	1,095,048.48		0			1,095,048.48	100.0%	
<b>Torreón - Saltillo</b>																



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Perfil	Contrato No.	Empresa	Periodo de Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado O	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelación E	Diferencia D-C-D-E	Cuentas a Pagar de Efectivo	Avance Financiero (%)	Ajustes de Costos Pagados
458AN	450011584	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 20 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SALTILLO - TOLUCA AL KM 245+000 DEL RAMAL A LA AUTOPISTA DEL POZONILLO DEL KM 0+000 AL KM 30+000 TRAMO LA CHICHILLA - MAYAGÜES	\$ 1,300,000.00	\$ 1,376,748.40	\$ 1,376,748.40	\$ 1,376,748.40	\$ 1,376,748.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,376,748.40	100.0%	\$ 16,820.04
<b>Carbónera - Ojo Caliente</b>																
459AN	450011585	MÓNICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 20 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CADZEBITA - OJO CALIENTE DEL KM 0+000 AL KM 21+000	\$ 500,000.00	\$ 460,100.20	\$ 460,100.20	\$ 460,100.20	\$ 460,100.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460,100.20	100.0%	\$ -
<b>Comas Palasio - Carrizal</b>																
460AN	450011582	CIAM INGENIERIA S.A DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 20 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CADZEBITA - PALASIO - CARRIZAL DEL KM 28+200 AL KM 104+000	\$ 1,600,000.00	\$ 1,944,476.03	\$ 1,944,476.03	\$ 1,944,476.03	\$ 1,944,476.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,944,476.03	100.0%	\$ -
<b>Coahuila - Reynosa</b>																
473AN	450011598	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE 20 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CADZEBITA - REYNOSA DEL KM 30+000 AL KM 107+000	\$ 1,300,000.00	\$ 1,377,336.40	\$ 1,377,336.40	\$ 1,377,336.40	\$ 1,377,336.40	\$ -	\$ 0.611,000	\$ -	\$ -	\$ 1,377,336.40	100.0%	\$ -
<b>Puerto Mexico - Carbonera</b>																
483AN	450011587	MÓNICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MENOR DE 10 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CARBONERA DEL KM 202+000 AL KM 224+000	\$ 800,000.00	\$ 789,751.51	\$ 789,751.51	\$ 789,751.51	\$ 789,751.51	\$ -	\$ 4,000.77	\$ -	\$ -	\$ 789,751.51	100.0%	\$ -
<b>Queretaro - Mazatlan</b>																
490AN	450017037	INGENIEROS Y ASISTORES UN PROYECTO C	01/11/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CIUDA DURANGO - MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KM 97+000	\$ -	\$ 489,770.00	\$ 489,770.00	\$ 489,770.00	\$ 489,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 489,770.00	100.0%	\$ -
495AN	450017039	GRUPO EMPRESARIAL JPPA S.A DE C.V.	01/11/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CIUDA DURANGO - MAZATLAN	\$ -	\$ 387,976.02	\$ 387,976.02	\$ 387,976.02	\$ 387,976.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387,976.02	100.0%	\$ -
<b>CHAPAS</b>																
499AN	450011587	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL KM 0+000 AL KM 107+000	\$ 3,000,000.00	\$ 1,224,604.20	\$ 1,224,604.20	\$ 1,224,604.20	\$ 1,224,604.20	\$ -	\$ -	\$ 17,761.22	\$ -	\$ 1,206,842.98	100.0%	\$ -
<b>GUERRERO</b>																
518AN	450010769	GALLES, S.A. DE C.V.	15/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 170+000 Y MANTENIMIENTO MENOR EN 07 ESTRUCTURAS DEL C D GUACHIPALAN - OAXACA	\$ -	\$ 1,021,000.31	\$ 1,021,000.31	\$ 1,021,000.31	\$ 1,021,000.31	\$ -	\$ -	\$ 61,414.00	\$ 122,859.20	\$ 1,105,273.51	91.1%	\$ -
528AN	450010774	MATERIA, S.A. DE C.V. Y LABORATORIO MATERIA, S.A. DE C.V.	15/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 245+000 Y RAMAL A HUIZO 1.7 KM Y MANTENIMIENTO MENOR EN 80 ESTRUCTURAS DEL C O GUACHIPALAN - OAXACA	\$ 3,470,000.00	\$ 1,700,792.44	\$ 1,700,792.44	\$ 1,700,792.44	\$ 1,717,802.36	\$ -	\$ -	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 1,789,792.44	100.0%	\$ 30,208.87
<b>TOTAL</b>																
					\$ 7,400,000.00	\$ 7,374,406.87	\$ 7,374,406.87	\$ 7,374,406.87	\$ 7,374,406.87	\$ -	\$ 10,201.77	\$ -	\$ -	\$ 7,364,205.10	100.0%	\$ 50,038.91
<b>Las Chapas - Huastla - Oaxaca</b>																
503AN	450011587	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	01/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL KM 0+000 AL KM 107+000	\$ 3,000,000.00	\$ 1,224,604.20	\$ 1,224,604.20	\$ 1,224,604.20	\$ 1,224,604.20	\$ -	\$ -	\$ 17,761.22	\$ -	\$ 1,206,842.98	100.0%	\$ -
<b>GUERRERO</b>																
518AN	450010769	GALLES, S.A. DE C.V.	15/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 170+000 Y MANTENIMIENTO MENOR EN 07 ESTRUCTURAS DEL C D GUACHIPALAN - OAXACA	\$ -	\$ 1,021,000.31	\$ 1,021,000.31	\$ 1,021,000.31	\$ 1,021,000.31	\$ -	\$ -	\$ 61,414.00	\$ 122,859.20	\$ 1,105,273.51	91.1%	\$ -
528AN	450010774	MATERIA, S.A. DE C.V. Y LABORATORIO MATERIA, S.A. DE C.V.	15/02/2011 15/02/2012	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 245+000 Y RAMAL A HUIZO 1.7 KM Y MANTENIMIENTO MENOR EN 80 ESTRUCTURAS DEL C O GUACHIPALAN - OAXACA	\$ 3,470,000.00	\$ 1,700,792.44	\$ 1,700,792.44	\$ 1,700,792.44	\$ 1,717,802.36	\$ -	\$ -	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 1,789,792.44	100.0%	\$ 30,208.87
					\$ 6,470,000.00	\$ 2,722,396.75	\$ 2,722,396.75	\$ 2,722,396.75	\$ 2,738,802.67	\$ -	\$ -	\$ 133,414.00	\$ 245,718.40	\$ 2,594,682.67	90.3%	\$ 60,247.68
<b>TOTAL</b>					\$ 6,470,000.00	\$ 46,981,426.87	\$ 46,981,426.87	\$ 46,981,426.87	\$ 45,840,816.11	\$ -	\$ -	\$ 167,310.98	\$ -	\$ 46,146,627.48	90.0%	\$ 90,842.29




**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Coprocesado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Reservaciones - Devoluciones	Alícuota de Costos Pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)		
Tijuana												0.0%	0.0%		
Culiacán												0.0%	0.0%		
Querétaro		\$ 1,740,605.10	\$ 1,740,605.10	\$ 1,740,605.10	\$ 1,740,605.10	\$ 305,158.00	\$ 250,020.18	\$ 2,824,308.23	\$ 1,740,605.10			100.0%	100.0%		
Cuernavaca		\$ 4,009,073.88	\$ 4,009,073.88	\$ 3,430,465.38	\$ 2,824,308.23	\$ 305,158.00	\$ 250,020.18	\$ 2,824,308.23	\$ 2,824,308.23			60.1%	0.0%		
Puebla		\$ 23,983,550.11	\$ 23,983,550.11	\$ 23,552,678.83	\$ 10,861,335.13	\$ 305,158.00	\$ 12,801,241.70	\$ 10,861,335.13	\$ 1,503,051.69			45.2%	60.5%		
Coahuila		\$ 6,510,557.37	\$ 6,510,557.37	\$ 6,510,557.37	\$ 6,340,580.28	\$ 305,158.00	\$ 178,888.00	\$ 6,340,580.28	\$ 6,340,580.28			100.0%	100.0%		
Veracruz	\$ 6,000,000.00	\$ 10,260,262.41	\$ 10,260,262.41	\$ 10,260,262.41	\$ 10,260,262.41	\$ 305,158.00	\$ 15,137.87	\$ 10,260,262.41	\$ 1,371,401.85			100.0%	100.0%		
Reynosa	\$ 5,150,000.00	\$ 4,302,204.70	\$ 4,302,204.70	\$ 4,302,204.70	\$ 4,287,157.03	\$ 305,158.00	\$ 12,002,257.23	\$ 4,287,157.03	\$ 12,555.17			100.0%	100.0%		
Guadaluajara		\$ 61,537,798.31	\$ 61,537,798.31	\$ 61,537,798.31	\$ 40,445,541.08	\$ 305,158.00	\$ 12,002,257.23	\$ 40,445,541.08				0.0%	0.0%		
Monterrey												0.0%	0.0%		
Chiapas												0.0%	0.0%		
Oaxaca												0.0%	0.0%		
<b>TOTAL</b>	\$ 11,150,000.00	\$ 112,643,141.86	\$ 112,643,141.86	\$ 111,372,580.10	\$ 85,679,775.26	\$ 305,158.00	\$ 12,286,302.99	\$ 13,141,261.86	\$ 85,679,776.26	\$ 2,947,006.71		86.9%	67.7%		

**Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)**

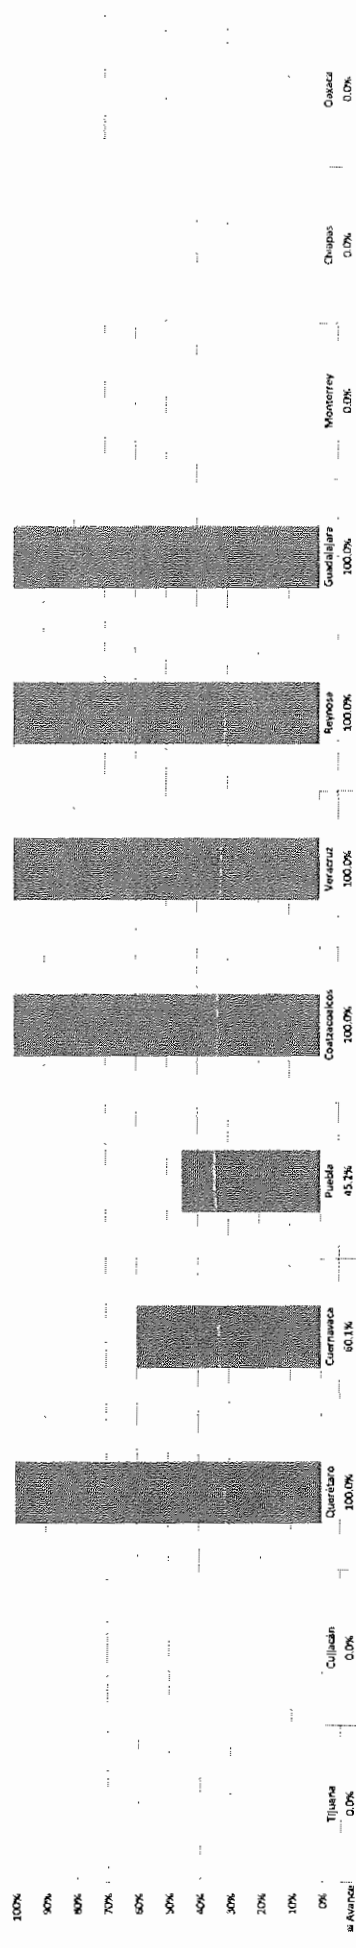

0282








Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Comenzado	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flajo de Efectivo	Relaciones - Devoluciones		Ajustes de Costos Pagados
Tijuana												0.0%
Culiacán												0.0%
Querétaro												0.0%
Cuernavaca	\$ 300,000.00	\$ 865,427.27	\$ 865,427.27	\$ 680,819.83	\$ 655,078.67		\$ 25,741.16	\$ 655,078.67				74.0%
Puebla	\$ 257,500.00	\$ 2,754,646.45	\$ 2,754,646.45	\$ 2,754,646.45	\$ 2,160,417.07		\$ 594,229.38	\$ 2,160,417.07		\$ 52,233.44		78.4%
Coahuila												0.0%
Veracruz	\$ 300,000.00	\$ 1,327,165.64	\$ 1,327,165.64	\$ 1,327,165.64	\$ 1,119,009.87		\$ 208,155.77	\$ 1,119,009.87		\$ 6,943.01		84.3%
Reynosa	\$ 257,500.00	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67			\$ 245,505.67				100.0%
Guadalupe		\$ 2,767,013.11	\$ 2,767,013.11	\$ 2,767,013.11	\$ 2,467,664.12		\$ 299,348.99	\$ 2,467,664.12				100.0%
Monterrey												0.0%
Chiapas												0.0%
Oaxaca												0.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 557,500.00	\$ 7,979,758.14	\$ 7,979,758.14	\$ 7,775,150.70	\$ 6,647,675.40		\$ 299,348.99	\$ 6,847,878.40		\$ 59,176.45		87.1%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

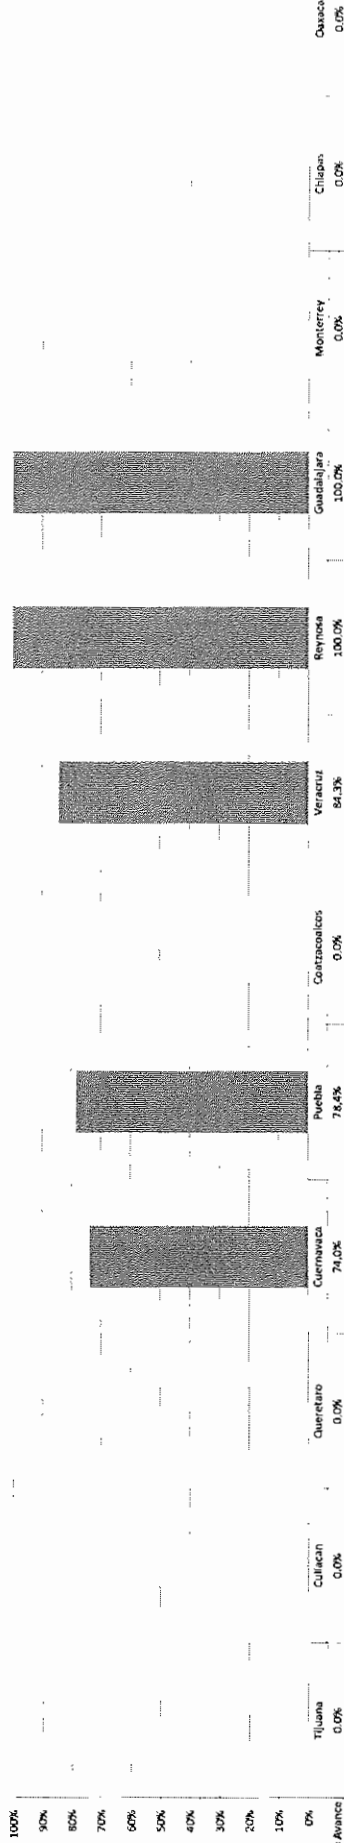

9



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Incluye en el costo 15.0m Costo de Op. 2011

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Cajado Acumulado C	Monto en Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Calculado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Flujo de Efectivo	Avance financiero (%)
			Inicia	Fin												
<b>CUERNAVACA</b>																
Puentes de bñla - Igual																
98ME	400015141 500000495	ALVAREZ CUILLEN INGENIEROS CONSULTORES S.A DE CV	08/05/2012	24/11/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE REPARACIÓN DEL PUNTE ARROYO DE SAN FRANCISCO EN EL KM 32+500 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA.	\$ 965,427.27	\$ 965,427.27	\$ 965,427.27	\$ 965,427.27	\$ 965,427.07	\$ 23,741.10	\$	\$ 965,427.07	\$ 23,741.10	\$ 965,427.07	74.0%
<b>PUEBLA</b>																
68ME	430017211	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A DE CV	12/01/2012	07/09/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: MODIFICACION DEL PUNTE ARROYO DE SAN FRANCISCO EN EL KM 32+500 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA.	\$ 1,530,433.37	\$ 1,530,433.37	\$ 1,530,433.37	\$ 1,530,433.37	\$ 1,323,260.56	\$	\$ 32,233.44	\$ 1,323,260.56	\$ 213,130.01	\$ 1,323,260.56	86.1%
138ME/11	4000143479 500000495 500000497	PROFESIONISTAS EN GED-ODONTOLOGIA S.A DE CV	26/02/2011	28/07/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRILERA DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA EN EL PSECC DEL KM 80+714 DE LA AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA.	\$ 1,216,213.06	\$ 1,216,213.06	\$ 1,216,213.06	\$ 1,216,213.06	\$ 637,120.31	\$	\$	\$ 637,120.31	\$ 381,592.57	\$ 637,120.31	56.7%
<b>VERACRUZ</b>																
La Tinaja - Itala																
19ME	400016040 500000441	ALVAREZ CUILLEN INGENIEROS CONSULTORES S.A DE CV	14/07/2011	26/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACION DEL ELEMENTO DE ANCLAJE SUPERIOR DEL PUNTE RIO DE LOS CACOS TERCERA PUNTA EN LA AUTOPISTA TIÑAJA - CD. RELA (Obra Contratada)	\$ 300,000.00	\$ 3,327,103.04	\$ 3,327,103.04	\$ 3,327,103.04	\$ 1,119,000.87	\$	\$ 6,943.01	\$ 1,119,000.87	\$ 266,193.77	\$ 1,119,000.87	64.3%
<b>REYNOSA</b>																
Puentes Ingreso Zaragoza																
28ME	400016007 500000439	ARGRI CONSTRUCCIONES S.A DE CV	15/02/2011	28/07/2011	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REPARACION DEL PUNTE DEL INGRESO AL PUNTE EN INGRESO AL PUNTE INGRESO ZARAGOZA	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67	\$ 245,505.67	\$	\$	\$ 245,505.67	\$	\$ 245,505.67	100.0%
<b>GUADALAJARA</b>																
Nueva Itola - Lázaro Cárdenas																
79ME	430018647	VICTORIA NAVARRO RODOLFO ARTURO	1/07/2011	28/04/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DE LOS PUENTES PINZANDARAN KM 235+000 INGRESILLO KM 235+000 (E INGRESILLO II) KM 235+000 AUTOPISTA NUEVA ITALA - LAZARO CARDENAS	\$ 2,707,013.11	\$ 2,707,013.11	\$ 2,707,013.11	\$ 2,707,013.11	\$ 2,487,064.12	\$	\$	\$ 2,487,064.12	\$	\$ 2,487,064.12	100.0%
<b>TOTAL</b>																
						\$ 7,878,756.14	\$ 7,878,756.14	\$ 7,878,756.14	\$ 7,878,756.14	\$ 6,647,075.40	\$	\$ 59,176.45	\$ 6,647,075.40	\$ 1,231,680.31	\$ 6,647,075.40	87.1%

100

0285

2




CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Resúmen de corte: 16 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance financiero (%)	Avance físico (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejecutado Flujo de Efectivo	Suplementos - Dotaciones	Ajustes de Costos Pagados		
Tijuana	\$ 9,500,000.00	\$ 8,051,984.59	\$ 8,051,984.59	\$ 8,051,984.59	\$ 8,051,984.33	\$ 0.26		\$ 8,051,984.33			100.0%	100.0%
Culiacán	\$ 2,500,000.00	\$ 2,281,354.75	\$ 2,281,354.75	\$ 2,281,354.75	\$ 2,281,354.75			\$ 2,281,354.75		\$ 76,002.52	100.0%	100.0%
Querétaro	\$ 31,700,000.00	\$ 30,186,451.00	\$ 30,186,451.00	\$ 30,186,451.00	\$ 30,180,879.06	\$ 5,571.94		\$ 31,408,566.42	\$ 223,434.85	\$ 1,227,687.36	100.0%	100.0%
Cuernavaca	\$ 10,700,000.00	\$ 10,316,948.22	\$ 10,316,948.22	\$ 10,316,948.22	\$ 10,315,360.74	\$ 1,587.48		\$ 10,422,812.25	\$ 7,907.68	\$ 107,451.51	100.0%	100.0%
Puebla	\$ 12,500,000.00	\$ 11,524,859.30	\$ 11,524,859.30	\$ 11,524,859.30	\$ 11,524,848.92	\$ 10.38		\$ 11,681,876.84	\$ 9,269.96	\$ 157,027.92	100.0%	100.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 18,800,000.00	\$ 16,419,794.30	\$ 16,419,794.30	\$ 16,419,794.30	\$ 16,419,320.32	\$ 473.98		\$ 16,456,523.68	\$ 48,566.90	\$ 37,203.36	100.0%	100.0%
Veracruz	\$ 21,600,000.00	\$ 19,695,243.95	\$ 19,695,243.95	\$ 19,695,243.95	\$ 19,695,243.95			\$ 19,699,641.27		\$ 204,397.32	100.0%	100.0%
Reynosa	\$ 17,800,000.00	\$ 13,802,225.97	\$ 13,802,225.97	\$ 13,802,225.97	\$ 13,802,104.21	\$ 121.76		\$ 14,224,119.30	\$ 195.82	\$ 422,015.00	100.0%	100.0%
Guadaluajara	\$ 18,000,000.00	\$ 16,404,822.46	\$ 16,404,822.46	\$ 16,404,822.46	\$ 16,404,822.14	\$ 0.32		\$ 17,079,217.79		\$ 674,395.65	100.0%	100.0%
Monterrey	\$ 8,300,000.00	\$ 12,819,089.53	\$ 12,819,089.53	\$ 12,819,089.53	\$ 12,819,078.76	\$ 10.77		\$ 12,819,078.76	\$ 378.24		100.0%	100.0%
Chiapas	\$ 3,200,000.00	\$ 3,136,511.36	\$ 3,136,511.36	\$ 3,136,511.36	\$ 530,398.00	\$ 2,606,113.36		\$ 530,398.00	\$ 180,854.29		100.0%	100.0%
Oaxaca	\$ 5,700,000.00	\$ 5,564,417.08	\$ 5,564,417.08	\$ 5,564,417.08	\$ 5,564,413.71	\$ 3.37		\$ 5,564,413.71			100.0%	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 169,300,000.00</b>	<b>\$ 150,203,702.51</b>	<b>\$ 150,203,702.51</b>	<b>\$ 150,203,702.51</b>	<b>\$ 147,589,808.89</b>	<b>\$ 2,613,893.62</b>		<b>\$ 150,495,989.62</b>	<b>\$ 470,607.34</b>	<b>\$ 2,906,180.73</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

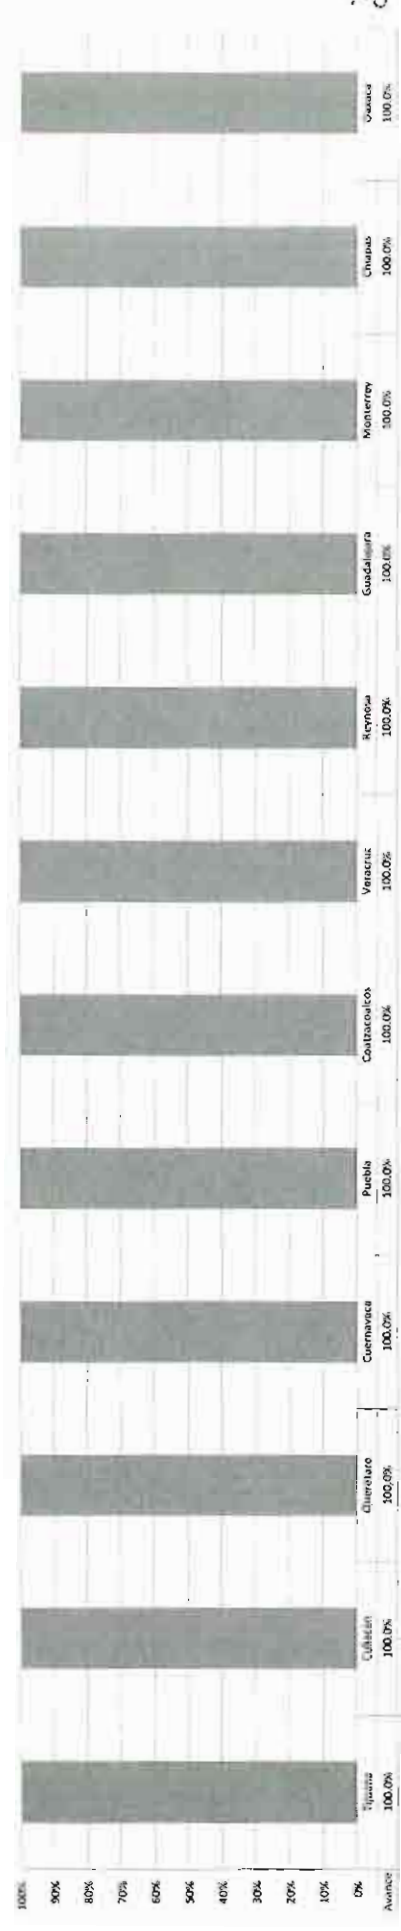

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2011 DE LA RED OEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha del corte: 31 de Octubre de 2012

No. Puentes	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Contratado	Monto Programado	Estado Acumulado	Monto en Trámite	Resoluciones - Devoluciones	Baldío Cancelado	Diferencia B.C.D.E.	Ejército a Fajro de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance Bruto (%)	Fecha de Corte
			Inicio	Fin													
<b>TJUJANA</b>																	
<b>Tijuana - Ensenada</b>																	
1NE	450010477	CONSTRUCCION Y CONSERVACION DEL CAMINO DIRECTO DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	01/02/2011	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 3,000,000.00	\$ 4,900,040.30	\$ 4,900,040.30	\$ 4,900,040.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,900,040.30	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
2NE	450010878	CONSTRUCCION DISEÑO Y BIENALAMEN TO	01/02/2011	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,010,200.75	\$ 2,010,200.75	\$ 2,010,200.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,010,200.75	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Libramiento los Cabos</b>																	
2NE	450010868	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	01/02/2011	31/03/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 500,000.00	\$ 440,200.00	\$ 440,200.00	\$ 440,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 440,200.00	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>CUERNAVACA</b>																	
<b>Estacion Don- Nogales</b>																	
4NE	450010819	CONTRATISTAS CIVILES, S.A. DE C.V.	01/02/2011	30/11/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,291,304.76	\$ 2,291,304.76	\$ 2,291,304.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,291,304.76	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Queretaro</b>																	
<b>Libramiento Horcones de Queretaro</b>																	
8NE	450010429	SAIPRONO, S.A. DE C.V.	01/02/2011	30/11/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 2,000,000.00	\$ 2,290,029.45	\$ 2,290,029.45	\$ 2,290,029.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,290,029.45	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Chihuahua - Lechuguilla</b>																	
6NE	450010441	CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 3,000,000.00	\$ 3,002,047.41	\$ 3,002,047.41	\$ 3,002,047.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,002,047.41	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Mexico - Cuernavaca</b>																	
7NE	450010436	CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 11,000,000.00	\$ 11,001,204.73	\$ 11,001,204.73	\$ 11,001,204.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,001,204.73	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
4NE	450010523	CONTRATISTAS DE OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 20,000,000.00	\$ 8,948,162.28	\$ 8,948,162.28	\$ 8,948,162.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,948,162.28	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Queretaro - Toluca</b>																	
8NE	450010541	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PUENTES, S.A. DE C.V.	10/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 3,000,000.00	\$ 4,247,001.06	\$ 4,247,001.06	\$ 4,247,001.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,247,001.06	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>CUERNAVACA</b>																	
8NE	450010784	PROYECTO, ASESORIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	14/02/2011	18/12/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 1,400,000.00	\$ 1,407,042.70	\$ 1,407,042.70	\$ 1,407,042.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,407,042.70	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Libramiento Cuernavaca</b>																	
10NE	450010784	PROYECTO, ASESORIA, SUPERVISION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	14/02/2011	18/12/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 1,000,000.00	\$ 940,204.20	\$ 940,204.20	\$ 940,204.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 940,204.20	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																	
11NE	450010805	MC CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	01/02/2011	27/11/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 5,000,000.00	\$ 4,990,070.70	\$ 4,990,070.70	\$ 4,990,070.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,990,070.70	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>La Perla - Ciudad</b>																	
12NE	450010784	PROYECTO, ASESORIA, SUPERVISION Y COMERCIALIZACION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	14/02/2011	18/12/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 1,700,000.00	\$ 1,742,005.49	\$ 1,742,005.49	\$ 1,742,005.49	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,742,005.49	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Puente de Ixtla - Ixtla</b>																	
12NE	450010720	MC CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	10/04/2011	11/10/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 1,000,000.00	\$ 980,810.70	\$ 980,810.70	\$ 980,810.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 980,810.70	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Zacatecas - Rancho Viejo</b>																	
14NE	450010720	MC CONSTRUCCIONES Y COMERCIALIZACION DE OBRAS, S.A. DE C.V.	10/04/2011	11/10/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 200,000.00	\$ 170,043.04	\$ 170,043.04	\$ 170,043.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 170,043.04	100.00%	100.00%	31 de Octubre de 2012
<b>Rancho Viejo - Tasso</b>																	

Handwritten signature





CAMINOS Y FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Centro No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto en Trámite D	Devoluciones Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia BUC-DAI	Ujeda y Flujo de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Fecha de Corte
			Inicio	Fin														
<b>PUEBLA</b>																		
<b>México - Puebla</b>																		
19ME	450011929	MC CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	13/04/2011	11/10/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE 4 ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO MANCHO HECHO - TACCO.	200,000.00	211,540.53	211,540.53	211,540.53	211,540.27		0.00	0.20		211,540.27	100.00%	100.00%	15 de Octubre de 2012
						<b>19,700,000.00</b>	<b>19,700,000.00</b>	<b>19,700,000.00</b>	<b>19,700,000.00</b>	<b>19,700,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.20</b>		<b>19,700,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Puebla - Acapulco</b>																		
19ME	450011929	INGENIERIA Y COMUNICACIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	4,100,000.00	4,100,000.10	4,100,000.10	4,100,000.10	4,100,000.87		0.00	10.20		4,100,000.87	100.00%	100.00%	
						<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>3,900,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.10</b>		<b>3,900,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSULTORIA S.A. DE C.V.	29/04/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUEBLA - ACAPULCO	4,100,000.00	3,964,343.70	3,964,343.70	3,964,343.70	3,964,343.00		0.00	0.10		3,964,343.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,900,000.00</b>	<b>3,927,739.40</b>	<b>3,927,739.40</b>	<b>3,927,739.40</b>	<b>3,927,739.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.10</b>		<b>3,927,739.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSULTORIA S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ACAPULCO - COAHUILA	4,100,000.00	3,927,739.40	3,927,739.40	3,927,739.40	3,927,739.40		0.00	0.10		3,927,739.40	100.00%	100.00%	
						<b>3,900,000.00</b>	<b>3,927,739.40</b>	<b>3,927,739.40</b>	<b>3,927,739.40</b>	<b>3,927,739.40</b>		<b>0.00</b>	<b>0.10</b>		<b>3,927,739.40</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	ASISORIA, PROYECTOS Y CONSULTORIA AMACALIA S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN 25 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE	1,000,000.00	1,000,207.30	1,000,207.30	1,000,207.30	1,000,208.00		0.00	0.37		1,000,208.00	100.00%	100.00%	
						<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,207.30</b>	<b>1,000,207.30</b>	<b>1,000,207.30</b>	<b>1,000,208.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.37</b>		<b>1,000,208.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSULTORIA S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN 108 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SAN ANTONIO - COAHUILA	3,000,000.00	2,991,117.20	2,991,117.20	2,991,117.20	2,991,110.61		0.00	0.76		2,991,110.61	100.00%	100.00%	
						<b>3,000,000.00</b>	<b>2,991,117.20</b>	<b>2,991,117.20</b>	<b>2,991,117.20</b>	<b>2,991,110.61</b>		<b>0.00</b>	<b>0.76</b>		<b>2,991,110.61</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS CONSULTORIA S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN 68 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA AGUASCALIENTES - COAHUILA	2,400,000.00	2,376,712.40	2,376,712.40	2,376,712.40	2,376,711.80		0.00	0.80		2,376,711.80	100.00%	100.00%	
						<b>2,400,000.00</b>	<b>2,376,712.40</b>	<b>2,376,712.40</b>	<b>2,376,712.40</b>	<b>2,376,711.80</b>		<b>0.00</b>	<b>0.80</b>		<b>2,376,711.80</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	ASISORIA, PROYECTOS Y CONSULTORIA AMACALIA S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN 69 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA AGUASCALIENTES - COAHUILA	4,700,000.00	4,690,280.17	4,690,280.17	4,690,280.17	4,690,280.17		0.00	0.00		4,690,280.17	100.00%	100.00%	
						<b>4,700,000.00</b>	<b>4,690,280.17</b>	<b>4,690,280.17</b>	<b>4,690,280.17</b>	<b>4,690,280.17</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,690,280.17</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO SERVICIOS DE PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN 200 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA AGUASCALIENTES - COAHUILA	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	4,400,000.00	3,375,006.44	3,375,006.44	3,375,006.44	3,374,992.21		0.00	4.00		3,374,992.21	100.00%	100.00%	
						<b>4,400,000.00</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,375,006.44</b>	<b>3,374,992.21</b>		<b>0.00</b>	<b>4.00</b>		<b>3,374,992.21</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		
19ME	450011929	GRUPO REICHI, PROYECTO Y OBRAS CIVILES S.A. DE C.V.	19/02/2011	29/06/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN LA ESTRUCTURA DEL PUENTE ZACATE	3,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		0.00	0.13		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
						<b>3,200,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.13</b>		<b>1,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	
<b>Coahuila de Zaragoza - Coahuila</b>																		





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 16 de Octubre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Culminado Acumulado C	Monto En Trámite D	Revoluciones Devoluciones	Monto Cancelado E	Diferencia D-C+E	Ejército y Fideicomiso de Electricidad	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	Fecha de Cierre	
			Inicio	Fin															
<b>Quintana Roo - Mazatlan</b>																			
40HE	450017008	TORSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10/1/2011	31/07/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA PERMANENTE MAZATLAN DEL KM 0+000 AL KM 52+000	\$ 5,041,700.00	\$ 5,041,700.00	\$ 5,041,700.00	\$ 5,041,700.00	\$ 5,041,700.00	\$ 5,041,700.00	\$ -	\$ 5,041,700.00	\$ -	\$ 5,041,700.00	100.00%	100.00%		
<b>CHIAPAS</b>																			
<b>Las Chorreras - Reuniries - Ocozacoacoatlán</b>																			
43HE	450011409	CONSTRUCCIONA TONKA S.A. DE C.V. Contrato Rescatado	07/02/2011	06/09/2011	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL Camino DIRECTO.	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ 3,130,000.00	\$ -	\$ 3,130,000.00	\$ -	\$ 3,130,000.00	\$ -	\$ 3,130,000.00	100.00%	100.00%	
<b>OAXACA</b>																			
<b>Cd. Cuicmojalán - Oaxaca</b>																			
44HE	450015275	ORLEO DE INGENIERIA DE LA CIENCIA S.A. DE C.V. Y S.A. DE C.V. DE INGENIERIA S.A. DE C.V.	14/02/2011	14/02/2011	MANTENIMIENTO MENOR EN 142 ESTRUCTURAS DEL C.D. CUICMOJALAN - OAXACA	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ 5,700,000.00	\$ -	\$ 5,700,000.00	\$ -	\$ 5,700,000.00	\$ -	\$ 5,700,000.00	100.00%	100.00%	
<b>TOTAL</b>						\$ 14,261,700.00	\$ 14,261,700.00	\$ 14,261,700.00	\$ 14,261,700.00	\$ 14,261,700.00	\$ -	\$ 14,261,700.00	\$ -	\$ 14,261,700.00	\$ -	\$ 14,261,700.00	100.00%	100.00%	

0290

0290

7




CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Estado de Cuentas: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Ejecutado	Programado Autorizado B	Estimado Autorizado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejército a Fines de Ejercicio	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Cuentas Pagadas	Avance Financiero (%)	Avance Fisical (%)	
Tijuana	\$ 5,000,000.00	\$ 4,417,236.05	\$ 6,417,236.05	\$ 6,417,236.85	\$ 6,417,238.58		\$ 8.07		\$ 0,417,229.58	\$ 9,014.00		100.0%	100.0%	
Culiacán	\$ 6,000,000.00	\$ 0,750,908.54	\$ 9,750,908.54	\$ 0,750,907.70	\$ 9,750,917.70		0.70		\$ 0,021,500.32		\$ 164,508.54	100.0%	100.0%	
Querétaro	\$ 1,000,000.00	\$ 0,062,477.36	\$ 0,062,477.36	\$ 0,062,477.30	\$ 0,062,477.30				\$ 0,062,477.36			100.0%	100.0%	
Guerrero	\$ 3,000,000.00	\$ 22,018,810.43	\$ 2,018,810.43	\$ 2,018,810.43	\$ 2,354,302.40			\$ 564,457.03	\$ 2,354,302.40	\$ 264,580.04		0.0%	0.0%	
Puebla	\$ 3,000,000.00	\$ 16,343,993.16	\$ 3,010,820.83	\$ 3,010,820.83	\$ 3,010,820.83				\$ 3,010,820.83			90.7%	100.0%	
Coahuila												0.0%	0.0%	
Veracruz												100.0%	0.0%	
Reynosa												0.0%	0.0%	
Guadaluajara												0.0%	0.0%	
Monterrey	\$ 1,050,000.00	\$ 1,020,747.84	\$ 1,020,747.84	\$ 1,020,747.84	\$ 1,020,747.84				\$ 1,020,747.84			100.0%	100.0%	
Chihuahua	\$ 6,153,000.00	\$ 3,070,360.08	\$ 3,070,360.98	\$ 3,070,360.98	\$ 2,701,708.11	\$ 18,733.20		\$ 1,256,061.67	\$ 2,701,708.11	\$ 27,650.81		99.5%	99.5%	
Oaxaca	\$ 1,825,400.00	\$ 1,718,051.20	\$ 1,718,051.20	\$ 1,718,051.28	\$ 1,718,051.28				\$ 1,718,051.20			100.0%	100.0%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 25,014,000.00</b>	<b>\$ 83,144,152.22</b>	<b>\$ 29,810,821.80</b>	<b>\$ 29,810,821.89</b>	<b>\$ 27,960,761.16</b>	<b>\$ 18,733.20</b>	<b>\$ 1,256,070.50</b>	<b>\$ 564,457.03</b>	<b>\$ 28,133,758.70</b>	<b>\$ 302,144.91</b>	<b>\$ 104,998.54</b>	<b>98.0%</b>	<b>99.93%</b>	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

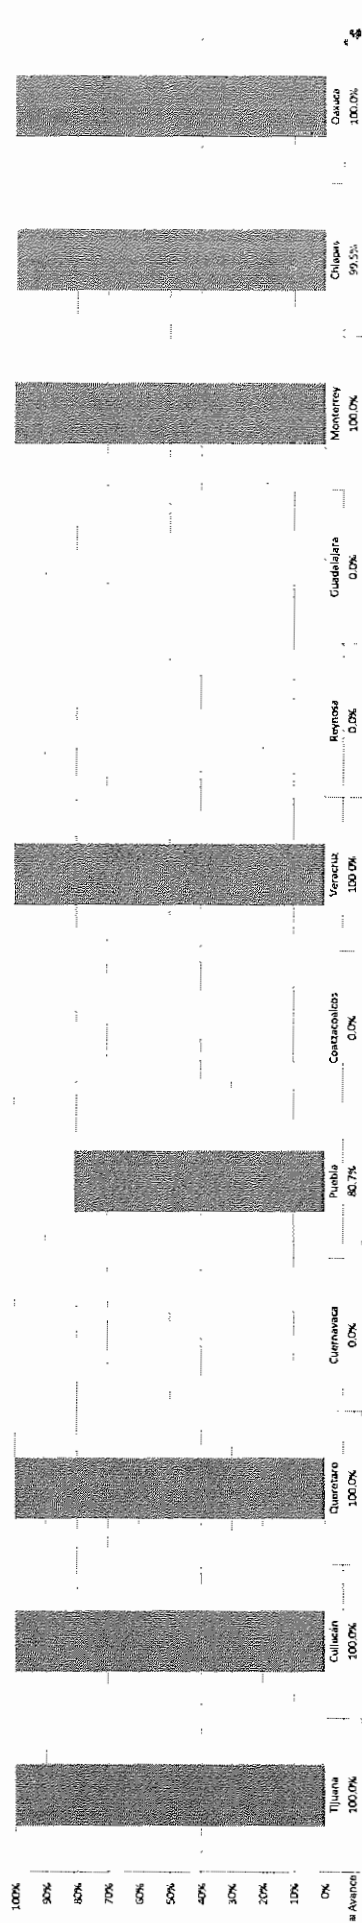

001 0291

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MODERNIZACION 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE EJECUCION: 15/06/2011 09:02:12

No. Partida	Contenido No.	Empresa	Periodo del Contrato	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Comprometido A	Monto Programado D	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Reservaciones - Devoluciones	Saldo Comprometido E	Diferencia U-C-D-E	Capítulo e Fijo de Efectivo	Avance Realizado (%)	Avance Fisico (%)	Alícuota de Costos Pujalota
<b>Tlaxiama - Esmatista</b>																
1MD	400010001	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00			0.00		1,400,000.00	100.00%	100.00%	
2MD	400010002	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			0.00		1,500,000.00	100.00%	100.00%	
3MD	400010003	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			0.00		700,000.00	100.00%	100.00%	
4MD	400010004	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			0.00		100,000.00	100.00%	100.00%	
5MD	400010005	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	RECONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00			0.00		700,000.00	100.00%	100.00%	
<b>La Esperanza - Terrell</b>																
6MD	400010006	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>GLX JACAP</b>																
7MD	400010007	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>Estacion Don. - Nahuatl</b>																
8MD	400010008	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
9MD	400010009	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>QUERETARO</b>																
10MD	400010010	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
11MD	400010011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>PUEBLA</b>																
12MD	400010012	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>México - Puebla</b>																
13MD	400010013	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
14MD	400010014	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>Puebla - Aztlahuacán</b>																
15MD	400010015	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
16MD	400010016	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
<b>Aztlahuacán - C. Manizote</b>																
17MD	400010017	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	
18MD	400010018	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	19/05/2011	CONSTRUCCION DE BARRIOS PERIFERICOS DE LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE TLUANNA	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00			0.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%	

0000292

Handwritten signature







CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra							Seguimiento al Avance Presupuestal			Avance financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones		Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 161,650.00											0.0%
Culiacán	\$ 177,779.00	\$ 557,178.89	\$ 557,178.89	\$ 557,178.89	\$ 535,639.25		\$ 21,539.64		\$ 535,639.25			100.0%
Querétaro												0.0%
Cuernavaca												0.0%
Puebla	\$ 137,838.00	\$ 1,000,000.00										0.0%
Coahuila												0.0%
Veracruz		\$ 665,666.67										0.0%
Reynosa												0.0%
Guadalupe												0.0%
Monterrey												0.0%
Chilpan	\$ 303,688.00	\$ 197,510.59	\$ 197,510.59	\$ 197,510.59	\$ 197,510.59				\$ 197,510.59	\$ 3,351.62		100.0%
Oaxaca	\$ 92,545.00											0.0%
<b>TOTAL</b>	\$ 893,500.00	\$ 2,421,356.15	\$ 754,689.48	\$ 754,689.48	\$ 733,149.84		\$ 21,539.64		\$ 733,149.84	\$ 3,351.62		100.0%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)



000 0204

Handwritten mark



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Fecha de corte: 31 de Octubre de 2011. Estado de Efectivo: 0.0%

No. Panteón	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Estado a Fines de Efectivo	Avance financiero (%)
			Inicio	Fin												
<b>Tlaxcala - Encomienda</b>																
1840		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDAS CARRETERAS EN LA PLAZA DE COBRO DE LA PLAZA DE COBRO DE TILAXCALA	37,700.00										
1847		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDAS CARRETERAS PERIFÉRICAS DE LA PLAZA DE COBRO DE TILAXCALA	68,840.00										
1848		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDAS CARRETERAS EN LA PLAZA DE COBRO DE TILAXCALA	21,810.00										
<b>La Rumorosa - Tesala</b>																
1849		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE TESALA	67,100.00										
<b>CULIACÁN</b>																
<b>Estación Don - Nogales</b>																
1850		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE DON NOGALES	74,830.00										
1851		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE DON NOGALES	27,827.00										
1852	486019200	IRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.	2/04/2011	08/09/2011	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE DON NOGALES		907,178.86	907,178.86	907,178.86	536,000.26			271,000.04		536,000.26	100.0%
<b>PUEBLA</b>																
<b>México - Puebla</b>																
1853		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE SAN MARCOS DE CALTEPEC	27,827.00										
1854		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE SAN MARCOS DE CALTEPEC	19,910.00										
<b>Puebla - Acatepec</b>																
1855		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE SAN MARCOS DE CALTEPEC	24,000.00										
1856		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE SAN MARCOS DE CALTEPEC	10,000.00										
<b>Acatepec - Co. Membrillo</b>																
1857		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE SAN MARCOS DE CALTEPEC	14,000.00										
1858		PANTERA DANIELA TRABAJOS A CARGO DE LA DELEGACIÓN REGIONAL			SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIFÉRICA DE LA PLAZA DE COBRO DE SAN MARCOS DE CALTEPEC	19,000.00										

*[Handwritten signature]*





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE MODERNIZACIÓN 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Comentario	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Registrado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Obras en M-C-A-E	Gasto a Mayo del Ejercicio	Avance Financiero (%)
			Inicio	Fin												
<b>VERACRUZ</b>																
<b>CA. MENDOZA - CURCUBA</b>																
					<b>SUBTOTAL VERACRUZ</b>	<b>132,824.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>

<b>CHIAPAS</b>																
<b>Las Chompas-Fundación-Ocozacoautla</b>																
22ND	460816410	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YACHE, S.A. DE C.V.	01/06/2011	13/05/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DE MURDO DE COBRO EN LA CARRETERA FEDERAL EN EL KM 102+000 DE LA CARRETERA DE OCOZACAOAUTLA	44,675.00	37,022.00	37,227.43	37,302.43	37,022.43	-	406.00	-	-	37,022.43	100.0%
23ND	460816421 (1)	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YACHE, S.A. DE C.V.	01/06/2011	13/05/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE CONCRETO EN LA ZONA DE DENTRO DE LA ZONA DE DENTRO DE LAS CHOMPAS EN EL KM 102+000 DE LA CARRETERA FEDERAL EN LAS CHOMPAS-HAUNALICH-OCOZACOAUTLA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	-	1,201.19	-	-	10,000.00	100.0%
24ND	460816421 (2)	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YACHE, S.A. DE C.V.	01/06/2011	13/05/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE CONCRETO EN LA ZONA DE DENTRO DE LAS CHOMPAS EN EL KM 112+000 DE LA CARRETERA FEDERAL EN LAS CHOMPAS-HAUNALICH-OCOZACOAUTLA	48,792.00	48,792.00	48,792.00	48,792.00	48,792.00	-	21.66	-	-	48,792.00	100.0%
25ND	460816421 (3)	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YACHE, S.A. DE C.V.	01/06/2011	13/05/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE CONCRETO EN LA ZONA DE DENTRO DE LAS CHOMPAS EN EL KM 107+000 DE LA CARRETERA FEDERAL EN LAS CHOMPAS-HAUNALICH-OCOZACOAUTLA	27,971.00	16,004.99	19,034.56	19,034.96	16,004.96	-	-	-	-	16,004.96	100.0%
<b>SUBTOTAL CHIAPAS</b>																
					<b>SUBTOTAL CHIAPAS</b>	<b>132,438.00</b>	<b>111,619.99</b>	<b>115,053.99</b>	<b>115,135.36</b>	<b>115,033.36</b>	<b>-</b>	<b>3,330.52</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>115,033.36</b>	<b>100.0%</b>

<b>OAXACA</b>																
<b>Carreteras y Puentes - Ocozacoautla</b>																
26ND	460816410	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YACHE, S.A. DE C.V.	01/06/2011	02/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE CONCRETO EN LA ZONA DE DENTRO DE LAS CHOMPAS EN EL KM 102+000 DE LA CARRETERA FEDERAL EN LAS CHOMPAS-HAUNALICH-OCOZACOAUTLA	30,791.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
27ND	460816410	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES YACHE, S.A. DE C.V.	01/06/2011	02/10/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE CONCRETO EN LA ZONA DE DENTRO DE LAS CHOMPAS EN EL KM 107+000 DE LA CARRETERA FEDERAL EN LAS CHOMPAS-HAUNALICH-OCOZACOAUTLA	98,600.00	84,911.20	84,911.20	84,911.20	84,911.20	-	1,878.70	-	-	84,911.20	100.0%
<b>SUBTOTAL OAXACA</b>																
					<b>SUBTOTAL OAXACA</b>	<b>129,391.00</b>	<b>84,911.20</b>	<b>84,911.20</b>	<b>84,911.20</b>	<b>84,911.20</b>	<b>-</b>	<b>1,878.70</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>84,911.20</b>	<b>100.0%</b>

<b>TOTAL</b>																
					<b>TOTAL</b>	<b>494,653.00</b>	<b>2,471,326.13</b>	<b>714,489.48</b>	<b>714,489.48</b>	<b>714,489.48</b>	<b>-</b>	<b>5,369.32</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>714,489.48</b>	<b>100.0%</b>

0296






CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 18 de Octubre de 2012

Designación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal					
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Conocido A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Saldo Generalizado E	Diferencia B+C-D+E	Ejercido a Flujos de Efectivos	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance Realizado (%)	Avance físico (%)
Tijuana	\$ 1,100,371.00	\$ 1,115,732.00	\$ 1,115,732.00	\$ 1,115,732.00	\$ 1,115,732.00			\$ 1,115,732.00			100.0%	N/A
Culiacan	\$ 2,070,401.00										0.0%	N/A
Quadrólaro	\$ 3,008,321.00	\$ 3,275,616.33	\$ 3,275,616.33	\$ 3,275,616.33	\$ 3,275,616.33			\$ 3,275,616.33			100.0%	N/A
Cuernavaca	\$ 1,137,062.00	\$ 2,743,065.02	\$ 2,743,065.02	\$ 2,743,065.02	\$ 2,743,065.02			\$ 2,743,065.02			100.0%	N/A
Puebla	\$ 1,247,898.00	\$ 1,990,446.76	\$ 1,990,446.76	\$ 1,990,446.76	\$ 1,990,446.76			\$ 1,990,446.76			100.0%	N/A
Coahuila de Zaragoza	\$ 1,002,022.00	\$ 2,427,578.36	\$ 2,427,578.36	\$ 2,427,578.36	\$ 2,427,578.36			\$ 2,427,578.36			100.0%	N/A
Veracruz	\$ 1,502,128.00	\$ 2,764,319.56	\$ 2,764,319.56	\$ 2,764,319.56	\$ 2,764,319.56			\$ 2,764,319.56			100.0%	N/A
Reynosa	\$	\$ 152,855.87	\$ 152,855.87	\$ 152,855.87	\$ 152,855.87	\$ 39,172.02		\$ 113,682.05			100.0%	N/A
Guadaluajara	\$ 1,310,107.00	\$ 1,513,011.05	\$ 1,513,011.05	\$ 1,513,011.05	\$ 1,513,011.05	\$ 304,037.70		\$ 1,119,874.18			100.0%	N/A
Minatitlán	\$ 2,758,021.00	\$ 2,128,224.10	\$ 2,128,224.10	\$ 2,128,224.10	\$ 2,128,224.10	\$ 553,575.27		\$ 1,574,648.83			100.0%	N/A
Chihuahua	\$ 1,204,488.00	\$ 1,023,765.75	\$ 1,023,765.75	\$ 1,023,765.75	\$ 1,023,765.75			\$ 1,023,765.75			100.0%	N/A
Oaxaca	\$	\$ 574,634.83	\$ 574,634.83	\$ 574,634.83	\$ 574,634.83			\$ 574,634.83			100.0%	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,250,000.00</b>	<b>\$ 19,719,140.13</b>	<b>\$ 19,719,140.13</b>	<b>\$ 19,719,140.13</b>	<b>\$ 19,732,363.15</b>	<b>\$ 886,785.98</b>		<b>\$ 18,732,363.15</b>			<b>100.0%</b>	<b>N/A</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

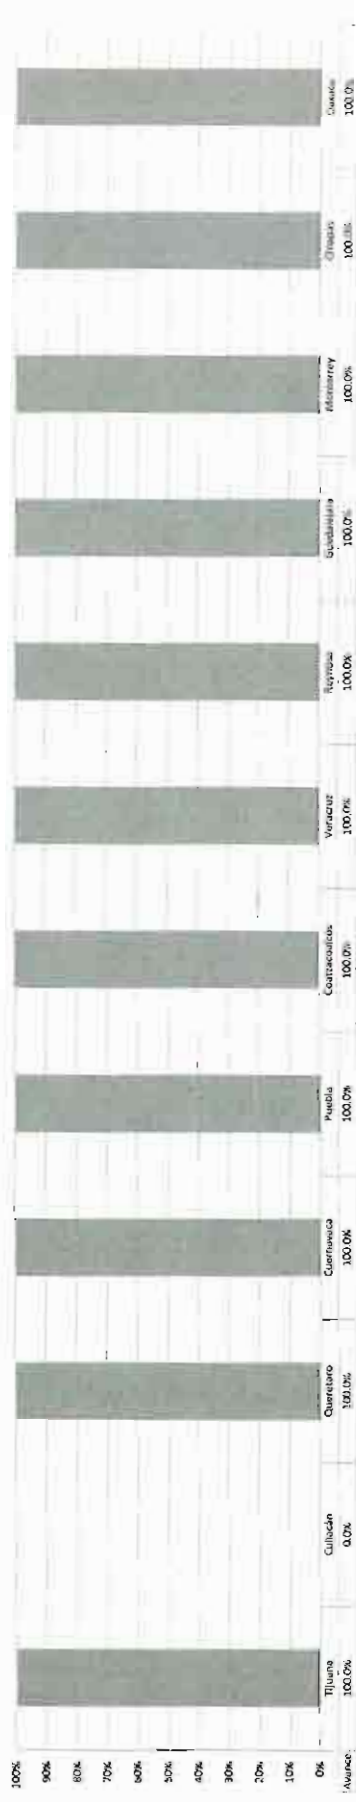

000 0207

Handwritten mark










**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



Fecha de corte: 16 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Exhausto Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Relaciones Devoluciones	Ajustes de Costos pagados		
Tijuana	\$ 2,967,930.54	\$ 2,967,930.54	\$ 2,967,930.54	\$ 2,967,930.54	\$ 2,967,930.54			\$ 2,967,930.54			100.0%	N/A
Culiacán											0.0%	N/A
Querétaro	\$ 190,018.31	\$ 190,018.31	\$ 190,018.31	\$ 190,018.31	\$ 190,018.30	\$ 0.01		\$ 190,018.30			100.0%	N/A
Cuernavaca	\$ 2,765,165.44	\$ 2,765,165.44	\$ 2,765,165.44	\$ 2,765,165.44	\$ 2,765,165.44			\$ 2,765,165.44			100.0%	N/A
Puebla	\$ 2,280,219.61	\$ 2,090,201.30	\$ 2,090,201.30	\$ 2,090,201.30	\$ 1,900,183.02	\$ 190,018.29		\$ 1,900,183.02			100.0%	N/A
Coahuila											0.0%	N/A
Veracruz	\$ 3,629,282.75	\$ 501,985.74	\$ 501,985.74	\$ 501,985.74	\$ 501,985.74			\$ 501,985.74			100.0%	N/A
Reynosa											0.0%	N/A
Guadalajara	\$ 857,401.66	\$ 1,898,142.12	\$ 1,898,142.12	\$ 1,898,142.12	\$ 1,898,142.12			\$ 1,898,142.12			100.0%	N/A
Monterrey											0.0%	N/A
Chiapas											0.0%	N/A
Oaxaca		\$ 3,127,297.01	\$ 3,127,297.01	\$ 3,127,297.01	\$ 3,127,297.01			\$ 3,127,297.01			100.0%	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 12,500,000.00</b>	<b>\$ 13,540,740.46</b>	<b>\$ 13,540,740.46</b>	<b>\$ 13,540,740.46</b>	<b>\$ 13,350,722.17</b>	<b>\$ 190,018.29</b>		<b>\$ 13,350,722.17</b>			<b>100.0%</b>	<b>N/A</b>

**Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)**

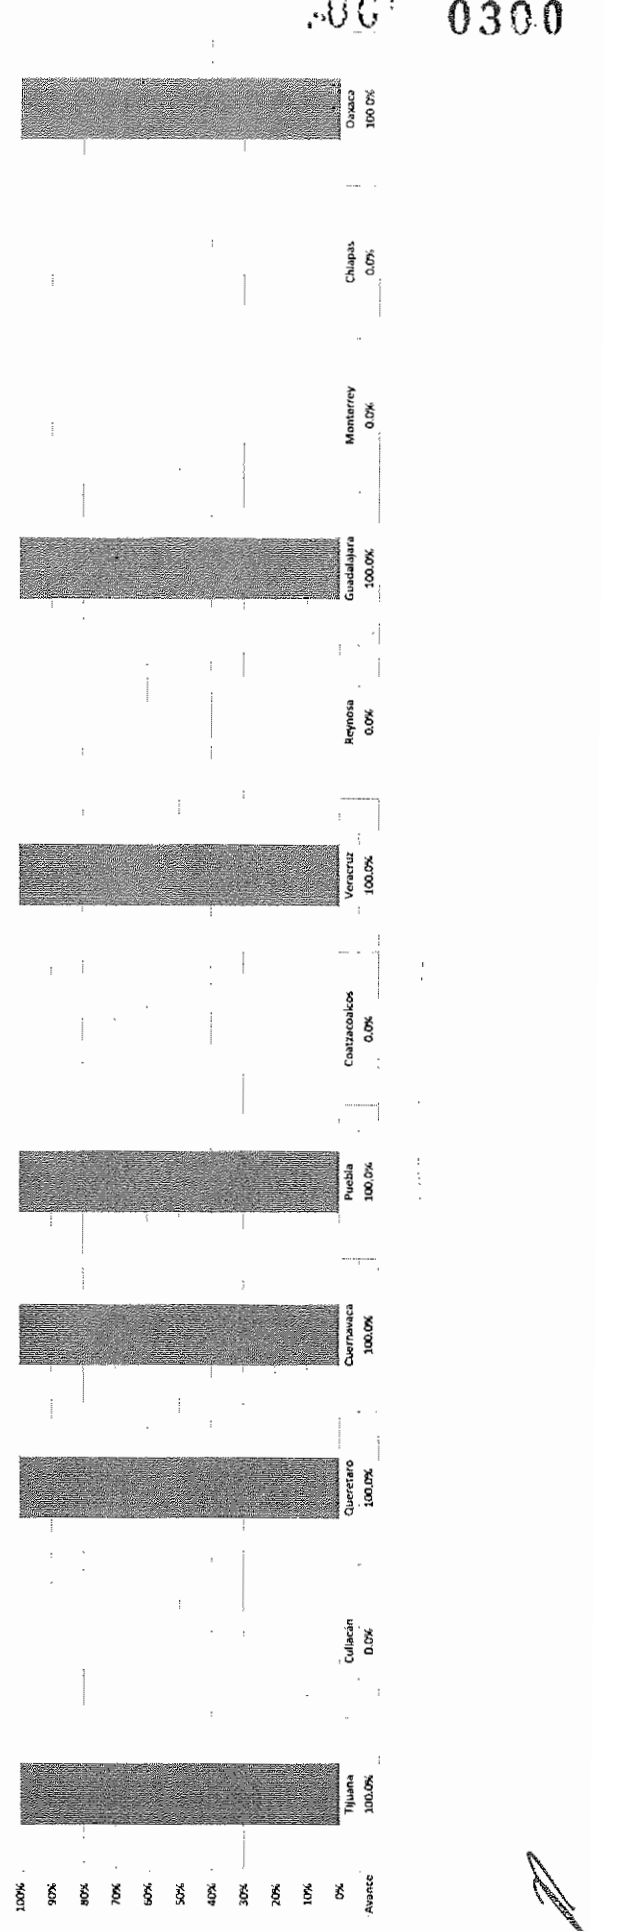

0300



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 ORECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS ESPECIALES 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Contratado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto En Trámite	Retenciones - Devoluciones	Estado Cancelado	Diferencia U-C-D-E	Canción de Efectivo	Avance financiero (%)
			Inicio	Fin											
<b>TIJUANA</b>															
<b>Tijuana - Ensenada</b>															
31E-11	40001007	MEXICANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A. DE CV	01/04/2011	28/09/2011	INSPECCION VISUAL DE 6 ESTRUCTURAS ESPECIALES UNIDADAS EN LAS AUTOPISTAS TIJUANA - ENRIQUENA (1) Y LA TIDATE - LA RUMICORRA (2)	2,867,200.00	2,867,200.00	2,867,200.00	2,867,200.00	2,867,200.00	-	0.00	0.00	2,867,200.00	100.0%
31E-11	40001007				<b>SUBTOTAL TIJUANA</b>	<b>2,867,200.00</b>	<b>2,867,200.00</b>	<b>2,867,200.00</b>	<b>2,867,200.00</b>	<b>2,867,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,867,200.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>GUERNAVACA</b>															
<b>Mexico-Cuernavaca</b>															
31E-11	40001013	COMBATINOS DE CONSTRUCCION Y PROYECTOR S.C.L	10/04/2011	10/06/2011	INSPECCION VISUAL DE 10 ESTRUCTURAS ESPECIALES UNIDADAS EN LAS AUTOPISTAS GUERNAVACA - ADAPULCO (1) Y GUERNAVACA - ADAPULCO (1)	2,705,100.00	2,705,100.00	2,705,100.00	2,705,100.00	2,705,100.00	-	0.00	0.00	2,705,100.00	100.0%
31E-11	40001013				<b>SUBTOTAL GUERNAVACA</b>	<b>2,705,100.00</b>	<b>2,705,100.00</b>	<b>2,705,100.00</b>	<b>2,705,100.00</b>	<b>2,705,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,705,100.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>PUEBLA</b>															
<b>Mexico-Puebla</b>															
31E-11	40001014	INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.C	10/04/2011	10/04/2011	INSPECCION VISUAL DE 12 ESTRUCTURAS ESPECIALES UNIDADAS EN LAS AUTOPISTAS MEXICO - PUEBLA (4) ACATZINGO - CD. MANZOCA (7) Y CHAMPAPA - LECHERA (1)	2,280,210.00	2,280,210.00	2,280,210.00	2,280,210.00	2,280,210.00	-	0.00	0.00	2,280,210.00	100.0%
31E-11	40001014				<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>	<b>2,280,210.00</b>	<b>2,280,210.00</b>	<b>2,280,210.00</b>	<b>2,280,210.00</b>	<b>2,280,210.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280,210.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>VERACRUZ</b>															
<b>Guerrero Zamora-Tehuacan</b>															
31E-11	40001021	GUERREROS INGENIERIA S.A. DE CV & FILIAL	04/05/2011	30/09/2011	INSPECCION VISUAL DE 6 ESTRUCTURAS ESPECIALES UNIDADAS EN LAS AUTOPISTAS GUERREROS ZAMORA - TIHUATLAN (2) Y GUANAJUATO-OAXACA (2)	3,070,207.00	3,070,207.00	3,070,207.00	3,070,207.00	3,070,207.00	-	0.00	0.00	3,070,207.00	100.0%
31E-11	40001021				<b>SUBTOTAL VERACRUZ</b>	<b>3,070,207.00</b>	<b>3,070,207.00</b>	<b>3,070,207.00</b>	<b>3,070,207.00</b>	<b>3,070,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,070,207.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>GUADALAJARA</b>															
<b>Nueva Jalisco - Lerano Capatzen</b>															
31E-11	40001022	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y OTH	12/02/2011	12/02/2011	INSPECCION VISUAL DE 12 ESTRUCTURAS ESPECIALES UNIDADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAJAZARO CADEMAS (4), PATZCUARO - ERUPAN (2) Y ERUPAN - NUEVA ITALIA (6)	13,540,724.00	13,540,724.00	13,540,724.00	13,540,724.00	13,540,724.00	-	0.00	0.00	13,540,724.00	100.0%
31E-11	40001022				<b>SUBTOTAL GUADALAJARA</b>	<b>13,540,724.00</b>	<b>13,540,724.00</b>	<b>13,540,724.00</b>	<b>13,540,724.00</b>	<b>13,540,724.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,540,724.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL</b>															
						<b>12,463,000.00</b>	<b>12,463,000.00</b>	<b>12,463,000.00</b>	<b>12,463,000.00</b>	<b>12,463,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,463,000.00</b>	<b>100.0%</b>

0301

22



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA


PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



Hoja de conteo: 18 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	
Tijuana												0.0%		
Culliacán												0.0%		
Querétaro		\$ 11,966,803.65	\$ 11,966,803.65	\$ 11,966,803.65	\$ 11,966,803.48		\$ 0.17		\$ 12,102,250.25	\$ 0.01	\$ 135,455.77	100.0%	100.0%	
Cuernavaca		\$ 56,818,860.57	\$ 56,818,860.57	\$ 56,818,860.57	\$ 56,311,885.63		\$ 507,020.94		\$ 56,311,885.63			100.0%	100.0%	
Puebla		\$ 90,050,991.04	\$ 90,050,991.04	\$ 90,050,991.04	\$ 97,981,209.12		\$ 1,089,781.92		\$ 97,981,209.12	\$ 62,439.73		100.0%	100.0%	
Coahuila		\$ 65,022,815.40	\$ 65,022,815.40	\$ 65,022,815.40	\$ 50,371,235.47		\$ 6,551,570.93		\$ 59,778,324.85	\$ 2,520,640.04		100.0%	100.0%	
Veracruz												0.0%		
Raynosa												0.0%		
Guadalupe		\$ 19,441,723.25	\$ 19,441,723.25	\$ 19,441,723.25	\$ 17,681,580.31		\$ 1,760,142.04		\$ 17,681,580.31			100.0%	100.0%	
Monterrey		\$ 92,987,980.33	\$ 92,987,980.33	\$ 92,987,980.33	\$ 50,271,438.59		\$ 12,716,550.78	\$ 0.01	\$ 50,271,438.59	\$ 1,038,219.07		100.0%	100.0%	
Chiapas		\$ 6,200,034.51	\$ 6,200,034.51	\$ 6,200,034.51	\$ 6,131,260.52		\$ 68,784.00		\$ 6,131,260.52	\$ 366.62		100.0%	100.0%	
Oaxaca												0.0%		
<b>TOTAL</b>		\$ 322,389,243.75	\$ 322,389,243.75	\$ 322,389,243.75	\$ 299,065,402.06		\$ 22,893,841.65	\$ 0.01	\$ 306,237,947.24	\$ 4,306,798.01	\$ 542,545.15	100.0%	100.0%	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

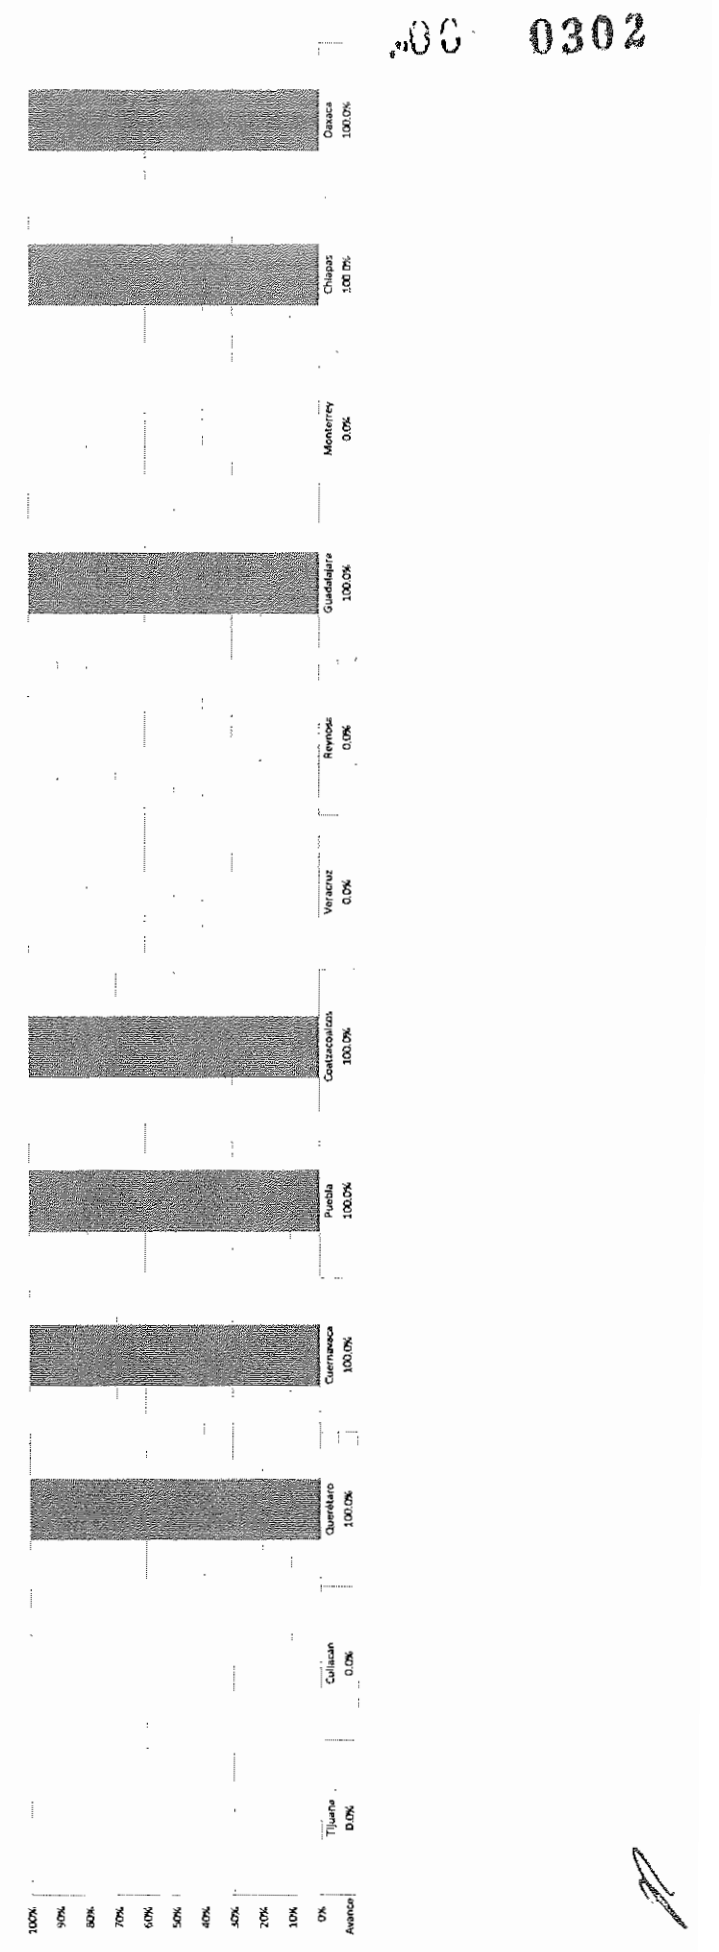

000 0302

Handwritten signature





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Puesta	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Referencias - Devoluciones	Estado Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Líquido a Flujos de Efectivo	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	Ajustes de Costos Pagados
			Inicio	Fin														
<b>QUILMÉZAR</b>																		
<b>Chamara - L. Lecheros</b>																		
ET-419-2011	450017322 500054976	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	10/17/2011	20/02/2012	ATENCIÓN TÉCNICA DE LA OMA EN EMERGENCIA Y PROTECCIÓN DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KILÓMETRO CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA CHAMARA - VICERREINA.	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ 11.000.000,00	\$ -	\$ 0,01	\$ 0,17	\$ -	\$ 12.102.200,29	100,0%	100,0%	\$ 138.406,77
<b>CUERNAVACA</b>																		
<b>Chamara - Acapulco</b>																		
ET-411-2011	450017180	CONSTRUCCIONES Y ELABORACIONES S.A. DE C.V.	06/02/2011	04/02/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KILÓMETRO CUERNAVACA-ACAPULCO.	\$ 22.702.702,21	\$ 22.702.702,21	\$ 22.702.702,21	\$ 22.702.702,21	\$ 22.702.147,00	\$ -	\$ -	\$ 179.014,82	\$ -	\$ 22.526.147,69	100,0%	100,0%	\$ -
ET-412-2011	450017116	G C ACUARIO, S.A. DE C.V.	06/02/2011	10/02/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KILÓMETRO CUERNAVACA-ACAPULCO.	\$ 11.103.471,00	\$ 11.103.471,00	\$ 11.103.471,00	\$ 11.103.471,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,00	\$ -	\$ 11.103.471,00	100,0%	100,0%	\$ -
ET-413-2011	450017124	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMPL, S.A. DE C.V.	01/02/2011	31/01/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KILÓMETRO CUERNAVACA-ACAPULCO.	\$ 10.659.051,77	\$ 10.659.051,77	\$ 10.659.051,77	\$ 10.659.051,77	\$ 10.676.000,00	\$ -	\$ -	\$ 83.000,00	\$ -	\$ 10.676.000,00	100,0%	100,0%	\$ -
ET-414-2011	PARTIDA CANCELADA POR CONCORDIA CON EL OFICIO DEPARTAMENTO DE VIALIDAD EN EL KILÓMETRO CUERNAVACA-ACAPULCO.																	
<b>Zacapalco - Rancho Viejo</b>																		
ET-416-2011	450017418	CANTAR DE GOMEZ REINE ROBERTO S.A. DE C.V.	29/11/2011	31/05/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DEL CORTE QUE SE UBICA EN EL KILÓMETRO ZACAPALCO-RANCHO VIEJO.	\$ 12.052.902,93	\$ 12.052.902,93	\$ 12.052.902,93	\$ 12.052.902,93	\$ 11.004.206,12	\$ -	\$ -	\$ 248.227,41	\$ -	\$ 11.004.206,12	100,0%	100,0%	\$ -
<b>PUEBLA</b>																		
<b>México - Puebla</b>																		
ET-403-2011	450017445 500054932	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	17/04/2011	30/02/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA DEL KM. 27+100 AL KM. 29+100 DEL CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA ACATZINGO - CD. MENDOZA.	\$ 11.721.086,44	\$ 11.721.086,44	\$ 11.721.086,44	\$ 11.721.086,44	\$ 11.640.000,00	\$ -	\$ -	\$ 72.769,70	\$ -	\$ 11.640.000,00	100,0%	100,0%	\$ -
ET-404-2011	450017408	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	01/07/2011	30/09/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA DEL KM. 29+800 AL KM. 3+800 CUERPOS "A" Y "B".	\$ 4.856.051,06	\$ 4.856.051,06	\$ 4.856.051,06	\$ 4.856.051,06	\$ 4.240.000,00	\$ -	\$ -	\$ 612.206,28	\$ -	\$ 4.240.000,00	100,0%	100,0%	\$ -
<b>Acapulco - Cd. Mendoza</b>																		
ET-415-2011	450017102 500054946	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES AMPL, S.A. DE C.V.	03/09/2011	06/04/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TALUZO DE LOS CORTES UBICADOS EN EL KM. 29+800 Y KM. 29+500 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA ACATZINGO - CD. MENDOZA.	\$ 42.056.290,00	\$ 42.056.290,00	\$ 42.056.290,00	\$ 42.056.290,00	\$ 42.204.004,40	\$ -	\$ -	\$ 374.174,80	\$ -	\$ 42.204.004,40	100,0%	100,0%	\$ -
ET-416-2011	450017103 500054958	EDIFICADORA LAGOS S.A. DE C.V.	03/09/2011	06/04/2012	ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA TÉCNICA MEDIANTE LA ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DEL TALUZO DE LOS CORTES UBICADOS EN EL KM. 29+200 Y KM. 29+200 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA ACATZINGO - CD. MENDOZA.	\$ 30.815.117,80	\$ 30.815.117,80	\$ 30.815.117,80	\$ 30.815.117,80	\$ 30.894.000,00	\$ -	\$ 62.400,70	\$ 100.000,00	\$ -	\$ 30.894.000,00	100,0%	100,0%	\$ -
<b>COATZACOALCOB</b>																		
<b>Salina Cruz - La Ventosa</b>																		
ET-406-2011	450018114 500054940 500054938	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	19/07/2011	10/02/2012	TRABAJOS POR EMERGENCIA TÉCNICA PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS OCASIONADAS POR LA OMBRA TROPICAL N.º 6 EN EL KILÓMETRO 10+000 DE LA AUTOPISTA TULAHUAPILLA - PUEBLA.	\$ 36.707.410,56	\$ 36.707.410,56	\$ 36.707.410,56	\$ 36.707.410,56	\$ 32.843.201,60	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 4.004.008,00	\$ -	\$ 32.843.201,60	100,0%	100,0%	\$ -
ET-407-2011	450016809	TECNOLOGIA UNICOLUBRANTES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	19/11/2011	19/11/2011	TRABAJOS POR EMERGENCIA TÉCNICA PROVOCADOS POR LAS LLUVIAS OCASIONADAS POR LA OMBRA TROPICAL N.º 6 EN EL KILÓMETRO 10+000 DE LA AUTOPISTA TULAHUAPILLA - PUEBLA.	\$ 20.216.404,82	\$ 20.216.404,82	\$ 20.216.404,82	\$ 20.216.404,82	\$ 20.227.013,97	\$ -	\$ -	\$ 2.487.403,20	\$ -	\$ 27.136.000,00	100,0%	100,0%	\$ 407.000,38

*[Handwritten signature]*



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**



**PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Paralela	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Flujo de Efectivo	Avance Contrato (%)	Avance Auto Pagado
			Inicio	Fin													
<b>GUADALAJARA</b>																	
<i>Guatemala - Tepe</i>																	
ET-201-2011	426001815	GRUPO CASCO, S.A. DE C.V.	2009/2011	2009/2011	REUBRICACION DEL CUERPO "X" DE LA PLAZA DEL COMERCIO CON TRAMILLAS DE CEMENTO Y ADECUACION EN LA PLAZA ACTUAL UBICADA EN 11.1 KM 69+100 DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPE	\$ 12,750,000.00	\$ 12,750,000.00	\$ 12,750,000.00	\$ 12,750,000.00	\$ 12,740,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,400,000.00	100.0%	\$ 12,400,000.00
ET-201-2011	426001870	GRUPO CASCO, S.A. DE C.V.	07/06/2011	24/10/2011	ESTABILIZACION POR LA INGENCIA TECNICA DEL CORTE UBICADO EN EL KM 77+000 DEL TPO "Y" DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPE	\$ 9,811,722.25	\$ 9,811,722.25	\$ 9,811,722.25	\$ 9,811,722.25	\$ 4,131,000.00	\$ 1,750,142.90	\$ 1,750,142.90	\$ 1,750,142.90	\$ 0.00	\$ 4,131,000.00	100.0%	\$ 4,131,000.00
<b>CHAPAS</b>																	
<i>Las Chaguas - Frautilles - Occozocautla</i>																	
ET-201-2011	426001914	OSGINAL S.A. DE C.V.	1/05/2011	1/06/2011	CONCLUSION DE LOS TRABAJOS DE REUBRICACION DEL CUERPO UNICO DEL KM 31+600 AL KM 34+000 DEL CAMINO DIRECTO LAS CHAGUAS - FRAUTILLES - OCCOZOCAUTLA	\$ 9,960,772.40	\$ 9,960,772.40	\$ 9,960,772.40	\$ 9,960,772.40	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 9,960,772.40	100.0%	\$ 9,960,772.40
ET-201-2011	426001948	FAMA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	1/07/2011	2/07/2012	REPARACION DEL TROMBLEN FALLADO UBICADO EN EL KM 199+300 DEL C. D. LAS CHAGUAS - FRAUTILLES - OCCOZOCAUTLA	\$ 31,276,656.59	\$ 31,276,656.59	\$ 31,276,656.59	\$ 31,276,656.59	\$ 24,041,746.07	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 24,041,746.07	100.0%	\$ 24,041,746.07
ET-201-2011	426001973	DRENO Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	3/17/2011	06/02/2012	ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE EN EL KM 127+000 LADO INGRESO DEL C. D. LAS CHAGUAS - FRAUTILLES - OCCOZOCAUTLA	\$ 24,762,367.34	\$ 24,762,367.34	\$ 24,762,367.34	\$ 24,762,367.34	\$ 18,326,000.00	\$ 9,422,437.25	\$ 9,422,437.25	\$ 9,422,437.25	\$ 0.00	\$ 18,326,000.00	100.0%	\$ 18,326,000.00
<b>SUBTOTAL CHAPAS</b>																	
						\$ 62,807,088.33	\$ 62,807,088.33	\$ 62,807,088.33	\$ 62,807,088.33	\$ 50,271,436.67	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 50,271,436.67	100.0%	\$ 50,271,436.67
<b>CAKACCA</b>																	
<i>Cuscomatlan - Occozocautla</i>																	
ET-201-2011	426001879	GRUPO CONSTRUCTOR CADAL S.A. DE C.V.	1/05/2011	30/11/2011	REPARACION DE TERRAPLENES DE ACERBO DEL PUENTE RIO RICO UBICADO EN EL KM 740+00 DEL C. D. CHONCAPAN - OCAJUCA	\$ 6,200,024.51	\$ 6,200,024.51	\$ 6,200,024.51	\$ 6,200,024.51	\$ 6,151,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,151,200.00	100.0%	\$ 6,151,200.00
<b>SUBTOTAL CAKACCA</b>																	
						\$ 6,200,024.51	\$ 6,200,024.51	\$ 6,200,024.51	\$ 6,200,024.51	\$ 6,151,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 6,151,200.00	100.0%	\$ 6,151,200.00
						\$ 322,289,243.75	\$ 322,289,243.75	\$ 322,289,243.75	\$ 322,289,243.75	\$ 276,688,407.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 276,688,407.00	100.0%	\$ 276,688,407.00
						\$ 4,300,766.01	\$ 4,300,766.01	\$ 4,300,766.01	\$ 4,300,766.01	\$ 22,653,441.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 22,653,441.65	100.0%	\$ 22,653,441.65
						\$ 326,589,999.76	\$ 326,589,999.76	\$ 326,589,999.76	\$ 326,589,999.76	\$ 299,341,848.65	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 299,341,848.65	100.0%	\$ 299,341,848.65

000 0304

*[Handwritten signature]*

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance financiero (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)					
Tijuana															0.0%	
Colima															0.0%	
Querétaro	\$ 1,662,127.43	\$ 1,662,127.43	\$ 1,662,127.43	\$ 1,662,127.43	\$ 1,662,127.43	\$ 1,662,127.43	\$ 1,662,127.43	\$ 1,679,194.54		\$ 17,067.11					100.0%	
Cuernavaca	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96	\$ 5,384,249.96							100.0%	
Puebla	\$ 5,933,475.28	\$ 5,933,475.28	\$ 5,933,475.28	\$ 5,933,475.28	\$ 5,865,689.94	\$ 67,785.34	\$ 5,865,689.94	\$ 5,865,689.94							100.0%	
Coahuila	\$ 3,027,044.69	\$ 3,027,044.69	\$ 3,027,044.69	\$ 3,027,044.69	\$ 3,027,044.65	\$ 0.04	\$ 3,027,044.65	\$ 3,073,382.26		\$ 46,337.61					100.0%	
Veracruz															0.0%	
Reynosa	\$ 593,646.25	\$ 593,646.25	\$ 593,646.25	\$ 593,646.25	\$ 593,646.25		\$ 593,646.25	\$ 593,646.25	\$ 8,346.18						100.0%	
Guadalupe	\$ 357,505.51	\$ 357,505.51	\$ 357,505.51	\$ 357,505.51	\$ 357,505.51		\$ 357,505.51	\$ 357,505.51							100.0%	
Monterrey															0.0%	
Chiapas	\$ 9,557,966.23	\$ 9,557,966.23	\$ 9,557,966.23	\$ 9,557,966.23	\$ 8,623,219.60	\$ 934,746.63	\$ 8,623,219.60	\$ 8,623,219.60	\$ 462.19						90.2%	
Oaxaca	\$ 294,638.09	\$ 294,638.09	\$ 294,638.09	\$ 294,638.09	\$ 294,638.09		\$ 294,638.09	\$ 294,638.09							100.0%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 26,810,653.44</b>	<b>\$ 26,810,653.44</b>	<b>\$ 26,810,653.44</b>	<b>\$ 26,810,653.44</b>	<b>\$ 25,808,121.43</b>	<b>\$ 67,785.38</b>	<b>\$ 25,808,121.43</b>	<b>\$ 25,871,526.15</b>	<b>\$ 8,808.37</b>	<b>\$ 63,404.72</b>					<b>96.5%</b>	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)



Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DE LAS EMERGENCIAS TECNICAS 2011 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha Recibo: 14/03/2012

No. Pedido	Control No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aumentado Reautorizado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Monto En Trámite D	Referencias - Devoluciones	Saldo Contratado C	Diferencia D-C (P)	Cjeto a Flajo (R) Factores	Alcance de Cobertura (P)
------------	-------------	---------	------------------------------	-----	----------	---------------------------	------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	--------------------	--------------------	----------------------------	--------------------------

**REANADA**

<b>REANADA - Demoras</b>															
4000180016	4000180016	CONSULTORES Y CONTRATISTAS ESCANIT S.A. DE C.V.	22/10/2010	04/04/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL TALLADO EN PAVIMENTO TRAMO DEL KM 12+000 AL KM 14+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA - TEPIC CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL TALLADO EN PAVIMENTO TRAMO DEL KM 30+000 AL KM 34+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA - TEPIC	374,540.27	374,540.27	374,540.27	374,540.27	374,540.27	0.00	0.00	0.00	374,540.27	100.0%
4000180016	4000180016	CONSULTORES Y CONTRATISTAS ESCANIT S.A. DE C.V.	22/10/2010	04/04/2011	RECONSTRUCCION DEL TALLADO EN PAVIMENTO TRAMO DEL KM 30+000 AL KM 34+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA - TEPIC	210,100.00	210,100.00	210,100.00	210,100.00	210,100.00	0.00	0.00	0.00	210,100.00	100.0%
						<b>SUBTOTAL REANADA</b>	<b>584,640.27</b>	<b>584,640.27</b>	<b>584,640.27</b>	<b>584,640.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>584,640.27</b>	<b>100.0%</b>

**GUADALAJARA**

<b>GUADALAJARA - Trámite</b>															
4000180017	4000180017	MULTI SOLUCIONES OROZCO Y COMANEA S.A. DE C.V.	07/06/2011	09/11/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION PARA LA RECONSTRUCCION TECNICA DEL CORTEZ UNICO EN EL KM 77+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - TEPIC	317,300.51	317,300.51	317,300.51	317,300.51	317,300.51	0.00	0.00	0.00	317,300.51	100.0%
						<b>SUBTOTAL GUADALAJARA</b>	<b>317,300.51</b>	<b>317,300.51</b>	<b>317,300.51</b>	<b>317,300.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>317,300.51</b>	<b>100.0%</b>

**CHAPALA**

<b>CHAPALA - Resudilla - Ocotzacatlán</b>															
4000180018	4000180018	PACCSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	14/07/2011	09/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL TALLADO EN PAVIMENTO TRAMO DEL KM 12+000 AL KM 14+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA - TEPIC	3,471,000.00	3,471,000.00	3,471,000.00	3,471,000.00	3,471,000.00	0.00	0.00	0.00	3,471,000.00	100.0%
4000180018	4000180018	PACCSA INGENIERIA S.A. DE C.V.	01/11/2011	14/07/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA RECONSTRUCCION DEL TALLADO EN PAVIMENTO TRAMO DEL KM 12+000 AL KM 14+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA - TEPIC	3,276,473.32	3,276,473.32	3,276,473.32	3,276,473.32	3,276,473.32	0.00	0.00	0.00	3,276,473.32	100.0%
4000180018	4000180018	CONSTRUCION CONTROL SA DE C.V.	31/05/2011	14/03/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE ESTABILIZACION DEL TALUD DE CORTEZ EN EL KM 127+000 LADO DERECHO DEL C. D. LAS CHAMPAS - HONDULES - OCOZACATLAN	1,820,040.74	1,820,040.74	1,820,040.74	1,820,040.74	1,820,040.74	0.00	0.00	0.00	1,820,040.74	100.0%
						<b>SUBTOTAL CHAPALA</b>	<b>8,567,514.06</b>	<b>8,567,514.06</b>	<b>8,567,514.06</b>	<b>8,567,514.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,567,514.06</b>	<b>100.0%</b>

**OAXACA**

<b>OAXACA - Ocotzacatlán - Oaxaca</b>															
4000180019	4000180019	VATURRA S.A. DE C.V.	13/06/2011	15/12/2011	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DEL TALLADO EN PAVIMENTO TRAMO DEL KM 24+000 AL KM 26+000 CUERPO UNICO DE LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA - TEPIC	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	100.0%
						<b>SUBTOTAL OAXACA</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,000.00</b>	<b>100.0%</b>
						<b>TOTAL</b>	<b>10,669,454.84</b>	<b>10,669,454.84</b>	<b>10,669,454.84</b>	<b>10,669,454.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,669,454.84</b>	<b>100.0%</b>

0000 0307



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Tomo III**  
**Anexos 6 al 7**

---



---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 6**

---


*M*

Fecha de corte: 19 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal					
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Conceptado E	Diferencia B - C - D - E	Ejecido a Flujos de Efectivo	Devoluciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)
Tijuana	\$ 2,716,981.07	\$ 2,667,465.62	\$ 2,667,465.62	\$ 1,294,714.28	\$ 1,128,455.36	\$ 166,268.92			\$ 1,128,455.36	-\$ 67,796.22		42.3%
Culiacán	\$ 2,943,396.23	\$ 1,840,132.96	\$ 1,840,132.96	\$ 1,239,496.32	\$ 1,239,496.32				\$ 1,239,496.32	-\$ 10,845.59		67.4%
Querétaro	\$ 8,150,943.34	\$ 7,816,943.53	\$ 7,816,943.53	\$ 4,661,975.50	\$ 3,960,742.28	\$ 399,039.65		\$ 302,193.57	\$ 3,976,034.08	-\$ 28,769.19	\$ 15,291.80	50.7%
Guerrero	\$ 6,815,094.34	\$ 5,286,956.57	\$ 5,286,956.57	\$ 3,391,892.64	\$ 3,061,905.95	\$ 329,986.74		0.05	\$ 3,061,905.95	-\$ 31,204.86		57.9%
Puebla	\$ 5,173,584.91	\$ 3,674,099.18	\$ 3,674,099.18	\$ 2,580,885.31	\$ 1,868,198.50	\$ 329,892.20		\$ 382,794.61	\$ 1,868,198.50	-\$ 15,295.37		50.8%
Coahuila	\$ 5,660,377.36	\$ 5,140,265.30	\$ 5,140,265.30	\$ 3,360,772.13	\$ 2,860,158.87	\$ 398,459.55		\$ 16,539.13	\$ 2,860,158.87	-\$ 35,923.08		56.0%
Veracruz	\$ 5,196,226.42	\$ 4,203,366.61	\$ 4,203,366.61	\$ 2,547,204.41	\$ 2,084,822.51	\$ 365,987.82		\$ 59,976.33	\$ 2,084,822.51	-\$ 9,351.58		53.3%
Reynosa	\$ 1,132,076.47	\$ 1,192,130.69	\$ 1,192,130.69	\$ 715,535.60	\$ 612,142.09			\$ 1,860.85	\$ 612,142.09			60.2%
* Guadalupe	\$ 6,701,886.79											0.0%
Monterrey	\$ 9,169,811.42	\$ 8,169,668.15	\$ 8,169,668.15	\$ 5,676,845.88	\$ 5,089,298.33	\$ 541,813.97		\$ 45,733.56	\$ 5,089,298.33	-\$ 21,799.04		62.3%
Chihuahua	\$ 2,943,396.23	\$ 1,300,194.38	\$ 1,300,194.38	\$ 913,383.38	\$ 813,493.55	\$ 99,889.83			\$ 813,493.55			62.6%
Oaxaca	\$ 3,396,226.42	\$ 3,368,478.79	\$ 3,368,478.79	\$ 2,187,250.12	\$ 2,048,082.44	\$ 139,167.96		0.28	\$ 2,048,082.44	-\$ 12,822.84		60.8%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 80,000,000.00</b>	<b>\$ 44,659,743.78</b>	<b>\$ 44,659,743.78</b>	<b>\$ 28,589,955.57</b>	<b>\$ 24,766,796.20</b>	<b>\$ 2,770,496.64</b>	<b>\$ 380,317.61</b>	<b>\$ 652,345.12</b>	<b>\$ 24,782,088.00</b>	<b>-\$ 233,807.77</b>	<b>\$ 15,291.80</b>	<b>56.3%</b>

\* Recursos presupuestales no listados por la desincorporación del ítem.

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

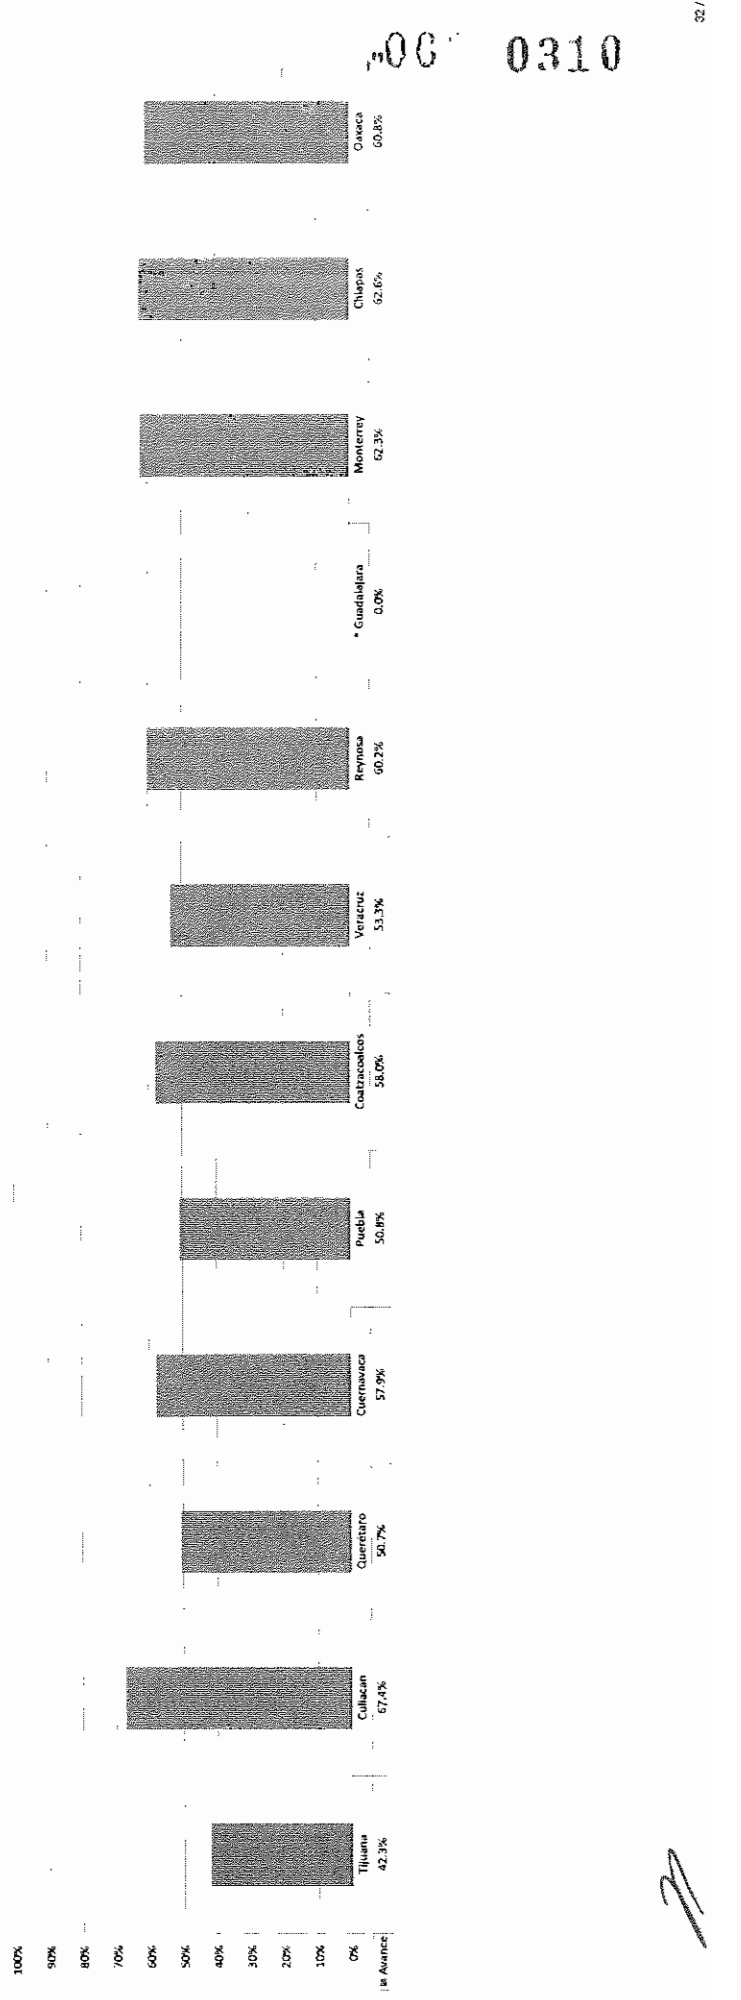



**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Nº. Perifoneo	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Periodo del Contrato Final	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Progresado D	Ejército Acumulado C	Monto En Trámite O	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejército a Cargo de Electivo	Alícuota de Ingresos (%)	Alícuota de Costos Pagados
<b>TJUJANA</b>																	
<b>Tijuana - Ezequiel</b>																	
18M-12	400017446	CLAPABH, S.A. DE C.V. & PYZAGOL, S.A. DE C.V.	01/02/2012	1/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO MENOR DE AUTOPISTA Y ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	\$ 1,811,320.70	\$ 1,750,797.64	\$ 1,750,797.64	\$ 1,178,495.35	\$ -	\$ 67,796.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,120,455.36	04.2%	04.2%
23M-12	400018502	CABLOS SALTADOR RAMIREZ AVILA	20/06/2012	13/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO MENOR DE AUTOPISTA Y ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA RUMOROSA - TEGATE	\$ 670,245.29	\$ 598,724.32	\$ 598,724.32	\$ 190,250.92	\$ -	\$ 190,250.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%
<b>Libramiento Los Cabos</b>																	
39M-12	400018618	ROLO AGUILAR CONSULTORES Y CONSTRUC. S.A. DE C.V.	17/06/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO LOS CABOS.	\$ 228,418.09	\$ 311,909.76	\$ 311,909.76	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%
<b>CULIACÁN</b>																	
<b>Estación Don. Nogales</b>																	
43M-12	400017236 (1)	PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL LIBRAMIENTO NOROCCIDENTE DE QUERÉTARO Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO NOROCCIDENTE DE QUERÉTARO - ESTACION DON. NOGALES, ESTADO DE QUERÉTARO.	\$ 479,400.37	\$ 479,400.37	\$ 479,400.37	\$ 309,874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,874.00	10.4%	10.4%
53M-12	400017236 (2)	PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/02/2013		\$ 479,400.37	\$ 479,400.37	\$ 479,400.37	\$ 309,874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,874.00	10.4%	10.4%
63M-12	400017236 (3)	PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/02/2013		\$ 479,400.37	\$ 479,400.37	\$ 479,400.37	\$ 309,874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,874.00	10.4%	10.4%
4NE-12	4100017236 (4)	PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/02/2013		\$ 401,931.85	\$ 401,931.85	\$ 401,931.85	\$ 309,874.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 309,874.00	10.4%	10.4%
<b>QUERÉTARO</b>																	
<b>Libramiento de Querétaro</b>																	
79M-12	400017435	CLAPABH, S.A. DE C.V.	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL LIBRAMIENTO NOROCCIDENTE DE QUERÉTARO Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO NOROCCIDENTE DE QUERÉTARO	\$ 660,037.74	\$ 1,305,418.97	\$ 1,245,418.67	\$ 650,700.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,700.10	63.2%	63.2%
<b>Chamapa - Lechería</b>																	
85M-12	400017354	AGEORIA PROYECTOS Y CONSULTORÍA AUTOTRIA, S.A. DE C.V.	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CHAMAPA - LECHERÍA Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMAPA - LECHERÍA.	\$ 1,135,076.47	\$ 1,504,526.79	\$ 1,664,035.78	\$ 1,642,547.69	\$ -	\$ 141,650.72	\$ 7,490.00	\$ -	\$ -	\$ 830,100.50	50.4%	50.4%
<b>México - Querétaro</b>																	
95M-12	400017208	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS - QUERÉTARO, TRAMO PALMILLAS - QUERÉTARO.	\$ 2,300,000.00	\$ 1,431,306.03	\$ 1,401,306.03	\$ 890,816.12	\$ 0.0111	\$ 121,000.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 731,306.40	50.0%	50.0%
105M-12	400017474	CORPORATIVO MCA, S.A. DE C.V. & GRUPO LAPEN, S.A. DE C.V.	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERÉTARO, TRAMO TEPALCAPA - QUERÉTARO Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERÉTARO, TRAMO TEPALCAPA - QUERÉTARO.	\$ 2,341,809.43	\$ 1,574,793.77	\$ 1,574,793.77	\$ 968,816.97	\$ -	\$ 135,283.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 701,516.35	48.4%	48.4%
<b>Querétaro - Iguala</b>																	
115M-12	450017243	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA Y MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES DE LA AUTOPISTA FEDERAL DE CUOTA QUERÉTARO - IPUJATO	\$ 1,011,320.70	\$ 1,205,301.20	\$ 1,205,301.20	\$ 615,742.00	\$ -	\$ 10,003.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 797,548.95	60.8%	60.8%
<b>La Grana de Moreno - Amariillas - Villa de Arriaga</b>																	
55M-12	450018025	CLAPABH, S.A. DE C.V.	10/06/2012	13/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LAS OBRAS DE MADRE - AMARILLAS - VILLA DE ARRIAGA.	\$ -	\$ 458,531.15	\$ 458,531.15	\$ 68,286.03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%
<b>QUERNAVACA</b>																	
125M-12	400017278	ROCHER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MEXICO QUERNAVACA (CALLE AMARILLAS) Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS.	\$ 1,036,112.21	\$ 940,170.79	\$ 940,170.79	\$ 500,619.35	\$ -	\$ 74,602.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 522,210.94	35.9%	35.9%

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Comentario	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Relaciones Devoluciones	Saldo Cancelado C	Diferencia D-C+E	Ejército a Flujo de Efectivo	Alícuota de Ingresos Financiero (%)	Alícuota de Costos Pagados
			Inicio	Fin											
<b>Laboratorio Cuernavaca</b>															
133MM-12	4500017432 (1)	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. & GRUPO EMPRESARIAL JVA, S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DEL LIBRAMIENTO CUERNAVACA KM 80+000 AL KM 85+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 39 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA PERA - CUATRAL KM 0+000 AL KM 34+200 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 51 ESTRUCTURAS.	2,110,207.00	240,448.01	210,207.00	31,101.11	2,142.08	0.03	210,207.03	50.0%		
143MM-12	4500017432 (1)	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. & GRUPO EMPRESARIAL JVA, S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/02/2013		026,416.10	240,448.00	210,207.04	31,161.11	2,182.06	0.02	210,207.04	50.0%		
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>															
153MM-12	4500017434	PIVIZOS S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO TRAMO DEL KM 174+000 AL KM 238+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 14 ESTRUCTURAS.	1,185,538.05	1,185,538.05	751,568.64		0,007.60	-	751,568.64	63.4%		
163MM-12	4500017422	CONSTRUCCIONES INGENIERIA MONTES, S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO, TRAMO DEL KM. 174+000 AL KM. 238+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 25 ESTRUCTURAS.	3,769,811.32	756,725.30	484,131.30	60,516.42	8,472.30	-	423,014.84	56.0%		
173MM-12	4500017424	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO, TRAMOS DEL KM 238+000 AL KM 304+000 Y DEL KM 304+000 AL KM 351+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 89 ESTRUCTURAS.	1,877,833.30	887,833.30	854,813.32	81,051.74	11,459.24	-	572,892.18	30.0%		
<b>Puerto de Ixtla - Ixtla</b>															
203MM-12	4500017406 (1)	FLOORDNO CHUIZ JAVIER	01/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO PUENTE DE IXTLA IXTLA KM 0+000 AL KM 03+000 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DEL CAMINO DIRECTO ZACAPALCO - RANCHO VIEJO 0+000 AL KM 17+124 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 3 ESTRUCTURAS; DEL MANTENIMIENTO MENOR KM 0+000 AL KM 8+240 Y DEL MANTENIMIENTO MENOR DE 4 ESTRUCTURAS.	319,366.17	319,366.17	202,015.76	25,920.07		-	117,350.70	35.7%		
213MM-12	4500017406 (2)	FLOORDNO CHUIZ JAVIER	01/02/2012	14/02/2013		1,120,764.71	191,031.67	121,969.44	15,108.10		-	106,870.20	33.7%		
223MM-12	4500017406 (3)	FLOORDNO CHUIZ JAVIER	01/02/2012	14/02/2013		2,249,944.33	127,354.49	81,040.32	10,130.70		-	70,910.53	36.7%		
<b>PUJEBLA</b>															
233MM-12	4500017403	CLAPAH S.A. DE C.V. & PIVIZOS S.A. DE C.V.	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA PUJEBLA - ACATZINGO PUJEBLA, TRAMO DEL KM 17+850 AL KM 370+000	2,220,186.00	1,269,720.00	871,624.07	116,131.81		-	735,692.00	50.8%		
<b>Puebla - Acatzingo</b>															
253MM-12	4500017402	SLORAM S.A. DE C.V.	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA PUJEBLA-ACATZINGO	1,245,280.02	1,143,989.07	816,000.80	162,847.00		-	562,802.13	49.7%		
<b>Acatzingo - Ctl. Mexcala</b>															
263MM-12	4500017405	PROYECTO Y CONSULTORIA S.A. DE C.V. & INGENIEROS CIVILES AMM S.A. DE C.V.	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA - MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA ACATZINGO-CD MENDOZA.	1,088,110.21	1,241,369.20	862,101.84	111,812.72	19,200.37	-	220,445.00	44.2%		
<b>COATZACOALCOS</b>															
273MM-12	4500017401	CONSTRUCCIONES NOMADGNA S.A. DE C.V.	01/02/2012	29/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS - MANTENIMIENTO MENOR EN 21 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHIAMPÓN - CHIAMPÓN	705,452.00	740,890.40	512,037.10		10,584.11	-	71,841.20	44,000.00	50.0%	
<b>Ctl. Ixtla - Acapulco</b>															
283MM-12	4500017403	RALU VICENTE CROZCO Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	01/02/2012	30/01/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS - MANTENIMIENTO MENOR EN 102 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. IXTLA-ACAPULCO	1,564,000.00	1,194,876.41	796,650.84	100,662.41	0,208.14	-	14,301.45	073,650.84	57.0%	
<b>Acapulco - Cosoleacaque</b>															
293MM-12	4500017404	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	14/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS - MANTENIMIENTO MENOR EN 86 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ACAPULCO-COSOLEACAQUE	1,245,280.02	1,405,261.01	871,460.77	143,278.27		-	12,804.87	041,108.37	56.0%	





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MENOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha del corte: 15 de Octubre de 2012

No. Partida	Control No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Autorizado C	Monto En Trámite D	Reservaciones - Dupliciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B+C-D-E	Ejercicio a Flajo de Efectivo	Avance Financiero [%]
			Inicio	Fin												
<b>VENACRUZ</b>																
<b>Cd. Mendoza - Carhobla</b>																
313M-12	450001514	SOULGONST, S.A DE C.V	2006/05/12	30/01/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 200 ESTRUCTURAS EN EL CAMINO DIRECTO SALINA CRUZ LA VENTOSA.	960,077.74	961,162.41	961,162.41	960,776.16	290,265.62	43,768.04	7,869.83	74,597.24	3,409.45	640,167.14	58.4%
	500004000				<b>SUBTOTAL COAZACALCOX</b>	<b>960,077.74</b>	<b>961,162.41</b>	<b>961,162.41</b>	<b>959,776.16</b>	<b>290,265.62</b>	<b>43,768.04</b>	<b>7,869.83</b>	<b>74,597.24</b>	<b>3,409.45</b>	<b>640,167.14</b>	<b>58.4%</b>
<b>Carhobla - Veracruz</b>																
323M-12	450001740	INGENIERIA AMBIENTAL Y URBANA, S.A DE C.V	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. MENDOZA - COHOBLA.	1,129,754.72	898,027.79	996,027.79	834,257.61	510,211.46	83,022.84	1,856.18	37,123.51	510,211.46	53.1%	
333M-12	450001486	PROFESIONISTAS EN GEO-CONTROL, S.A DE C.V	16/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA COHOBLA - VERACRUZ.	1,471,928.11	1,306,030.35	1,306,030.35	785,020.10	646,048.23	112,048.84	0,722.03	28,801.35	28,801.35	846,048.25	53.7%
343M-12	450001794	PROYECTO CIVIL INTEGRAL, S.A DE C.V	16/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJAJA - ISLA TIJAJA.	1,760,037.74	1,107,610.96	1,197,916.89	674,332.22	549,916.26	92,788.52		46,304.27	46,304.27	546,616.26	50.7%
<b>Guadalupe Zamora - Tlaxiuhán</b>																
353M-12	450001730	EFRAIN CASILLAS ESCAMILLA DE C.V	18/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CUTIERREZ - ZAMORA TIJAJA.	986,037.74	532,870.34	552,870.34	331,713.30	287,484.56	44,220.44	442.20	22,114.22	22,114.22	207,484.56	56.0%
363M-12	450001542	EFRAIN CASILLAS ESCAMILLA DE C.V	11/09/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR Y MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPOCO.	271,958.11	270,718.44	270,718.44	121,181.12	88,181.74	33,019.36	330.10			88,181.74	32.8%
<b>Libramiento Poniente de Tampoco</b>																
					<b>SUBTOTAL VERACRUZ</b>	<b>5,192,276.49</b>	<b>4,293,388.61</b>	<b>4,293,388.61</b>	<b>2,417,266.41</b>	<b>2,084,522.61</b>	<b>365,077.82</b>	<b>6,331.08</b>	<b>156,370.41</b>	<b>58,970.23</b>	<b>2,084,522.61</b>	<b>53.3%</b>
<b>REYNOSA</b>																
<b>Másamora - Reynosa</b>																
373M-12	450001730	EDC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	26/02/2012	14/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - REYNOSA.	1,132,076.47	764,923.29	764,923.29	518,360.30	414,672.96			1,800.85	1,800.85	414,672.96	95.0%
463M-12	450001526	FEM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	03/06/2012	06/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - REYNOSA.	427,207.49	427,207.49	427,207.49	187,189.21	197,189.21					197,189.21	48.2%
<b>SUBTOTAL REYNOSA</b>																
					<b>SUBTOTAL REYNOSA</b>	<b>1,559,283.96</b>	<b>1,192,130.78</b>	<b>1,192,130.78</b>	<b>705,549.51</b>	<b>611,862.17</b>			<b>1,800.85</b>	<b>1,800.85</b>	<b>611,862.17</b>	<b>60.7%</b>
<b>GUADALAJARA</b>																
<b>Nueva Italia - Lazaro Cárdenas</b>																
383M-12	450001730	PARTIDA CANCELADA DE CONFIRMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - SAN CARLOS (06-09-2012) DE LA D.F.D.C.			SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GUADALAJARA - SAN CARLOS (06-09-2012) DE LA D.F.D.C.	1,822,941.51										0.0%
<b>Uruapan - Nueva Italia</b>																
393M-12	450001730	PARTIDA CANCELADA DE CONFIRMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA AUTOPISTA URUAPAN - NUEVA ITALIA			SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA URUAPAN - NUEVA ITALIA	1,519,347.22										0.0%
<b>Panzacaro - Uruapan</b>																
403M-12	450001730	PARTIDA CANCELADA DE CONFIRMACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DE LA AUTOPISTA PANZACARO - URUAPAN			SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PANZACARO - URUAPAN	1,485,077.34										0.0%
<b>MONTERREY</b>																
<b>Monterrey - Nuevo Laredo</b>																
413M-12	450001747	HC CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A DE C.V	01/02/2012	15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, MANTENIMIENTO MENOR Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 42 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO	1,356,480.79	1,231,040.13	1,321,046.13	916,400.05	800,903.48	100,480.37				800,903.48	61.0%

0313


No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Eliminado Autorizado	Monto En Trámite	Reservaciones - Omnibusman	Estado Cancelado	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Flajo de Ejecuto	Porcentaje Ejecutado (%)	Ambos de Costos Pagados
<b>Torreón - Saltillo</b>																
43MM-12	4500017206	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE CV	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 29 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SANTIAGO - TORREÓN	1,864,000.00	1,302,207.10	1,300,367.10	992,003.39	887,200.35	86,384.03				\$ 897,200.35	64.4%	
<b>Cuernavaca - Ojo Caliente</b>																
43MM-12	4500017478	ANGEL PEREZ MONTANO	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CARBONERA - OJO CALIENTE.	643,300.20	526,627.40	528,927.40	381,173.23	340,840.16	37,327.09				\$ 343,846.16	60.9%	
<b>Gómez Palacio - Corralitos</b>																
48MM-12	4500017208	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS, S.A. DE CV,	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 11 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GOMEZ PALACIO - CORRALITOS	1,898,113.21	1,307,320.90	1,357,030.90	844,887.21	847,787.76	97,119.46				\$ 847,787.76	62.4%	
<b>Cuadragua - Reynosa</b>																
45MM-12	4500017427	CIAM INGENIERIA, S.A. DE CV	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CADREYTA - REYNOSA.	1,335,848.08	1,200,100.00	1,200,100.00	901,845.85	768,420.81	70,680.46				\$ 46,723.68	85.9%	
<b>Puerto México - Cardonera</b>																
46MM-12	4500017205	CONSTRUCCION E INGENIERIA MONTE, S.A. DE CV	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUERTO MEXICO - CARDONERA.	905,000.00	651,476.20	651,476.20	576,034.27	551,212.90	55,321.77	15,400.00			\$ 551,212.90	62.0%	
<b>Oaxtepec - Mazatlán</b>																
47MM-12	4500017201	SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORIA ABES Y LABORATORIO, S.A. DE CV,	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 10 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA OAXTEPEC - MAZATLÁN DEL KM 0+000 AL KM 10+000	1,743,396.20	1,206,511.52	1,206,511.52	996,028.27	986,028.27		0,308.05			\$ 986,028.27	62.0%	
52MM-12	4500016397	SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORIA ABES Y LABORATORIO, S.A. DE CV,	20/06/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DE LA AUTOPISTA DURANGO - MACATLÁN DEL KM 8+000 AL KM 10+000	107,740.71	107,740.71	107,740.71	76,500.60		76,500.00				\$ 76,500.00	0.0%	
<b>CHIAPAS</b>																
<b>Las Chochapas - Freudales - Cozacoatlán</b>																
48MM-12	4500017218	RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑIA, S.A. DE CV	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DEL MANTENIMIENTO MENOR DE MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL KM 0+000 AL KM 107+500 DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOCHAPAS - RAUDALES - COZCOCAUTLÁN	2,843,390.20	1,200,194.38	1,200,194.38	913,303.38	813,493.55	96,000.00				\$ 813,493.55	62.9%	
<b>OAXACA</b>																
<b>Cuernavaca - Oaxaca</b>																
50MM-12	4500017437	CALECO, S.A. DE CV	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 120+000 Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DEL C. O. CUERNAVACA-OAXACA	1,798,000.00	1,726,026.70	1,726,026.70	1,113,343.40	974,175.72	139,497.90				\$ 974,175.72	56.4%	
51MM-12	4500017411	OBRAS Y SERVICIOS JGA, S.A. DE CV	01/02/2012 15/02/2013	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 120+000 AL KM 246+800 Y RAMAL A FUJITO 17 KM Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DEL C. CUERNAVACA-OAXACA	1,696,299.42	1,641,540.00	1,641,540.00	1,073,000.72	1,073,000.72		12,822.54			\$ 1,073,000.72	63.4%	
<b>SUBTOTAL OAXACA</b>																
					3,494,399.62	3,367,566.70	3,367,566.70	2,187,200.12	2,047,176.48	139,107.06	12,822.54			\$ 2,047,176.48	60.9%	
<b>TOTAL</b>																
					99,000,000.00	44,959,743.78	44,959,743.78	28,849,855.67	24,768,766.20	3,770,489.84	233,607.77			\$ 24,768,766.20	56.1%	

000 0314

Fecha de corte: 19 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance financiero (%)	Avance físico (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Relaciones - Devoluciones			Ajustes de Costos pagados
Tijuana	\$ 5,000,000.00	\$ 2,795,222.33	\$ 2,795,222.33	\$ 1,824,173.11	\$ 2,350,127.79			-\$ 525,954.68	\$ 2,350,127.79			94.1%	87.53%
Culiacán												0.0%	0.00%
Querétaro												0.0%	0.00%
Cuernavaca	\$ 174,600,000.00	\$ 138,227,338.72	\$ 138,227,338.72	\$ 101,780,870.32	\$ 73,411,480.45	\$ 9,321,562.15	\$ 19,047,847.72	\$ 1,804,472.04	\$ 73,411,480.45	\$ 1,804,472.04		53.1%	73.21%
Puebla	\$ 44,965,747.66	\$ 44,965,747.66	\$ 44,965,747.66	\$ 3,306,593.18	\$ 1,644,993.03		\$ 1,661,590.15					0.0%	10.20%
Coahuila de Zaragoza	\$ 59,650,000.00	\$ 55,859,585.97	\$ 55,859,585.97	\$ 46,967,593.99	\$ 41,016,649.52	\$ 4,761,173.78	\$ 1,080,770.69	\$ 189,319.28	\$ 41,016,649.52	\$ 189,319.28		73.4%	100.00%
Veracruz	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00										0.0%	0.00%
Reynosa												0.0%	0.00%
Guadaluajara												0.0%	0.00%
Monterrey												0.0%	0.00%
Chilpancingo	\$ 28,500,000.00	\$ 24,821,609.51	\$ 24,821,609.51	\$ 10,840,163.51	\$ 14,006,734.78	\$ 1,126,202.04	\$ 4,707,240.09	\$ 822,873.59	\$ 14,006,734.78	\$ 822,873.59		58.4%	70.92%
Oaxaca												0.0%	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 270,000,000.00</b>	<b>\$ 268,919,904.19</b>	<b>\$ 266,669,904.19</b>	<b>\$ 173,819,404.11</b>	<b>\$ 130,784,972.54</b>	<b>\$ 16,853,931.00</b>	<b>\$ 25,980,500.57</b>	<b>\$ 2,846,664.81</b>	<b>\$ 130,784,972.54</b>	<b>\$ 2,846,664.81</b>		<b>49.0%</b>	<b>68.14%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

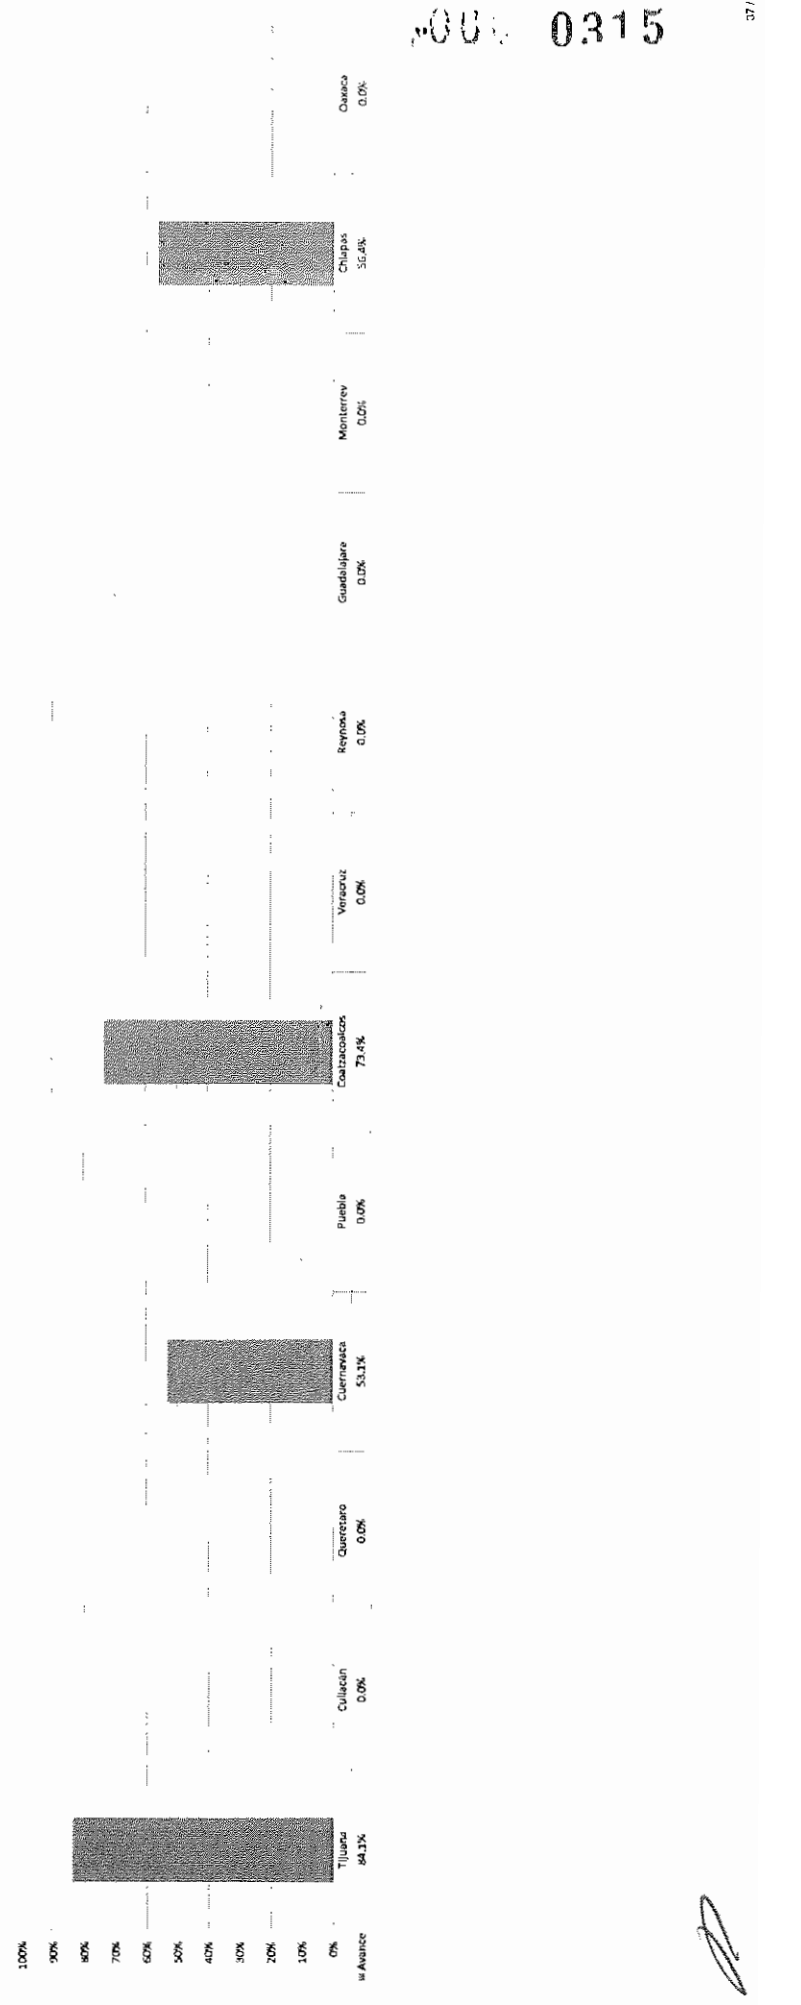



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Póliza	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acreditado C	Monto Ejecutado D	Relaciones Demosnstradas	Saldo Cancelado E	Obligación D.C.D.E	Ejecución y Flujo del Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance físico (%)
			Inicio	Fin													

TJAJANA																	
Mantenimiento Mayor de Puente																	
14MYE-12	450011937	CONSTRUCCION CHAL, S.A. DE C.V.	21/09/2012	18/11/2012	MANTENIMIENTO MAYOR DE LA OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM. 10+500 DE LA AUTOPISTA TAJANA - ENSENADA	\$ 5,000,000.00	\$ 2,700,222.33	\$ 2,700,222.33	\$ 1,324,173.11	\$ 2,306,122.79	\$ 2,306,122.79	\$ 20,142.46	\$ 11,061,391.47	\$ 4,520,844.96	\$ 2,306,122.79	44.1%	87.5%
<b>SUBTOTAL TAJANA</b>																	

GUERRAVAVA																	
Mantenimiento Mayor de Puente																	
24MYE-12	450017708	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS AGR. S.A. DE C.V.	17/06/2012	12/12/2012	MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS TUNELLOS LOS QUARENCES, ACAPULCO, TIERRA COLORADA GUERRAVAVA, ACAPULCO.	\$ 52,000,000.00	\$ 45,974,828.81	\$ 45,974,828.81	\$ 27,108,494.41	\$ 10,081,391.47	\$ 4,950,000.00	\$ 20,142.46	\$ 11,061,391.47	\$ 3,601,100.85	\$ 4,950,000.00	43.2%	79.8%
34MYE-12	450017704	JADE MAYA, S.A. DE C.V. A	24/06/2012	06/02/2013	CONSTRUCCION DEL VAREMOTO KM 222+200 DE LA AUTOPISTA GUERRAVAVA - ACAPULCO	\$ 62,300,000.00	\$ 47,922,912.26	\$ 47,922,912.26	\$ 34,960,116.44	\$ 19,763,007.71	\$ 1,903,949.02	\$ 1,918,811.77	\$ 19,763,007.71	\$ 13,303,047.81	\$ 19,763,007.71	42.0%	86.7%
44MYE-12	450011937	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES, S.A. DE C.V. & OMAJAS Y CONSULTAS	02/05/2012	12/10/2012	MANTENIMIENTO MAYOR DEL PUENTE VAREMOTO PALO BLANCO KM 202+500 DE LA AUTOPISTA GUERRAVAVA - ACAPULCO	\$ 26,500,000.00	\$ 17,441,841.33	\$ 17,441,841.33	\$ 13,916,466.06	\$ 15,838,006.57	\$ 624,998.01	\$ 16,838,006.57	\$ 15,838,006.57	\$ 4,725,818.87	\$ 15,838,006.57	10.85%	10.85%
54MYE-12	450017602	PRECYSINTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10/04/2012	11/11/2012	MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS PUENTES KM 225+050 Y 227+160 DE LA AUTOPISTA GUERRAVAVA - ACAPULCO	\$ 12,000,000.00	\$ 10,324,324.07	\$ 10,324,324.07	\$ 6,085,258.12	\$ 6,476,000.26	\$ 1,723,840.88	\$ 49,426.86	\$ 6,476,000.26	\$ 665,490.22	\$ 6,476,000.26	47.7%	79.95%
64MYE-12	450017905	PRECYSINTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14/02/2012	15/12/2012	REPARACION DEL PUENTE PAPAAYO KM 350+400	\$ 20,000,000.00	\$ 15,531,376.50	\$ 15,531,376.50	\$ 12,170,808.19	\$ 9,029,300.06	\$ 504,084.48	\$ 70,068.21	\$ 9,029,300.06	\$ 1,818,423.84	\$ 9,029,300.06	50.0%	4.37%
74MYE-12	450011640	TORREZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	02/05/2012	13/10/2012	MANTENIMIENTO MAYOR DEL PUENTE ZARATELO UBICADO EN EL KM 31+119 DELA GUERRAVAVA - ACAPULCO	\$ 3,900,000.00	\$ 2,822,862.70	\$ 2,822,862.70	\$ 2,160,629.41	\$ 2,321,208.44	\$ 3,414.24	\$ 3,414.24	\$ 2,321,208.44	\$ 428,374.07	\$ 2,321,208.44	82.2%	82.20%
<b>SUBTOTAL GUERRAVAVA</b>																	

PUEBLA																	
Modernización de la Superestructura y Acreditación de Avances																	
13MYE-12	450011642	PRECYSINTE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	01/06/2012	27/04/2013	MODERNIZACION DE LA SUPERESTRUCTURA Y ACREDITACION DE AVANCES DE LA OBRA DEL KM 118+000 DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	17.90%
14MYE-12	450011936	EMPRESAS CONQUIA CIVIL Y CARRETERAS BETA, S.A. DE C.V.	01/06/2012	20/06/2012	MANTENIMIENTO MAYOR DEL PIV. TLASCOVAYA EN EL KM. 20+500 DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA.	\$ 2,415,346.70	\$ 2,415,346.70	\$ 2,415,346.70	\$ 2,415,346.70	\$ 750,896.00	\$ -	\$ -	\$ 750,896.00	\$ 1,661,450.70	\$ 2,415,346.70	0.0%	0.06%
15MYE-12	450011636	TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EN CONSTRUCCIONES SA DE CV	20/06/2012	16/01/2013	AMPLIACION TRANSVERSAL DEL PIV UBICADO EN EL KM 20+150 DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	\$ 14,874,724.11	\$ 14,874,724.11	\$ 14,874,724.11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.06%
16MYE-12	450012011	GRUPO EMPRESARIAL DE PUENTES SA DE CV.	10/01/2012	10/06/2012	MODIFICACION DEL PUENTE ARROYO SAN FRANCISCO, UBICADO EN EL KM 32+000 DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA	\$ 891,238.46	\$ 891,238.46	\$ 891,238.46	\$ 891,238.46	\$ 891,197.03	\$ 891,197.03	\$ -	\$ 891,197.03	\$ 191.43	\$ 891,197.03	0.0%	0.06%
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>																	

COAHUILA DE ZARAGOZA																	
Protección Anticorrosiva del Puente Zacatal																	
8MYE-12	450017891	MEXICANA DE MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	22/05/2012	02/12/2012	PROTECCION ANTICORROSIONA DEL PUENTE ZACATAL UBICADO EN EL KM 108+000 DE LA CARRETERA FEDERAL VALMERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN.	\$ 60,600,000.00	\$ 52,770,100.80	\$ 52,770,100.80	\$ 43,783,716.82	\$ 38,152,903.74	\$ 4,206,808.07	\$ 156,808.41	\$ 38,152,903.74	\$ 294,854.11	\$ 38,152,903.74	74.1%	78.0%
Rehabilitación de las Obras de Drenaje																	
9MYE-12	450011231	VILLA CONSTRUCCIONES DEL SUISA, S.A. DE C.V.	01/06/2012	26/06/2012	REHABILITACION DE LAS OBRAS DE DRENAJE DEL KM 124+070 CPO A KM 124+070 CPO B, KM 143+000 CPO A KM 143+000 P.S.O. KM 14+000 CPO B, KM 143+000 CPO A KM 143+000 P.S.O. KM 171+000 CPO A KM 171+000 CPO B DEL TRAMO ISLA - ACAYCAN	\$ 3,100,000.00	\$ 3,083,877.17	\$ 3,083,877.17	\$ 3,083,877.17	\$ 1,863,000.26	\$ 605,274.81	\$ 4,688.87	\$ 1,863,000.26	\$ 784,916.90	\$ 3,083,877.17	61.1%	100.0%
<b>SUBTOTAL COAHUILA DE ZARAGOZA</b>																	

La Tinaja - Isla																	
Reparación del Piv. Oahuahuanan																	
10MYE-12	450017948	IC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	26/06/2012	31/10/2012	REPARACION DEL PIV OAHUAHUANAN UBICADO EN EL KM 64+000 DE LA AUTOPISTA LA TINAJA - ISLA.	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ 2,250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%
<b>SUBTOTAL LA TINAJA - ISLA</b>																	


Las Chichas - Ranchales - Ocozacoatlán																	
Reparación del Sistema de Piv. del Puente de Playas																	
11MYE-12	450017948	IC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	26/06/2012	31/10/2012	REPARACION DEL SISTEMA DE PIV DEL PUENTE DE PLAYAS KM 45+000 Y PLAYAS KM 48+000	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,292.89	\$ 10,000,292.89	\$ 11,242,268.23	\$ 9,106,308.44	\$ 1,129,202.04	\$ 822,873.66	\$ 9,106,308.44	\$ 4,918,770.70	\$ 10,000,292.89	39.4%	61.0%
Reparación del Sistema de Piv. del Puente Mecánico																	
13MYE-12	450017947	IC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	10/04/2012	06/11/2012	REPARACION DEL SISTEMA DE PIV DEL PUENTE MECANICO KM 69+200	\$ 10,000,000.00	\$ 9,919,316.62	\$ 9,919,316.62	\$ 8,657,374.27	\$ 7,006,338.34	\$ 1,650,975.93	\$ 1,650,975.93	\$ 7,006,338.34	\$ 680,975.93	\$ 7,006,338.34	89.7%	89.7%
<b>SUBTOTAL LAS CHICHAS</b>																	

TOTAL																	
<b>SUBTOTAL GENERAL</b>																	
<b>TOTAL</b>																	

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance Financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejecutado a Flujos de Efectivo	Reservaciones - Devoluciones		Alícuotas de Costos Pagados
Tijuana	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00										0.0%
Culiacán												0.0%
Querétaro												0.0%
Cuernavaca	\$ 8,530,000.00	\$ 8,514,319.74	\$ 8,334,319.74	\$ 4,742,428.92	\$ 3,778,769.32	\$ 963,659.60			\$ 3,778,769.32	\$ 17,600.72		45.3%
Puebla												0.0%
Coahuila de Zaragoza	\$ 2,037,500.00	\$ 2,467,944.51	\$ 2,467,944.51	\$ 1,917,556.23	\$ 1,589,594.30	\$ 231,067.13	\$ 96,894.80		\$ 1,589,594.30	\$ 27,744.49		64.4%
Veracruz	\$ 112,500.00	\$ 112,500.00										0.0%
Reynosa												0.0%
Guadalajara												0.0%
Monterrey												0.0%
Chihuahua	\$ 1,450,000.00	\$ 2,288,792.12	\$ 2,288,792.12	\$ 1,897,668.61	\$ 1,710,943.88	\$ 186,724.76			\$ 1,710,943.88	\$ 3,929.87		74.8%
Oaxaca												0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,000,000.00</b>	<b>\$ 16,633,536.37</b>	<b>\$ 13,091,056.37</b>	<b>\$ 8,557,653.76</b>	<b>\$ 7,079,307.50</b>	<b>\$ 1,381,451.49</b>	<b>\$ 96,894.77</b>	<b>\$ 96,894.77</b>	<b>\$ 7,079,307.50</b>	<b>\$ 49,275.08</b>		<b>54.1%</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

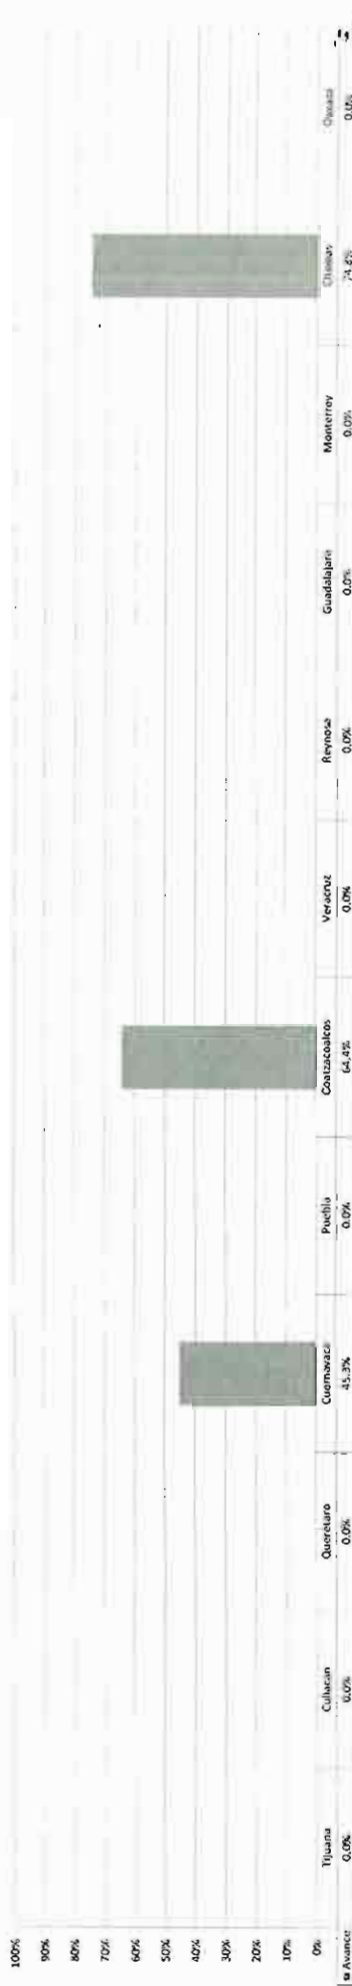

Handwritten signature or mark.



No. Parilla	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencial D-C-D-E	Ejercido a Fines de Efectivo	Avance financiero (%)
			Inicia	Fin												
<b>TJUJANA</b>																
<b>Tlaxiama - Erasmenda</b>																
18MYE-12	450001812				SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA OBRA DE DRENAJE UBICADA EN EL KM 16+950 DE LA AUTOPISTA TJUJANA - ERASMENDA	200,000.00 \$	200,000.00 \$	2,410,074.97 \$	1,401,804.07 \$	1,145,311.23 \$	200,830.43 \$	17,600.72 \$		\$	\$	0.0%
<b>CUERNAVACA</b>																
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																
25MYE-12	450001819	LOGRITICA Y GERENCIAMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V.	19/05/2012	30/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS TUNELES DE LOS RIVEROS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO	3,500,000.00 \$	2,410,074.97 \$	2,410,074.97 \$	1,401,804.07 \$	1,145,311.23 \$	200,830.43 \$	17,600.72 \$		\$	1,145,011.22 \$	47.0%
33MYE-12	4500018104	CALECS, S.A. DE C.V.	02/02/2012	26/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO KM 222-200 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO	3,000,000.00 \$	2,994,795.96 \$	2,994,795.96 \$	1,415,549.89 \$	1,112,704.17 \$	300,158.06 \$			\$	1,112,704.17 \$	37.2%
43MYE-12	4500017935 300004994	ALVAREZ GUILLEN INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	20/02/2012	28/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL PUENTE VIADUCTO PALO BLANCO KM 202-300 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO	1,250,000.00 \$	1,150,836.97 \$	1,150,836.97 \$	1,010,366.20 \$	619,722.37 \$	100,666.92 \$			\$	619,722.37 \$	71.2%
53MYE-12	4500018124	JOSE LUIS ESTEBANNO AGUILAR BAHENA	09/05/2012	19/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LOS PUENTES KM 235+650 Y 232-700 DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULCO	600,000.00 \$	778,746.00 \$	778,746.00 \$	510,720.00 \$	401,221.61 \$	100,501.95 \$			\$	401,221.61 \$	51.5%
63MYE-12	4500018215	CONSTRUCCIONES NOMADAGH, S.A. DE C.V.	29/05/2012	23/02/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REPARACIÓN DEL PUENTE PAPAGAYO KM 320-401	1,000,000.00 \$	999,850.78 \$	999,850.78 \$	403,201.61 \$	300,019.75 \$	103,231.80 \$			\$	300,019.75 \$	30.0%
73MYE-12					SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: MANTENIMIENTO MAYOR DEL PUENTE ZAPOTILLO UBICADO EN EL KM 311+110 DE LA CUERNAVACA - ACAPULCO.	180,000.00 \$	180,000.00 \$							\$		0.0%
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA</b>						<b>6,530,000.00 \$</b>	<b>6,514,310.74 \$</b>	<b>6,514,310.74 \$</b>	<b>4,742,628.97 \$</b>	<b>3,778,709.32 \$</b>	<b>983,659.80 \$</b>	<b>17,600.72 \$</b>		<b>\$</b>	<b>3,778,709.32 \$</b>	<b>45.5%</b>
<b>PUEBLA</b>																
<b>México - Puebla</b>																
133MYE-12					SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR DE LA RECONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DEL PASADIZO DE LOS ACCESOS DEL PUENTE ATOVAC, UBICADO EN EL KM 119+800 DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA.	1,000,000.00 \$								\$		0.0%
143MYE-12					SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO MAYOR DEL PIV Tlapacoyá UBICADO EN EL KM 39+056 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.	250,000.00 \$								\$		0.0%
163MYE-12					SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: AMPLIACIÓN TRANSVERSAL DEL PSV UBICADO EN EL KM 70+250 DE LA AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA.	1,200,000.00 \$								\$		0.0%
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>						<b>2,450,000.00 \$</b>	<b>2,450,000.00 \$</b>	<b>2,450,000.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>\$</b>	<b>0.00 \$</b>	<b>0.0%</b>
<b>COAHUILCO DE ZARAGOZA</b>																
<b>Puente Zacatal</b>																
63MYE-12	4500017932	ALVAREZ GUILLEN INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	20/02/2012	17/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: PROTECCIÓN ANTICORROSIVA EL PUENTE ZACATAL UBICADO EN EL KM 105+000 DE LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - CIUDAD DEL CARMEN	2,300,000.00 \$	2,311,341.26 \$	2,311,341.26 \$	1,789,380.04 \$	1,470,516.95 \$	201,867.13 \$	27,732.17 \$		\$	61,776.96 \$	63.9%
<b>Cd. Ixtla - Acayucan</b>																
63MYE-12	4500018219	SOUL CONST, S.A. DE C.V.	01/02/2012	13/10/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE LAS OBRAS DE DRENAJE DEL KM 129+070 CPO. A KM 129+120 CPO. KM 154+200, KM 160+000, P.I.S.O. KM 101+500 P.S.O. KM 105+444, KM 105+300, KM 171+505 A, KM 171+505 B, KM 170+300 CPO. A Y KM 170+300 CPO. B DEL TRAMO IXTLA - ACAYUCAN	167,000.00 \$	156,023.22 \$	150,000.23 \$	148,190.19 \$	113,075.35 \$	12.92 \$			\$	35,117.84 \$	72.2%
<b>SUBTOTAL COAHUILCO DE ZARAGOZA</b>						<b>2,467,000.00 \$</b>	<b>2,467,364.48 \$</b>	<b>2,467,364.48 \$</b>	<b>1,937,760.23 \$</b>	<b>1,583,592.30 \$</b>	<b>211,879.26 \$</b>	<b>27,764.34 \$</b>		<b>\$</b>	<b>1,583,592.30 \$</b>	<b>64.2%</b>



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR DE PUENTES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Póliza	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Reclamaciones Devolutivas	Saldo Cancelado E	Diferencia G-C-D-E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Avance Financiero (%)
			Inicio	Fin												
<b>VERACRUZ</b>																
<b>La Tinaja - Isla</b>																
103MYE-12					SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRASUBSTITUCION DEL SISTEMA DE PIRO DEL PUENTE DE PLAYAS I KM. 48+000 Y PLAYAS II KM. 48+000.	112,000.00 \$	112,500.00 \$	1,330,000.00 \$	1,000,000.00 \$	500,000.00 \$	180,724.76 \$	3,020.07 \$	- \$	0.03 \$	900,000.25 \$	0.0%
<b>SUBTOTAL VERACRUZ</b>						<b>112,000.00 \$</b>	<b>112,500.00 \$</b>									
<b>CHIAPAS</b>																
<b>Las Chochas - Retuldlán - Ocoyocauitlán</b>																
118MYE-12	450001799	GESTION SERVICIOS Y CONSULTORIA PARA OBRA PUBLICA S.A. DE C.V.	10/04/2012	15/11/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRASUBSTITUCION DEL SISTEMA DE PIRO DEL PUENTE DE PLAYAS I KM. 48+000 Y PLAYAS II KM. 48+000.	500,000.00 \$	1,330,000.00 \$	1,330,000.00 \$	1,000,000.00 \$	500,000.00 \$	180,724.76 \$	3,020.07 \$	- \$	0.03 \$	900,000.25 \$	0.07%
123MYE-12	450001790	ALVAREZ GUILLEN INGENIEROS CONSULTORES S.A. DE C.V.	10/04/2012	05/11/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRASUBSTITUCION DEL SISTEMA DE PIRO DEL PUENTE YUCATECO KM. 08+420.	500,000.00 \$	940,000.00 \$	940,000.00 \$	904,004.00 \$	904,004.00 \$	- \$	- \$	0.03 \$	- \$	904,004.00 \$	94.0%
<b>SUBTOTAL CHIAPAS</b>						<b>1,000,000.00 \$</b>	<b>2,270,000.00 \$</b>	<b>2,270,000.00 \$</b>	<b>1,904,004.00 \$</b>	<b>1,404,004.00 \$</b>	<b>180,724.76 \$</b>	<b>3,020.07 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>0.03 \$</b>	<b>1,708,008.25 \$</b>	<b>74.8%</b>
<b>TOTAL</b>						<b>1,112,000.00 \$</b>	<b>1,112,500.00 \$</b>	<b>3,600,000.00 \$</b>	<b>2,904,004.00 \$</b>	<b>1,904,004.00 \$</b>	<b>361,449.52 \$</b>	<b>6,040.14 \$</b>	<b>- \$</b>	<b>0.06 \$</b>	<b>3,416,016.50 \$</b>	<b>54.1%</b>

003 0319

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal						
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Convalidado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercicio a Flajo de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance (Finalizado) (%)	Avance físico (%)
Tijuana	\$ 30,970,000.00	\$ 22,531,371.66	\$ 22,531,371.66	\$ 17,823,020.41	\$ 14,578,803.65			\$ 3,244,825.76	\$ 14,578,803.65	\$ -	\$ 405,767.95	64.7%	64.7%
Culliacán	\$ 1,340,000.00	\$ 1,037,310.75	\$ 1,037,310.75	\$ 902,710.05	\$ 905,574.25			\$ -	\$ 905,574.25	\$ -		87.3%	87.3%
Querétaro	\$ 44,520,000.00	\$ 30,553,703.70	\$ 30,553,703.79	\$ 13,632,529.82	\$ 12,934,477.31	\$ 1,424,715.82		\$ -	\$ 12,934,477.31	\$ -	\$ 90,112.21	42.3%	47.0%
Guerrero	\$ 6,840,000.00	\$ 6,920,635.48	\$ 6,920,636.48	\$ 4,943,992.87	\$ 4,875,091.69	\$ 407,556.14		\$ -	\$ 4,875,091.69	\$ -	\$ 1,127.98	70.4%	83.2%
Puebla	\$ 23,070,000.00	\$ 18,744,088.52	\$ 18,744,088.52	\$ 11,177,279.78	\$ 6,107,924.00	\$ 3,531,961.04		\$ -	\$ 6,107,924.00	\$ -	\$ 105,817.91	32.9%	32.0%
Coahuila	\$ 42,360,000.00	\$ 25,355,812.33	\$ 25,355,812.33	\$ 15,505,242.42	\$ 16,901,308.26	\$ 2,074,097.51		\$ -	\$ 16,901,308.26	\$ -	\$ 176,050.32	10.7%	78.4%
Veracruz	\$ 51,990,000.00	\$ 35,791,429.68	\$ 35,791,429.68	\$ 20,054,234.64	\$ 21,254,214.07	\$ 1,724,830.20		\$ -	\$ 21,254,214.07	\$ -	\$ 32,319.78	59.4%	64.4%
Roynosa	\$ 6,410,000.00	\$ 10,084,118.22	\$ 10,084,118.22	\$ 6,482,234.23	\$ 5,787,461.05			\$ 694,773.18	\$ 5,787,461.05	\$ -	\$ 20,358.95	57.4%	59.1%
* Guadalajara	\$ 25,540,000.00											0.0%	0.0%
Monterrey	\$ 43,930,000.00	\$ 26,873,090.70	\$ 26,873,090.70	\$ 26,873,090.70	\$ 25,442,450.14	\$ 1,600		\$ 1,600	\$ 25,442,450.14	\$ -	\$ 71,531.95	94.7%	99.9%
Chiapas	\$ 6,430,000.00	\$ 2,292,805.85	\$ 2,292,805.85	\$ 2,202,805.85	\$ 2,228,667.82			\$ 84,138.03	\$ 2,228,667.82	\$ -	\$ 2,208.90	97.2%	100.0%
Oaxaca	\$ 14,600,000.00	\$ 8,873,041.11	\$ 8,873,041.11	\$ 6,406,691.40	\$ 6,527,069.09			\$ 120,377.69	\$ 6,527,069.09	\$ -		73.6%	73.7%
<b>TOTAL</b>	\$ 300,000,000.00	\$ 189,058,009.09	\$ 189,058,009.09	\$ 126,094,446.97	\$ 117,603,041.33	\$ 9,163,161.51		\$ 1,600	\$ 117,603,041.33	\$ -	\$ 876,302.73	62.2%	68.72%

\* Recursos presupuestales no liberados por la desincorporación del Inamo.

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

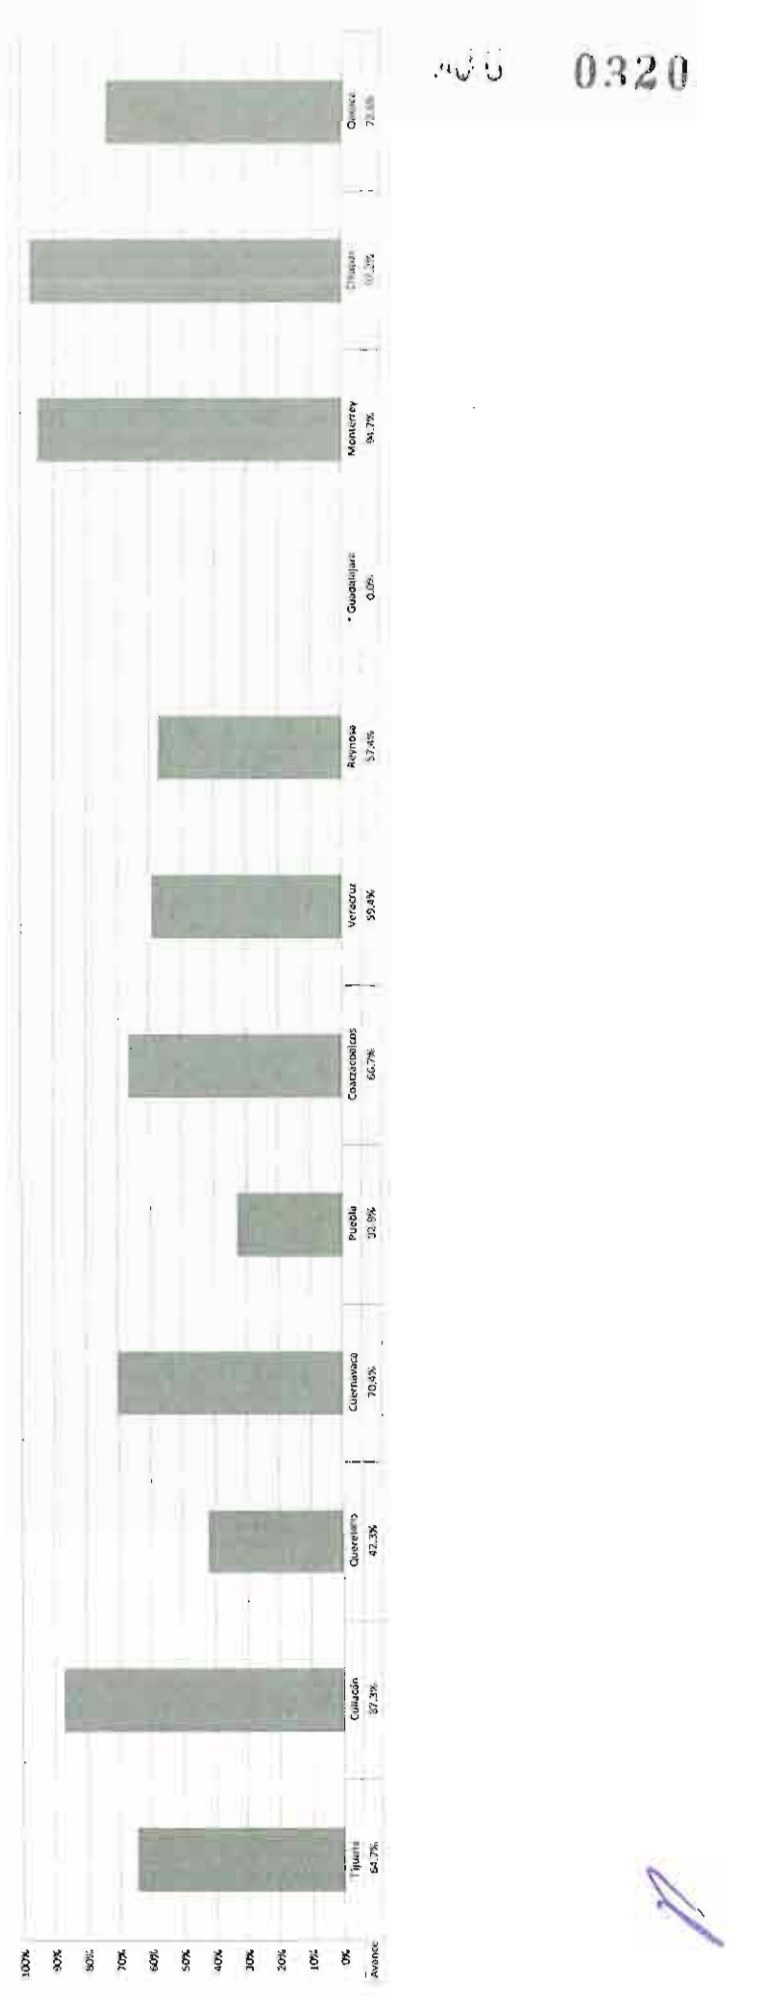

0320



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Inch de junio 15 de Octubre de 2012

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Falso de Efectivo	Avance Financiero (%)	Avance físico (%)	
			Inicio	Fin														
<b>TJUJANA - Envasado</b>																		
<b>Tijuana - Tercera</b>																		
1ME-12	4500017203	CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL (CODISEV), S.A. DE CV	01/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - BENSABENA	13,440,000.00	10,206,087.26	10,206,087.26	8,907,778.03	7,213,490.06		203,144.47	\$	1,724,206.48	\$	7,213,490.05	70.04%	
2ME-12	4500017204	CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO VIAL (CODISEV), S.A. DE CV	01/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA TIJUANA - TEJUPATE	11,100,000.00	8,287,810.58	8,287,810.58	6,434,016.04	5,006,787.20		142,821.19	\$	1,428,221.70	\$	5,006,787.25	60.44%	
<b>Libramiento Etn. Caribos</b>																		
3ME-12	4500017205	MARCO AURELIO HERNANDEZ SALAZAR	01/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO LOS CAJOS	6,430,000.00	3,045,483.81	3,045,483.81	2,420,833.84	2,358,638.35			\$	64,207.49	\$	2,358,638.35	58.87%	
<b>CULIACAN</b>																		
<b>Estación Don. Nogales</b>																		
4ME-12	4500017207	SOV Y ASOCIADOS, S.A. DE CV	01/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE 376 ESTRUCTURAS DE LA ESTACION DON - NOGALES	1,340,000.00	1,077,310.75	1,077,310.75	862,718.05	804,074.20			\$	2,886.20	\$	804,074.25	67.50%	
<b>QUERETARO</b>																		
<b>Libramiento de Querétaro</b>																		
5ME-12	4500017205	CORPORATIVO IMONSA, S.A. DE CV	06/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO NOROESTE DE QUERETARO	3,040,000.00	2,348,327.80	2,348,327.80	1,276,931.77	1,271,000.00			\$	342,711.26	\$	1,271,000.00	70.29%	
6ME-12	4500017206	CONSTRUCCION OCCON, S.A. DE CV	08/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMPA - LECHERIA	8,780,000.00	5,788,038.30	5,788,038.30	3,210,888.72	3,786,138.24			\$	478,888.52	\$	3,786,138.24	80.48%	
<b>México - Querétaro</b>																		
7ME-12	4500017208	CONTRASTA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE CV	20/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO, TRAMO TEPALCAPA - PALMILLAS	9,700,000.00	5,878,783.78	5,878,783.78	2,888,848.58	1,887,583.37	571,219.88	24,414.20	\$	497,779.11	\$	1,387,583.37	32.35%	
8ME-12	4500017209	CONTRASTA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE CV	20/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - QUERETARO, TRAMO PALMILLAS - QUERETARO	9,000,000.00	5,008,811.92	5,008,811.92	2,887,187.02	1,717,881.58	883,881.84	28,887.58	\$	428,881.49	\$	1,717,881.58	42.30%	
<b>Querétaro - Inguapio</b>																		
9ME-12	4500017210	CONSTRUCCIONES PROYECTOS Y CONSULTA, S.A. DE CV	20/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA QUERETARO - INGUAPIO	14,020,000.00	10,798,828.80	10,798,828.80	3,878,788.75	3,888,878.88			\$	789,888.13	\$	3,888,878.88	35.83%	
<b>QUERNAVACA</b>																		
<b>México - Cuernavaca</b>																		
10ME-12	4500017205	PROYECTO, ASESORIA, CONSTRUCCION, SUPERVISION Y CONCURSO DE OBRAS	01/02/2012	27/02/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE 62 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA QUERNAVACA - ROPULLCO	1,000,000.00	509,271.71	509,271.71	448,188.15	388,428.88			\$	78,873.87	\$	388,428.88	78.77%	
<b>La Para - Cuautla</b>																		
12ME-12	4500017205				ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO LA PARA - CUAUTLA		573,815.34	573,815.34	488,733.88	437,872.88			\$	88,881.71	\$	437,872.88	76.22%	
<b>Cuernavaca - Acapulco</b>																		
13ME-12	4500017207	MC CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS, S.A. DE CV	01/02/2012	29/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE 108 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ROPULLCO	4,900,000.00	4,382,277.43	4,382,277.43	2,842,625.67	3,088,111.98	289,481.74		\$	744,988.10	\$	3,088,111.98	70.33%	
<b>Puente de Itzla - Itzala</b>																		
14ME-12	4500017205				ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ROPULLCO		588,188.42	588,188.42	588,188.42	588,188.42		1,127.88	\$	22,588.88	\$	588,188.42	98.13%	
<b>Zacapulco - Rancho Viejo</b>																		
15ME-12	4500017205	INMOBILIARIA ARVIZO DEL BANC, S.A	01/02/2012	28/06/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE 44 ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO PUENTE DE ITZLA - IZCALA	688,000.00	134,782.10	134,782.10	134,782.10	1,048.04			\$	133,748.06	\$		0.00%	
<b>Rancho Viejo - Taxco</b>																		
16ME-12	4500017205				ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO RANCHO VIEJO - TAXCO		138,288.73	138,288.73	138,288.73	138,288.73	107,111.38		\$	28,887.35	\$	138,288.73	100.00%	
<b>SUBTOTAL TIJUANA</b>																		
						\$	27,831,374.88	\$	22,831,374.88	\$	17,831,374.88	\$	4,034,887.87	\$	3,834,887.87	\$	4,874,887.87	83.18%
<b>SUBTOTAL CULIACAN</b>																		
						\$	3,340,000.00	\$	2,348,327.80	\$	1,276,931.77	\$	1,271,000.00	\$	1,271,000.00	\$	70.29%	
<b>SUBTOTAL QUERETARO</b>																		
						\$	3,040,000.00	\$	2,348,327.80	\$	1,276,931.77	\$	1,271,000.00	\$	1,271,000.00	\$	70.29%	
<b>SUBTOTAL MEXICO - QUERETARO</b>																		
						\$	14,020,000.00	\$	10,798,828.80	\$	3,878,788.75	\$	3,888,878.88	\$	3,888,878.88	\$	35.83%	
						\$	30,855,783.78	\$	23,855,783.78	\$	12,714,716.88	\$	12,714,716.88	\$	12,714,716.88	\$	42.33%	
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA</b>																		
						\$	587,979.74	\$	587,979.74	\$	588,428.88	\$	430,311.19	\$	75,102.71	\$	430,311.18	62.94%
<b>SUBTOTAL MANTENIMIENTO MENOR DE 168 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ROPULLCO</b>																		
						\$	1,000,000.00	\$	509,271.71	\$	448,188.15	\$	388,428.88	\$	78,873.87	\$	388,428.88	78.77%
<b>SUBTOTAL LA PARA - CUAUTLA</b>																		
						\$	573,815.34	\$	573,815.34	\$	488,733.88	\$	437,872.88	\$	88,881.71	\$	437,872.88	76.22%
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA - ACAPULCO</b>																		
						\$	4,900,000.00	\$	4,382,277.43	\$	2,842,625.67	\$	3,088,111.98	\$	744,988.10	\$	3,088,111.98	77.15%
<b>SUBTOTAL PUENTE DE ITZLA - ITZALA</b>																		
						\$	588,188.42	\$	588,188.42	\$	588,188.42	\$	588,188.42	\$	22,588.88	\$	588,188.42	100.00%
<b>SUBTOTAL ZACAPALCO - RANCHO VIEJO</b>																		
						\$	688,000.00	\$	134,782.10	\$	134,782.10	\$	1,048.04	\$	133,748.06	\$		0.00%
<b>SUBTOTAL RANCHO VIEJO - TAXCO</b>																		
						\$	138,288.73	\$	138,288.73	\$	138,288.73	\$	138,288.73	\$	28,887.35	\$	138,288.73	100.00%
						\$	6,849,888.88	\$	5,078,828.88	\$	2,834,887.87	\$	2,834,887.87	\$	3,334,887.87	\$	4,874,887.87	83.18%



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Incluye los costos 15 de Octubre del 2012

No. Puesto	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Gastado Acumulado C	Monto Da Transferido D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia (B-C)-D-E	Licitado a Flipo de Ejecutivo	Avance Fisico (F)
			Inicio	Fin												
<b>PUEBLA</b>																
<b>México - Puebla</b>																
17ME-12	4500017002	CONTRATAS DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	01/03/2012	30/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA.	\$ 11,000,000.00	\$ 0,001,027.00	\$ 0,001,027.00	\$ 0,100,010.04	\$ 3,774,200.70	\$ 1,304,420.00	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000,000.00	\$ 3,774,200.70	46.64%
18ME-12	4500018106	JAK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	01/05/2012	30/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA PUEBLA - ACATZINGO	\$ 5,200,000.00	\$ 4,093,001.30	\$ 4,093,001.30	\$ 3,021,127.00	\$ 1,100,530.30	\$ 1,110,000.20	\$ 14,370.12	\$ 0	\$ 710,020.24	\$ 1,100,000.30	21.16%
<b>Acázingo - Cd. Mendoza</b>																
19ME-12	4500018200	JAK SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	01/03/2012	30/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ACATZINGO - CD. MENDOZA.	\$ 0,100,000.00	\$ 0,701,460.20	\$ 0,701,460.20	\$ 1,007,000.00	\$ 1,007,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200,000.00	\$ 1,107,000.00	21.00%
<b>COATZACOALCOS</b>																
<b>Champotón - Campeche</b>																
20ME-12	4500017007	GRUPO PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES ALM, S.A. DE C.V.	02/04/2012	30/09/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 23 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CHAMPOTON - CAMPECHE	\$ 1,040,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000.00	\$ 0	0.00%
<b>Cd. Isla - Acapulcan</b>																
21ME-12	4500017007	CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS ANGELES S.A. DE C.V. & TERRACERIAS Y PAVIMENTOS URBANICOS, S.A. DE C.V.	10/04/2012	31/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 180 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. ISLA - ACAPULCAN.	\$ 11,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 4,403,710.11	\$ 2,000,700.04	\$ 0	\$ 124,204.71	\$ 0	\$ 700,000.00	\$ 2,000,700.04	42.00%
<b>Acapulcan - Coahuila de Zaragoza</b>																
22ME-12	4500017004	CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS ANGELES, S.A. DE C.V.	10/04/2012	31/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 00 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA ACATZINGO - COSOLEACAQUE DE C.V.	\$ 0,300,000.00	\$ 0,701,000.00	\$ 0,701,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
<b>Aguila Dulce - Chidrens</b>																
23ME-12	4500018043	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ALM, S.A. DE C.V.	24/04/2012	30/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 00 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA AGUA DULCE - CARDENAS	\$ 10,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 2,442,400.74	\$ 0,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
<b>C.D. Salina Cruz - La Ventosa</b>																
24ME-12	4500017003	GRUPO RECH, PROYECTO DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS ANGELES S.A. DE C.V. & TERRACERIAS Y MODIFICACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V.	10/04/2012	31/12/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 200 ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO SALINA CRUZ - LA VENTOSA	\$ 7,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,724,410.00	\$ 1,040,420.00	\$ 0	\$ 0	\$ 1,100,000.00	\$ 2,724,410.00	58.91%
<b>Puerto Zacaqui</b>																
25ME-12	4500017006	ASESORIA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES	02/04/2012	28/09/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL PUENTE "ZACACAL"	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1,000,000.00	100.00%
<b>VERACRUZ</b>																
<b>Cd. Mendoza - Córdoba</b>																
26ME-12	4500017001	MIC & RCG OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	02/04/2012	10/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CD. MENDOZA - CORDOBA	\$ 0,700,000.00	\$ 0,700,000.00	\$ 0,700,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 3,400,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
<b>Córdoba - Veracruz</b>																
27ME-12	4500017005	FREEMANET DE MEXICO, S.A. DE C.V.	02/04/2012	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CORDOBA - VERACRUZ	\$ 14,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
<b>La Tinaha - Isla</b>																
28ME-12	4500018004	TENDONES EN RECUR. Y CONST. S.A. DE C.V.	01/05/2012	31/01/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LA TINAJA - ISLA	\$ 20,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 7,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
<b>Guilermo Zamora - Tlaxiuhcan</b>																
29ME-12	4500017007	GRUPO CONSTRUCTOR JEDY, S.A. DE C.V.	02/04/2012	01/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA GUATEMEX ZAMORA - TLAXIUHCAN	\$ 2,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%
<b>Libramiento Poniente Tlaxiuhcan</b>																
30ME-12	4500017000	DE COSIY BLANCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	02/04/2012	01/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL LIBRAMIENTO PONIENTE TAMPICO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 1,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	50.00%
<b>REYNOSA</b>																
<b>Puerto Internacional Reynosa - Pharr</b>																
31ME-12	4500017012	SECURA ORTEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	01/02/2012	30/11/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - PHARR	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0,000,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00%





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR DE PUENTES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 13 de Octubre de 2012


No. Paralelo	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estado Acumulado C	Monto En Trámite D	Retenciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Liquidado a Flujo de Efectivo	Avance físico (Porcentaje)	Avance físico (Porcentaje)
<b>Puente Internacional Ignacio Zaragoza</b>																
33ME-12	400017133	VENTE CERRO DOS CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V	30/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR ESTRUCTURAS PUENTE INTERNACIONAL GENERAL IGNACIO ZARAGOZA	\$ 2,500,000.00	\$ 1,993,397.46	\$ 1,993,397.46	\$ 1,141,298.85	\$ 1,206,367.96			\$ 67,000.71	\$ -	\$ 1,273,368.67	72.00%	72.00%
<b>Mastiluneros - Reynosa</b>																
40ME-12	4300015208	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CANOEN, S.A DE CV	20/05/2012	MANTENIMIENTO MENOR ESTRUCTURAS EN LA AUTOPISTA MANTAMBORES-REYNOSA	\$ 3,406,000.00	\$ 3,456,001.99	\$ 3,456,001.99	\$ 1,260,771.92	\$ 990,961.97		\$ 13,063.46	\$ -	\$ 281,239.55	\$ 696,661.97	26.00%	26.00%
<b>GUADALAJARA</b>																
<b>Patricio - Uribean</b>																
40ME-12	4300027032	CONSTRUCIONES CONE (S.A DE CV)	01/04/2012	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SAN JOAQUIN-NUEVA ITALIA	\$ 8,730,000.00										0.00%	0.00%
<b>Uribean - Nueva Italia</b>																
40ME-12	4300027033	CONSTRUCIONES CONE (S.A DE CV)	01/04/2012	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SAN JOAQUIN-NUEVA ITALIA	\$ 4,200,000.00										0.00%	0.00%
<b>Nueva Italia - Lazaro Cardenas</b>																
40ME-12	4300027034	CONSTRUCIONES CONE (S.A DE CV)	01/04/2012	MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SAN JOAQUIN-NUEVA ITALIA	\$ 4,610,000.00										0.00%	0.00%
<b>MONTERRREY</b>																
<b>Monterrrey - Nuevo Laredo</b>																
37ME-12	400017017	INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CARDEN, S.A DE CV	01/04/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 42 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO	\$ 7,900,000.00	\$ 5,251,651.20	\$ 5,251,651.20	\$ 5,251,651.20	\$ 5,251,651.46		\$ -	\$ 0.02	\$ -	\$ 5,251,651.46	100.00%	100.00%
<b>Torreón - Saltillo</b>																
30ME-12	400017100	TORCA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	20/06/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 28 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA SALTILLO - TORREÓN.	\$ 4,070,000.00	\$ 2,961,387.05	\$ 2,961,387.05	\$ 2,961,387.05	\$ 2,961,385.91		\$ -	\$ 1.24	\$ -	\$ 2,961,385.91	100.00%	100.00%
<b>Carbonera - Ojs Caliente</b>																
30ME-12	400017076	GUADALUPE ELOSA GARCIA RODRIGUEZ	01/04/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CARBONERA - OJO CALIENTE	\$ 2,750,000.00	\$ 1,461,540.16	\$ 1,461,540.16	\$ 1,461,540.16	\$ 1,461,540.16		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,461,540.16	100.00%	100.00%
<b>Gomez Palacio - Corralitos</b>																
40ME-12	400017075	TORCA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	20/07/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 11 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA LÓPEZ PALACIO - CORRALITOS	\$ 11,980,000.00	\$ 6,404,933.20	\$ 6,404,933.20	\$ 6,404,933.20	\$ 6,404,933.20		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,404,933.20	100.00%	100.00%
<b>Cadereyta - Reynosa</b>																
41ME-12	400017005	CONTRATA DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V	01/04/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 45 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA CADEREYTA-REYNOSA	\$ 14,810,000.00	\$ 6,183,711.39	\$ 6,183,711.39	\$ 6,183,711.39	\$ 7,950,072.41		\$ -	\$ 71,531.96	\$ -	\$ 6,755,072.43	92.22%	92.22%
<b>Puerto Mexico - Carbonera</b>																
42ME-12	400017000	TORCA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	01/04/2012	MANTENIMIENTO MENOR EN 8 ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA NUEVO LAREDO - CARBONERA	\$ 880,000.00	\$ 616,740.66	\$ 616,740.66	\$ 616,740.66	\$ 616,740.26		\$ -	\$ 0.30	\$ -	\$ 616,740.26	100.00%	100.00%
<b>Durango - Mazatlán</b>																
43ME-12	400017004	TORCA CONSTRUCCIONES S.A DE CV	01/04/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DE LA AUTOPISTA DURANGO - MAZATLÁN DEL KM 0+000 AL KM 42+000	\$ 2,340,000.00	\$ 2,132,917.82	\$ 2,132,917.82	\$ 2,132,917.82	\$ 2,132,917.76		\$ -	\$ 0.04	\$ -	\$ 2,132,917.76	100.00%	99.2%
<b>CHIHUAHUA</b>																
<b>Las Choapas - Raudales - Ocozacoatlán</b>																
44ME-12	400017270	CONSTRUCCIONES DEL CERRO S.A DE CV	01/02/2012	MANTENIMIENTO MENOR DE ESTRUCTURAS DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES OCOZOCOATLÁN	\$ 6,300,000.00	\$ 2,292,895.85	\$ 2,292,895.85	\$ 2,292,895.85	\$ 2,229,697.92		\$ -	\$ 64,197.93	\$ -	\$ 2,229,697.92	97.20%	96.99%
<b>OAXACA</b>																
<b>Cd. Cuicatlan - Oaxaca</b>																
46ME-12	400017415	ORUPE DE INGENIERIA DE LA CIENCIA, S.A DE CV	01/02/2012	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN 142 ESTRUCTURAS DEL C D CUICATLAN-OAXACA	\$ 14,900,000.00	\$ 6,673,041.11	\$ 6,673,041.11	\$ 6,668,091.40	\$ 6,327,069.00		\$ -	\$ 120,371.69	\$ -	\$ 6,507,437.69	73.60%	73.60%
<b>TOTAL</b>																
					\$ 10,000,000.00	\$ 48,804,000.00	\$ 48,804,000.00	\$ 48,804,000.00	\$ 47,804,446.97	\$ 47,804,446.97	\$ -	\$ 117,003,041.32	\$ -	\$ 47,804,446.97	62.20%	62.20%

0323

Fecha de corte: 16 de Octubre de 2012

Destacados	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance Inicialmente (%)	Avance Actual (%)	
Tijuana	\$ 3,000,000.00	\$ 5,078,681.04	\$ 5,078,681.04	\$ 2,546,250.28	\$ 1,250,125.80			\$ 1,208,124.57	\$ 1,250,125.69	\$ 57,700.17		20.0%	20.0%	
Culiacán												0.0%	0.0%	
Querétaro	\$ 6,470,280.93	\$ 1,930,894.86	\$ 1,930,894.86	\$ 1,028,604.17	\$ 1,155,975.10	\$ 530,848.92		\$ 241,780.15	\$ 1,155,975.10	\$ 33,954.10		0.0%	0.0%	
Coahuila	\$ 658,000.00	\$ 658,000.00										59.7%	76.8%	
Coahuila de Zaragoza												0.0%	0.0%	
Veracruz	\$ 3,445,322.44	\$ 2,981,595.62	\$ 2,981,595.62	\$ 2,277,451.28	\$ 1,556,268.32			\$ 721,182.06	\$ 1,556,268.32			32.5%	54.6%	
Reynosa	\$ 376,396.82	\$ 543,317.05	\$ 181,317.05	\$ 181,317.05	\$ 181,295.75		\$ 51.30		\$ 181,265.75	\$ 833.02		100.0%	100.0%	
Guadalajara												0.0%	0.0%	
Monterrey	\$ 800,000.00	\$ 988,649.71	\$ 868,649.71	\$ 599,366.85		\$ 998,408.28	\$ 2,241.43	\$ 399,282.86				0.0%	59.8%	
Chiapas	\$ 6,908,428.87	\$ 7,563,065.98	\$ 7,563,065.98	\$ 6,245,548.31	\$ 1,770,352.25			\$ 4,475,190.06	\$ 1,770,352.25	\$ 27,718.64		23.4%	8.4%	
Oaxaca	\$ 3,341,571.13	\$ 3,341,571.13										0.0%	0.0%	
<b>TOTAL</b>	\$ 24,999,999.99	\$ 23,981,775.39	\$ 19,620,204.26	\$ 13,780,537.92	\$ 5,913,987.11	\$ 1,527,257.20	\$ 2,292.73	\$ 6,317,000.88	\$ 5,913,987.11	\$ 120,205.93		30.2%	46.87%	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

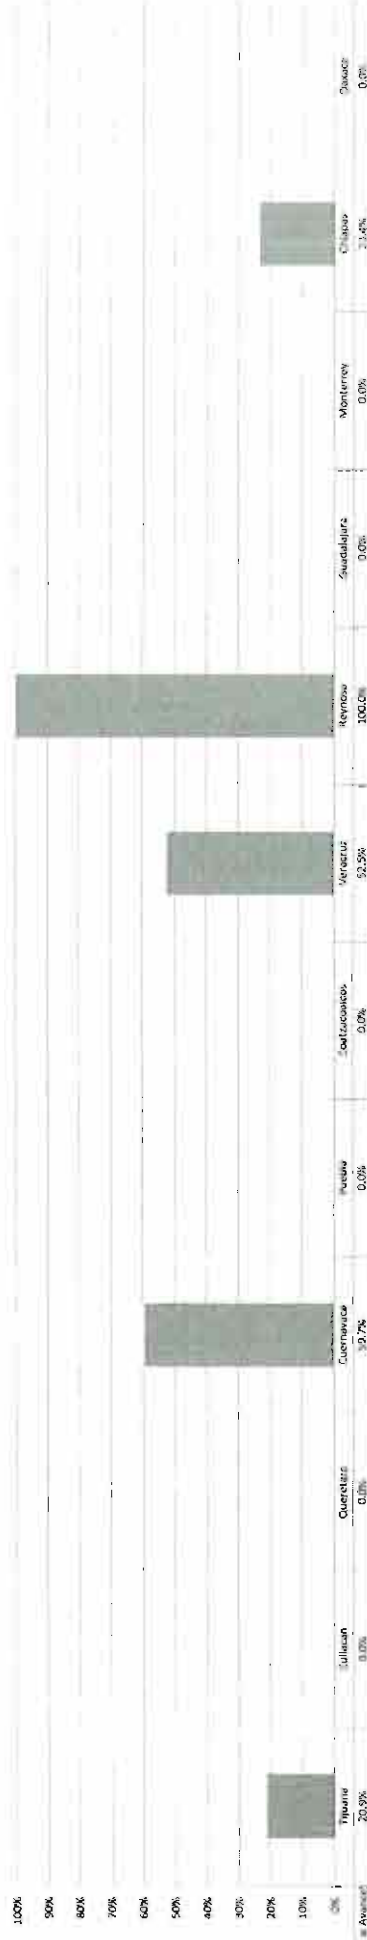



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MODERNIZACION 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Perfil del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Excluidos Acumulados C	Monto En Trámite O	Selecciones - Devoluciones	Saldo Capitalizado L	Ejecutado DAC-DE	Ejecución - Fideicomiso de Ejecución	Avance financiero (%)	Avance físico (%)	
			Inicio	Fin														
<b>TIJUANA</b>																		
<b>Tijuana - Encomienda</b>																		
14M-12	4500018213	TECHACIAS LC INSTALACIONES HIDRAULICAS, S.A. DE CV. A RICARDO TECHACIY ERNANO	04/06/2012	16/11/2012	CONSTRUCCION DE BANIAS PARA LAS TORRES DE AUXILIO VIAL, UBICADAS EN LA AUTOPISTA TIJUANA - CHIHUAHUA	3,000,000.00	2,005,981.04	2,005,981.04	1,927,127.37	1,250,125.69	-	37,700.17	-	577,001.08	1,250,125.69	41.02%	45.01%	
15M-12	4500018275	MACQUINARIA Y SUMINISTROS JAPANEZ S.A. DE CV	30/06/2012	27/12/2012	MANUTENCION Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMENAS TIPO LUMENAS DE 81 WATTS Y 6005 LUMENES EN LAS PLAZAS DE COBRO NO 34 PLAYAS DE TIJUANA, NO 36 ROSARIO Y NO 38 ENSENADA, DE LA AUTOPISTA TIJUANA - ENSENADA	1,725,306.40	1,725,306.40	1,725,306.40	510,833.47	-	-	-	-	510,833.47	-	0.06%	25.50%	
<b>La Rumorosa - Teclat</b>																		
16M-12	4500018277	MARCO AURELIO HERNANDEZ SALAZAR	07/09/2012	04/11/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMENAS TIPO LUMENAS DE 81 WATTS Y 6005 LUMENES EN LAS PLAZAS DE COBRO NO 49 EL HONDO, DE LA AUTOPISTA LA RUMOROSA - TECLAT	503,114.40	503,114.40	503,114.40	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
<b>Llirramento Los Cabos</b>																		
17M-12	4500018229	CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUMINISTROS DE MANUEL DELGADO CONZALIZ	07/09/2012	08/11/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON LUMENAS TIPO LUMENAS DE COBRO NO 86 SAN JOSE DEL CAYO DEL LLIRRAMENTO LOS CABOS	765,080.40	765,080.40	765,080.40	211,080.42	-	-	-	-	211,080.42	-	0.00%	0.00%	
<b>GUERRAVACA</b>																		
<b>Guerravaca - Acapulco</b>																		
18M-12	4500018215	SARITA CAPELLADA ACIERO TOMADO EN MANITO DE LA RUMOROSA, COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	04/06/2012	01/11/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	840,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
19M-12	4500018216	GRUPO DE TRABAJO DE CONSERVACION FORESTAL DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRUPO DE TRABAJO DE CONSERVACION FORESTAL DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA)	07/09/2012	08/11/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
20M-12	4500018217	CONSERVACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	07/09/2012	08/11/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	1,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
21M-12	4500018218	SUMINISTRO Y COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	07/09/2012	08/11/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	211,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
<b>G.D. Puente de Bita - Tijuana</b>																		
6M-12	4500018219	INGENIERIA Y ASOCIADOS, S.A. DE CV	04/06/2012	01/11/2012	SUMINISTRO, COLOCACION Y AMPLIACION DE PLAZAS DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	2,108,424.70	1,926,894.86	1,926,894.86	1,926,894.86	1,195,075.10	500,948.92	33,004.10	-	241,780.16	1,195,075.10	29.68%	76.81%	
<b>PUEBLA</b>																		
<b>México - Puebla</b>																		
7M-12	4500018220	SUSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO FRACATURADAS QUE SOPORTAN LOS SENORIOS REPARANDO BIENES EN LA PLAZA DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	04/06/2012	01/11/2012	SUSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO FRACATURADAS QUE SOPORTAN LOS SENORIOS REPARANDO BIENES EN LA PLAZA DE COBRO EN LA PLAZA DE COBRO NO 149 GUERRAVACA	636,000.00	636,000.00	636,000.00	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	0.00%	
<b>VERACRUZ</b>																		
<b>Cuernavaca - Tihuanlián</b>																		
8M-12	4500018252	RECICLADO Y CONSERVACION DE CAMINOS RUMOROSA, S.A. DE CV	16/06/2012	24/10/2012	CONSTRUCCION DE LOMAS DE ACCESO A LA PLAZA DE COBRO 177 TONOMETROS DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - TIHUANLIAN	3,445,322.44	2,601,359.82	2,601,359.82	2,277,451.28	1,356,248.32	-	-	-	721,102.06	1,356,248.32	27.85%	54.91%	
<b>REYNOSA</b>																		
<b>México - Reynosa</b>																		
9M-12	4500018260	PROYECTOS DE INTERACCIONES DE INSHAM INDUSTRIALES, S.A. DE CV	13/06/2012	11/07/2012	REPARACION DE LOMAS DE CONCRETO FRACATURADAS DE 36 CM DE ESPESOR MODALO DE RIPTURA EN KGCM EN ZONA DE COBRO DE LA AUTOPISTA MATAMOROS - REYNOSA	103,965.04	137,504.86	137,504.86	137,504.86	137,504.86	20.23	909.92	-	-	137,504.86	100.00%	100.00%	
<b>Puerto Internacional General Ignacio Zaragoza</b>																		
10M-12	4500018266	PROYECTOS DE INTERACCIONES DE INSHAM INDUSTRIALES, S.A. DE CV	13/06/2012	11/07/2012	REPARACION DE LOMAS DE CONCRETO FRACATURADAS DE 36 CM DE ESPESOR MODALO DE RIPTURA EN KGCM EN ZONA DE COBRO EN EL PUENTE INTERNACIONAL IGNACIO ZARAGOZA	777,410.98	43,382.07	43,382.07	43,382.07	43,382.07	26.07	-	-	-	43,382.07	100.00%	99.94%	
<b>Puerto Internacional Reynosa - Pinar</b>																		
11M-12	4500018267	SUSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO FRACATURADAS EN LA PLAZA DE COBRO NO 75 DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - PINAR	04/06/2012	01/11/2012	SUSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO FRACATURADAS EN LA PLAZA DE COBRO NO 75 DEL PUENTE INTERNACIONAL REYNOSA - PINAR	375,304.68	343,317.68	343,317.68	343,317.68	343,317.68	83.20	833.82	-	-	343,317.68	100.00%	100.00%	

*[Handwritten signature]*



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CDXENIX  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA



PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Reintegrado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Ejecutado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejército a Faltos en Ejército	Fecha anterior 15 de Octubre de 2012	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)
			Inicio	Fin														
<b>Puerto México - Caribarrera</b>																		
11MD-12	4000018117	CONSTRUCTORA DEL NORTE TORRESA S.A DE C.V.	03/03/2012	07/07/2012	MODERNIZACIÓN DEL SUMINISTRO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CARRETERA FEDERAL 171+000 DE LA AUTOPISTA PUERTO MÉXICO - LA CARIBARRERA	600,000.00	516,046.71	600,000.71	580,000.00	5	186,400.28		2,741.43	300,000.00			0.00%	90.75%
<b>CHAMPAS</b>																		
<b>Las Chispas Realistas-Quetzocastillo</b>																		
13MD-12	4000018208 5300004980	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA DE CHAMPAS ECOSA S.A. DE C.V.	12/06/2012	02/01/2013	AMPLIACIÓN DE LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA PLAZA DE COARO (70) LAS CHAMPAS MM 10+000, 101 MALPASITO MM 117+200 Y 107 OCOZOCOCAUTLA MM 105+200 DEL ESTADO DE OAXACA - OAXACA	6,006,428.87	6,124,450.24	6,124,450.24	5,320,287.05	1,474,003.71				3,048,000.25	1,474,003.71		24.97%	24.07%
16MD-12	4000018518	CONSTRUCTORA Y APLICADORA PARROZ, A.C.	10/09/2012	22/11/2012	REPOSICIÓN DE TIRANQUILIZANTES DE CARRILES EN LA CARRETERA FEDERAL 100+000 DEL ESTADO DE OAXACA - OAXACA		1,400,026.74	1,400,026.74	527,750.25	200,258.04		27,716.04		682,607.71	200,258.04		30.84%	48.20%
<b>OAXACA</b>																		
<b>Comercio y Turismo - Oaxaca</b>																		
12MD-12					CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA CARRETERA FEDERAL 100+000 DEL ESTADO DE OAXACA - OAXACA	3,241,871.13	3,241,871.13										0.00%	0.00%
<b>TOTAL</b>																		
						24,908,898.80	23,981,775.36	19,650,204.95	13,740,571.32	8,043,087.11	1,297,257.20	130,206.02	2,202.71	6,237,000.03	8,043,087.11		30.15%	46.87%

0326

RECURSOS ADICIONALES (AVE) AL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

No. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto En Trámite	Reservaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado	Diferencia D-C-D-E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Avenida Financiera (%)	Avenida Física (%)
			Inicio	Fin												
<b>QUERÉTARO</b>																
<b>México - Querétaro</b>																
4AVE-12	400001020	CONSTRUCTORA XIMSA S.A. DE C.V. & PACISCO S.A. DE C.V.	19/09/2012	13/08/2012	ADECUACION GEOMETRICA DE CARRILES EXPRESS AVE EN LA PLAZA DE COBRO No. 4 TEPOTZOTLAN.	9,103,480.04	9,103,480.04	9,103,480.04	-	7,197,007.01	-	1,906,477.73	-	-	0.00%	144.17%
2AVE-12	400001020	CONSTRUCTORA XIMSA S.A. DE C.V. & PASCO S.A. DE C.V.	19/09/2012	09/09/2012	ADECUACION GEOMETRICA DE CARRILES EXPRESS AVE EN LA PLAZA DE COBRO No. 5 PALMILLAS.	4,200,301.01	4,200,301.01	4,200,301.01	-	3,353,910.13	-	802,390.88	-	-	0.00%	140.84%
<b>Querétaro - Irapuato</b>																
4AVE-12	400001020	CONSTRUCTORA XIMSA S.A. DE C.V. & PASCO S.A. DE C.V.	19/09/2012	01/09/2012	ADECUACION GEOMETRICA DE CARRILES EXPRESS AVE EN LA PLAZA DE COBRO No. 6 QUERETARO	4,200,952.04	4,200,952.04	4,200,952.04	-	2,205,715.35	-	1,995,237.70	-	-	0.00%	137.85%
<b>SUBTOTAL QUERETARO</b>																
						17,504,733.09	17,504,733.09	17,504,733.09	-	12,756,627.49	-	4,748,105.61	-	-	0.00%	100.76%
<b>CUERNAVACA</b>																
<b>México - Cuernavaca</b>																
4AVE-12	40001020	CONSTRUCTORA XIMSA S.A. DE C.V. & PACISCO S.A. DE C.V.	01/09/2012	13/08/2012	ADECUACION GEOMETRICA DE CARRILES EXPRESS EN LA PLAZA DE COBRO No. 1 TLALPÁN.	2,774,351.41	2,774,351.41	2,707,045.35	-	2,307,061.10	-	4.25	-	-	0.00%	70.54%
<b>CUERNAVACA - Acapulco</b>																
4AVE-12	40000000	CONSTRUCTORA XIMSA S.A. DE C.V. & PASCO S.A. DE C.V.	01/09/2012	13/08/2012	ADECUACION GEOMETRICA DE CARRILES EXPRESS EN LA PLAZA DE COBRO No. 194 FRANCISCO VELASCO DURAN	6,764,871.83	6,764,871.83	6,611,207.56	-	5,210,208.41	-	1,554,663.42	-	3,567,755.31	5.27%	55.11%
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA</b>																
						9,539,223.24	9,539,223.24	9,318,252.91	-	7,517,269.51	-	2,021,953.73	-	3,567,755.31	3.74%	61.34%
<b>PUEBLA</b>																
<b>México - Puebla</b>																
4AVE-12	40001020	PANCO S.A. DE C.V.	09/09/2012	30/06/2012	ADECUACION GEOMETRICA DE CARRILES EXPRESS AVE EN SAN MARCOS.	5,854,813.03	5,854,813.03	4,806,507.03	-	2,323,145.45	-	-	-	2,323,145.45	10.88%	100.00%
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>																
						5,854,813.03	5,854,813.03	4,806,507.03	-	2,323,145.45	-	-	-	2,323,145.45	10.00%	100.00%
<b>TOTAL</b>						33,017,875.66	33,017,875.66	30,621,200.58	-	22,767,890.34	-	1,046.20	-	5,935,418.20	0.12%	111.07%

Nota: Los recursos correspondientes a las partidas de este programa son adicionales al presupuesto autorizado de Operación, motivo por el cual dichos montos no se consideran en el programa original de Modernización, ni en el Resumen General.


000 0327



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal			
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Eliminado Acumulado C	Monto En Trámite D	Salido Cancelado E	Diferencia D - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Relaciones - Devoluciones	Ajustes de Cuentas Pagadas	Avance Financiero (%)		
Tijuana		\$ 303,229.93										0.0%		
Culiacán												0.0%		
Querétaro												0.0%		
Cuernavaca	\$ 388,216.86											0.0%		
Puebla												0.0%		
Coahuila												0.0%		
Veracruz	\$ 205,719.35	\$ 205,948.11	\$ 205,948.11	\$ 158,299.14	\$ 158,299.14				\$ 158,299.14	-\$ 433.30		76.9%		
Reynosa												0.0%		
Guadaluajara												0.0%		
Monterrey												0.0%		
Chiapas	\$ 405,083.80	\$ 657,606.62	\$ 657,606.62	\$ 326,949.35	\$ 326,949.35				\$ 326,949.35			40.7%		
Oaxaca												0.0%		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,000,000.01</b>	<b>\$ 1,186,784.66</b>	<b>\$ 863,554.73</b>	<b>\$ 485,248.49</b>	<b>\$ 485,248.49</b>				<b>\$ 485,248.49</b>	<b>-\$ 433.30</b>		<b>0.0%</b>		

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

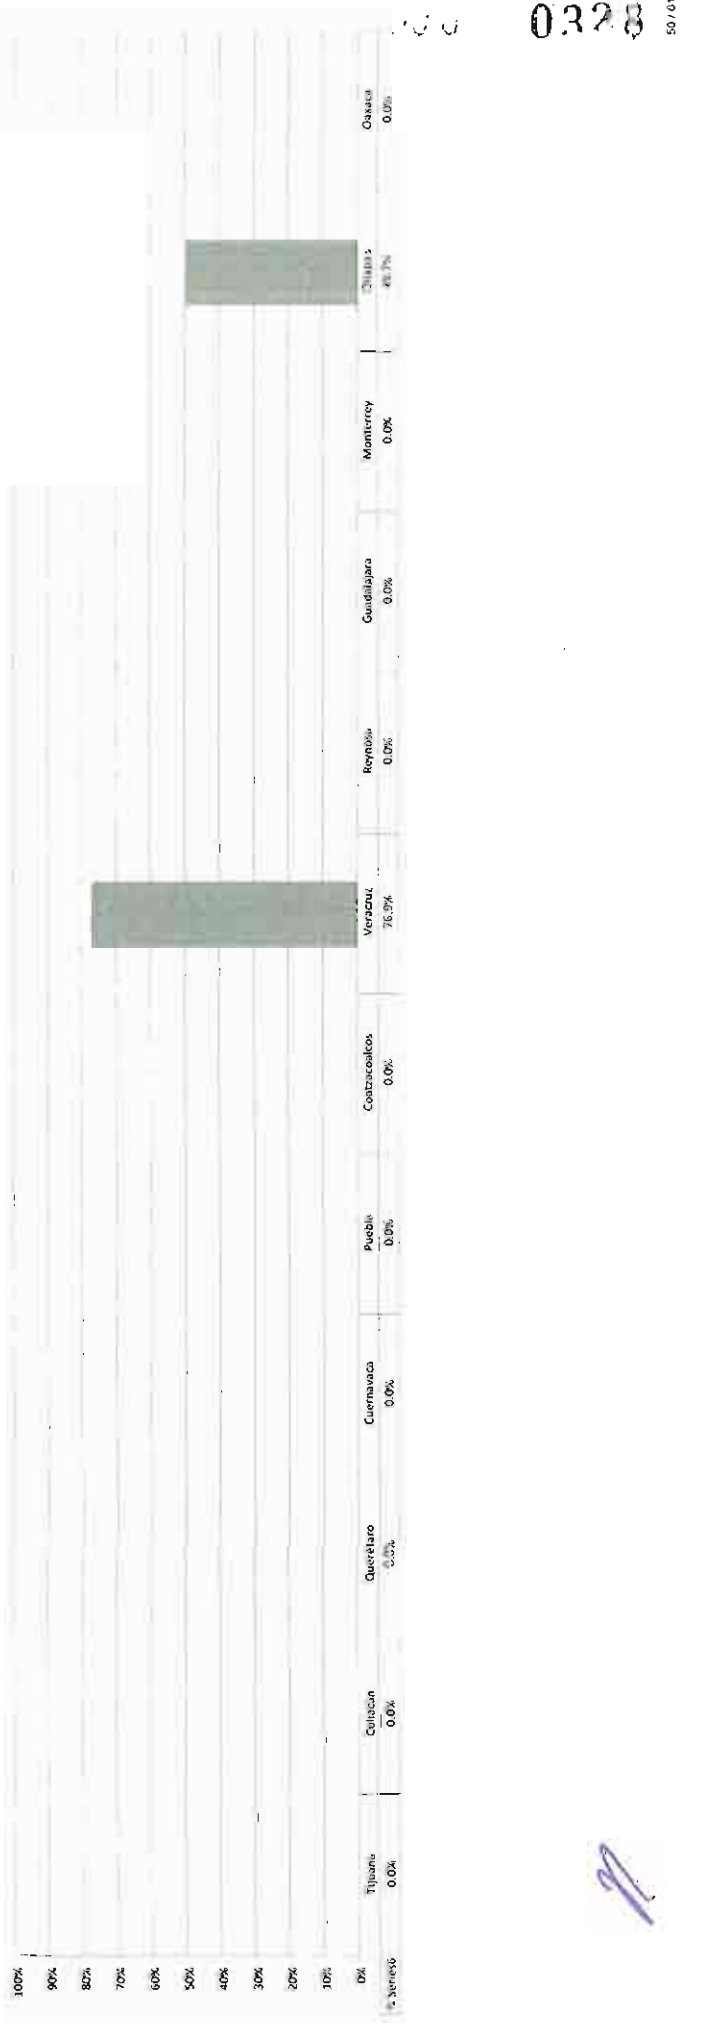






**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal		
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Relaciones - Dovelaciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)	Avance físico (%)
Tlaxiua	\$ 1,150,000.00	\$ 1,285,081.23	\$ 1,285,081.23	\$ 991,893.45	\$ 991,893.45				\$ 991,893.45			78.4%	N/A
Coliaca	\$ 2,500,000.00	\$ 2,340,129.48	\$ 2,349,129.48	\$ 1,930,275.87	\$ 2,179,884.16		-\$	249,408.29	\$ 2,179,884.16			82.8%	N/A
Queretaro	\$ 3,250,000.00	\$ 3,094,682.71	\$ 3,094,682.71	\$ 2,630,510.54	\$ 2,630,510.54				\$ 2,630,510.54			85.0%	N/A
Cuernaueca	\$ 2,800,000.00	\$ 2,741,465.23	\$ 2,741,465.23	\$ 1,380,555.72	\$ 854,611.50			514,944.22	\$ 854,611.50	\$ 131,410.28		31.2%	N/A
Puebla	\$ 2,000,000.00	\$ 1,721,587.38	\$ 1,721,587.38	\$ 1,506,435.41	\$ 912,731.33			593,704.08	\$ 912,731.33	\$ 18,886.52		53.0%	N/A
Coahuila	\$ 2,300,000.00	\$ 2,002,273.30	\$ 2,002,273.30	\$ 1,809,027.55	\$ 1,689,027.55				\$ 1,809,027.55			84.9%	N/A
Veracruz	\$ 2,500,000.00	\$ 2,346,270.81	\$ 2,346,270.81	\$ 1,898,651.43	\$ 1,686,651.43				\$ 1,898,651.43			72.3%	N/A
Yucatán			\$ 258,638.60	\$ 228,428.52	\$ 228,428.52				\$ 228,428.52			87.5%	N/A
* Guadalupe	\$ 1,600,000.00											0.0%	N/A
Monterrey	\$ 2,200,000.00	\$ 4,250,725.20	\$ 3,992,086.60	\$ 3,226,602.24	\$ 3,061,235.33			165,420.91	\$ 3,061,235.33	\$ 1,007.13		76.7%	N/A
Chiapas y Oaxaca	\$ 1,700,000.00	\$ 757,952.24	\$ 757,952.24	\$ 875,034.95	\$ 875,034.95				\$ 875,034.95			90.1%	N/A
Oaxaca		\$ 716,789.28	\$ 716,789.28	\$ 598,229.93	\$ 598,229.93				\$ 598,229.93			83.5%	N/A
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 22,000,000.00</b>	<b>\$ 21,245,952.86</b>	<b>\$ 21,245,952.86</b>	<b>\$ 16,550,495.61</b>	<b>\$ 15,525,828.69</b>			<b>\$ 1,024,666.92</b>	<b>\$ 15,525,828.69</b>	<b>\$ 151,091.93</b>		<b>73.1%</b>	<b>N/A</b>

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

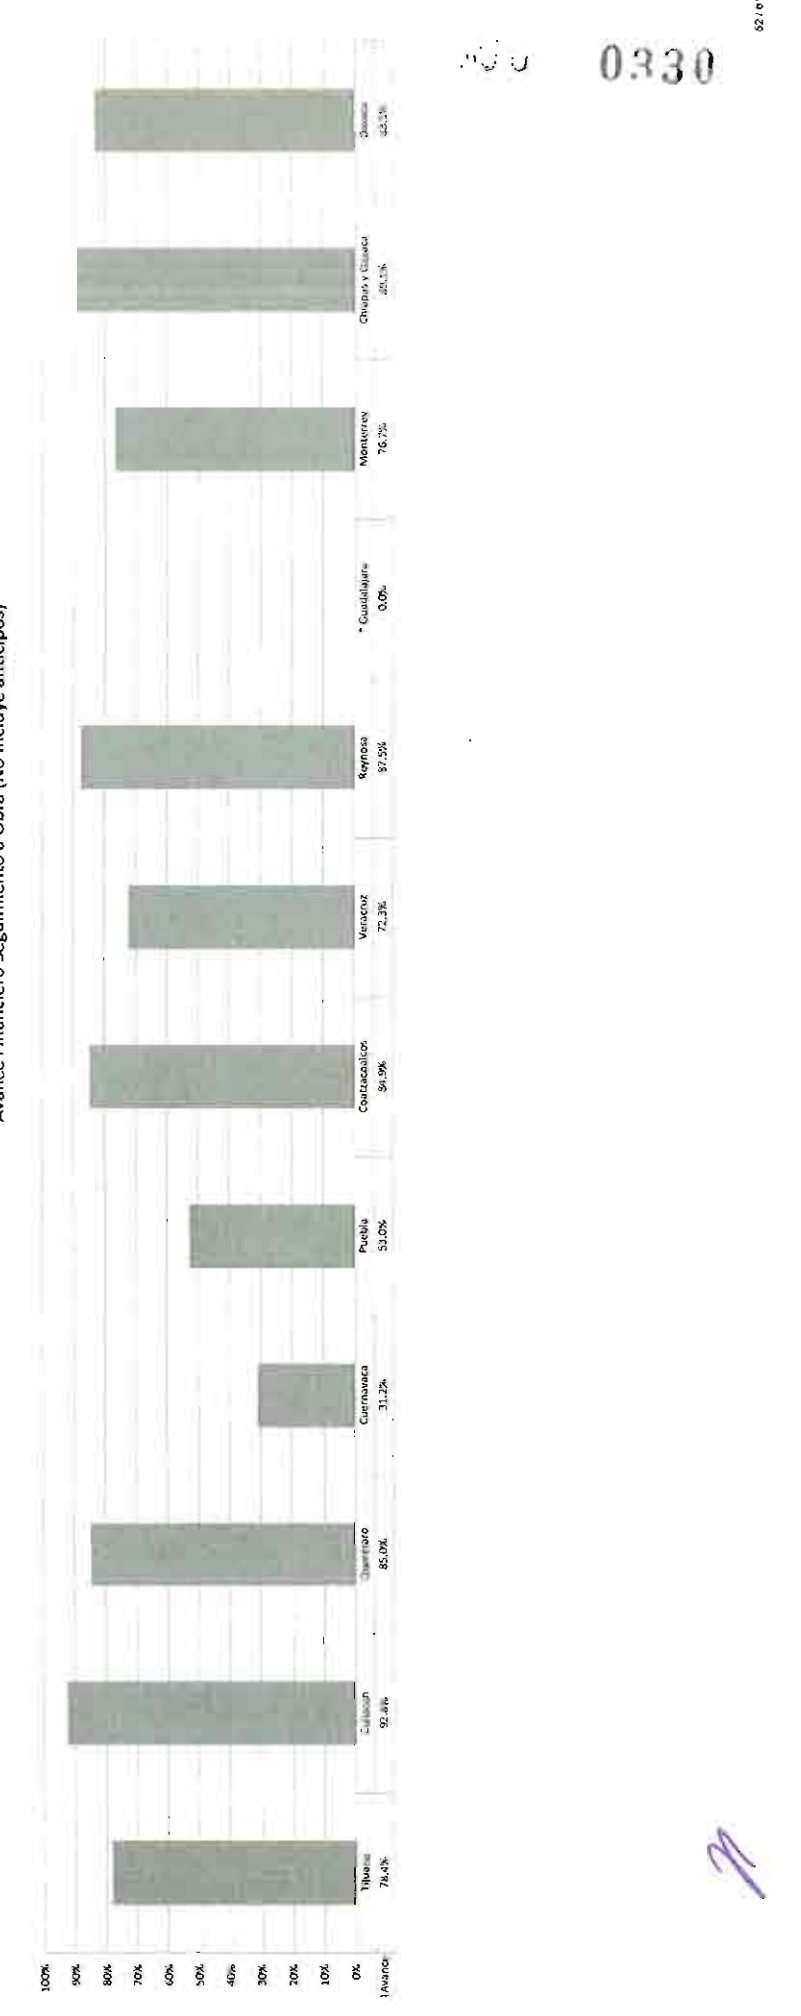



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Pared	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Reservaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia D-C+E	Ejecución Flujo de Efectivo	Avance Real Financiero (%)	Avance Real Físico (%)	
<b>TUJANA</b>																	
		Tijuana - Encomienda															
11ET-12	4500018200	(1)		INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS TIJUANA - ENSENADA Y LA FLORETA - LA RUMOROSA Y LIBRAMIENTO LOS CABOS	1,100,000.00		660,678.20	338,315.12	338,315.12					\$ 660,678.20	60.9%	60.9%	
11ET-12	4500018200	(2)	01/03/2012			333,861.81	333,861.81	270,982.95	270,982.95					\$ 333,861.81	76.4%	76.4%	
11ET-12	4500018200	(3)			1,100,000.00	2,244,539.98	1,295,041.73	609,298.07	889,365.07					\$ 2,244,539.98	81.4%	81.4%	
<b>SUBTOTAL TIJUANA</b>																	
					1,100,000.00	2,244,539.98	1,295,041.73	609,298.07	889,365.07					\$ 2,244,539.98	77.4%	77.4%	
<b>CULIACAN</b>																	
		Estación Opn - Nogales															
21ET-12	4500017814	ALVAROZ DURLEN INGENIERIA S.A. DE CV.	09/03/2012	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LA AUTOPISTA ESTACION OON - NAVOJUA, NAVOJUA - CO. OUREGON, CO. OUREGON - EMPALME, LIBRAMIENTO GUAYMAS, MEXICO - TOLUCA, TOLUCA - MEXICO - MEXICALTEPEC DE MEXICO	2,600,000.00		2,340,128.48	1,000,278.87	2,170,894.19						\$ 2,340,128.48	90.8%	90.8%
<b>SUBTOTAL CULIACAN</b>																	
					2,600,000.00	2,340,128.48	1,000,278.87	2,170,894.19						\$ 2,340,128.48	90.8%	90.8%	
<b>QUERETARO</b>																	
		Libramiento de Cuernavaca															
31ET-12	4500018250	(1)		INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS: LIBRAMIENTO NORORIENTE DE QUERETARO, CHAMAPA - LECHERIA, MEXICO - QUERETARO Y QUERETARO - IMPUNTUO	3,250,000.00		1,171,131.60	329,626.70	1,171,131.60						\$ 1,171,131.60	36.0%	36.0%
31ET-12	4500018250	(2)	03/01/2013		3,250,000.00	180,332.44	180,332.44	180,332.44						\$ 180,332.44	100.0%	100.0%	
<b>SUBTOTAL QUERETARO</b>																	
					3,250,000.00	1,351,464.04	509,959.14	509,959.14						\$ 1,351,464.04	41.9%	41.9%	
<b>MEXICO - CUERNAVACA</b>																	
		Libramiento de Cuernavaca															
41ET-12	4500018281	(1)		INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS: LIBRAMIENTO NORORIENTE DE QUERETARO, CHAMAPA - LECHERIA, MEXICO - QUERETARO Y QUERETARO - IMPUNTUO	2,600,000.00		232,818.00	232,818.00	232,818.00						\$ 232,818.00	8.9%	8.9%
41ET-12	4500018281	(2)			2,600,000.00	140,918.74	140,918.74	140,918.74						\$ 140,918.74	5.4%	5.4%	
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA</b>																	
					2,600,000.00	373,736.74	373,736.74	373,736.74						\$ 373,736.74	14.3%	14.3%	
<b>CUERNAVACA - TOLUCA</b>																	
		La Pasa - Cuautla															
41ET-12	4500018281	(3)	27/12/2012	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS: MEXICO - CUERNAVACA, LIBRAMIENTO CUERNAVACA, CUERNAVACA - TOLUCA, TOLUCA - MEXICO - MEXICALTEPEC DE MEXICO Y RANCHO VIEJO - TOLUCA	2,600,000.00		1,452,100.07	521,910.03	1,050,090.04						\$ 1,452,100.07	55.8%	55.8%
41ET-12	4500018281	(4)			2,600,000.00	294,124.79	294,124.79	294,124.79						\$ 294,124.79	11.3%	11.3%	
<b>SUBTOTAL CUERNAVACA - TOLUCA</b>																	
					2,600,000.00	1,746,224.86	816,034.82	816,034.82						\$ 1,746,224.86	67.1%	67.1%	
<b>MEXICO - PUEBLA</b>																	
		Libramiento de Cuernavaca															
41ET-12	4500018281	(5)		INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS: MEXICO - PUEBLA, PUEBLA - ACATZINGO Y ACATZINGO - CO. MENDOZA	2,000,000.00		660,000.00	767,637.54	437,614.80						\$ 660,000.00	33.0%	33.0%
41ET-12	4500018281	(6)	10/08/2012		2,000,000.00	322,843.04	322,843.04	322,843.04						\$ 322,843.04	16.1%	16.1%	
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>																	
					2,000,000.00	982,843.08	1,090,480.58	1,090,480.58						\$ 982,843.08	49.1%	49.1%	
<b>MEXICO - PUEBLA</b>																	
		Libramiento de Cuernavaca															
41ET-12	4500018281	(7)		INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS: MEXICO - PUEBLA, PUEBLA - ACATZINGO Y ACATZINGO - CO. MENDOZA	2,000,000.00		1,277,657.28	1,277,657.28	1,277,657.28						\$ 1,277,657.28	63.9%	63.9%
41ET-12	4500018281	(8)			2,000,000.00	506,335.65	506,335.65	506,335.65						\$ 506,335.65	25.3%	25.3%	
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>																	
					2,000,000.00	1,783,992.93	1,783,992.93	1,783,992.93						\$ 1,783,992.93	89.2%	89.2%	



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Periodo	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejercicio a Flajo de Efectivo	Avance Bilingüe (%)	Avance Bilingüe (%)
6/E1-12	4500017880 (1)					\$ 132,200.00	\$ 132,200.00	\$ 110,165.20	\$ 110,165.20		\$	\$	\$	\$ 110,165.20	80.3%	80.3%
<p><b>Acayucan - Comacruán</b></p> <p>6/E1-12 4500017880 (2)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS CHAMPOTÓN - CAMPECHE, ACAYUCAN - CERCENAS, COATEZACQUE, CD ISLA - ACAYUCAN Y SALINA CRUZ - LA VENTOSA</p>																
<p><b>El Estero de Cardenas - Ahucan</b></p> <p>6/E1-12 4500017880 (3)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS CHAMPOTÓN - CAMPECHE, ACAYUCAN - CERCENAS, COATEZACQUE, CD ISLA - ACAYUCAN Y SALINA CRUZ - LA VENTOSA</p>																
<p><b>Col. Isla - Acayucan</b></p> <p>6/E1-12 4500017880 (4)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS CHAMPOTÓN - CAMPECHE, ACAYUCAN - CERCENAS, COATEZACQUE, CD ISLA - ACAYUCAN Y SALINA CRUZ - LA VENTOSA</p>																
<p><b>Salina Cruz - La Ventosa</b></p> <p>6/E1-12 4500017880 (5)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS CHAMPOTÓN - CAMPECHE, ACAYUCAN - CERCENAS, COATEZACQUE, CD ISLA - ACAYUCAN Y SALINA CRUZ - LA VENTOSA</p>																
<p><b>VERACRUZ</b></p> <p><b>Licenciamiento Puentes de Tiempo</b></p> <p>7/E1-12 4500018027 (1)</p>																
<p>Col. Mendocza - Córdoba</p> <p>7/E1-12 4500018027 (2)</p>																
<p>Córdoba - Veracruz</p> <p>7/E1-12 4500018027 (3)</p>																
<p>La Tinaja - Col. Isla</p> <p>7/E1-12 4500018027 (4)</p>																
<p>Guilierrez Zimera - Tihualtil</p> <p>7/E1-12 4500018027 (5)</p>																
<p><b>GUADALAJARA</b></p> <p><b>Nueva Italia - Lazaro Cardenas</b></p> <p>6/E1-12 4500018027 (1)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p><b>Morelia - Uruapan</b></p> <p>6/E1-12 4500018027 (1)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p><b>Morelia - Nueva Italia</b></p> <p>6/E1-12 4500018027 (2)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p><b>REYNOSA</b></p> <p>6/E1-12 4500018027 (1)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p><b>MONTENREY</b></p> <p>Montenrey - Nuevo Laredo</p> <p>6/E1-12 4500018027 (2)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p>Torreón - Saltillo</p> <p>6/E1-12 4500018027 (3)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p>La Carbonera - Ojo Caliente</p> <p>6/E1-12 4500018027 (4)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p>Comarzal Palacio - Corralitos</p> <p>6/E1-12 4500018027 (5)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p>Caderenas - Reynosa</p> <p>6/E1-12 4500018027 (6)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p>Puerto Mexico - La Carbonera</p> <p>6/E1-12 4500018027 (7)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p><b>Durango - Mezquilitan</b></p> <p>6/E1-12 4500018027 (1)</p>																
<p>INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN LAS AUTOPISTAS NUEVA ITALIA - LAZARO CARDENAS, ATIZAPAN Y JUJUMAN - ALBUQUERQUE</p>																
<p><b>DAMAGA Y CHAPAS</b></p>																

Handwritten signature or mark.





**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**

**PROGRAMA DE INSPECCIONES VISUALES DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**


No. Partida	Certificado No.	Empresa	Periodo del Contrato		Covenato	Monto Original Autorizado	Monto Ajustado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite O	Retenciones + Devoluciones	Saldo Cancelado E	Diferencia D-C-D-E	Ejecutado a Flujos de Efectivo	Iniciado Inicialmente (%)	Avance Ratio (%)
			Inicio	Fin													
181E1-12	4300079MB (1)	SERVEN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	2004/2012	08/12/2012	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN EL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES OCCOQUICUAUTLA, E INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN EL CAMINO DIRECTO CUANDOPALAN - OSAACA.	1,700,000.00	787,682.24	737,682.24	675,034.95	675,034.95				\$	075,034.95	44.1%	N/A
181E1-12	4300079MB (2)	SERVEN INGENIERIA, S.A. DE C.V.	2004/2012	08/12/2012	INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN EL CAMINO DIRECTO LAS CHOAPAS - RAUDALES OCCOQUICUAUTLA, E INSPECCION VISUAL DE ESTRUCTURAS TRADICIONALES UBICADAS EN EL CAMINO DIRECTO CUANDOPALAN - OSAACA.	1,700,000.00	716,799.20	716,799.20	508,220.85	698,220.85				\$	508,220.85	29.9%	N/A
<b>SUBTOTAL OMAKA Y BRIBZAN</b>						\$ 3,200,000.00	\$ 1,474,748.88	\$ 1,474,748.88	\$ 1,273,244.88	\$ 1,273,244.88				\$	\$ 1,273,244.88	39.8%	0.0%
<b>TOTAL</b>						\$ 22,000,000.00	\$ 21,245,932.88	\$ 21,245,932.88	\$ 18,560,488.81	\$ 18,560,488.81				\$	\$ 18,560,488.81	84.4%	0.0%

000 0333

Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra						Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance (financiero) (%)	Avance (físico) (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B + C + D + E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Relaciones - Devoluciones			Ajustes de Costos Pagados
Tijuana	\$ 2,560,000.00	\$ 648,847.90	\$ 648,847.90	\$ 648,847.90	\$ 519,310.52			\$ 129,537.38	\$ 519,310.52			80.0%	N/A
Culiacán	\$ 2,500,000.00	\$ 991,441.26	\$ 991,441.26	\$ 782,459.10	\$ 782,459.10				\$ 782,459.10			78.9%	N/A
Querétaro	\$ 2,500,000.00	\$ 2,003,571.99	\$ 2,003,571.99	\$ 1,657,503.75	\$ 1,352,539.39			\$ 304,964.36	\$ 1,352,539.39			67.5%	N/A
Cuernavaca	\$ 4,000,000.00	\$ 3,594,354.60	\$ 3,594,354.60	\$ 1,919,886.12	\$ 1,581,978.56			\$ 337,907.56	\$ 1,581,978.56	\$ 559.68		44.0%	N/A
Puebla												0.0%	N/A
Coahuila de Zaragoza												0.0%	N/A
Veracruz	\$ 3,500,000.00	\$ 643,439.99	\$ 643,439.99	\$ 454,076.88	\$ 368,152.17			\$ 85,924.71	\$ 368,152.17			57.2%	N/A
Roynosa	\$ 2,250,000.00	\$ 1,530,549.96	\$ 1,530,549.96	\$ 1,371,495.72	\$ 1,411,379.61			\$ -39,883.89	\$ 1,411,379.61			92.2%	N/A
Guadalupe												0.0%	N/A
Monterrey		\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 256,923.56	\$ 478,075.96			\$ -221,152.40	\$ 478,075.96			100.0%	N/A
Chiapas	\$ 877,294.70	\$ 877,294.70	\$ 877,294.70	\$ 641,845.18	\$ 502,314.42			\$ 139,530.76	\$ 502,314.42			57.3%	N/A
Oaxaca	\$ 2,084,465.09	\$ 2,084,465.09	\$ 2,084,465.09	\$ 1,476,165.45	\$ 1,828,334.77			\$ -152,169.32	\$ 1,828,334.77			78.1%	N/A
Oficinas Centrales												0.0%	N/A
<b>TOTAL</b>	\$ 15,000,000.00	\$ 12,852,041.45	\$ 12,852,041.45	\$ 9,209,203.66	\$ 6,624,544.50			\$ 584,659.16	\$ 8,824,544.50	\$ 559.68		67.1%	N/A

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

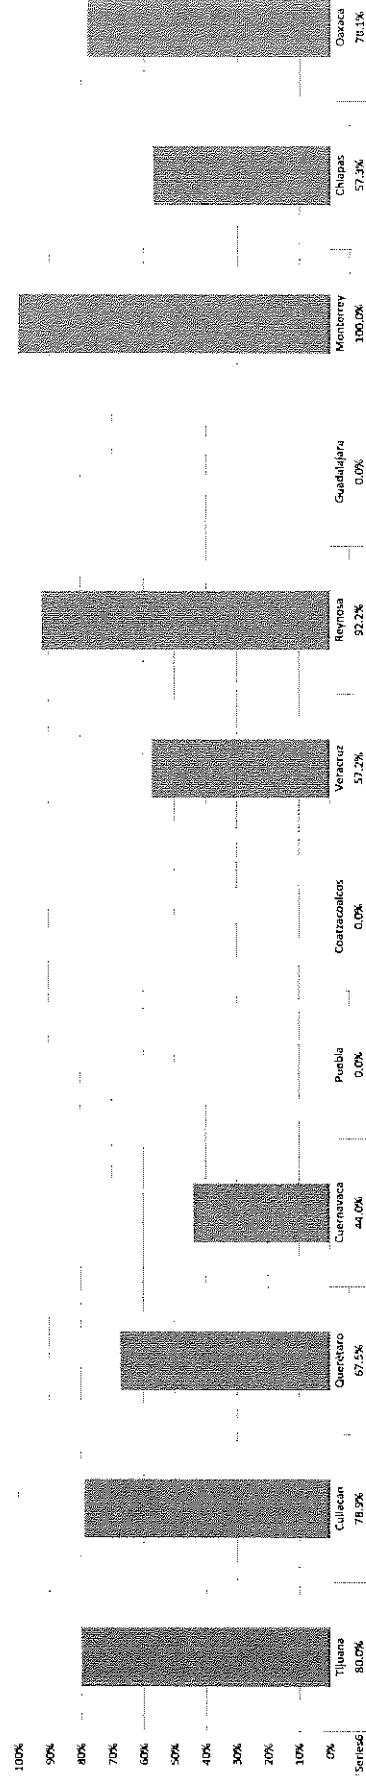

0334





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
 PROGRAMA DE EMERGENCIAS TECNICAS 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE CONSULTA: 16 de Octubre de 2012

Delegacion	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance Incremento (%)	Avance Absoluto (%)											
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado G	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Retenciones - Devoluciones			Avances de Costos Pagados										
Tijuana												0.0%											
Culiacán												0.0%											
Querétaro												0.0%											
Guerrero												0.0%											
Puebla												0.0%											
Coahuila												0.0%											
Veracruz												0.0%											
Reynosa												0.0%											
Guadalupe												0.0%											
Morelia												0.0%											
Chihuahua												0.0%											
Oaxaca												0.0%											
<b>TOTAL</b>																							
	\$	5,866,824.18	\$	5,866,824.18	\$	5,866,824.18	\$	3,016,409.09	\$	1,419,118.65	\$	1,431,296.44	\$	3,016,409.09	\$	61,646.72	\$	61,646.72	\$	3,016,409.09	\$	51.4%	85.24%

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE EMERGENCIAS TÉCNICAS 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Fecha: 30 de Septiembre 2012

No. Partida	Centro de No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto En Trámite	Retenciones - Devoluciones	Saldo Disponible	Diferencia B-C-D-E	Ejecución a Mayo de Efectivo	Avance Ejecución (%)	Avance Físico (%)
			Inicio	Fin													
1412	45001003	GRUPO CONSTRUCTORA JUDY, S.A. DE C.V.	1/07/2012	13/09/2012	RECONSTRUCCION DEL TERMINAL UNICADO DE LA CARRETERA DEL C.D. CUICHOPULUM - OAXACA	\$ -	\$ 3,856,824.18	\$ 3,856,824.18	\$ 3,856,824.18	\$ 3,016,400.00	\$ 1,410,118.00	\$ 61,466.72	\$ -	\$ 1,431,256.44	\$ 1,016,400.00	31.4%	83.24%
					SUBTOTAL OAXACA	\$ -	\$ 3,856,824.18	\$ 3,856,824.18	\$ 3,856,824.18	\$ 3,016,400.00	\$ 1,410,118.00	\$ 61,466.72	\$ -	\$ 1,431,256.44	\$ 1,016,400.00	31.4%	83.24%
					TOTAL	\$ -	\$ 3,856,824.18	\$ 3,856,824.18	\$ 3,856,824.18	\$ 3,016,400.00	\$ 1,410,118.00	\$ 61,466.72	\$ -	\$ 1,431,256.44	\$ 1,016,400.00	31.4%	83.24%

Cuicropulm - Oaxaca

00

0337

2






**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DE LAS EMERGENCIAS TÉCNICAS 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra					Seguimiento al Avance Presupuestal					Avance financiero (%)	
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Saldo Cancelado E	Diferencia B+C-D-E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados		
Tijuana												0.0%
Culiacán												0.0%
Querétaro												0.0%
Cuernavaca												0.0%
Puebla												0.0%
Coahuila												0.0%
Veracruz												0.0%
Reynosa												0.0%
Guadalajara												0.0%
Monterrey												0.0%
Chihuahua												0.0%
Oaxaca												0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 428,305.67</b>	<b>\$ 428,305.67</b>	<b>\$ 428,305.67</b>	<b>\$ 428,305.67</b>	<b>\$ 295,464.88</b>	<b>\$ 49,255.33</b>	<b>\$ 295,464.88</b>	<b>\$ 295,464.88</b>				<b>69.0%</b>

**Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)**

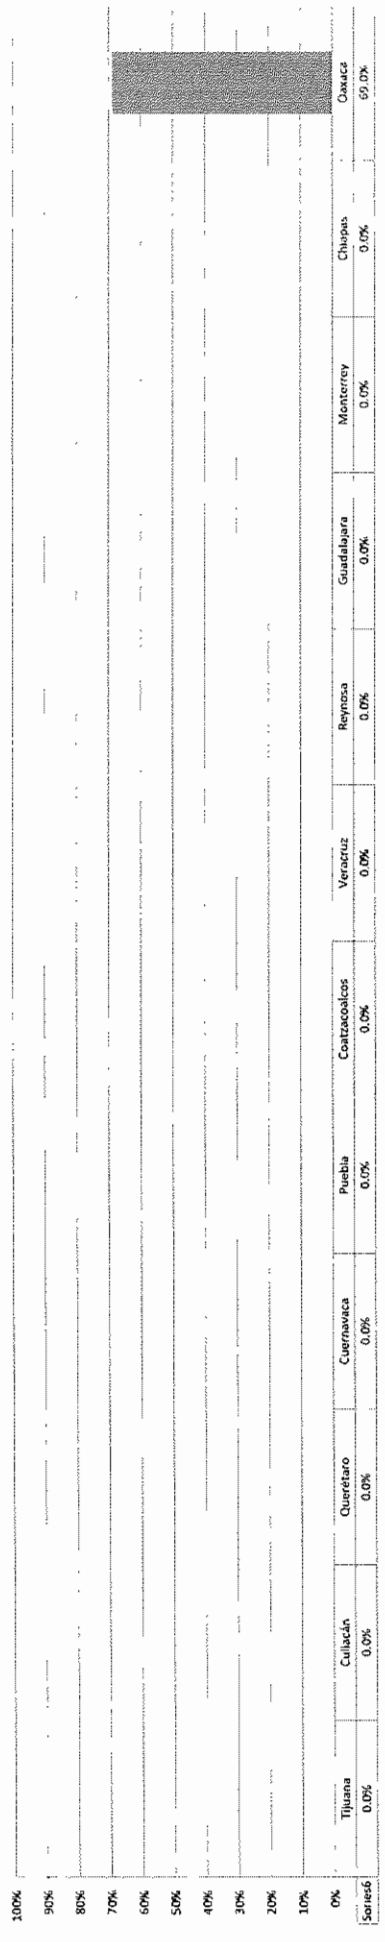

000 0338



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
PROGRAMA DE SUPERVISION DE LAS EMERGENCIAS TECNICAS 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nu. Perfil	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Ejecutado Acumulado C	Monto En Trámite D	Reservaciones Derivadas E	Saldo Cancelado F	Diferencia UIC-DUE	Beneficio a Fijar del Contrato	Avance financiero (%)
			Inicio	Fin												
11CT12	406011833	GDC INGENIERIA S.A. DE C.V.	18/07/2012	7/08/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA RECONSTRUCCION DEL TUNEL EN LA CARRETERA EN EL KM. 188-190 DEL CD. CHAMPOLAN, OAXACA	\$ 428,206.07	\$ 428,206.07	\$ 428,206.07	\$ 428,206.07	\$ 205,664.08	\$ 131,000.46		\$ 40,200.33	\$ 200,000.00	40.7%	
<b>TOTAL</b>																
						\$ 428,206.07	\$ 428,206.07	\$ 428,206.07	\$ 428,206.07	\$ 205,664.08	\$ 131,000.46		\$ 40,200.33	\$ 200,000.00	40.7%	


*[Handwritten signature]*

fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				Avance Ratio de las obras (%)
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado U	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencial B-C-D-E	Ejercido a Flujos de Efectivo	Reservaciones Devoluciones	Avances de Costos Pagados	Avance financiero (%)			
Tijuana	\$ 326,666,981.07	\$ 348,430,976.36	\$ 347,877,746.43	\$ 213,509,696.73	\$ 104,461,526.87	\$ 19,420,876.48	\$ 12,616.21	\$ 89,614,675.17	\$ 104,461,526.87	\$ 4,874,179.56	\$ -	\$ 30.0%	38.6%		
Culiacán	\$ 32,783,396.23	\$ 47,788,062.03	\$ 47,788,082.03	\$ 35,850,823.33	\$ 25,971,888.44			\$ 9,858,934.89	\$ 25,018,896.00	\$ 359,556.27	\$ 47,007.56	\$ 54.3%	65.1%		
Querétaro	\$ 388,060,943.34	\$ 542,773,060.42	\$ 542,773,060.42	\$ 331,621,783.59	\$ 308,494,212.42	\$ 21,743,707.08	\$ 0.30	\$ 1,363,863.79	\$ 308,794,926.91	\$ 1,248,043.86	\$ 300,714.49	\$ 56.8%	64.1%		
Cuernavaca	\$ 545,733,592.13	\$ 551,901,572.00	\$ 434,601,572.00	\$ 342,435,878.49	\$ 291,303,687.22	\$ 17,039,485.24	\$ 9,325.16	\$ 34,053,480.87	\$ 291,359,952.04	\$ 3,723,816.29	\$ 26,364.82	\$ 87.0%	77.9%		
Puebla	\$ 418,866,584.91	\$ 2,470,423,865.85	\$ 535,265,865.85	\$ 150,024,280.99	\$ 77,228,465.68	\$ 9,893,253.16		\$ 82,902,562.15	\$ 77,228,465.68	\$ 894,559.24	\$ -	\$ 14.4%	18.7%		
Coahuila	\$ 460,197,877.36	\$ 441,388,734.85	\$ 441,388,734.85	\$ 300,567,045.24	\$ 217,871,752.69	\$ 23,108,138.86	\$ 118,682.84	\$ 59,488,460.85	\$ 218,349,077.64	\$ 5,838,404.89	\$ 477,324.05	\$ 49.4%	57.4%		
Veracruz	\$ 355,340,768.21	\$ 365,839,848.87	\$ 363,477,348.67	\$ 243,130,025.47	\$ 223,308,370.41	\$ 13,514,592.49	\$ 156,370.41	\$ 6,150,692.16	\$ 223,996,369.27	\$ 2,164,484.10	\$ 687,908.06	\$ 81.5%	70.8%		
Reynosa	\$ 127,168,472.09	\$ 138,975,797.55	\$ 138,872,436.15	\$ 79,332,593.97	\$ 76,910,376.44		\$ 105,305.66	\$ 2,316,911.87	\$ 76,910,376.44	\$ 51,088.06	\$ -	\$ 55.5%	55.1%		
Guadalajara	\$ 93,041,866.79											\$ 0.0%	0.0%		
Monterrey	\$ 504,704,811.42	\$ 475,417,594.77	\$ 475,158,956.17	\$ 386,636,411.37	\$ 329,392,609.28	\$ 28,312,085.94	\$ 36,313.29	\$ 28,895,402.86	\$ 329,392,609.28	\$ 3,754,471.57	\$ -	\$ 69.3%	78.5%		
Chiapas	\$ 178,076,888.90	\$ 196,587,280.89	\$ 198,587,280.89	\$ 163,186,159.54	\$ 127,854,010.48	\$ 3,450,467.94	\$ 159,809.82	\$ 31,723,871.30	\$ 127,854,010.48	\$ 1,574,209.88	\$ -	\$ 64.5%	77.3%		
Oaxaca	\$ 261,337,797.55	\$ 262,017,152.87	\$ 258,675,581.54	\$ 190,136,435.56	\$ 156,742,321.74	\$ 11,465,190.37		\$ 19,928,923.45	\$ 158,750,596.51	\$ 836,796.74	\$ 8,274.77	\$ 61.4%	66.8%		
Oficinas Centrales	\$ 315,000,000.00	\$ 25,339,102.09										\$ 0.0%	0.0%		
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,007,000,000.00</b>	<b>\$ 5,868,883,068.15</b>	<b>\$ 3,784,466,665.00</b>	<b>\$ 2,436,433,134.28</b>	<b>\$ 1,941,569,121.67</b>	<b>\$ 147,947,799.56</b>	<b>\$ 598,433.69</b>	<b>\$ 346,317,779.36</b>	<b>\$ 1,943,116,807.12</b>	<b>\$ 25,259,610.26</b>	<b>\$ 1,547,685.45</b>	<b>\$ 51.3%</b>	<b>59.2%</b>		

Nota: Debido a que a partir de este ejercicio la DGST será la encargada de los servicios correspondientes a: "Estudios y Proyectos", se reduce treinta millones de pesos del monto original autorizado (Programa de Mantenimiento Mayor); así como también, se informa que la suma del presente no incluye los importos autorizados para Emergencias Técnicas (200 mdp) y Ajustes de Costos (80 mdp). El monto considerado en el rubro de Oficinas Centrales, disminuirá en los reportes sucesivos, ya que el mismo será incorporado a la unidad regional que corresponda (Delegaciones Regionales y/o Gerencias de Tramo), de acuerdo a su contratación.

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

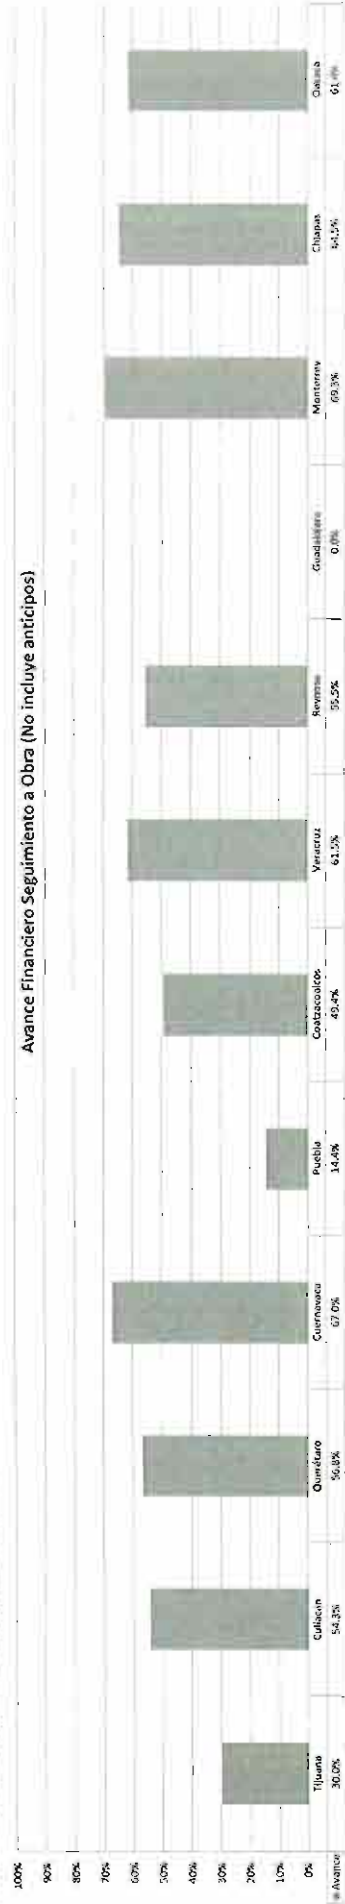

Nota: El ejercicio a Flujos de Efectivo correspondo a la suma (+) del Anticipo Otorgado más (+) Estimaciones mas (+) Ajustes de Costos Pagados menos (-) Amortización de Anticipos.

77



Departamento / Tramo	Montos Mayor Supervisión	Montos Menor Supervisión	Supervisión	Montos Mayor Puentes	Supervisión	Montos Menor Puentes	Supervisión	Modernización	Supervisión	Inspecciones (Tradicionales)	Inspecciones (Especial)	Emprendidas Terminadas	Supervisión	Total
<b>GUADALAJARA</b>														
Guadalajara - Tepic														
Pitzcuaro - Uriapan														
Uriapan - Nuevo Itala														
Nueva Itala - Lakaro Cardenas														
Varosa Tenorio														
<b>Total Guadalajara</b>														
<b>MONTERRREY</b>														
Monterrey - Nuevo Laredo	\$ 131,402,144.29	\$ 2,362,679.65	\$ 8,706,256.60	\$ 859,883.49	\$ 5,261,651.48	\$ 2,901,336.81	\$ 229,853.10	\$ 444,330.25	\$ 444,330.25	\$ 111,817.46	\$ 276,075.96	\$ 3,016,400.00	\$ 151,007,037.04	\$ 151,007,037.04
Torreón - Saltillo	\$ 361,147,876.88	\$ 1,442,570.22	\$ 8,602,476.70	\$ 697,269.35	\$ 2,901,336.81	\$ 816,749.28	\$ 111,817.46	\$ 229,853.10	\$ 229,853.10	\$ 111,817.46	\$ 276,075.96	\$ 3,016,400.00	\$ 50,166,101.26	\$ 50,166,101.26
Puerto México - La Carbonera	\$ 3,441,912.39	\$ 310,266.42	\$ 5,102,916.26	\$ 57,272.50	\$ 816,749.28	\$ 1,461,640.10	\$ 108,000.04	\$ 108,000.04	\$ 108,000.04	\$ 391,362.20	\$ 6,763,072.43	\$ 6,763,072.43	\$ 8,872,969.60	\$ 8,872,969.60
La Carbonera - Ojo Caliente	\$ 697,269.04	\$ 379,940.46	\$ 5,394,142.10	\$ 785,472.81	\$ 6,763,072.43	\$ 6,403,033.20	\$ 1,223,300.70	\$ 3,061,233.23	\$ 3,061,233.23	\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 3,016,400.00	\$ 14,039,839.19	\$ 14,039,839.19
Cadereyta - Raynosa	\$ 7,652,073.75	\$ 134,709.34	\$ 9,410,045.09	\$ 647,767.70	\$ 2,132,017.78	\$ 2,132,017.78	\$ 1,223,300.70	\$ 3,061,233.23	\$ 3,061,233.23	\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 3,016,400.00	\$ 24,967,707.24	\$ 24,967,707.24
Comaz Palisco - Corralitos	\$ 61,596,051.05	\$ 1,510,630.30	\$ 6,627,603.04	\$ 660,955.27	\$ 2,132,017.78	\$ 2,132,017.78	\$ 1,223,300.70	\$ 3,061,233.23	\$ 3,061,233.23	\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 3,016,400.00	\$ 76,943,498.79	\$ 76,943,498.79
Durango - Mazatlán	\$ 244,096,437.00	\$ 6,100,722.46	\$ 44,292,399.04	\$ 5,069,200.33	\$ 26,442,406.14	\$ 26,442,406.14	\$ 3,061,233.23	\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 478,075.96	\$ 3,016,400.00	\$ 393,932,669.26	\$ 393,932,669.26
<b>Total Monterrey</b>	\$ 69,106,072.08	\$ 2,024,428.13	\$ 14,697,018.27	\$ 814,403.55	\$ 14,000,754.79	\$ 17,013,023.28	\$ 320,640.35	\$ 676,024.65	\$ 676,024.65	\$ 563,314.42	\$ 563,314.42	\$ 3,016,400.00	\$ 127,854,019.48	\$ 127,854,019.48
<b>CHIAPAS</b>														
Las Chispas - Baudabae - Ocozacoaco	\$ 89,186,972.05	\$ 2,834,429.13	\$ 14,497,018.27	\$ 613,490.53	\$ 17,013,023.28	\$ 17,013,023.28	\$ 320,640.35	\$ 676,024.65	\$ 676,024.65	\$ 563,314.42	\$ 563,314.42	\$ 3,016,400.00	\$ 190,747,371.74	\$ 190,747,371.74
<b>Total Chiapas</b>	\$ 89,186,972.05	\$ 2,834,429.13	\$ 14,497,018.27	\$ 613,490.53	\$ 17,013,023.28	\$ 17,013,023.28	\$ 320,640.35	\$ 676,024.65	\$ 676,024.65	\$ 563,314.42	\$ 563,314.42	\$ 3,016,400.00	\$ 190,747,371.74	\$ 190,747,371.74
<b>DUARTE</b>														
Cd. Cuauhtémoc - Oribasa	\$ 12,341,477.00	\$ 2,862,900.55	\$ 17,424,730.90	\$ 2,044,062.44	\$ 6,627,050.00	\$ 6,627,050.00	\$ 2,044,062.44	\$ 2,044,062.44	\$ 2,044,062.44	\$ 594,270.93	\$ 1,629,334.77	\$ 3,016,400.00	\$ 190,747,371.74	\$ 190,747,371.74
<b>Total Duarte</b>	\$ 12,341,477.00	\$ 2,862,900.55	\$ 17,424,730.90	\$ 2,044,062.44	\$ 6,627,050.00	\$ 6,627,050.00	\$ 2,044,062.44	\$ 2,044,062.44	\$ 2,044,062.44	\$ 594,270.93	\$ 1,629,334.77	\$ 3,016,400.00	\$ 190,747,371.74	\$ 190,747,371.74
<b>OFICINAS CENTRALES</b>														
Carretera De Colliac Tlapaca														
<b>Total Oficinas Centrales</b>														
<b>Total General</b>	\$ 1,286,100,389.71	\$ 40,385,009.60	\$ 292,600,210.77	\$ 24,760,766.20	\$ 130,794,074.59	\$ 7,076,307.60	\$ 117,400,091.33	\$ 6,015,697.13	\$ 465,296.60	\$ 10,930,331.69	\$ 9,024,644.33	\$ 3,076,400.00	\$ 1,647,399,121.07	\$ 1,647,399,121.07


000 0342



Fecha de corte: 15 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal				
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Conculato A	Programado Acumulado G	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Conculato E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Rotaciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)		
Tijuana	\$ 245,000,000.00	\$ 270,208,454.11	\$ 270,208,454.11	\$ 186,954,005.30	\$ 63,588,001.04	\$ 17,600,788.00	\$ 12,616.21	\$ 85,493,500.05	\$ 63,588,001.04	-\$	\$ 4,086,012.61	22.8%	33.3%		
Culiacán	\$	\$ 19,003,958.55	\$ 19,003,958.55	\$ 15,762,165.93	\$ 5,927,419.41	\$	\$	\$ 9,634,740.52	\$ 5,927,419.41	-\$	\$ 255,112.34	31.2%	60.2%		
Querétaro	\$ 245,800,000.00	\$ 415,022,389.89	\$ 415,022,389.89	\$ 253,565,992.60	\$ 225,472,037.11	\$ 19,241,272.85	\$ 0.30	\$ 8,852,652.34	\$ 225,633,261.52	\$	\$ 161,224.11	54.3%	63.2%		
Guerrero	\$ 201,800,000.00	\$ 312,014,408.70	\$ 198,014,408.70	\$ 172,121,045.23	\$ 158,869,518.09	\$ 3,844,133.84	\$ 9,325.10	\$ 9,598,070.14	\$ 158,895,880.91	-\$	\$ 20,364.82	81.0%	84.0%		
Puebla	\$ 338,300,000.00	\$ 2,342,328,328.84	\$ 412,925,328.84	\$ 89,398,931.90	\$ 40,372,337.41	\$	\$	\$ 59,028,594.49	\$ 40,372,337.41	-\$	\$ 540,045.32	9.9%	13.5%		
Coahuila	\$ 283,400,000.00	\$ 293,483,485.48	\$ 293,483,485.48	\$ 190,830,268.99	\$ 118,980,988.45	\$ 9,631,890.61	\$	\$ 92,098,409.93	\$ 110,375,776.43	-\$	\$ 475,697.98	40.5%	48.0%		
Veracruz	\$ 228,800,000.00	\$ 262,301,570.28	\$ 262,301,570.28	\$ 176,171,758.72	\$ 154,480,274.65	\$ 8,417,281.12	\$	\$ 13,274,200.95	\$ 154,851,413.35	-\$	\$ 371,138.70	58.9%	68.7%		
Reynosa	\$ 100,000,000.00	\$ 112,458,348.06	\$ 112,458,348.06	\$ 81,182,285.54	\$ 60,342,766.47	\$	\$	\$ 839,519.07	\$ 00,242,706.47	\$	\$	53.7%	53.7%		
Guadalupe	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.0%	0.0%		
Monterrey	\$ 350,100,000.00	\$ 357,581,915.44	\$ 357,581,915.44	\$ 280,528,481.62	\$ 244,808,437.00	\$ 22,674,143.84	\$ 34,070.26	\$ 28,922,840.52	\$ 244,898,437.00	-\$	\$ 3,502,577.91	68.5%	76.5%		
Chihuahua	\$ 98,800,000.00	\$ 130,354,932.26	\$ 130,354,932.26	\$ 110,511,632.07	\$ 80,108,072.08	\$	\$	\$ 21,243,750.17	\$ 89,108,072.08	-\$	\$ 582,824.26	68.0%	83.2%		
Oaxaca	\$ 200,000,000.00	\$ 204,382,778.89	\$ 204,382,778.89	\$ 151,147,142.73	\$ 124,341,477.00	\$ 8,594,355.39	\$	\$ 18,211,310.34	\$ 124,341,477.00	-\$	\$ 708,690.10	60.8%	86.1%		
Olimpas Centrales	\$ 300,000,000.00	\$ 20,000,000.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	0.0%	0.0%		
<b>TOTAL</b>	\$ 2,640,000,000.00	\$ 4,748,741,580.80	\$ 2,682,741,580.80	\$ 1,694,175,588.63	\$ 1,286,100,396.71	\$ 90,463,865.65	\$ 215,821.75	\$ 317,395,594.52	\$ 1,287,134,842.62	-\$	\$ 19,726,567.77	47.0%	55.5%		

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

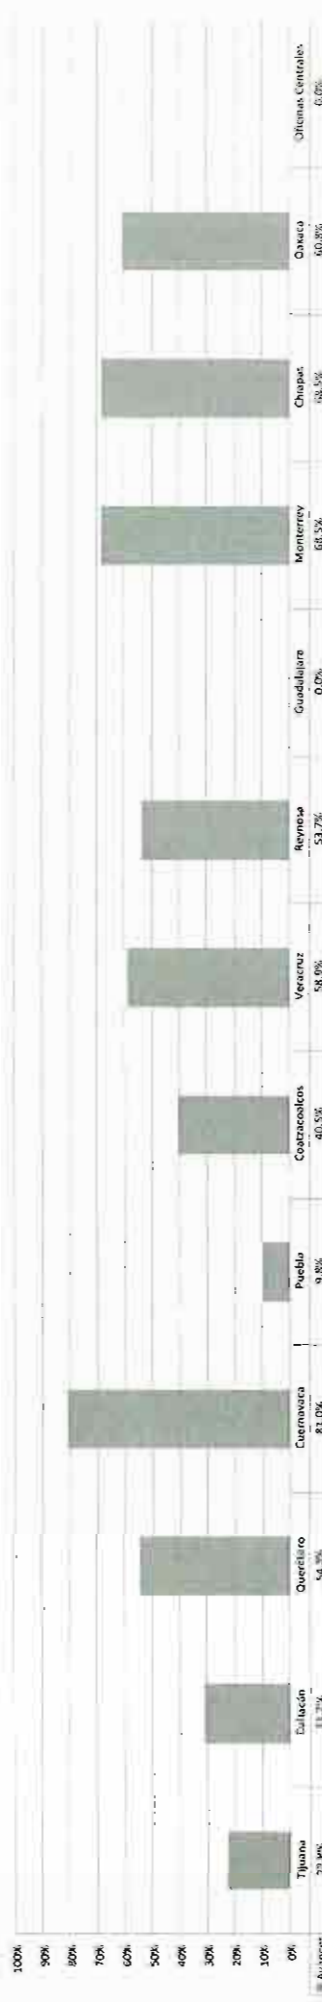

00 0343





**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

No. Fomento	Cuentas No. de Proyecto	Empresa	Periodo del Contrato	Fecha	Descripción	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado Modificado	Monto Comprometido A	Monto Traspasado D	Ejercido Autorizado C	Monto Ejecutado D	Subvenciones Disponibles	Saldo Ejercido E	Diferencia D-E	Eliminación de Ejercido	Avance Reportado (%)	Avance Realizado (%)
-------------	-------------------------	---------	----------------------	-------	-------------	---------------------------	-----------------------------	----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------	--------------------------	------------------	----------------	-------------------------	----------------------	----------------------

38F-12	400017005 500003000	PROYECTOS DE INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.	10/06/2012	10/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y INDUCTIVO AMBOS TIPOS EN LOS TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	5,000,000.00	9,004,807.74	0,004,807.74	0,004,807.74	0,200,701.66	32,407.26	-	1,304,125.95	1,304,125.95	5,240,701.66	72.2%	100.0%
48F-12	400018001	INGENIERIA PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA SERVICION PARA LA CONSTRUCCION S DE R.L. CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20/04/2012	20/04/2012	TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LAS CAJAS DE LOS ENTORNOS DEL KM 0+000 CUARTILAN, KM 21+000 AIZAPALA, KM 21+000 AIZAPALA, KM 20+300 OPIHESEN, Y 27+100 CHAMPA, DE LA AUTOPISTA CHAMPA - GUERRERO Y COLOCACION DE BARRERA DE ACERO MALLA ANTISUBSERRANTE Y MALLA GRADADA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	14,000,000.00	10,451,825.91	15,481,503.81	16,052,797.62	16,052,797.62	25,002.04	-	918,008.87	918,008.87	11,062,201.92	81.1%	91.1%
38C-12	400018015 (1)	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	01/06/2012	20/12/2012	REPARACION Y COLOCACION DE BARRERA DE ACERO MALLA ANTISUBSERRANTE Y MALLA GRADADA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	1,016,622.00	-	-	1,000,370.00	1,000,370.00	1,016,622.00	36.3%	71.0%
48C-12	400018017 (2)	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	30/04/2012	20/06/2012	REPARACION Y COLOCACION DE BARRERA DE ACERO MALLA ANTISUBSERRANTE Y MALLA GRADADA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00	-	-	100,300.00	100,300.00	100,300.00	100.0%	100.0%
68C-12	400017000 (3)	TECNOLOGOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10/06/2012	10/06/2012	CONSTRUCCION DE BANDAS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	-	-	24,300.00	24,300.00	24,300.00	100.0%	100.0%
88C-12	400018017 (4)	UNIVERSO CONECTOR EL JALISCO S.A. DE C.V.	17/06/2012	13/02/2013	CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DE ALTA FRICCION EN ZONAS IDENTIFICADAS DE ALTA SINISTRALIDAD EN LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.0%	0.0%

Lluvia de Ingresos de Cuantías																	
88F-12	400018005	RELY S.A. DE C.V.	01/06/2012	30/06/2012	REPOSICION DEL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	26,000,000.00	21,671,326.60	21,671,326.60	17,603,240.27	17,307,196.16	10,704.20	-	296,283.02	296,283.02	17,307,600.15	79.9%	79.9%
19C-12	400017017 (5)	KONAS METALICAS S.A	10/06/2012	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRES CRISTALES Y TERMINALES DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	-	-	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	100.0%	100.0%
88F-12	400017002 500003019	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	01/06/2012	31/06/2012	REPARACION Y COLOCACION DE BARRERA DE ACERO MALLA ANTISUBSERRANTE Y MALLA GRADADA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	16,000,000.00	20,613,006.42	20,613,006.42	20,613,006.42	20,300,000.00	278,539.62	-	6.33	20,300,000.00	20,300,000.00	96.9%	100.0%

Módulo - Cuantías																	
78F-12	400017010 500003005	COCONAL S.A. DE C.V.	01/06/2012	30/06/2012	REPARACION DEL PAVIMENTO HERBALCO EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	160,000,000.00	244,067,891.03	244,067,891.03	116,694,103.71	116,618,614.60	11,025,384.44	-	13,300,390.38	13,300,390.38	110,317,633.07	68.4%	62.2%
88F-12	400018011 500003010	COCONAL S.A. DE C.V.	01/06/2012	30/06/2012	REPARACION DEL PAVIMENTO HERBALCO EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	37,000,000.00	700,770.96	-	16,198,002.04	16,198,002.04	17,000,700.00	0.0%	100.0%
48F-12	400017011 500003001	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	10/12/2011	07/06/2012	REPARACION DEL PAVIMENTO HERBALCO EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	10,017,644.12	10,017,644.12	10,017,644.12	10,017,644.12	9,940,222.02	9,971,421.30	0.30	0.30	9,971,421.30	9,940,222.02	97.7%	97.7%
19C-12	400017017 500003011	KONAS METALICAS S.A	10/06/2012	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRES CRISTALES Y TERMINALES DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	16,015,697.16	16,015,697.16	16,015,697.16	16,015,697.16	16,015,697.16	64,003.87	-	1,309,428.17	1,309,428.17	7,271,304.42	40.7%	97.0%
38C-12	400018015 (6)	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	01/06/2012	20/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRES CRISTALES Y TERMINALES DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	1,110,716.00	1,110,716.00	1,110,716.00	1,110,716.00	1,110,716.00	-	-	1,110,716.00	1,110,716.00	1,110,716.00	0.0%	0.0%
48C-12	400018021 (8)	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	30/06/2012	20/10/2012	REPARACION DEL PAVIMENTO HERBALCO EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.0%	0.0%
68C-12	400018012 (7)	RECS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04/06/2012	31/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRES CRISTALES Y TERMINALES DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	604,102.50	604,102.50	604,102.50	604,102.50	604,102.50	-	-	604,102.50	604,102.50	604,102.50	0.0%	0.0%
88C-12	400017000 (4)	TECNOLOGOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10/06/2012	10/06/2012	CONSTRUCCION DE BANDAS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	133,810.00	133,810.00	133,810.00	133,810.00	133,810.00	-	-	133,810.00	133,810.00	133,810.00	100.0%	100.0%

Cuantías - Ingresos																	
48F-12	400018005	AGACEL AGROPECUARIO APHALLI S.A. DE C.V.	10/06/2012	30/11/2012	TRAMOS DE OCHO Y REINCLACIONES EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	13,003,207.00	13,003,207.00	13,003,207.00	2,415,107.49	497,069.35	30,443.76	-	2,023,142.74	2,023,142.74	497,069.35	1.5%	20.7%
19C-12	400017017 (9)	KONAS METALICAS S.A	10/06/2012	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRES CRISTALES Y TERMINALES DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	4,250,414.10	4,250,414.10	4,250,414.10	4,250,414.10	4,250,414.10	-	-	28,009.81	28,009.81	4,250,600.00	99.0%	100.0%
38C-12	400018015 (8)	GRUPOS Y PAVIMENTOS PERRECS S.A. DE C.V.	01/06/2012	20/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRES CRISTALES Y TERMINALES DE ALTA EN TRAMOS AJLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS CHAMPA - LEONHERRERA (TAPPA)	1,117,200.00	1,117,200.00	1,117,200.00	1,117,200.00	1,117,200.00	-	-	1,117,200.00	1,117,200.00	1,117,200.00	0.0%	0.0%

0345

No. Paralela	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicio-Fin	Generado	Monto Original Autorizada	Monto Autorizado Modificado	Monto Comprobado A.	Monto Programado B.	Estimado Cumplido C.	Monto E. Triénimo D.	Comprobado Distribuciones	Saldo Comprobado E.	Diferencia B-A-B+C	Estado de Chile del Estado	Avance Realizado (%)	Avance Realizado (%)	Alícuota de Costos Fugitivos	
48C-12	4800018021 (7)	GIJAS VALLES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30/04/2012 - 30/06/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICULMINACIONES Y BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.550.320,07	\$ 1.384.776,04	\$ 1.384.776,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1314.776,04	100,0%	100,0%		
98C-12	4800017806 (8)	CONTRUCCIONES TECNOLOGICAS DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.	16/04/2012 - 14/06/2012	CONSTRUCCION DE MANOS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA	\$ 245.000.000,00	\$ 412.222.222,22	\$ 412.222.222,22	\$ 276.276.222,22	\$ 276.276.222,22	\$ 19.241.272,22	\$ 19.241.272,22	\$ 0,30	\$ 442.022,22	\$ 276.276.222,22	167,0%	167,0%	14,3%	\$ 91.224,41

**GUANAYACA**

**Misión - Guernayaca**

68Y-12	4800017406	INDUSTRIAS AERONAUTICAS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	01/02/2012 - 29/07/2012	CONSTRUCCION DE MURO MONOLITICO CANTAL EN TRAMOS RECTOS DEL KM 24+800 AL KM 26+500 DEL MA 24+100 AL KM 26+500 Y DEL MA 26+500 AL KM 28+400 DE LA AUTOPISTA MECANO-GUANAYACA	\$ 4.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 4.550.320,07	\$ 1.384.776,04	\$ 1.384.776,04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.384.776,04	100,0%	100,0%		\$ 20.384,42
28C-12	4800018027 (7)	TRONCALA SUDOR S.A. DE C.V.	11/04/2012 - 30/07/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA ANTICULMINACIONES Y BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA UAR	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ 5.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
38C-12	4800018015 (8)	GIJAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012 - 30/04/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE CABLEO DE ACERO, MALLA ANTICULMINACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ 70.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000,00	100,0%	100,0%	
48C-12	4800018021 (8)	GIJAS VALLES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30/04/2012 - 30/04/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICULMINACIONES Y BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
68C-12	4800017806	ACALAZOS TECNOLOGICOS DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.	16/04/2012 - 14/06/2012	CONSTRUCCION DE MANOS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ 36.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
98C-12	4800018017 (8)	UNIPERRO CONSTRUCTORES DE CALLES S.A. DE C.V.	17/05/2012 - 17/05/2012	CONSTRUCCION DE SUPERFICIES DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTA DEL FIN	\$ 1.404.000,00	\$ 1.404.000,00	\$ 1.404.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	

**Mision - Asquipo**

118C-12				SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA MECANO-ACAPULCO	\$ 10.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%		\$ -
28C-12	4800017806	TRONCALA SUDOR S.A. DE C.V.	10/04/2012 - 30/07/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRIL ORETRAS Y TERMINALES DE AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	\$ 507.000,00	\$ 507.000,00	\$ 507.000,00	\$ 507.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 507.000,00	100,0%	100,0%	
48C-12	4800018027 (7)	GIJAS VALLES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30/04/2012 - 29/07/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICULMINACIONES Y BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ 230.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	

**Chimnavaica - Acapulco**

68Y-12	4800017406	INDUSTRIAS AERONAUTICAS CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	01/02/2012 - 27/06/2012	TRABAJOS SUPERFICIALES EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 15+000 AL KM 17+000 DEL MA 15+000 AL KM 17+000 DE LA AUTOPISTA COENAVACA-ACAPULCO	\$ 30.000.000,00	\$ 30.814.013,74	\$ 30.814.013,74	\$ 33.047.221,40	\$ 33.047.221,40	\$ -	\$ 889.207,66	\$ -	\$ 769.792,66	\$ 30.814.271,40	100,0%	97,7%		\$ 20.384,42	
108Y-12	4800017806	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/02/2012 - 29/06/2012	TRABAJOS SUPERFICIALES EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 10+000 AL KM 20+000 DEL MA 10+000 AL KM 20+000 DE LA AUTOPISTA COENAVACA-ACAPULCO	\$ 34.000.000,00	\$ 35.942.031,38	\$ 35.942.031,38	\$ 36.614.169,04	\$ 36.614.169,04	\$ 208.663,66	\$ 373.202,97	\$ -	\$ 678	\$ 36.614.169,54	100,0%	100,0%		\$ -	
118Y-12	4800018240	EDIFICACIONES S.A. DE C.V.	28/06/2012 - 29/07/2012	ESTABILIZACION DEL CORTIL VERIFICADO DEL MA 18+000 AL KM 19+200, GRUPO A, DE LA AUTOPISTA COENAVACA-ACAPULCO	\$ 20.000.000,00	\$ 27.769.181,22	\$ 27.769.181,22	\$ 30.810.102,47	\$ 30.810.102,47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.068.000,22	\$ 29.810.102,47	79,6%	79,6%		\$ -	
128Y-12	4800017806	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/02/2012 - 29/06/2012	ESTABILIZACION DE LOS CORTILES VERIFICADOS EN EL MA 16+000 AL KM 17+000, GRUPO A, DE LA AUTOPISTA COENAVACA-ACAPULCO	\$ 24.000.000,00	\$ 27.206.706,74	\$ 27.206.706,74	\$ 27.160.573,38	\$ 27.160.573,38	\$ -	\$ 46.137,36	\$ 7.220,46	\$ -	\$ 27.160.573,38	100,0%	100,0%		\$ -	
138Y-12	4800017406	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/03/2012 - 13/08/2012	ESTABILIZACION DE PROTECCION DEL TALUZO EN EL MA 24+000 AL KM 24+000, GRUPO B, DE LA AUTOPISTA COENAVACA-ACAPULCO	\$ 17.000.000,00	\$ 15.876.301,27	\$ 15.876.301,27	\$ 15.097.229,01	\$ 15.097.229,01	\$ 3.140.000,00	\$ -	\$ -	\$ 2.090.790,29	\$ 12.881.229,01	95,9%	95,9%		\$ -	
148Y-12	4800017806	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/03/2012 - 27/06/2012	ESTABILIZACION DEL TALUD DEL CORTE LINCADO EN EL MA 27+800 AL KM 28+100, GRUPO A, DE LA AUTOPISTA COENAVACA-ACAPULCO	\$ 10.000.000,00	\$ 4.076.450,72	\$ 4.076.450,72	\$ 4.077.746,00	\$ 4.077.746,00	\$ -	\$ -	\$ 1.098,29	\$ -	\$ 4.077.746,00	100,0%	100,0%		\$ -	
28C-12	4800017806	TRONCALA SUDOR S.A. DE C.V.	10/04/2012 - 30/07/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA ANTICULMINACIONES Y BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ 1.250.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.250.000,00	100,0%	100,0%		
38C-12	4800018015 (8)	GIJAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012 - 30/04/2012	CABLEO DE ACERO, MALLA ANTICULMINACION HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ 4.000.131,07	\$ 4.000.131,07	\$ -	\$ 508.868,93	\$ -	\$ 508.868,93	\$ 4.000.131,07	100,0%	100,0%		\$ -	
48C-12	4800018021 (8)	GIJAS VALLES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	30/04/2012 - 29/07/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICULMINACIONES Y BARRERAS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 932.248,46	\$ 932.248,46	\$ 932.248,46	\$ 932.248,46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 932.248,46	0,0%	0,0%		
78C-12	4800018211 (7)	TRONCALA SUDOR S.A. DE C.V.	04/06/2012 - 01/08/2012	SUBMINISTRO Y APLICACION DE MELO SELLADOR EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 127.613,14	\$ 127.613,14	\$ 127.613,14	\$ 127.613,14	\$ 127.613,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 127.613,14	74,3%	74,3%		\$ 44.049,66

03/16



MINISTERIO DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proceso	Concepto No.	Empresa	Periodo de Contrato Inicial	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Reajustado	Monto Contratado A	Monto Programado U	Eliminado Asumido C	Monto En Trámite D	Relaciones - Dependientes	Ratificado Contratado E	Diferencia (D)-E	Ejercido a Fines del Ejercicio	Antes Ingresos (E)	Antes Ingresos (E)	Alícuota de Costos Pagaros
25C-12	450018329 (17)	M.C. CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS S.A.	15/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LA INTERSECCION DE LOS CARRETERAS ATRAVESADAS "MEZCALA" UBICADO EN EL KM 21+700, "GUATAPARA" UBICADO EN EL KM 21+700 Y "SANTANA" UBICADO EN EL KM 21+700 Y "SANTANA" UBICADO EN EL KM 21+700 DE LA AUTOPISTA GUATEMALA - ZACAPALCO	10,000,000.00	100,000,000.00	2,485,650.30	2,485,650.30	766,271.20	0.00000000		766,271.20	918,366.01	766,271.20	30.0%	30.0%	

C.D. Puente de Lela - Nigua

25C-12	450018329 (17)	TRONCALVA SUD S.A. DE C.V.	16/06/2012	REHABILITACION GEOMETRICA Y ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 0+000 AL KM 2+000 Y DEL KM 2+000 AL KM 3+000 DEL CARRILLO HORIZONTAL Y VERTICAL, INCLUIDO EL SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, Y OBRAS SUPLENDRAS EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 2+000 AL KM 3+000, DEL CARRILLO DIRECTO FUENTE DE LELA - HIGUERA	4,473,200.56	4,473,200.56	4,473,200.56	4,473,200.56					4,473,200.56		0.0%	0.0%	1.0%
25C-12	450018329 (18)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	01/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	200,250.00	200,250.00	200,250.00	200,250.00					200,250.00		100.0%	100.0%	0.0%
25C-12	450018329 (19)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTI-DESEMBAQUE EN TRAMOS AISLADOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	120,300.04	120,300.04	120,300.04	120,300.04					120,300.04		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (20)	TRANSACCIONES CONSTRUCTORA DE JALISCO S.A. DE C.V.	17/06/2012	CONSTRUCCION DEL SUPERFICIE DE ALTA RESISTENCIA EN LA RED DE AUTOPISTA DEL FM	200,200.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00							0.0%	0.0%	0.0%

La Peca - Chiantla

25C-12	450018329 (6)	TRONCALVA SUD S.A. DE C.V.	16/06/2012	REHABILITACION Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	474,309.40	474,309.40	474,309.40	474,309.40					474,309.40		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (18)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTI-DESEMBAQUE EN TRAMOS AISLADOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	2,104.14	2,104.14	2,104.14	2,104.14					2,104.14		0.0%	0.0%	100.0%

Zacapa - Rancho Viejo

25C-12	450018329 (6)	PAVITERRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/06/2012	REHABILITACION Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (9)	TRONCALVA SUD S.A. DE C.V.	16/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	2,702,647.06	2,702,647.06	2,702,647.06	2,702,647.06					2,702,647.06		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (12)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTI-DESEMBAQUE EN TRAMOS AISLADOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	32,073.04	32,073.04	32,073.04	32,073.04					32,073.04		0.0%	0.0%	0.0%

Rancho Viejo - Totonic

25C-12	450018329 (10)	MECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	02/06/2012	TRATAMIENTO A BASO DEL SACILO SUPLENDRAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE LA METALICA DE TRES OMBROS Y TERMINALES DE AMORTIGUAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00	11,000,000.00					11,000,000.00		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (11)	TRONCALVA SUD S.A. DE C.V.	16/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	1,412,270.22	1,412,270.22	1,412,270.22	1,412,270.22					1,412,270.22		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (13)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTI-DESEMBAQUE EN TRAMOS AISLADOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	21,308.04	21,308.04	21,308.04	21,308.04					21,308.04		0.0%	0.0%	0.0%

PAZUNZA

25C-12	450018329 (10)	MECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	02/06/2012	TRATAMIENTO A BASO DEL SACILO SUPLENDRAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE LA METALICA DE TRES OMBROS Y TERMINALES DE AMORTIGUAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	9,433,600.20	9,433,600.20	9,433,600.20	9,433,600.20					9,433,600.20		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (11)	TRONCALVA SUD S.A. DE C.V.	16/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	1,412,270.22	1,412,270.22	1,412,270.22	1,412,270.22					1,412,270.22		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (13)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	30/06/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTI-DESEMBAQUE EN TRAMOS AISLADOS HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	21,308.04	21,308.04	21,308.04	21,308.04					21,308.04		0.0%	0.0%	0.0%

Moticon - Puenche

25C-12	450018329 (10)	OBRA Y PAVIMENTOS FENIX S.A. DE C.V.	16/06/2012	REHABILITACION Y COLOCACION DE DEFENSA PASIVA EN LAS CARRETERAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	187,037,172.20	187,037,172.20	187,037,172.20	187,037,172.20					187,037,172.20		0.0%	0.0%	1.4%
25C-12	450018329 (13)	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16/06/2012	AMPLIACION DE CARRETERA Y CONSTRUCCION DE LOSAS DE CONCRETO REFORZADO DE LA CARRETERA EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	102,070,825.06	102,070,825.06	102,070,825.06	102,070,825.06					102,070,825.06		0.0%	0.0%	0.0%
25C-12	450018329 (13)	ARIT CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS S.A. DE C.V.	16/06/2012	AMPLIACION DE TRES A CUATRO CARRETERAS DEL CARRILLO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	20,600,761.73	20,600,761.73	20,600,761.73	20,600,761.73					20,600,761.73		0.0%	0.0%	11.7%
25C-12	450018329 (13)	CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	16/06/2012	AMPLIACION DE TRES A CUATRO CARRETERAS DEL CARRILLO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00					1,350,000,000.00		0.0%	0.0%	0.0%

Handwritten signature and date: 03/06/2012



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

EXHIBICIÓN 10-09-DICIEMBRE DE 2012

No. Folio	Control No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Comprobado A	Monto Programado B	Créditos Anulados C	Monto en Trámite D	Relaciones Distribuciones	Saldo Comprobado C	Diferencia BC-DE	Empleos a Flujo de Efectivo	Avance Inicial (%)	Avance Final (%)	Avance Bando de Control																																					
I	40001802 (12)	TRIOCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	30/09/2012	ETAPA 1 "MODERNIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA DEL KM. 27+600 AL KM. 27+600. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN LA CARRETERA DEL PKM DEL 0 AL 10 DEL KM Y LA CONSTRUCCIÓN DE "MUELDOS-PANDELI"	\$ 146,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	\$ -																																					
II	40001805 (11)	GRUAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012	20/02/2012	ETAPA 2 "MODERNIZACIÓN DE LA AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA DEL KM. 20+000 AL KM. 25+000. INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PASOS"	\$ 14,200,000.00	\$ 14,200,000.00	\$ 14,200,000.00	\$ 7,022,202.71	\$ -	\$ 632,460.07	\$ -	\$ 2,469,007.20	\$ 2,822,202.71	\$ 47.7%	47.7%	\$ 2,822,202.71																																					
III	40001807 (10)	GRUAS VALLS Y SEÑALIZACIONES S.A. DE C.V.	20/04/2012	20/09/2012	CONSTRUCCIÓN DE COLOCACION DE VALLS DE ALINEAMIENTO, DISTONDO Y DESARROLLO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 2,072,874.14	\$ 2,072,874.14	\$ 2,072,874.14	\$ 1,820,000.00	\$ -	\$ 668,704.00	\$ -	\$ 109,444.40	\$ 1,963,429.60	\$ 93.8%	93.8%	\$ 1,963,429.60																																					
IV	40001812 (8)	MECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04/06/2012	31/02/2012	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE CONTINGENCIA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 31,702,000.00	\$ 31,702,000.00	\$ 26,529,393.00	\$ 10,702,000.00	\$ -	\$ 141,000.00	\$ -	\$ 9,243,300.00	\$ 10,702,000.00	\$ 57.0%	40.0%	\$ 10,702,000.00																																					
V	40001786 (7)	ACANADOS TECNOLÓGICOS DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.	16/04/2012	15/08/2012	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES DE ALTA TRAFICABILIDAD EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,111,004.71	\$ 1,111,004.71	\$ 1,111,004.71	\$ 1,066,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 1,098,520.00	\$ 98.8%	98.8%	\$ 1,098,520.00																																					
VI	40001807 (1)	TRUVALCO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	17/05/2012	13/02/2013	CONSTRUCCIÓN DE BARRERAS DE CONTINGENCIA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,420,400.00	\$ 1,420,400.00	\$ 1,420,400.00	\$ 940,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.0%	0.0%	\$ -																																					
<b>Subtotal - Autopistas</b>																																																						
39C-12	40001805 (12)	GRUAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	07/06/2012	20/02/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERAS DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTIDEBLORANTE Y MALLA GRAMADA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 1,200,000.00																																					
40C-12	40001807 (16)	GRUAS VALLS Y SEÑALIZACIONES S.A. DE C.V.	20/04/2012	20/09/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLS DE ALINEAMIENTO, DISTONDO Y DESARROLLO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 623,847.12	\$ 623,847.12	\$ 623,847.12	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 623,847.12																																					
50C-12	40001786 (8)	ACANADOS TECNOLÓGICOS DEL NOROCCIDENTE S.A. DE C.V.	16/04/2012	15/08/2012	CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIES DE ALTA TRAFICABILIDAD EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 1,510,400.00	\$ 1,510,400.00	\$ 1,510,400.00	\$ 940,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	90.1%	90.1%	\$ 940,000.00																																					
<b>Autopistas - Col. Montañas</b>																																																						
40M-12	40001802 (13)	TRIOCA SONS S.A. DE C.V.	24/06/2012	20/01/2013	TRATAMIENTO SUPERFICIA A BASES DE PULVERIZADO Y BACHO PROFUNDO Y SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 23,910,704.42	\$ 23,910,704.42	\$ 23,910,704.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	\$ -																																					
40M-12	40001802 (15)	TRIOCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	20/02/2012	TRATAMIENTO DE BACHO PROFUNDO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM. 27+600 AL KM. 20+000 DEL PKM DE LA AUTOPISTA ACATZINGO - OCOYOACÁN	\$ 30,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	\$ -																																					
29C-12	40001802 (15)	TRIOCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	20/02/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERAS DE CONTINGENCIA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 243,400.00	\$ 243,400.00	\$ 243,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%	\$ -																																					
35C-12	40001805 (13)	GRUAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012	20/02/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERAS DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTIDEBLORANTE Y MALLA GRAMADA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ 70,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	100.0%	100.0%	\$ 70,800.00																																					
<b>TOTAL</b>																																																						
<table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> <td style="width:10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">\$ 2,549,070,218.33</td> <td style="text-align: right;">\$ 41,249,928.44</td> <td style="text-align: right;">\$ 41,249,928.44</td> <td style="text-align: right;">\$ 40,272,227.41</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td style="text-align: right;">\$ 540,445.22</td> <td style="text-align: right;">\$ -</td> <td style="text-align: right;">\$ 50,724,044.88</td> <td style="text-align: right;">\$ 49,212,227.41</td> <td style="text-align: right;">9.8%</td> <td style="text-align: right;">9.8%</td> <td style="text-align: right;">\$ 49,212,227.41</td> </tr> </table>																																											\$ 2,549,070,218.33	\$ 41,249,928.44	\$ 41,249,928.44	\$ 40,272,227.41	\$ -	\$ 540,445.22	\$ -	\$ 50,724,044.88	\$ 49,212,227.41	9.8%	9.8%	\$ 49,212,227.41
						\$ 2,549,070,218.33	\$ 41,249,928.44	\$ 41,249,928.44	\$ 40,272,227.41	\$ -	\$ 540,445.22	\$ -	\$ 50,724,044.88	\$ 49,212,227.41	9.8%	9.8%	\$ 49,212,227.41																																					

0348



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS  
 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Fondo	Codigo No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Pagarizado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Dependencias	Estado Calificado C	Diferencia D-C-E	Ejecución a Fines de Ejercicio	Inversión Ejecutada (%)	Avance Ratio (%)	Alcance de Cobertura Pagarizado
			Inicio	Fin													
<b>Chamquiñ - Compañía</b>																	
<b>02472404028</b>																	
28M-12	490017315	CONSTRUCCIONA LUCALANTI, S.A. DE CV	23/01/2012	15/06/2012	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PULVERIZADO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 10+000 AL KM 10+000 DEL CAMINO CARRETERO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA CHAMQUIÑ-CAMPICHE	\$ 36.190.000,00	\$ 36.110.220,26	\$ 36.110.220,26	\$ 20.723.271,01	\$ 3.074.304,12	-	\$ 967.189,09	\$ 4.810.201,10	\$ 20.723.271,01	70,1%	67,7%	
49C-12	490018021 (17)	GRIMAS VALLS Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE CV	30/05/2012	20/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE VALLAS ANTE-SALIBURRIENTES, INDICADORES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 1.012.464,00	\$ 1.012.464,00	\$ 1.012.464,00	\$ 680.094,64	-	-	\$ 301.130,36	\$ 301.130,36	\$ 680.094,64	64,2%	64,0%	
<b>Ata - Aconcagua</b>																	
28M-12	490018022	ELAN CARLOS SANCHEZ ZETINA	01/05/2012	20/11/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL HORIZONTAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 5.200.000,00	\$ 2.250.690,94	\$ 2.250.690,94	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
28M-12	490018202	COPI, S.A. DE CV	01/06/2012	02/01/2013	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 10+000 AL KM 10+000 DEL CAMINO CARRETERO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA LA TIENA-AQUICAN	\$ 170.500.000,00	\$ 168.207.208,74	\$ 168.207.208,74	\$ 18.878.071,57	\$ -	\$ 4.578.008,26	\$ -	\$ 163.629.200,00	\$ 18.878.071,57	11,0%	17,1%	
28C-12	490017602 (11)	TROCENA SGNH, S.A. DE CV	16/04/2012	30/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE VALLAS ANTE-SALIBURRIENTES, INDICADORES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 2.743.307,00	\$ 2.743.307,00	\$ 2.743.307,00	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
49C-12	490018021 (18)	GRIMAS VALLS Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE CV	30/04/2012	20/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE VALLAS ANTE-SALIBURRIENTES, INDICADORES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 14.017.104,64	\$ 14.017.104,64	\$ 14.017.104,64	\$ 13.498.669,29	-	-	\$ -	\$ -	\$ 518.435,35	95,2%	90,2%	
09C-12	490017800 (8)	CONSTRUCCION TECNOLÓGICOS DEL NOROESTE, S.A. DE CV	16/04/2012	15/09/2012	CONSTRUCCION DE MANGA VENTILADORA DE ALERTEA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 3.400.200,00	\$ 3.400.200,00	\$ 3.400.200,00	\$ 3.400.200,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ 3.400.200,00	100,0%	100,0%	
<b>Aconcagua - Concepcion</b>																	
28C-12	490017802 (9)	TROCENA SGNH, S.A. DE CV	16/04/2012	20/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE DEFENSA VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 6.000.200,00	\$ 6.000.200,00	\$ 6.000.200,00	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
<b>C. O. Neltin Cruz - La Ventana</b>																	
28M-12	490017603	MAR MELLER SGRAL S.A. DE CV	01/02/2012	13/11/2012	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PULVERIZADO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 2+000 AL KM 2+000 DEL CAMINO CARRETERO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 45.000.000,00	\$ 42.430.007,70	\$ 42.430.007,70	\$ 36.789.892,43	\$ 6.640.115,27	\$ -	\$ 249,32	\$ 7.290.227,90	\$ 36.789.892,43	94,3%	99,1%	\$ -75.607,90
49C-12	490018021 (9)	GRIMAS VALLS Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE CV	30/04/2012	20/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE VALLAS ANTE-SALIBURRIENTES, INDICADORES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 900.200,00	\$ 900.200,00	\$ 900.200,00	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
<b>Ata - Duque - Cochinos</b>																	
28M-12	490017300	UPHA, S.A. DE CV	01/03/2012	12/05/2012	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PULVERIZADO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 4+000 AL KM 4+000 DEL CAMINO CARRETERO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 20.000.000,00	\$ 18.091.479,24	\$ 18.091.479,24	\$ 16.402.749,13	\$ 208.729,10	\$ -	\$ 74.870,15	\$ 0,13	\$ 18.402.749,13	90,4%	100,0%	
28M-12	490017600	HELIX, S.A. DE CV	04/03/2012	04/03/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 2.000.000,00	\$ 181.729,51	\$ 181.729,51	\$ 181.729,51	\$ -	\$ 2.137,71	\$ -	\$ -	\$ 181.729,51	100,0%	100,0%	
28C-12	490017602 (10)	TROCENA SGNH, S.A. DE CV	10/04/2012	30/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS Y TERMINALES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 3.784.240,36	\$ 3.784.240,36	\$ 3.784.240,36	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
38C-12	490018015 (14)	GRIMAS VALLS Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE CV	01/05/2012	20/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE VALLAS ANTE-SALIBURRIENTES, INDICADORES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 141.610,00	\$ 141.610,00	\$ 141.610,00	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	0,0%	0,0%	
49C-12	490018021 (19)	GRIMAS VALLS Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE CV	30/04/2012	20/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE VALLAS ANTE-SALIBURRIENTES, INDICADORES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 626.160,88	\$ 626.160,88	\$ 626.160,88	\$ 626.160,88	-	-	\$ -	\$ -	\$ 626.160,88	100,0%	100,0%	
<b>VEPAGUZ</b>																	
<b>Col. Muebles - Córdoba</b>																	
28M-12	490018142	CONSTRUCCION INGENIERIA MAYAN S.A. DE CV	10/05/2012	14/01/2013	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE PULVERIZADO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 20+000 AL KM 20+000 DEL CAMINO CARRETERO EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ 4.066.410,31	\$ 1.933.589,69	\$ 608.171,44	\$ -	\$ 13.390.177,60	\$ 4.066.410,31	67,8%	22,0%	
27M-12	490017604	IMC CONTRATACIONES ILICHIROCANICAS S.A. DE CV	01/03/2012	20/08/2012	REPARACION DE LA DIVA DE ENERGA LIBERADA EN EL KM 208+700 DE LA AUTOPISTA	\$ 4.987.312,66	\$ 4.987.312,66	\$ 4.987.312,66	\$ 4.781.480,04	\$ -	\$ 9.691,18	\$ -	\$ 180.223,65	\$ 4.781.480,04	96,1%	100,0%	
28C-12	490017602 (11)	TROCENA SGNH, S.A. DE CV	16/04/2012	30/10/2012	SURTIENDO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CRESTAS Y TERMINALES DE ALINEAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA AUTOPISTA	\$ 11.227.688,42	\$ 11.227.688,42	\$ 11.227.688,42	\$ 8.026.301,26	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.117.326,94	\$ 8.026.301,26	70,6%	100,0%	

Handwritten signature or initials.



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMIOZ  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puesto	Cambio No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Comprometido A	Monto En Trámite B	Selecciones - Desembolsos	Saldo Catastrado C	Diferencia D+E	Ejercido a Fines de Ejercicio	Alcance Ejercido (%)	Alcance Físico (%)	Atenas de Cambio
			Inicio	Fin												
38C-12	400018105 (16)	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	560,440.00 \$	420,382.31 \$	560,440.00 \$	-	-	-	420,382.31 \$	0.0%	0.0%	-	
49C-12	400018101 (12)	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	30/04/2012	30/12/2012	ALINEAMIENTO, BORTONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	774,340.38 \$	774,340.38 \$	774,340.38 \$	139,243.60 \$	-	-	139,243.60 \$	11.0%	18.0%	-	
68C-12	400017800 (17)	ACABADOS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	16/04/2012	15/08/2012	CONSTRUCCION DE BARRERA VITAMOTONAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	142,330.00 \$	142,330.00 \$	142,330.00 \$	-	-	-	142,330.00 \$	100.0%	100.0%	-	

Córdoba - Veracruz

28M-12	400017412	GRUPO EDIFICACION DE LA SOTO, S.A. DE C.V.	01/02/2012	23/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA COORDOBA-VERACRUZ	42,460,111.89 \$	42,460,111.89 \$	42,460,111.89 \$	33,732,141.37 \$	410,801.91 \$	-	3,727,970.52 \$	34,160,112.88 \$	79.4%	79.4%	3,727,970.52 \$	
29C-12	400017802 (13)	TRONCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CILINDROS Y TERMINALES DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	15,104,337.89 \$	15,104,337.89 \$	15,104,337.89 \$	2,761,960.19 \$	272,714.76 \$	-	2,761,960.19 \$	18.1%	77.2%	-		
38C-12	400018105 (16)	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	212,419.08 \$	212,419.08 \$	212,419.08 \$	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-		
49C-12	400018101 (12)	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	30/04/2012	30/12/2012	ALINEAMIENTO, BORTONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	9,400.00 \$	9,400.00 \$	9,400.00 \$	6,400.00 \$	-	-	9,400.00 \$	100.0%	100.0%	-		
68C-12	400017800 (17)	ACABADOS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	16/04/2012	15/08/2012	CONSTRUCCION DE BARRERA VITAMOTONAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	36,495.00 \$	36,495.00 \$	36,495.00 \$	19,601.73 \$	-	-	17,893.27 \$	19,601.73 \$	52.1%	52.1%	-	

La Tolda - Isla

28M-12	400017412	VANTON CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.	01/02/2012	20/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA TOLIMA-BOGOTA	67,912,803.03 \$	67,912,803.03 \$	67,912,803.03 \$	51,872,034.90 \$	3,787,777.42 \$	360,867.07 \$	899,929.88 \$	51,872,034.90 \$	79.4%	82.1%	3,787,777.42 \$	
29C-12	400017802 (13)	TRONCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CILINDROS Y TERMINALES DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	6,006,670.26 \$	6,006,670.26 \$	6,006,670.26 \$	869,113.34 \$	-	-	869,113.34 \$	0.0%	14.0%	-		
38C-12	400018105 (16)	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3,666,148.09 \$	3,666,148.09 \$	3,666,148.09 \$	-	-	-	-	0.0%	0.0%	-		
49C-12	400018101 (12)	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	30/04/2012	30/12/2012	ALINEAMIENTO, BORTONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	9,781,772.54 \$	9,781,772.54 \$	9,781,772.54 \$	6,781,772.54 \$	-	-	7,786,109.48 \$	6,781,772.54 \$	100.0%	100.0%	-	
68C-12	400017800 (17)	MECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04/02/2012	31/12/2012	CONSTRUCCION DE BARRERA VITAMOTONAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	4,072,842.00 \$	4,072,842.00 \$	4,072,842.00 \$	4,072,842.00 \$	-	-	4,072,842.00 \$	4,072,842.00 \$	100.0%	100.0%	-	

Chimenes - Zumbales - Trujillo

38M-12	400018127	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS TECNICO SOTO S.A. DE C.V.	04/02/2012	02/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA GUICHENEZ-BOGOTA-THIATLAN	10,530,606.96 \$	10,530,606.96 \$	10,530,606.96 \$	13,024,417.70 \$	633,763.02 \$	18,612.70 \$	3,901,058.07 \$	13,024,417.70 \$	80.0%	10.1%	3,901,058.07 \$
--------	-----------	--	------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------	-----------------	------------------	-------	-------	-----------------

Uruapan - Páramo - Tumbaco

31M-12	400017802	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	20/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA GUICHENEZ-BOGOTA-THIATLAN	10,000,000.00 \$	10,000,000.00 \$	10,000,000.00 \$	10,000,000.00 \$	-	-	-	10,000,000.00 \$	100.0%	100.0%	-
29C-12	400017802 (14)	TRONCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CILINDROS Y TERMINALES DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	2,132,270.13 \$	2,132,270.13 \$	2,132,270.13 \$	-	-	-	2,132,270.13 \$	0.0%	0.0%	-	

REYNOSA

23M-12	400017802	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	20/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA GUICHENEZ-BOGOTA-THIATLAN	10,000,000.00 \$	10,000,000.00 \$	10,000,000.00 \$	10,000,000.00 \$	-	-	-	10,000,000.00 \$	100.0%	100.0%	-
18C-12	400017802 (14)	TRONCA SONS S.A. DE C.V.	16/04/2012	30/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DEFENSA METALICA DE TRES CILINDROS Y TERMINALES DE ALTO Y BAJA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	5,494,131.64 \$	5,494,131.64 \$	5,494,131.64 \$	-	-	-	5,494,131.64 \$	0.0%	0.0%	-	

MONTESORIO

23M-12	400017802	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	20/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA GUICHENEZ-BOGOTA-THIATLAN	8,300,000.00 \$	8,300,000.00 \$	8,300,000.00 \$	8,300,000.00 \$	-	-	-	8,300,000.00 \$	100.0%	100.0%	-
--------	-----------	---	------------	------------	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	---	---	---	-----------------	--------	--------	---

Montevideo - Nuevo Laredo

23M-12	400017802	ORNAS Y PAVIMENTOS FERRECA S.A. DE C.V.	01/02/2012	20/12/2012	REPOSICION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 21+000 AL KM 21+500 CUERPO A Y DEL KM 21+500 AL KM 21+600 CUERPO B DE LA AUTOPISTA GUICHENEZ-BOGOTA-THIATLAN	12,420,000.00 \$	12,420,000.00 \$	12,420,000.00 \$	12,420,000.00 \$	-	-	-	12,420,000.00 \$	100.0%	100.0%	-
--------	-----------	---	------------	------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	---	---	---	------------------	--------	--------	---

Handwritten signature



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2013 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorización	Monto Aprobado	Monto Construido	Monto Programado	Ejercicio Acumulado	Monto a Tránsito	Requisitos Derivados	Saldo Ejecutado	Diferencia D.C.P.F.	Ejercicio e Inicio del Contrato	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Atenuación de Riesgo
			Inicio	Fin														
34M-12	400017300	CONSTRUCTORA MANZANILLA S.A. DE C.V.	07/07/2012	08/12/2012	REHABILITACION DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOSAS DE CONCRETO ARMADO COLUCADO EN LA AUTOPISTA MONTREALEY - ANTOFAGASTA	236.000.000,00	214.710.100,40	214.710.100,40	194.201.208,42	110.919.780,57	22.074.143,84	2.016.808,21		1.811.229,88	116.915.016,92	64,3%	66,4%	
18C-12	400017307	FOHNAS METALICAS S.A. DE C.V.	10/05/2012	30/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA NORTE		12.376.141,48	12.376.141,48	12.376.141,48	8.241.968,10		262.002,01		4.639.149,29	8.241.968,10	67,5%	112,4%	
30C-12	400018105	DIRNAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012	20/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		1.400.264,00	1.400.264,00	1.400.264,00	1.400.264,00					1.400.264,00	100,0%	100,0%	
Terneros - Sagües																		
34M-12	400017318	PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	09/05/2012	03/05/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL BLENADO VERTICAL Y HORIZONTAL DEL KM 0+000 AL KM 1+400 EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS MATAMOROS AUTOPISTA SALTILLO - TORREON	10.000.000,00	9.797.910,47	9.797.910,47	9.797.910,47	6.791.689,24			4,2%		9.797.910,47	100,0%	100,0%	
34M-12	400017341	CONSTRUCTORA MANZANILLA S.A. DE C.V.	11/02/2012	12/07/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS AVILA - EL MORFEN, AUTOPISTA SALTILLO - TORREON	30.000.000,00	26.338.400,23	26.338.400,23	26.338.400,23	26.316.066,64			34,80%		26.338.400,23	100,0%	91,1%	
Cajamarca - Romeros																		
18C-12	400017317	FOHNAS METALICAS S.A. DE C.V.	10/05/2012	30/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA NORTE		483.314,02	483.314,02	483.314,02	484.510,06				823,44	484.510,56	96,8%	100,0%	
30C-12	400018116	DIRNAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012	20/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		189.000,00	189.000,00	189.000,00	189.000,00					189.000,00	100,0%	100,0%	
40C-12	400018101	DIRNAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	30/05/2012	20/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS		4.200,36	4.200,36	4.200,36	4.200,36					4.200,36	100,0%	100,0%	
08C-12	400018112	RECA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04/05/2012	31/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		249.230,00	249.230,00	249.230,00	249.230,00					249.230,00	100,0%	100,0%	
08C-12	400017306	ACABADOS TECNOLOGICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10/05/2012	15/03/2012	CONSTRUCCION DE BARRAS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		12.104,00	12.104,00	12.104,00	12.104,00					12.104,00	100,0%	100,0%	
Cajamarca - Puerto Miquele																		
18C-12	400017317	FOHNAS METALICAS S.A. DE C.V.	10/05/2012	30/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA NORTE		1.208.460,33	1.208.460,33	1.208.460,33	1.208.460,33					1.208.460,33	100,0%	100,0%	
30C-12	400018116	DIRNAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	01/05/2012	20/12/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		394.076,00	394.076,00	394.076,00	394.076,00					394.076,00	100,0%	100,0%	
40C-12	400018101	DIRNAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	30/05/2012	20/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS		39.469,14	39.469,14	39.469,14	39.469,14					39.469,14	100,0%	100,0%	
65C-12	400017306	ACABADOS TECNOLOGICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10/05/2012	15/03/2012	CONSTRUCCION DE BARRAS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		1.940.400,00	1.940.400,00	1.940.400,00	1.829.971,62					1.940.400,00	100,0%	100,0%	
Cajamarca - Comillas																		
40C-12	400018101	DIRNAS Y PAVIMENTOS FERRECS S.A. DE C.V.	30/05/2012	20/10/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS		2.391.029,12	2.391.029,12	2.391.029,12	2.391.029,12					2.391.029,12	100,0%	100,0%	
65C-12	400017306	ACABADOS TECNOLOGICOS DEL NOROESTE S.A. DE C.V.	10/05/2012	15/03/2012	CONSTRUCCION DE BARRAS VIBRATORIAS DE ALTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00	5.380.000,00					5.380.000,00	100,0%	100,0%	
70C-12	400018111	TONICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	04/05/2012	01/05/2012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS		3.229.899,85	3.229.899,85	3.229.899,85	3.229.899,85					3.229.899,85	100,0%	100,0%	
Durango - Mapatlan																		
37M-12	400017307	PAVIMENTOS S.A. DE C.V.	20/02/2012	19/07/2012	TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE BACHO EN MICROCAPITA DEL KM 4+000 AL KM 10+000 INCLUYENDO BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	60.000.000,00	49.700.780,20	49.700.780,20	49.700.780,20	49.700.780,20		433.949,06	0,16		49.700.780,20	100,0%	100,0%	
42M-12	400018100	CONSTRUCTORA MANZANILLA S.A. DE C.V.	18/02/2012	14/02/2012	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE MICROCAPITA DEL KM 0+000 AL KM 10+000 INCLUYENDO BARRAS DE ACERO Y MALLA ANTICULAMBANTE EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		13.108.277,66	13.108.277,66	13.108.277,66	11.067.109,72		10.240,00			13.108.277,66	85,2%	100,0%	

0351



CAMIROS Y PUNTES ESCORALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proyecto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Ejecutado C	Monto Ejecutado D	Relaciones Dependientes	Saldo Comprobado E	Deuda por D.O.U.C.	Urgencia e Impacto del Proyecto	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Atenuación de Riesgo
			Inicio	Fin														
48C-12	480011821 (27)	GRUPOS VALLS Y CALLEJONES, S.A. DE C.V.	30/06/2012	29/06/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICOLIDANTES, INCRUSTACIONES DE HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 104.570,00	\$ 104.570,00	\$ 104.570,00	\$ 104.570,00	\$ 104.570,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104.570,00	100,0%	100,0%	
75C-12	480011821 (3)	TORREZA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04/06/2012	01/10/2012	SUBMINISTRO Y APLICACION DE RELOJO BELLAHOR EN CARPETAS ASFALTICAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 6.704.412,00	\$ 5.294.412,00	\$ 5.294.412,00	\$ 5.410.226,16	\$ 5.294.412,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.410.226,16	0,0%	83,0%	
<b>SUBTOTAL MONTEBERRY</b>																		
						\$ 395.149.020,00	\$ 337.864.414,00	\$ 337.864.414,00	\$ 344.984.437,20	\$ 344.984.437,20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 344.984.437,20	85,0%	78,0%	

CHAPAS

No. Proyecto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Ejecutado C	Monto Ejecutado D	Relaciones Dependientes	Saldo Comprobado E	Deuda por D.O.U.C.	Urgencia e Impacto del Proyecto	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Atenuación de Riesgo
			Inicio	Fin														
38M-12	480011728 (2)	DISCO Y MANUFACTURACION, S.A. DE C.V.	12/06/2012	24/06/2012	REPARACION DE CARPETA ASFALTICA DEL KM 1600 AL KM 3140, INCLUIE ENTORNOS DE LAS CHOPAS 1 Y II DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOPAS MAUDALE-OCOCOAULTA	\$ 40.000.000,00	\$ 74.800.104,10	\$ 74.800.104,10	\$ 74.800.104,10	\$ 53.821.014,02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 53.821.014,02	184,5%	100,0%	
38M-12	480011826 (2)	NICHOLS VALATIANO ANIBAL	02/06/2012	18/07/2012	CONSTRUCCION DE MUROS TIPO OMBRO DEL KM 113+550 DEL KM 116+500 AL KM 117+000 Y DEL KM 117+400 AL KM 118+000 DEL KM 118+000 AL KM 124+700 DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOPAS MAUDALE-OCOCOAULTA	\$ 10.000.000,00	\$ 7.322.163,70	\$ 7.322.163,70	\$ 7.322.163,70	\$ 7.165.209,97	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.165.209,97	73,2%	100,0%	
40M-12	480011727	DE OROS TORRELA ARQUITECTOR, S.A. DE C.V.	16/06/2012	26/07/2012	REPARACION DEL CONT. DEL KM 124+500 AL KM 140+000 DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOPAS MAUDALE-OCOCOAULTA	\$ 8.000.000,00	\$ 6.074.656,00	\$ 6.074.656,00	\$ 6.074.656,00	\$ 6.004.960,00	\$ -	\$ 22.694,27	\$ -	\$ -	\$ 6.004.960,00	76,0%	76,0%	
47M-12	480011824 (5)	DISCO Y MANUFACTURACION, S.A. DE C.V.	01/06/2012	01/06/2012	RECONSTRUCCION DE CUATRO TERAPIALES EN ESTADO CRITICO Y SUS CURVAS DE DRENAJE EN LOS ENTORNOS DE LAS CHOPAS MAUDALE-OCOCOAULTA	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ 12.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000,00	0,0%	4,8%	
50M-12	480011805	MECA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	28/06/2012	30/01/2013	SERVIS. CONEXOS MAUDALE DEL KM 140+000 AL KM 144+000 DEL CAMINO DIRECTO LAS CHOPAS MAUDALE-OCOCOAULTA	\$ 2.482.800,00	\$ 2.482.800,00	\$ 2.482.800,00	\$ 2.482.800,00	\$ 2.482.800,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.482.800,00	0,0%	0,0%	
25C-12	480011802 (17)	TRIOGAMA SONS S.A. DE C.V.	16/06/2012	30/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRILLOS Y TERMINALES DE ANCHURAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ 14.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14.000.000,00	100,0%	71,8%	
75C-12	480011821 (8)	TORREZA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04/06/2012	01/10/2012	SUBMINISTRO Y APLICACION DE RELOJO BELLAHOR EN CARPETAS ASFALTICAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 10.717.448,00	\$ 10.717.448,00	\$ 10.717.448,00	\$ 10.717.448,00	\$ 10.717.448,00	\$ -	\$ 360.739,50	\$ -	\$ -	\$ 10.717.448,00	100,0%	100,0%	
<b>SUBTOTAL CHAPAS</b>						\$ 84.282.800,00	\$ 84.282.800,00	\$ 84.282.800,00	\$ 84.282.800,00	\$ 84.282.800,00	\$ -	\$ 229.428,27	\$ -	\$ -	\$ 84.282.800,00	88,0%	83,3%	

OAZACA

No. Proyecto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Ejecutado C	Monto Ejecutado D	Relaciones Dependientes	Saldo Comprobado E	Deuda por D.O.U.C.	Urgencia e Impacto del Proyecto	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Atenuación de Riesgo
			Inicio	Fin														
41M-12	480011808 (3)	GLOVALTOS, S.A. DE C.V.	28/06/2012	12/01/2013	REHABILITACION ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO DEL KM 30+000 AL KM 34+000, INCLUIE SUMINISTRO DE MATERIALES Y OBRAS DE ACERQUE DEL IMPACTO DEL VERTICAL DEL C/D CHOPAS MAUDALE-OCOCOAULTA	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 200.000.000,00	\$ 147.031.050,00	\$ 130.828.142,50	\$ 8.694.355,50	\$ 70.059,10	\$ -	\$ -	\$ 130.828.142,50	60,4%	60,7%	
28C-12	480011802 (16)	TRIOGAMA SONS S.A. DE C.V.	16/06/2012	30/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRILLOS Y TERMINALES DE ANCHURAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	\$ 200.700,00	\$ 200.700,00	\$ 200.700,00	\$ 200.700,00	\$ 200.700,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.700,00	100,0%	100,0%	
48C-12	480011821 (2)	GRUPOS VALLS Y CALLEJONES, S.A. DE C.V.	06/06/2012	29/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICOLIDANTES, INCRUSTACIONES DE HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 1.306.103,00	\$ 1.306.103,00	\$ 1.306.103,00	\$ 1.306.103,00	\$ 1.306.103,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.306.103,00	100,0%	76,0%	
75C-12	480011821 (4)	TORREZA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04/06/2012	01/10/2012	SUBMINISTRO Y APLICACION DE RELOJO BELLAHOR EN CARPETAS ASFALTICAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 1.046.102,00	\$ 1.046.102,00	\$ 1.046.102,00	\$ 1.046.102,00	\$ 1.046.102,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.046.102,00	100,0%	99,0%	
<b>SUBTOTAL OAZACA</b>						\$ 401.748,00	\$ 401.748,00	\$ 401.748,00	\$ 401.748,00	\$ 401.748,00	\$ -	\$ 360.739,50	\$ -	\$ -	\$ 401.748,00	100,0%	89,7%	

OFICINAS CENTRALES

No. Proyecto	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Acreditado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Monto Ejecutado C	Monto Ejecutado D	Relaciones Dependientes	Saldo Comprobado E	Deuda por D.O.U.C.	Urgencia e Impacto del Proyecto	Avance Financiero (%)	Avance Físico (%)	Atenuación de Riesgo
			Inicio	Fin														
18C-12	480011807	FORNIA MATECARRIA S.A. DE C.V.	16/06/2012	30/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRILLOS Y TERMINALES DE ANCHURAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA NORTE	\$ 54.186.128,00	\$ 54.186.128,00	\$ 54.186.128,00	\$ 54.186.128,00	\$ 54.186.128,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.186.128,00	0,0%	0,0%	
29C-12	480011802	TRIOGAMA SONS, S.A. DE C.V.	16/06/2012	30/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRILLOS Y TERMINALES DE ANCHURAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.400.000,00	0,0%	0,0%	
38C-12	480011810	GRUPOS VALLS Y CALLEJONES, S.A. DE C.V.	01/06/2012	29/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICOLIDANTES, INCRUSTACIONES DE HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.400.000,00	0,0%	0,0%	
48C-12	480011802	GRUPOS VALLS Y CALLEJONES, S.A. DE C.V.	01/06/2012	29/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTICOLIDANTES, INCRUSTACIONES DE HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ 40.400.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.400.000,00	0,0%	0,0%	
10C-12	480011812	HECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	04/06/2012	31/10/2012	SUBMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA METALICA DE TRILLOS Y TERMINALES DE ANCHURAMIENTO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS ZONA SUR	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ 30.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	0,0%	0,0%	
05C-12	480011789	ACIADOS TECNOLOGICOS DEL NOROCCIDENTE, S.A. DE C.V.	16/06/2012	15/06/2012	CONSTRUCCION DE MARCHAS VERTICALES DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000,00	0,0%	0,0%	
75C-12	480011821 (1)	TORREZA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	04/06/2012	01/10/2012	SUBMINISTRO Y APLICACION DE RELOJO BELLAHOR EN CARPETAS ASFALTICAS EN TRAMOS AISLADOS DE DISTINTAS AUTOPISTAS	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	0,0%	0,0%	
09C-12					CONSTRUCCION DE MARCHAS VERTICALES DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	0,0%	0,0%	

003 0352





CAMINOS Y FUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida (06C12)	Cuentas No.	Cuenta	Partido del Concepto		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aumentado Modificado	Monto Compromiso A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto De Tránsito D	Restricciones - Desembolsos	Saldo Cancelado E	Diferencia DC-DE	Licitados a Favor de Crédito	Anexo Desembolso (%)	Anexo Retiro (%)	Monto de Comite Pagación
			Inicio	Fin														
					REVISIÓN DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE LOS SERVICIOS CONEXOS DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	300,000,000.00	300,000,000.00											
					TOTAL	2,640,000,000.00	4,741,741,865.26	2,682,741,865.26	3,084,175,688.03	1,284,190,302.74	80,043,885.06	-10,798,007.77	213,827.75	-317,365,368.53	3,397,534,482.02	41.9%	34.0%	1,024,028.91


400 0353

Handwritten mark

Fecha de corte: 10 de Octubre de 2012

Delegación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal		
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejército a Flujo de Efectivo	Retenciones - Devoluciones	Ajustes de Costos Pagados	Avance financiero (%)	
Tijuana	\$ 12,250,000.00	\$ 8,854,754.84	\$ 8,854,754.84	\$ 5,430,700.56	\$ 3,900,038.54	\$ 584,720.10	\$ 945,941.92	\$ 3,900,038.54	\$ 201,816.26	\$ -	\$ -	44.0%	
Culiacán	\$ 11,840,000.00	\$ 1,400,737.29	\$ 1,400,737.29	\$ 584,233.31	\$ 453,173.98		\$ 131,059.35	\$ 453,173.96		\$ -	\$ -	32.4%	
Queretaro	\$ 12,890,000.00	\$ 9,573,422.72	\$ 9,573,422.72	\$ 6,874,948.70	\$ 5,381,327.77	\$ 878,678.76	\$ 234,942.17	\$ 5,988,210.83		\$ -	\$ 6,882.86	52.3%	
Guerrero	\$ 12,890,000.00	\$ 14,929,606.58	\$ 13,809,606.58	\$ 11,702,161.51	\$ 7,370,968.55	\$ 254,730.02	\$ 4,076,472.94	\$ 7,370,968.55	\$ 10,842.01	\$ -	\$ -	53.4%	
Puebla	\$ 15,965,000.00	\$ 18,245,485.17	\$ 18,745,485.17	\$ 6,017,265.37	\$ 4,423,335.01	\$ 1,889,934.27	\$ 276,003.01	\$ 4,423,335.01	\$ 47,573.27	\$ -	\$ -	26.4%	
Coahuila	\$ 14,170,000.00	\$ 10,402,739.54	\$ 10,402,739.54	\$ 7,838,082.33	\$ 6,542,807.58	\$ 780,823.17	\$ 512,455.58	\$ 6,544,324.55	\$ 34,296.86	\$ 1,516.97	\$ 1,516.97	62.9%	
Veracruz	\$ 11,440,000.00	\$ 9,848,195.80	\$ 9,848,195.80	\$ 6,846,577.59	\$ 5,818,982.63	\$ 737,582.64	\$ 290,022.32	\$ 5,834,611.35	\$ 1,527.91	\$ -	\$ -	59.1%	
Raynosa	\$ 5,000,000.00	\$ 5,135,680.01	\$ 5,135,680.01	\$ 3,132,541.72	\$ 2,894,739.66		\$ 237,802.06	\$ 2,894,739.66		\$ -	\$ -	56.4%	
Guadalupe												0.0%	
Monterrey	\$ 17,505,000.00	\$ 7,642,235.54	\$ 7,642,235.54	\$ 6,021,217.23	\$ 6,130,722.48	\$ 250,644.03	\$ 239,850.72	\$ 6,130,722.48	\$ 43,701.33	\$ -	\$ -	80.2%	
Chiapas	\$ 4,940,000.00	\$ 3,555,513.03	\$ 3,555,513.03	\$ 2,403,702.57	\$ 2,024,429.13	\$ 233,565.27	\$ 145,708.17	\$ 2,024,429.13		\$ -	\$ -	56.9%	
Oaxaca	\$ 10,000,000.00	\$ 4,193,896.52	\$ 4,193,896.52	\$ 2,756,394.67	\$ 2,862,500.55		\$ 106,105.88	\$ 2,862,500.55	\$ 21,770.50	\$ -	\$ -	68.3%	
Oficinas Centrales	\$ 15,000,000.00	\$ 5,339,102.09										0.0%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 131,000,000.00</b>	<b>\$ 99,121,349.13</b>	<b>\$ 94,162,247.04</b>	<b>\$ 60,205,835.76</b>	<b>\$ 48,382,995.86</b>	<b>\$ 5,390,694.26</b>	<b>\$ 6,432,145.64</b>	<b>\$ 48,407,044.41</b>	<b>\$ 317,987.14</b>	<b>\$ 24,048.55</b>	<b>\$ -</b>	<b>53.1%</b>	

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

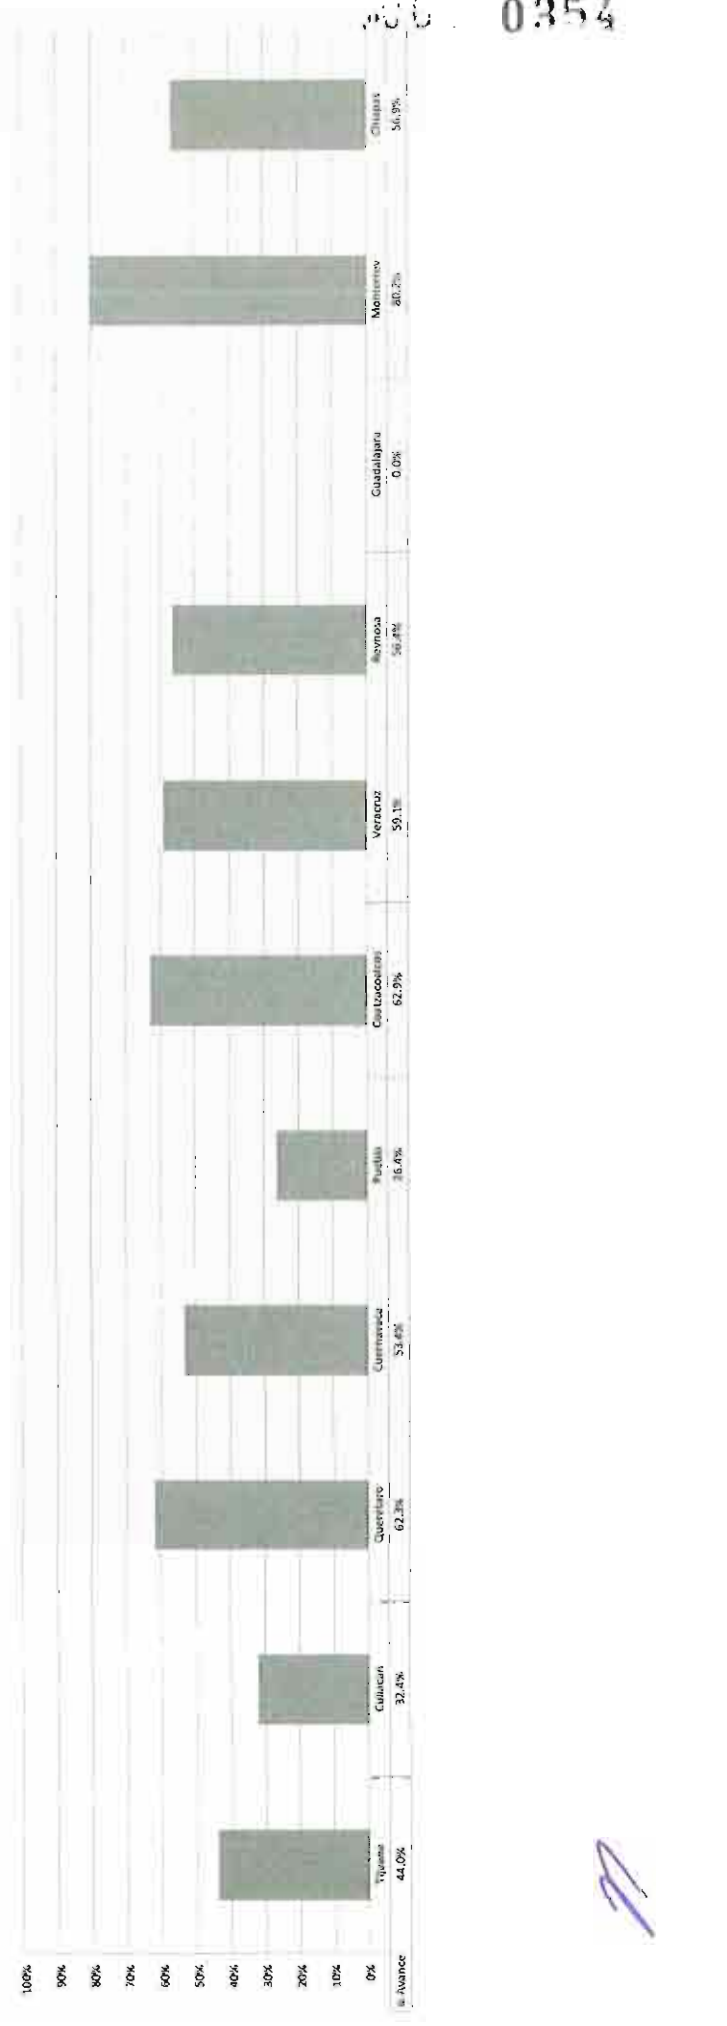

0354





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS COMÚNS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Puntaje	Cuenta No.	Empresa	Partido del Contrato	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Aprobado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado D	Limite Autorizado C	Monto En Trámite D	Relaciones - Desembolsos	Índice Cancelado E	Diferencia I-D-C-E	Ejército a Hijo de Ejército	Avance de Obras (%)	Avance de Obras (%)
-------------	------------	---------	----------------------	----------	---------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

**Quindío - Luchania**

45M12	45001842	INDUSTRIAS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	16/02/2012	740.000.00 \$	1.206.130.25 \$	1.206.130.25 \$	1.206.130.25 \$	1.070.013.00 \$	85.026.31 \$	195.614.20 \$			0 \$	0 \$	91.023.31	71.3%
35B12	45001848 (7)	FONDA DE CUMPLIMIENTO S.A. DE C.V.	07/02/2012	0 \$	120.481.28 \$	120.481.28 \$	120.481.28 \$	116.648.12 \$	116.648.12 \$				0 \$	0 \$	116.648.12	10.2%
45B12	45001841 (7)	COMPLEY SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	07/02/2012	0 \$	85.568.95 \$	85.568.95 \$	85.568.95 \$	43.725.40 \$					0 \$	0 \$		0.0%
65B12	45001816 (6)	HOCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	16/02/2012	0 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$				3.147.10 \$	16.342.77	16.342.77	94.7%

**L. Buitrago de Curiano**

65M12	45001876	CONCRETO LUCHANIA S.A. DE C.V.	10/02/2012	1.300.000.00 \$	769.814.05 \$	769.814.05 \$	769.814.05 \$	107.107.95 \$	443.065.95 \$	141.170.90 \$			0 \$	0 \$	443.065.95	97.4%
65M12	45001813	HOCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	01/02/2012	990.000.00 \$	1.272.897.33 \$	1.272.897.33 \$	1.272.897.33 \$	1.103.284.54 \$	1.196.174.93 \$				0 \$	0 \$	1.196.174.93	184.2%
15B12	45001818 (8)	PIEZOS S.A. DE C.V.	16/02/2012	0 \$	118.897.00 \$	118.897.00 \$	118.897.00 \$	118.897.00 \$	164.157.74 \$				0 \$	0 \$	164.157.74	107.0%

**Mérida - Quibdó**

71M12	45001847	SUEC S.A. DE C.V.	07/02/2012	9.065.000.00 \$	4.416.652.70 \$	4.416.652.70 \$	4.416.652.70 \$	2.689.662.26 \$	2.980.812.78 \$	308.171.48 \$			0 \$	0 \$	2.980.812.78	94.4%
15B12	45001816 (7)	PIEZOS S.A. DE C.V.	16/02/2012	0 \$	271.189.56 \$	271.189.56 \$	271.189.56 \$	271.189.56 \$	290.123.40 \$				0 \$	0 \$	290.123.40	99.3%
35B12	45001808 (8)	FONDA DE CUMPLIMIENTO S.A. DE C.V.	07/02/2012	0 \$	126.481.29 \$	126.481.29 \$	126.481.29 \$	116.648.12 \$					0 \$	0 \$		0.0%
45B12	45001841 (6)	COMPLEY SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	07/02/2012	0 \$	70.389.26 \$	70.389.26 \$	70.389.26 \$	70.389.26 \$	72.269.05 \$				0 \$	0 \$	72.269.05	41.6%
65B12	45001816 (8)	HOCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	16/02/2012	0 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$	56.489.87 \$				0 \$	0 \$	56.489.87	44.7%

**Quibdó - Tadó**

65M12	45001848	INDUSTRIAS INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	16/02/2012	0 \$	707.865.73 \$	707.865.73 \$	707.865.73 \$	168.489.79 \$					0 \$	0 \$	168.489.79	0.0%
15B12	45001818 (8)	PIEZOS S.A. DE C.V.	16/02/2012	0 \$	111.648.00 \$	111.648.00 \$	111.648.00 \$	111.648.00 \$	97.070.04 \$				0 \$	0 \$	97.070.04	17.0%

0356



PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA



No. Partida	Cuenta No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fin	Comentarios	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Programado B	Limite Autorizado C	Monto En Trámite D	Revisiones - Devoluciones	Saldo Comprobado E	Diferencia D-C+E	Opedito a Flajo de Efectivo	Avance de Cuenta Pagadora	Avance de Cuenta Pagadora (%)	
308C-12	40001804 (E)	FONDA DEL CULMINO, S.A. DE C.V.	07/07/2012	15/01/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE CERRILLO DE AZERO, MALLA METALICA DE TRES CHERSTAS Y TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 120,461.20	\$ 120,461.20	\$ 3,607.58	\$ 3,607.58	\$ 9,961.60	\$ -	\$ -	\$ 9,961.60	\$ -	0.0%	0.0%	
408C-12	40001805 (E)	COMARTE SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/06/2012	10/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS DE ALUMBRADO, MOTONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90,508.86	\$ 90,508.86	\$ 43,720.40	\$ 90,508.86	\$ 27,603.40	\$ -	\$ 90,508.86	\$ 27,603.40	\$ 90,508.86	\$ -	100.0%	100.0%
608C-12	40001816 (E)	ROCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	10/05/2012	21/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALERTEA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 60,813.64	\$ 60,813.64	\$ 60,813.64	\$ 60,813.64	\$ 3,147.10	\$ -	\$ 60,813.64	\$ 3,147.10	\$ 60,813.64	\$ -	30.5%	30.5%
<b>CULMINO - ACAPULECO</b>						\$ 11,440,000.00	\$ 11,440,000.00	\$ 5,720,000.00	\$ 5,720,000.00	\$ 37,526.70	\$ -	\$ 37,526.70	\$ 37,526.70	\$ -	0.0%	0.0%	

808C-12	400017473	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	07/02/2012	15/06/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE MURO MONOLITICO CENTRAL EN PUNTO RECORO DEL KM 24+600 DEL TRAMO DEL KM 20+000 DEL AL. KM 20+000 DE LA AUTOPISTA METEOROLÓGICA ACAPULECO.	\$ 240,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 407,962.27	\$ 20,910.31	\$ -	\$ -	\$ 407,962.27	\$ -	94.6%	94.6%
208C-12	40001806 (E)	CVLTRANS S.A. DE C.V.	07/05/2012	09/12/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE CERRILLO DE AZERO, MALLA METALICA DE TRES CHERSTAS Y TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR.	\$ 175,991.21	\$ 175,991.21	\$ 175,991.21	\$ 175,991.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,991.21	\$ -	0.0%	0.0%
308C-12	40001808 (E)	COMARTE SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/06/2012	10/11/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALERTEA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 115,892.02	\$ 115,892.02	\$ 5,641.58	\$ 106,194.80	\$ -	\$ -	\$ 90,407.27	\$ 90,407.27	\$ -	91.5%	91.5%
408C-12	40001809 (E)	COMARTE SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/06/2012	10/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS DE ALUMBRADO, MOTONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 70,389.26	\$ 70,389.26	\$ 50,609.70	\$ 50,609.70	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,609.70	\$ -	0.0%	0.0%
608C-12	40001810 (E)	ROCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	10/05/2012	21/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALERTEA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 96,480.87	\$ 96,480.87	\$ 56,489.87	\$ 56,489.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,489.87	\$ -	0.0%	0.0%
<b>MALLA - ACAPULECO</b>						\$ 1,120,000.00	\$ 1,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%

208C-12	40001805 (E)	CVLTRANS S.A. DE C.V.	07/05/2012	09/12/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRERA DE CERRILLO DE AZERO, MALLA METALICA DE TRES CHERSTAS Y TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR.	\$ 90,531.12	\$ 90,531.12	\$ 90,531.12	\$ 90,531.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,531.12	\$ -	100.0%	100.0%
408C-12	40001805 (E)	COMARTE SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/06/2012	10/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS DE ALUMBRADO, MOTONES Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 60,508.80	\$ 60,508.80	\$ 43,720.40	\$ 60,508.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,720.40	\$ -	0.0%	0.0%
<b>CULMINO - ACAPULECO</b>						\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ -	\$ -	\$ 1,307,200.00	\$ -	100.0%	100.0%

088C-12	40001742	PROYECTO CIVIL REGIONAL S.A. DE C.V.	16/01/2012	11/06/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ACAPULECO	\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ 1,307,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,307,200.00	\$ -	100.0%	100.0%
088C-12	40001743	ROCHER INGENIERIA S.A. DE C.V.	07/05/2012	10/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ACAPULECO	\$ 1,844,077.00	\$ 1,844,077.00	\$ 1,740,407.50	\$ 1,740,407.50	\$ 23,629.70	\$ -	\$ -	\$ 1,740,407.50	\$ -	20.1%	20.1%
1108C-12	40001734	INGENIERIA Y SERVICIOS PRODUCTIVOS CONSTRUCCION SUPERVISION S.A. DE C.V.	10/02/2012	07/01/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, ESTABILIZACION DEL CORTI, LINDERO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA - ACAPULECO	\$ 1,400,000.00	\$ 1,200,277.00	\$ 1,200,277.00	\$ 744,800.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 470,412.40	\$ -	20.0%	20.0%
1208C-12	40001747	FLORIANO CHAZ JAVIER	07/02/2012	20/09/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, ESTABILIZACION DE OBRAS DE CALIDAD DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ACAPULECO	\$ 1,118,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,000.00	\$ -	100.0%	100.0%
<b>CULMINO - ACAPULECO</b>						\$ 1,118,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ 1,118,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,118,000.00	\$ -	100.0%	100.0%



**PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**

No. Puesto	Concepto No.	Empresa	Periodo del Contrato	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Reservaciones - Contingencias	Redes Contratado G	Diferencia D-C-D1	Estado a Fines de Ejecución	Avance Programado (%)	Alfabeto de Control
133M-12	400016146	GLUSTON SERVICIOS Y CONSULTORIA PARA OBRAS PÚBLICAS S.A. DE C.V.	16/02/2012 - 19/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LOS KM. 25+815 AL KM. 26+000 Y DEL 26+000 AL KM. 26+400 DE LA AUTOPISTA GUERRERAS-ACAPULCO.	\$ 600,000.00	\$ 732,469.76	\$ 732,469.76	\$ 478,851.19	\$ 478,246.11	\$ 104,858.99			\$ 32,433.60	\$ 478,246.11	98.2%	
143M-12	400016142	COMERCIAL CONSTR. S.A. DE C.V.	01/03/2012 - 19/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN EL KM. 22+800 AL KM. 23+000 DE LA AUTOPISTA GUERRERAS-ACAPULCO.	\$ 500,000.00	\$ 707,136.71	\$ 707,136.71	\$ 797,116.71	\$ 992,972.72	\$ 14,168.89				\$ 182,973.72	94.0%	
233C-12	400016145	CIVIL TRANS. S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 06/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE DEFENSA METÁLICA DE TRILLOS, DREPAS Y ALICATADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR.		\$ 60,331.12	\$ 60,331.12	\$ 60,331.12	\$ 60,331.12					\$ 60,331.12	100.0%	
303M-12	400016148	FOUZA DE CUIRINKA, S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 07/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ANTICLUMBRANTE Y MALLA SINGADA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 120,481.29	\$ 126,481.29	\$ 110,848.12	\$ 110,648.12					\$ 110,648.12	92.2%	
423C-12	400016141	COMSETYL SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 08/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ANTICLUMBRANTE, INDICADORES DE ALICATADO, MOTONES Y SENAAMIENTO AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 66,666.66	\$ 66,666.66	\$ 43,750.40					\$ 43,750.40		0.0%	
033C-12	400016140	ROCKEER INGENIERIA, S.A. DE C.V.	16/02/2012 - 26/02/2012	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE JAMAS VINCULADAS DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DEL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS AISLADAS EN TRAMOS AISLADOS EN INSTANTANEA AUTOPISTAS.		\$ 62,899.16	\$ 62,899.16	\$ 62,899.16	\$ 62,899.16				\$ 3,147.10	\$ 60,652.06	99.0%	
153M-12	400016143	LAUDATORIO DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	01/02/2012 - 26/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE GEOMETRÍA Y ALICATADO EN LOS TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 6,000,000.00	\$ 4,002,840.77	\$ 4,002,840.77	\$ 2,622,004.60					\$ 2,622,004.60		0.0%	
283C-12	400016146	CIVIL TRANS. S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 09/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ANTICLUMBRANTE, INDICADORES DE ALICATADO, MOTONES Y SENAAMIENTO AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 66,331.12	\$ 66,331.12	\$ 66,331.12					\$ 66,331.12		0.0%	
323C-12	400016148	FOUZA DE CUIRINKA, S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 16/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ANTICLUMBRANTE Y MALLA SINGADA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 126,481.29	\$ 126,481.29	\$ 9,691.58	\$ 110,648.12				\$ 10,000.54	\$ 110,648.12	92.2%	
423C-12	400016141	COMSETYL SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 16/12/2012	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ALICATADO, MOTONES Y SENAAMIENTO AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 66,666.66	\$ 66,666.66	\$ 43,750.40					\$ 43,750.40		0.0%	
253C-12	400016146	CIVIL TRANS. S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 06/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE DEFENSA METÁLICA DE TRILLOS, DREPAS Y ALICATADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR.		\$ 60,331.12	\$ 60,331.12	\$ 60,331.12					\$ 60,331.12		0.0%	
423C-12	400016141	COMSETYL SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 16/12/2012	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ALICATADO, MOTONES Y SENAAMIENTO AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 66,666.66	\$ 66,666.66	\$ 43,750.40					\$ 43,750.40		0.0%	
283C-12	400016146	CIVIL TRANS. S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 09/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE DEFENSA METÁLICA DE TRILLOS, DREPAS Y ALICATADO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR.		\$ 60,331.12	\$ 60,331.12	\$ 60,331.12					\$ 60,331.12		0.0%	
423C-12	400016141	COMSETYL SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	07/02/2012 - 16/12/2012	SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO MAYOR EN LAS OBRAS DE ALICATADO, MOTONES Y SENAAMIENTO AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA.		\$ 66,666.66	\$ 66,666.66	\$ 43,750.40					\$ 43,750.40		0.0%	





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

01/01/2012 - 31/12/2012

No. Proyecto	Comunidad No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Programado B	Elemento Asumido C	Monto En Trámite D	Heterogeneas - Desdobladas	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejército o Faja de Ejército	Avance (Porcentaje %)	Alcance de Control Pagador
3090-12	400018208 (12)	FONDA DE GUERREHO S.A. DE C.V.	07/05/2012	16/11/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 120.461.20	\$ 120.461.20	\$ 116.646.12	\$ 116.646.12			\$ -	\$ -	\$ 116.646.12	97.2%	
4090-12	400018051 (14)	COMSETEL SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/05/2012	19/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 59.549.80	\$ 59.549.80	\$ 43.750.40	\$ 59.549.80			\$ -	\$ 22.803.40	\$ 99,000.00	100.0%	
4090-12	400018164 (16)	BOCHEN INGENIERIA S.A. DE C.V.	16/06/2012	20/06/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 59.489.07	\$ 59,489.07	\$ 59,489.07	\$ 59,489.07			\$ -	\$ 3,147.00	\$ 56,342.07	94.7%	
<b>SUBTOTAL PUEBLA</b>																	
4090-12	400018228	LABORATORIO DE ENSAYO Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	24/05/2012	20/01/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 759,004.90	\$ 759,004.90	\$ 759,004.90				\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	
4090-12	400018112				SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 1,620,000.00						\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	
2090-12	400018086 (8)	CHULTANS S.A. DE C.V.	07/05/2012	06/12/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 90,600.00	\$ 90,600.00	\$ 90,600.00	\$ 90,600.00			\$ -	\$ 90,600.00	\$ -	0.0%	
3090-12	400018088 (13)	FONDA DE GUERREHO S.A. DE C.V.	07/05/2012	16/11/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 119,992.02	\$ 119,992.02	\$ 108,158.60	\$ 108,158.60			\$ -	\$ -	\$ 108,158.60	91.0%	
<b>SUBTOTAL CALDAS</b>																	
						\$ 5,946,200.00	\$ 5,946,200.00	\$ 5,946,200.00	\$ 5,946,200.00	\$ 5,946,200.00	\$ 5,946,200.00	\$ 41,672.37	\$ 279,653.00	\$ -	\$ 4,424,924.67	74.4%	

CAJAZO CALDAS

Chempobán - Compañía

2090-12	400017448	INGENIEROS CIVILES A.M.M. S.A. DE C.V.	01/02/2012	12/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 1,825,000.00	\$ 1,825,476.67	\$ 1,978,476.67	\$ 1,968,824.62	\$ 1,711,656.46	\$ 0,644.34	\$ -	\$ 727,169.44	\$ 1,711,656.46	93.6%	
4090-12	400018081 (16)	COMSETEL SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/05/2012	18/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 60,600.00	\$ 60,600.00	\$ 43,750.40	\$ 60,600.00			\$ -	\$ 22,803.40	\$ 70,000.00	100.0%	

CE. Ma. Sumpahan

2090-12	400017460	INGENIEROS CIVILES A.M.M. S.A. DE C.V.	01/02/2012	14/05/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 20,000.00	\$ 20,130.21	\$ 20,130.21				\$ -	\$ -	\$ -	0.0%	
2100-12	400018201	LABORATORIO DE ENSAYO Y SUPERVISION S.A. DE C.V.	01/06/2012	21/01/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 6,756,000.00	\$ 3,707,306.73	\$ 2,940,420.85	\$ 1,973,200.92	\$ 497,822.71		\$ -	\$ 29,671.96	\$ 1,973,200.92	41.8%	
4090-12	400018041 (17)	COMSETEL SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/05/2012	18/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 78,395.20	\$ 78,395.20	\$ 60,820.10	\$ 78,395.20			\$ -	\$ 21,003.16	\$ 78,395.20	100.0%	
0890-12	400018140 (9)	BOCHEN INGENIERIA S.A. DE C.V.	16/06/2012	20/06/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO ESPECIAL A DASE EN PAVIMENTO DE CABLES DE ACERO, MALLA ANTI-SUBSUNTANTE Y MALLA OROGADA EN MANOS ATLASADOS EN TRAMOS ATLASADOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		\$ 69,813.84	\$ 69,813.84	\$ 69,813.84	\$ 69,813.84			\$ -	\$ 3,147.00	\$ 69,813.84	96.5%	







CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Proceso	Código No.	Empresa	Período del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Nóvato Autorizado Modificado	Monto Cancelado A	Monto Programado B	Gremio Autorizado C	Monto Ejecutado D	Monto Ejecutado B+C+D	Porcentaje de Ejecución	Monto de Costos en 2012	Porcentaje de Ejecución
			Inicio	Fin											
2884-12	48001762	CONTRUCTORA NARRAGONGA, S.A. DE C.V.	18/02/2012	22/11/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE TERMINALES NACIONALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA Y DEL SUBSECTOR CARRETERO EN LOS TUNAJES DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL ESTADO ZULIA	2.760.000,00	1.432.479,30	1.432.479,30	1.103.687,00	1.103.687,00	1.103.687,00	100,0%		100,0%	
2885-12	48001854	CONSTRUTORA S.A. DE C.V.	06/02/2012	06/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		340.000,00	340.000,00	171.705,40	40.807,19	80.342,30	80.342,30	24,0%		24,0%
2886-12	48001855	FORSA DE CALABOHO S.A. DE C.V.	07/02/2012	16/01/2013	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	
4800-12	48001851	CORSALETA SUPERVISORA S.A. DE C.V.	07/02/2012	18/11/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		96.548,66	96.548,66	42.729,40	16.548,96	35.031,36	61.548,06	100,0%		100,0%
4800-12	48001851	ROCHEL IRON S.A. DE C.V.	08/02/2012	26/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	
2894-12	48001766	CONSTRUTORA NARRAGONGA, S.A. DE C.V.	15/02/2012	22/11/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL DE TRANSFERENCIA DE TERMINALES NACIONALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	3.496.000,00	2.402.274,94	2.402.274,94	1.599.479,09	1.070.004,09	740.073,61	1.070.004,09	100,0%		100,0%
2895-12	48001856	CONSTRUTORA S.A. DE C.V.	07/02/2012	07/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	
2896-12	48001855	FORSA DE CALABOHO S.A. DE C.V.	07/02/2012	18/11/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		128.481,70	128.481,70	0,00	0,00	0,00	0,0%		0,0%	
4800-12	48001851	CONSTRUTORA S.A. DE C.V.	07/02/2012	18/11/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		86.000,00	86.000,00	43.770,40	0,00	0,00	86.000,00	100,0%		100,0%
4800-12	48001854	CONSTRUTORA S.A. DE C.V.	18/02/2012	26/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		68.813,64	68.813,64	0,00	0,00	0,00	68.813,64	100,0%		100,0%
3894-12	48001871	CONSTRUTORA NARRAGONGA, S.A. DE C.V.	04/02/2012	17/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	668.000,00	776.452,60	776.452,60	487.367,25	302.368,41	14.886,42	302.368,41	45,7%		45,7%
3184-12	48001859	FORSA DE CALABOHO S.A. DE C.V.	22/02/2012	28/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA DE MANTENIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE TERMINALES DE AUTOPUERTOS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	750.000,00	680.282,81	680.282,81	680.282,81	0,00	27.934,59	680.282,81	100,0%		100,0%

Handwritten signature and initials.



CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRIERA

PROGRAMA DE SUPERVISIÓN DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Partida	Cuenta No.	Empresa	Periodo del Contrato Inicial	Fecha	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Monto Programado B	Estimado Acumulado C	Monto La-Terminada D	Homoncias - Devoluciones	Debito Cancelado E	Diferencia ILC-DE	Ejecución a Flujos de Echeques	Avance Realizado (%)	Alícuota de Costos Partición
280C-12	480018000 (16)	CONTRALAM S.A. DE CV	07/02/2012	07/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE MONITOREO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 90.000.00	\$ 90.000.00	\$ 90.000.00	\$ 78.660.00	\$ 90.000.00	\$ -	\$ -	\$ 78.660.00	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%
<b>REVENUSA</b>																	
						\$ 11.420.000.00	\$ 11.420.000.00	\$ 11.420.000.00	\$ 11.420.000.00	\$ 11.420.000.00	\$ -	\$ -	\$ 11.420.000.00	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%

<b>Melipal - Maypo</b>																	
280C-12	480018000 (16)	CONSULTING DE INGENIERIA S.A. DE CV	22/02/2012	06/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL KM 70+000 AL KM 40+000 CUERPO "A" Y DEL KM 40+000 AL KM 30+000 CUERPO "B" DE LA AUTOPISTA MAYPO-REVENUSA	\$ 9.000.000.00	\$ 4.986.029.78	\$ 4.986.029.78	\$ 5.000.981.99	\$ 2.894.029.68	\$ -	\$ -	\$ 195.241.00	\$ -	\$ 2.894.029.68	51.4%	51.4%
180C	480018100 (8)	PROCESOS SA DE CV	16/02/2012	16/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA DE LAS BARRERAS Y PANTALLAS DE TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 137.120.25	\$ 137.120.25	\$ 96.800.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 96.800.13	\$ -	0.0%	0.0%
<b>MONTICORREY</b>																	
						\$ 137.120.25	\$ 137.120.25	\$ 137.120.25	\$ 137.120.25	\$ 137.120.25	\$ -	\$ -	\$ 137.120.25	\$ -	\$ -	0.0%	0.0%

<b>Melipal - Nuevo Laredo</b>																	
280C-12	480018000 (16)	MC CONSORCIO DE INGENIERIA S.A. DE CV	20/02/2012	03/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PANTALLAS METÁLICAS DEL KM 0+000 AL KM 147+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA MONTEPERE-PUERTO HERRERA	\$ 416.000.00	\$ 384.816.09	\$ 384.816.09	\$ 384.816.09	\$ 384.816.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 384.816.09	100.0%	100.0%
280C-12	480018100 (8)	SOCAL SUPERVISIÓN CONSULTORIA, AS & A CONSULTING S.A. DE CV	23/02/2012	23/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO MEDIANTE LOMAS DE CONCRETO HORIZONTAL DEL KM 70+000 AL KM 60+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA MONTEPERE-PUERTO HERRERA	\$ 11.800.000.00	\$ 2.413.031.24	\$ 2.413.031.24	\$ 1.833.819.83	\$ 1.833.819.83	\$ 240.000.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.833.819.83	10.8%	10.8%
180C	480018100 (8)	PROCESOS SA DE CV	16/02/2012	16/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DEFENSA METÁLICA DE LAS BARRERAS Y PANTALLAS DE TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 292.035.77	\$ 292.035.77	\$ 207.000.04	\$ -	\$ 10.016.17	\$ -	\$ -	\$ 207.000.04	\$ -	10.0%	10.0%
280C-12	480018000 (8)	FONCA DE OULIHUEND. S.A. DE CV	07/02/2012	10/01/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS DE CABLES DE ACERO, MALLA METÁLICA Y PANTALLAS DE TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 129.481.20	\$ 129.481.20	\$ 97.419.06	\$ 116.648.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.648.12	\$ -	10.7%	10.7%
<b>Tirén - Baillín</b>																	
280C-12	480018000 (16)	MC CONSORCIO DE INGENIERIA S.A. DE CV	20/02/2012	18/02/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PANTALLAS VERTICALES Y HORIZONTALES DEL KM 0+000 AL KM 70+000 TRAMO PLAN DE AYALÁ DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ 796.000.00	\$ 410.130.89	\$ 410.130.89	\$ 410.130.89	\$ 410.130.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 410.130.89	100.0%	100.0%
280C-12	480018100 (8)	SOAL CONSULTORIA Y SERVICIOS S.A. DE CV	13/02/2012	27/01/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA TRATAMIENTO SUPERFICIAL A BASE DE CEMENTO DEL KM 0+000 AL KM 71+000 CUERPO "A" DE LA AUTOPISTA BAILLÍN-TIRÉN	\$ 1.800.000.00	\$ 1.105.142.77	\$ 1.105.142.77	\$ 1.105.142.77	\$ 1.002.482.29	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102.659.48	\$ -	61.4%	61.4%
<b>Colchagua - Empuque</b>																	
180C	480018100 (11)	PROCESOS SA DE CV	16/02/2012	16/12/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TERMINALES DE MONITOREO DE IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 148.719.64	\$ 148.719.64	\$ 148.719.64	\$ 134.309.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148.719.64	\$ -	91.0%	91.0%
280C-12	480018000 (8)	FONCA DE OULIHUEND. S.A. DE CV	07/02/2012	10/01/2012	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRERAS DE CABLES DE ACERO, MALLA METÁLICA Y PANTALLAS DE TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 193.481.20	\$ 193.481.20	\$ 116.648.12	\$ 116.648.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116.648.12	\$ -	97.2%	97.2%
480C-12	480018000 (14)	COMSETEL SUPERVISIÓN S.A. DE CV	07/02/2012	10/12/2012	ANTIDEBLUMBRANTES, INDICADORES DE DEFORMACIÓN Y VERTICALES EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 65.659.86	\$ 65.659.86	\$ 43.754.49	\$ 65.659.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43.754.49	\$ -	100.0%	100.0%
680C-12	480018100 (16)	ROCHE INGENIERIA S.A. DE CV	16/02/2012	26/02/2012	SUPERVISIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO DEL KM 0+000 AL KM 70+000 TRAMO PLAN DE AYALÁ DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$ -	\$ 94.418.87	\$ 94.418.87	\$ 94.418.87	\$ 63.342.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63.342.77	\$ -	94.1%	94.1%

*[Handwritten signature]*







CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS  
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMA DE SUPERVISION DEL MANTENIMIENTO MAYOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

No. Paralela	Código No.	Empresa	Periodo del Contrato (Inicio)	Fin	Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monte Comprobado A	Monte Programado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Relaciones Derivadas E	Saldo Cancelado E	Diferencia B-C-D-E	Ejército a Flujos de Efectivo	Antes de Emisión (F)	Agencia de Crédito Pagador
4884-12	488017245	GESTION INMOBILIARIA Y CONSULTORIA PAMA OMA PUBLICA, S.A. DE C.V.	15/04/2012	13/09/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, LUBRIFICACION DEL CORTE DE LA CARRETERA EN EL TRAMO ASIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, ESTADO DE GUANAJUATO	446,000.00	400,377.72	400,377.72	400,377.72	361,319.68				30,000.00	30,219.06	90.3%	
4784-12	480011948	JM SUPERVISION Y CONSTRUCCION DEL V	03/02/2012	08/02/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE CUATRO TERMINALES EN ESTADO CRITICO Y SUS ANEXOS EN EL TRAMO ASIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, ESTADO DE GUANAJUATO		749,446.26	749,446.26	128,795.34					126,795.34		0.0%	
6084-12	480018864	SEMANA ASISTORIA EN INGENIERIA DE R.L. DE C.V.	24/02/2012	12/01/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL KM 12/000 AL KM 12/000 EN EL TRAMO ASIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, ESTADO DE GUANAJUATO		189,601.09	189,601.09								0.0%	
2884-12	480018865 (16)	CVLTIAMND, S.A. DE C.V.	01/05/2012	01/12/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO Y COLOCACION DE PANTALLAS DE TRAFICO EN LAS CERCANIAS DEL TRAMO ASIALES DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR		340,956.59	340,956.59		182,716.49				157,716.49	182,716.49	13.6%	
6884-12	480018866 (17)	RODHE INGENIERIA S.A. DE C.V.	10/03/2012	29/03/2012	DE CONSTRUCCION DE BANDAS VERTICALES DE ALERTA EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR		204,896.12	204,896.12	274,896.12	136,642.37				66,613.76	35,842.37	10.4%	
<b>SUBTOTAL GUANAJUATO</b>																	
						446,000.00	3,075,819.49	3,075,819.49	2,845,603.32	2,845,603.32	273,888.77			148,799.17	273,420.11	66.9%	

OAXACA

Contratos - Oaxaca

4184-12	480017345	PACCIA INGENIERIA S.A. DE C.V.	27/02/2012	21/01/2013	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR	10,800,000.00	3,975,819.49	3,975,819.49	2,845,603.32	2,845,603.32		21,776.68			2,867,380.00	16.7%	
2884-12	480018866 (17)	CVLTIAMND, S.A. DE C.V.	07/02/2012	04/12/2012	SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA SUMINISTRO DE TRAFICO EN LOS TERMINALES DE AMPLIAMIENTO DEL IMPACTO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR		160,809.00	160,809.00						90,558.00	90,899.00	100.0%	
4884-12	480018861 (18)	COMARTEL SUPERVISION S.A. DE C.V.	07/02/2012	18/11/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALLAS ANTI-DESEMBALES, INDICADORES DE DIRECCION DE TRAFICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		68,468.89	68,468.89	43,734.40	62,479.10				18,740.79	62,479.10	90.9%	
6884-12	480018140 (19)	RODHE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	14/02/2012	29/03/2012	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR		62,959.15	62,959.15	62,959.15	66,852.00				3,147.10	66,852.00	100.0%	
						10,800,000.00	4,102,826.53	4,102,826.53	3,295,366.97	3,295,366.97		21,776.68		165,135.89	3,462,502.86	68.2%	

OTRAS CONTRALES

1884-12					SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, ZONA SUR	15,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00								0.0%	
8884-12					SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA COMISION DE EMPODORADO EN LA RED DE AUTOPISTAS DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		1,600,000.00									0.0%	
						15,000,000.00	7,600,000.00	7,600,000.00							0.0%		
						31,800,000.00	11,702,826.53	11,702,826.53	3,295,366.97	3,295,366.97	3,295,366.97			165,135.89	4,857,869.83	53.1%	

Verde Finito


Handwritten signature

Fecha del corte: 15 de Octubre de 2012

Deliberación	Seguimiento al Avance de Obra										Seguimiento al Avance Presupuestal		
	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Modificado	Monto Contratado A	Programado Acumulado B	Estimado Acumulado C	Monto En Trámite D	Saldo Cancelado E	Diferencia B - C - D - E	Ejercido a Flujo de Efectivo	Rotaciones - Ovoluciones	Aplicar de Costos Pajados	Avance Financiero (%)	Avance físico (%)
Tijuana	\$ 24,000,000.00	\$ 23,927,867.40	\$ 23,927,867.40	\$ 15,982,792.46	\$ 16,154,980.83	\$ 809,111.46		-\$	\$ 10,154,980.83	\$ 55,086.65		67.2%	72.4%
Culiacán	\$ 20,000,000.00	\$ 21,165,371.74	\$ 21,165,371.74	\$ 14,629,476.75	\$ 14,464,061.24			\$	\$ 14,531,066.80	\$ 93,598.34	\$ 47,007.58	61.1%	68.1%
Querétaro	\$ 72,000,000.00	\$ 74,708,345.79	\$ 74,708,345.79	\$ 48,508,362.88	\$ 58,182,578.02			-\$	\$ 58,290,893.44	\$ 98,923.29	\$ 117,315.42	75.1%	76.3%
Guerrero	\$ 60,000,000.00	\$ 57,735,588.52	\$ 57,735,588.52	\$ 38,535,441.19	\$ 36,573,320.01	\$ 1,387,007.83		\$	\$ 36,573,320.01	\$ 41,914.71		63.1%	67.7%
Puebla	\$ 45,700,000.00	\$ 36,484,029.10	\$ 36,484,029.10	\$ 26,036,900.04	\$ 23,483,839.43	\$ 2,516,471.82		\$	\$ 23,483,839.43	\$ 107,241.77		64.4%	71.4%
Coahuila	\$ 50,000,000.00	\$ 46,076,188.42	\$ 46,076,188.42	\$ 34,570,491.00	\$ 28,382,238.16	\$ 5,030,821.11		-\$	\$ 28,382,238.16	\$ 151,437.24	\$ 301,211.44	60.1%	61.1%
Veracruz	\$ 45,900,000.00	\$ 45,175,522.77	\$ 45,175,522.77	\$ 32,923,773.38	\$ 35,980,725.49	\$ 2,208,900.71		-\$	\$ 36,191,936.93	\$	\$	79.4%	89.5%
Quintana Roo	\$ 10,000,000.00	\$ 8,031,873.58	\$ 8,031,873.58	\$ 6,040,755.50	\$ 5,454,193.29			\$	\$ 5,454,193.29	\$ 29,896.09		67.9%	66.9%
* Guadalupe	\$ 50,200,000.00											0.0%	0.0%
Monterrey	\$ 81,000,000.00	\$ 89,423,234.07	\$ 89,423,234.07	\$ 48,852,810.29	\$ 44,292,380.04	\$ 3,849,975.82		-\$	\$ 44,292,380.04	\$ 113,894.21		63.8%	61.1%
Chihuahua	\$ 26,000,000.00	\$ 24,117,514.20	\$ 24,117,514.20	\$ 17,439,405.76	\$ 14,887,018.27	\$ 1,854,086.04		\$	\$ 14,887,018.27	\$ 133,656.42		60.9%	71.5%
Oaxaca	\$ 30,000,000.00	\$ 28,760,965.01	\$ 28,760,965.01	\$ 19,269,431.21	\$ 17,424,753.99	\$ 1,228,962.91		\$	\$ 17,433,028.76	\$ 74,558.58	\$ 8,274.77	60.6%	65.6%
<b>TOTAL</b>	\$ 530,000,000.00	\$ 436,207,240.58	\$ 436,207,240.58	\$ 298,869,633.95	\$ 292,990,218.77	\$ 18,894,237.70		-\$	\$ 293,464,027.96	\$ 875,067.30	\$ 473,809.19	67.2%	71.7%

\* Recursos presupuestales no incluidos por la desmembración del ítem.

Avance Financiero Seguimiento a Obra (No incluye anticipos)

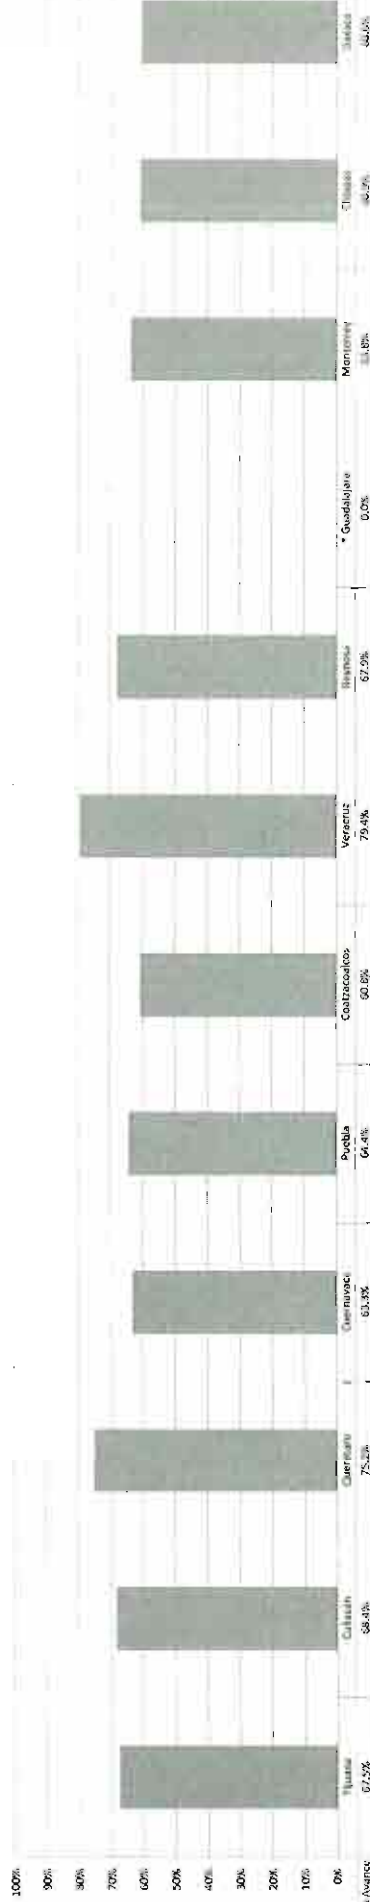

000 0366











**CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS**  
**DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO MENOR 2012 DE LA RED DEL FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**



Nro. Partida	Contrato No.	Empresa	Periodo del Contrato		Concepto	Monto Original Autorizado	Monto Autorizado Reembolsado	Monto Concrecionado	Monto Programado	Estimado Acumulado	Monto En Trámite	Retenciones y Deducciones	Saldo Cancelado	Diferencia (D-C+DE)	Comisión a Pagar (de Factura)	Monto Reembolsado	Diferencia (F-P)	Monto a Pagar	Monto de Cobro
			Inicio	Fin															
50M-12	46881734	GRUPO COMERCIAL JEDI, S.A. DE C.V.	01/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 0+000 AL KM 12+000 DEL C. D. CUAGUAPULCAN - OTOCACA	30,000,000.00	13,549,607.30	13,640,607.30	6,256,476.02	10,384,207.18	100,000.00	-	-	1,240,445.98	10,111,611.00	61.0%	17,000,000.00	0	0,274.77
51M-12	46881749	INNOVACION EN VALORES S.A. DE C.V.	01/02/2012	31/01/2013	MANTENIMIENTO MENOR DEL KM 17+000 AL KM 20+000 DEL C. D. CUAGUAPULCAN - OTOCACA	30,000,000.00	10,211,507.92	10,211,507.92	10,012,866.10	7,171,200.33	1,000,200.00	14,948.46	-	1,800,160.46	7,171,200.33	46.0%	0	0	0
<b>TOTAL</b>						<b>60,000,000.00</b>	<b>23,761,115.22</b>	<b>23,852,115.22</b>	<b>16,269,342.12</b>	<b>17,555,407.51</b>	<b>1,000,200.00</b>	<b>14,948.46</b>	<b>-</b>	<b>3,040,606.44</b>	<b>17,182,807.07</b>	<b>58.6%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

000 0370

*[Handwritten signature]*

---

**Memoria Documental**  
**Programa de Mantenimiento y Modernización de la**  
**Red Operada por Contrato del Fondo Nacional de**  
**Infraestructura (FNI)**

**Anexo 7**

---

*[Handwritten mark]*

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**

"2008, Año de la Educación Física y el Deporte"

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

*C. Tajito*  
*Conoc*

**Oficio S.C./ 035 /2008**

**Asunto:** Avance al cuarto trimestre y 6to. Bimestre 2007 de las acciones competencia de la Dirección Técnica.

Cuernavaca, Mor., 21 de Enero de 2008

001647  
CAMINOS Y PUENTES  
FEDERALES DE INGRESOS  
Y SERVICIOS CONEXOS  
2008 ENE 21 07 11 02  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y ARCHIVO

**LIC. MARIANO CHIMES FERNÁNDEZ**  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO**  
**PRESENTE**

En atención a sus comunicados DPD/003/07 y DPD/008/07 donde solicita se proporcione el informe de avances físicos y financieros con cifras correspondientes al 6to. Bimestre de 2007 y el avance al cuarto trimestre de las acciones competencia de la Dirección Técnica, con el propósito de dar seguimiento al grado de cumplimiento de las acciones comprometidas por la Dirección Técnica en el programa de trabajo institucional 2007 respectivamente. En seguimiento de las instrucciones del Director Técnico, le comento que la información que solicitó, se le envió el día jueves 17 del mes en curso al correo electrónico de Alberto Oliva Torres.

**ATENTAMENTE**

*[Firma]*  
**ING. ALEJANDRO MONTEJO VÁZQUEZ**  
**SUBDIRECTOR DE CONSERVACIÓN**

**RECIBIDO**  
13:09 hrs  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

**RECIBIDO**  
21 ENE. 2008  
13:36  
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

- Ccp.- **ING. OMAR ORTIZ RAMÍREZ** - Director Técnico. cvazquez@
- ING. LUIS SÁNCHEZ GARCÍA** - Subdirector de Construcción y Programación. lsanchezg@
- ING. RUBEN CUELLAR SALAZAR** - Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico. rcuellar@
- ING. AGUSTÍN ALVARADO SARAIVA** - Subdirector de Evaluación de Obra.

Atiente turno D.T. 20800001 y 20800004

CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO  
INSTITUCIONAL 2007  
(CUARTO TRIMESTRE)

 caminos y  
puentes



SCT

0

0373

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE

Acción	Meta Original	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Unidad de medida	Programado						Avance Real				Realizado vs. Programado en el período	Realizado Acumulado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Enero-Marzo	Abr-Junio	Julio-sept.	Oct-Dic					
Servicio de paso en la Red Operada	464.70	464.70	464.70	464.70	Millones de vehículos	113.30	114.90	117.50	119.00	110.50	114.90	116.50	109.90	92.35%	97.22%			
Red FARAC	346.90	346.90	346.90	346.90	Millones de vehículos	87.70	85.60	88.00	89.40	81.90	84.30	86.20	79.00	88.37%	95.53%	No se cumplió la meta debido a la desincorporación de los tramos carreteros Maravatio-Zapotlanejo, Guadalupe-Zapotlanejo, León-Lagos-Aguascalientes y Zapotlanejo-Lagos de Moreno a partir del 3 de octubre del 2007.		
Ingreso por peaje en la Red Operada:	24,409.90	24,409.90	24,409.90	-	mdp	5,847.40	6,121.00	6,146.10	6,295.40	5,630.90	6,048.00	6,199.20	5,796.10	92.07%	97.81%			
Red FARAC	21,101.80	21,101.80	21,101.80	21,101.80	mdp	5,060.70	5,276.00	5,337.20	5,457.90	5,022.20	5,197.00	5,353.90	4,940.90	90.53%	97.21%	No se cumplió la meta debido a la desincorporación de los tramos carreteros Maravatio-Zapotlanejo, Guadalupe-Zapotlanejo, León-Lagos-Aguascalientes y Zapotlanejo-Lagos de Moreno a partir del 3 de octubre del 2007.		
Ingreso por la prestación de servicios de Operación y Mantenimiento en las Redes FARAC y Contratada:	842.72	842.72	842.72	-	mdp	210.68	210.68	210.68	210.68	265.00	214.90	213.90	277.16	131.55%	115.21%			
Red FARAC	827.80	827.80	827.80	827.80	mdp	206.95	206.95	206.95	206.95	260.90	209.20	209.20	271.99	131.40%	114.92%			
Obra Publica Red FARAC																		
Instalar Plantas modulares para el tratamiento de aguas residuales en las plazas de cobro	25.00	18.00	18.00	18.00	Plantas			1.00	17.00			1.00	3.00	17.65%	22.22%	Otra que fue cancelada derivado por problemas sociales de la población de Tres Marias.		
Tres Marias	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta											Dicha planta no fue terminada en virtud de que se elaboró un convenio de diferimiento por entrega tardía del anticipo. Obras que se prevé finalizar para el ejercicio 2008.		
Parador "Servicio Médico"		1.00	1.00	1.00	Planta				1.00							Dicha planta no fue terminada en virtud de que se elaboró un convenio de diferimiento por entrega tardía del anticipo. Obras que se prevé finalizar para el ejercicio 2008.		
Iguala		1.00	1.00	1.00	Planta				1.00							Dicha planta no fue terminada en virtud de que se elaboró un convenio de diferimiento por entrega tardía del anticipo. Obras que se prevé finalizar para el ejercicio 2008.		
Paseo Morelos	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00							Dicha planta no fue terminada en virtud de que se elaboró un convenio de diferimiento por entrega tardía del anticipo. Obras que se prevé finalizar para el ejercicio 2008.		
Palo Blanco	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00							Dicha planta no fue terminada en virtud de que se elaboró un convenio de diferimiento por entrega tardía del anticipo. Obras que se prevé finalizar para el ejercicio 2008.		



**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE

Acción	Meta Original	Meta Modificado I	Meta Modificado II	Meta Modificado III	Unidad de medida	Programado				Avance Real				Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado Acumulado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Marzo	Abr-Junio	Julio-sept.	Oct-Dic			
La Venta	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta			1.00								Dicha planta no fue terminada en virtud de que se elaboró un convenio de fideicomiso por entrega de las obras de mantenimiento. Obras que se prevé finalizar para el ejercicio 2008.
Tanco	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Zicatlan	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Central de Abasco	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Aeropuerto Cuerpo "A"	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Aeropuerto Cuerpo "B"	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Xochitlpec	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Gasas de Alpujeca	1.00	-	-	-	Planta											Esta planta fue cancelada a petición de la Delegación, ya que no la consideraron prioritaria.
Alpujeca	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta			1.00				1.00		100.00%		Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.
Puente Internacional Gal. Ignacio Zaragoza	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00							Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.
No. 108 Sabinas, km. 100+000 de Monterrey-Nuevo Laredo	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta					1.00						Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.
No. 128 General Bravo, km. 120+000 de Cadereyta-Repussa	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta						1.00					Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.
No. 141 Los Chorros, km. 203+650 de Puerto México-La Carbonera	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta							1.00				Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.
No. 142 Huchichil, km. 213+700 de Puerto México-La Carbonera	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta							1.00				Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.



**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE

Acción	Meta Original	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Unidad de medida	Programado						Avance Real				Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado Acumulado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Marzo	Abr-Junio	Julio-sept.	Oct-Dic					
No. 140 La Carbonera, km. 12-300 de La Carbonera-Ojo Caliente	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-							Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.	
No. 163 La Cuchilla, km. 67-000 de Torreón-Saltillo	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-							Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.	
No. 162 Plan de Ayala, km. 229-500 de Torreón-Saltillo	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-							Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.	
No. 180 Barmejillo, km. 44-200 de Gómez Palacio-Corrillos	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-							Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.	
No. 161 Ceballos, km. 128-750 de Gómez Palacio-Corrillos	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-							Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.	
No. 179 Las Choapas, km. 17-000 de Las Choapas-Raudales-Ocozacoautla	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-					1.00	100.00%		
No. 181 Malpaisito, km. 112-000 de Las Choapas-Raudales-Ocozacoautla	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-					1.00	100.00%		
No. 182 Ocozacoautla, km. 182-200 de Las Choapas-Raudales-Ocozacoautla	1.00	1.00	1.00	1.00	Planta				1.00	-					1.00	100.00%		
Conservación Mayor de Autopistas:	921.87	828.56	830.56	-		232.02	262.18	222.38	113.98	86.93	182.15	231.01	181.48	159.22%		82.30%		
Estación Don-Nogales	21.95	21.95	21.95		km-cuerpo	7.07	11.10	3.78	-	3.24	12.59	5.76	0.36		100.00%		Dicha planta no fue terminada en virtud de que la empresa no ha finalizado los trabajos contratados. Se analiza la posibilidad de una rescisión de contrato.	
México-Querétaro	36.80	36.80	36.80		km-cuerpo	19.50	17.40	-	-	4.40	6.60	13.52	3.28		75.34%		Los trabajos no se concluyeron, principalmente por falta de liquidez de la Empresa Grupo Constructora Diamante, S.A. de C.V., previendo su conclusión en mayo de 2006.	
Querétaro-Tlapualco	102.80	102.80	102.80		km-cuerpo	40.07	38.65	24.08	-	14.78	11.12	61.63	15.37		100.00%			
Mazatlán-Culiacán	118.00	118.00	118.00		km-cuerpo	29.50	44.74	43.76	-	30.28	21.00	49.65	17.07		100.00%			
Cuernavaca-Acapulco	98.20	12.88	14.68		km-cuerpo	7.77	4.91	-	2.00	3.84	10.32	0.48	0.58	29.00%	103.68%		Respecto a la meta modificada, se cumplió con lo programado.	
La Pira-Cuaulla	27.97	25.97	25.97		km-cuerpo	6.85	7.32	6.00	6.00	3.51	10.30	10.80	3.12	52.00%	106.76%		Respecto a la meta modificada, se cumplió con lo programado.	

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE

Acción	Meta Original	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Unidad de medida	Programado				Avance Real				Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado Acumulado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-sept.	Oct-Dic			
Puente de Ixla-Iguala	63.00	35.12	35.12		km-cuerpo	2.17	8.50	9.86	16.59	-	0.88	1.78	8.39	50.53%	31.41%	La meta modificada para el 2007 no fue posible cumplida debido a atraso en los contratos de las empresas Proyecistas y Construcciones del Centro en el tramo del 0+000 al km 26+000 y de la empresa ROSTEC del tramo del 26+000 al 63+000. El cumplimiento de la meta anual se prevé concluya en el mes de marzo de 2008.
Zanapallo-Rancho Viejo	17.13	14.68	14.68		km-cuerpo	-	-	7.34	7.34	-	-	-	7.88	107.32%	53.85%	Con ligero atraso de la empresa ROSTEC & Impulsora de Maquinaria y Constructora en el tramo del 0+000 al km 17+124 a causa de la entrega tardía del anticipo y por problemas en la liberación del banco de materiales petroleros. El cumplimiento de la meta anual se prevé concluya en el mes de febrero de 2008.
México-Puebla	10.31	10.31	10.31		km-cuerpo	5.67	4.64	-	-	4.62	1.72	2.53	1.24		99.85%	En proceso de finiquito. Los trabajos de la ampliación e ingresos carritos están concluidos al 100%, únicamente existen pendientes trabajos de obras complementarias.
Puebla-Acatzingo	138.50	122.48	122.48		km-cuerpo	39.83	35.00	23.52	23.33	-	48.50	5.85	23.42	98.53%	63.50%	La meta modificada para el 2007 no fue posible cumplida debido a atrasos en los contratos de las empresas: Con ligero atraso de la empresa GCP S.A. de C.V. en la rehabilitación del km 172+500 al km 195+000 los trabajos iniciaron después de la fecha contractual. Con serio atraso de la empresa BETA Y ASOCIADOS S.A. de C.V. en el tramo del km 195+000 al km 217+600 los trabajos iniciaron después de la fecha contractual, fallo de suministros de maquinaria y de los materiales estériles. El cumplimiento de la meta anual se prevé concluya en el mes de abril de 2008.
Chórdoba-Veracruz	15.54	29.42	29.42		km-cuerpo	7.77	11.24	10.41	-	15.54	-	12.21	1.67		100.00%	
Aguascal-Cosoleacaque	10.00	10.00	10.00		km-cuerpo	3.00	3.00	3.00	1.00	-	3.50	3.50	2.91	291.00%	99.10%	Obras concluidas en proceso de finiquito.
Guadalupe-Tepic	79.24	79.24	79.24		km-cuerpo	20.97	20.32	26.14	11.81	3.38	20.30	21.31	26.23	222.10%	89.88%	La meta programada no se cumplió debido al incumplimiento de la empresa en producción de agregados y suministros de esfaltes. Se prevé concluya en el mes de febrero de 2008.

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2007 de CAPUFE

Acción	Meta Original	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Unidad de medida	Programado				Avance Real				Realizado vs. Programado en el periodo	Realizado Acumulado vs. Meta Anual	Observaciones
						Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-sept.	Oct-Dic			
Las Choapas-Rauvales-Ocozacoatlán	79.13	105.81	105.81		km-cuerpo	24.89	27.95	35.40	17.43	3.54	31.43	19.97	21.87	125.47%	72.59%	La meta modificada para el 2007 no fue posible cumplirla, toda vez que al inicio de esta obra las empresas enfocaron las acciones al bacheo de la superficie de rodamiento para elevar el nivel de servicio. El cumplimiento a la meta anual se prevé concluirá en el mes de Marzo 2008.
Cuauhtémoc-Oaxaca	100.00	100.00	100.00		km-cuerpo	16.15	27.95	27.95	27.95	1.03	3.14	20.85	47.46	168.87%	72.50%	La meta modificada para el 2007 no fue posible cumplirla debido a atrasos en los contratos de las empresas: COCONAL, S.A. de C.V. por presentar fallas mecánicas de sus equipos de recuperación y problemas con fileros. ROCTEC, S.A. de C.V. debido a que el banco de materiales propuesto no fue factible su explotación y también por problemas con fileros. Los trabajos de la superficie de rodamiento están concluidos al 100%.
Elevar la rasante del tramo carretero Cadereyta-Reynosa	3.20	3.20	3.20		km-cuerpo	0.91	0.82	1.14	0.33	0.57	0.75	1.27	0.61	184.85%	100.00%	
Estabilizar corles en la autopista Cuernavaca-Acapulco	6.00	6.00	6.00		Corles	2.57	2.57	0.86	-	1.20	2.40	1.07	1.33	100.00%	100.00%	
Acercar el Distribuidor Vial Tepoztlán en la Autopista México-Querétaro	1.00	1.00	1.00		Distribuidor Vial	0.30	0.40	0.30	-	0.28	0.24	0.28	0.20	100.00%	100.00%	
Modernizar el acceso a la cabecera municipal de Acahualtán en la Autopista Zapatlán-Lagos de Moreno	1.00	1.00	1.00		Estronque	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	100.00%	100.00%	
Reponer los dispositivos de soporte superior de los anclajes de los tirantes del Puente "Pagabagan"	1.00	1.00	1.00		Puentes	-	-	-	1.00	-	-	-	0.50	50.00%	50.00%	No se cumplió la meta dado que el apoyo estructural (especial) para la reparación de los dispositivos de anclaje superior de los tirantes del puente, no se pudieron comprar en México, por lo que se recurrió a mercados internacionales. Se estima terminar la obra en el primer semestre de 2008.
Reparar los puentes (Río Grande, El Márquez II, Coyuquilla e Ignacio Chávez) en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas	4.00	4.00	4.00		Puentes	4.00	-	-	-	4.00	-	-	-	100.00%	100.00%	Falla por terminar el trámite del permiso de descarga de agua residual, tiempo estimado, 100 días, no se consiguió en el tiempo establecido porque no se contaba con planta de tratamiento de aguas residuales.
Obtención por parte de la PROFEPA del certificado que acredite como "Industria Limpia" la Planta de Pinturas y Emulsiones.	1.00	1.00	1.00		Certificado	-	-	1.00	-	-	-	0.90	0.05	95.00%	95.00%	



Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN**

"2008 Año de la Educación Física y el Deporte"  
Oficio: SD.C/ 021 /08

Asunto: Programa de Trabajo Institucional.  
Sexto bimestre.

Cuernavaca, Morelos a 22 de Enero de 2009.

**Lic. César A. Trujillo Islas**  
**Subdirector de Planeación, Evaluación**  
**E Información Institucional**  
**PRESENTE**

En atención al comunicado DPD/003/09 de la Dirección de Planeación y Desarrollo, donde solicita sean informados los avances bimestrales del **Programa de Trabajo Institucional 2008 (PTI 2008)**, en el cual se muestran las acciones comprometidas por la Dirección Técnica.

Al respecto me permito enviar a usted el avance al sexto bimestre del mencionado Programa, el cual ha sido validado con las áreas responsables dentro de la Dirección Técnica de cada una de las actividades.

No omito mencionar a usted, que dicho formato ha sido enviado correo electrónico a la dirección aoliva.


Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
**Subdirector de Construcción y Programación**

C.c.p. Ing. José Gpe. Tarcisio Rodríguez Martínez. Director General.  
Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@  
Lic. Mariano Chimes. Director de Planeación y Desarrollo.  
Ing. Salvador Escobar Morales. Encargado de la Subdirección de Conservación.  
Ing. Rubén Cuellar Salazar. Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico.  
Ing. Juan Tellez Muñoz. Gerente de Puentes.  
Ing. Francisco E. Hernández Ortega. Gerente de Autopistas.  
Ing. Francisco Moreno Fierros. Gerente de Nuevas Tecnologías.  
Ing. Eduardo G. Tirado del Río. Gerente de Licitaciones y Administración de Contratos.

*MM 10:32  
22/ene/09*





CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO  
INSTITUCIONAL 2008  
(SEXTO BIMESTRE)

caminos y  
puentes



SCT

FEBRERO 2009 380





**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2008 de CAPIFE**  
**Semio Bimestre 2008**

No.	Situación	Vinculación con el Programa	Actividad	Meta Anual Aprobada	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Meta Modificada IV	Meta Modificada V	Unidad de medida	Programa												Realizado vs. Programado % en el periodo	Realizado vs. Programado % en el Año Actual	Observaciones			
											Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun
41	3	1.1	1.1.3	1.1.3.3	71.32					Iniciado	6.27	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	35%	83%	La meta física anual se modificó, ya que los trabajos se iniciaron en el mes de abril 2008, según contrato. (58)
42	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	0.04					Iniciado	0.24															100%	100%	Se concluyó.
43	4	1.1	1.1.3	1.1.3.3	51.56	71.32				Iniciado	50.75	8.88	4.44	8.88	7.58	9.52	8.87	11.44	4.81	2.50	13.09	13.09	13.09	13.09	13.09	35%	93%	La meta no se alcanzó debido a que la obra a cargo de la empresa PROYECTOS Y OBRAS CIVILES S.A. de CV, se inició un avance errático en los trabajos de rehabilitación del pavimento de los 0400 al 1000 metros de la carretera (Subtramo 7) reanunciada con anterioridad. Actualmente la Delegación Regional inició el proceso de selección administrativa.
44	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	9.25					Iniciado	9.25				8.40	0.28										100%	100%	Trabajos concluidos.
45	3	1.1	1.1.3	1.1.3.3	18.00					Iniciado	0.00															21%	25%	La meta física anual se modificó, ya que los trabajos del programa 2008 están pendientes de iniciar. (59)
					20.35							2.25	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50			Las partidas de obra que representaban la obra no se iniciaron dentro del periodo indicado por el contrato. (59)
																												La meta anual se modificó, ya que los trabajos de rehabilitación a cargo de la empresa CONSTRUCTORA GARVE PARRADO S.A. de CV, se iniciaron en el mes de mayo 2008. La subdelegación correspondiente avisa las actividades que se iniciaron en el ejercicio 2008. Esta obra se iniciará en el ejercicio 2009.



Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
Programa de Trabajo Institucional 2008 de CAPUFE  
Sexto Bimestre 2008

Cuarto No. del Programa	Cuarto No. del Programa	Modificaciones al Programa Institucional 2007-2012				Actividad	Meta Anual Autorizada	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Meta Modificada IV	Meta Modificada V	Unidad de medida	Avance Real												Realizado vs Programado en el periodo	Observaciones	
		EM	DI	E	LA									Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic			
50	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Masalitán - Culiacán	1						Estructura														100%	Otra concluida	
54	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Misicó-Cuamatzaco	1						Estructura														100%	Otra concluida	
55	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Cuamatzaco - Anapuzo	2						Estructura																La meta física fue modificada a 1.98 que se cubrió por la cancelación de un contrato de mantenimiento de un ASV ubicado en el km. 1.98 del camino Misicó-Cuamatzaco. El programa de trabajo 2008 se canceló por el programa de trabajo 2009.
56	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Puente de San Agustín	1						Estructura														100%	Otra concluida	
57	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Cd. Mercedes - Córdoba	1						Estructura														100%	Otra concluida	
58	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Córdoba - Veracruz	2						Estructura														100%	Otra concluida	
59	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Puente Reynosa Pinar	1						Estructura														100%	Otra concluida	
60	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Guadalupe - Tepic	2						Estructura														100%	Otra concluida	
61	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Jas. Chapas - Raulador - Coahuila	2						Estructura														100%	Otra concluida	
					Totales	14																						
					Conservación Menor de Puentes - Mantenimiento Menor																							
62	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Trabajos de Mantenimiento en vehicular	3,409						Estructura														40%	Otra concluida	
63	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Inspecciones Periódicas de Puentes	3,259						Estructura inspeccional														84%	Clase concluida	
64	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Inspecciones Especiales de Puentes	50						Estructura inspeccional														100%	Actividad concluida. Conforme a programa, se finalizaron las inspecciones.	
78	1	4.1	4.1.1	4.1.1.1	Recopilación y procesamiento de información para el Sistema de Gestión de Puentes.	100%						% Avance														100%	Se contrataron 3 empresas para tener a cabo los levantamientos respectivos. La meta física fue cumplida al 100%.	





Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

**DIRECCIÓN TÉCNICA**

**SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN**

Oficio: SD.C/ 0092 /10

Asunto: Programa de Trabajo Institucional 2009 y 2010.

Cuernavaca, Morelos a 29 de enero de 2010.

**Lic. Mariano Chimes**  
**Director de Planeación y Desarrollo**  
Presente

*C. Trujillo*  
*Conse-*

En atención a su comunicado DPD/499/09 dirigido a la Dirección Técnica, referente a los Programas de Trabajo Institucional 2009 y 2010, me permito enviar a usted la siguiente información:

- Avance al sexto bimestre del Programa de Trabajo Institucional 2009.
- Programa de Trabajo Institucional 2010.


No omito mencionar, que dicha información ha sido validada con las Gerencias Operativas, responsables del seguimiento a las actividades del mencionado Programa.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

*M* 29/01/10  
14-29

**Atentamente**

*Jaime Ezequiel Donlucas Gómez*  
**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
**Subdirector de Construcción y Programación**



C.c.p. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico. oortiz@  
Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres. Subdirector de Conservación.  
Ing. José Roberto Vázquez González. Gerente de Puentes.  
Ing. Miriam Sánchez López. Encargada de la Gerencia de Autopistas.  
Arq. Mario André Tapia Flores. Gerente de Calidad Técnica.  
Ing. Francisco Moreno Fierros. Gerente de Nuevas Tecnologías.  
Arq. Verónica Inacua Gómez. Gerente de Instalaciones y Maquinaria.  
JEDG/LCL









SCT

# Programa de Trabajo Institucional 2009

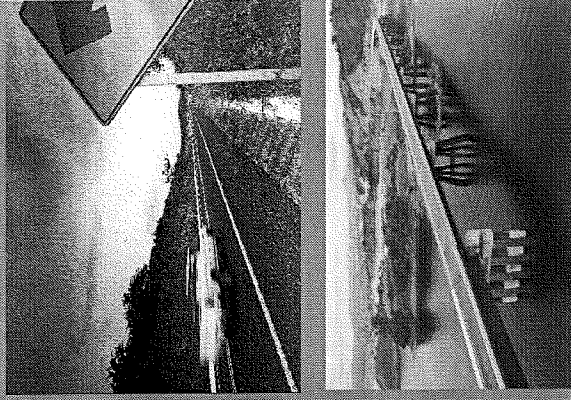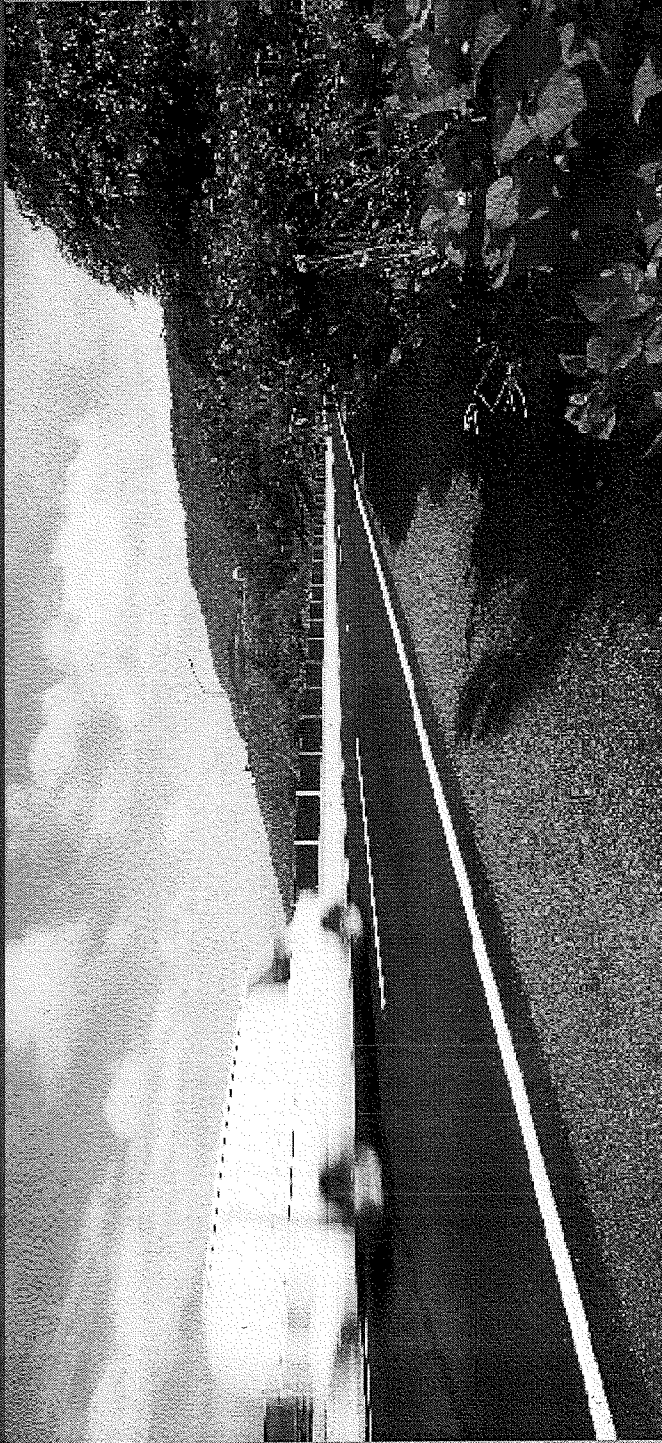

## Avance al 6to. Bimestre de 2009

0387

Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos















**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2009 de CAPUFE**  
**Seguimiento al Sexto Bimestre 2009**

Código	Módulo	Submódulo	E	N	O	I	L	A	Vinculación con el Programa Institucional de Trabajo 2009	Actividad	Método Autorizado	Método Modificado I	Método Modificado II	Método Modificado III	Método Modificado IV	Método Modificado V	Método Modificado VI	Unidad de medida	Programa (acumulado)												Avance Real (acumulado)	Avance Real Programado en el período	Avance Acumulado vs. Avance Real	Distintivos
																			Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sep-Oct	Nov-Dic				
60	2	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Conservación Menor de Alibolitas	Conservación menor alibolitas	6.967.31							Imp-capto	1,152.92	2,386.67	3,038.02	4,759.34	5,883.97	6,967.31	228.96	1,439.40	3,038.02	4,541.71	5,774.34	6,919.64	89%	89%	Actividad programada: En virtud de la modificación de las metas de los meses de febrero, marzo y abril se programó el inicio de las obras de conservación de las carreteras en el mes de febrero. Se reportó el avance en virtud de que las carreteras de conservación de las carreteras en el mes de febrero de febrero 2009. febrero 2010. (ver región siguiente)	
61	1	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2				Conservación Menor de Puentes: Rehabilitación de Estructuras	Conservación Menor de Puentes: Rehabilitación de Estructuras								Estructura					1										Actividad programada: En virtud de que se controla a otra actividad se reportaron los recursos por región siguiente.	
62	1	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Puentes de Inlet - Igualá	Puentes de Inlet - Igualá								Estructura														Actividad con meta modificada y programada. La meta anual se modificó, ya que se reportó la reparación del puente de Inlet en el mes de febrero de febrero 2009. febrero 2010. (ver región siguiente)		
63	2	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Módulo - Puebla	Módulo - Puebla	12							Estructura					12										Actividad concluida: En proceso de finalización. Se finalizó la reparación del FOT ubicado en el km. 56-550.	
64	1	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Puentes Ingresos Puert	Puentes Ingresos Puert								Estructura					1										Actividad programada: En virtud de que se modificó la meta con un período de ejecución del 29 de marzo al 29 de junio, esta actividad se reportó en el mes de febrero de febrero 2009. febrero 2010. (ver región siguiente)	
65	3	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Sanjalisco - Tepic	Sanjalisco - Tepic								Estructura					1										Actividad concluida.	
66	1	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Las Chispas - Raudales - Ocozacoatlán	Las Chispas - Raudales - Ocozacoatlán								Estructura					1											Actividad programada: Esta obra ha concluido dentro de grupo de trabajo del FONDIR del 11 de febrero.
67	1	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3				Conservación Menor de Puentes: Mantenimiento Menor	Conservación Menor de Puentes: Mantenimiento Menor	3.609							Estructura															Actividad programada: Diminución del período de continuación de la obra por el grupo de trabajo al término de las obras de conservación de las carreteras en el mes de febrero de febrero 2009. febrero 2010. (ver región siguiente)	
																																	Actividad concluida.	


**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2009 de CAPUFE**  
**Seguimiento al Sexto Bimestre 2009**

Módulo	Act. II	Vinculación con el Programa Institucional de Capacitación 2009-2011				Actividad	Mita Anual Autorizada	Meta Modificada I	Meta Modificada II	Meta Modificada III	Meta Modificada IV	Meta Modificada V	Meta Modificada VI	Unidad de medida	Programa (cumplido)												Avance Real (acumulado)	Avance Real Programado en el periodo	Avance Acumulado vs Meta Anual	Dispersiones					
		E	EN	DI	E										L	A	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago	Sept-Oct	Nov-Dic	Ene-Feb	Mar-Abr	May-Jun	Jul-Ago					Sept-Oct	Nov-Dic			
68	1	1	1	1	1	1.1.3.3	Inspecciones Tradicionales de Puentes	3,359						Elementos inspeccionados															3,359	100%	100%	Actividad concluida.			
69	1	1	1	1	1	1.1.3.3	Inspecciones Espectrales de Puentes	50						Elementos inspeccionados															50	100%	100%	Actividad concluida.			
70	1	1	1	1	1	1.1.3.3	Estudios y proyectos	14						proyectos															14	100%	100%	Actividad concluida.			
71	4	1	1	1	1	1.1.3.3	Desarrollo de herramientas informáticas para el sistema de Gestión de Pavimentos basado en el HDQ-4	1						proyecto															1			La actividad se inició en el mes de agosto y se adelantó un total de 100% de la programación. Se realizaron 14 pláticas y de ellas, ya se tiene la lista de alumnos que se inscribirán en el curso hasta el mes de diciembre de 2009. Se ha finalizado el contrato hasta el mes de diciembre de 2009. Se ha concluido la programación de actividades (ver renglón siguiente) por un monto de \$0.00.			
109	1	5	5	5	5	5.1.1.1	Pláticas de tratamiento de aguas residuales instaladas	19						Pláticas instaladas																		19	100%	100%	Actividad concluida. En el 6to. bimestre fueron terminadas 16 pláticas de tratamiento en las plazas de la Delegación X (7) y 5 de Cuernavaca de Tramo Cuernavaca (3).

0393



DIRECCIÓN TÉCNICA  
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMACIÓN



Lic. César A. Trujillo Islas  
Subdirector de Planeación, Evaluación  
E Información Institucional  
Presente

SDC/ 0050/2011

26 de enero de 2011

Asunto: Programa de Trabajo Institucional.

Me refiero al comunicado SPEII/123/10 de la Subdirección a su cargo, donde se solicita sean informados los avances en la implementación y ejecución del Programa de Trabajo Institucional 2010.

Al respecto me permito enviar a usted, el avance al sexto bimestre del mencionado Programa, el cual ha sido validado con las áreas responsables de cada una de las actividades dentro de la Dirección Técnica.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

*[Handwritten signature of Jaime Ezequiel Donlucas Gómez]*

Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez  
Subdirector de Construcción y Programación

*[Handwritten signature and date: 26/ene/2011 12:11]*

- C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director Técnico.
  - Ing. José Roberto Vázquez González. Subdirector de Calidad y Desarrollo Tecnológico.
  - Ing. Fidencio Elpidio Valdez Torres. Subdirector de Conservación.
  - Arq. Verónica Inacua Gómez. Gerente de Instalaciones y Maquinaria.
- JEDG/VIG\*Idl TURNO: 2010001470

*[Handwritten mark]*





**GOBIERNO  
FEDERAL**

**SCT**

**caminos y puentes  
federales**

Programa de Trabajo Institucional

**2010**

# Seguimiento al Programa de Trabajo Institucional 2010

## Cierre al Sexto Bimestre

Febrero 2011



**Vivir Mejor**























**DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA  
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS**

**Lic. César A. Trujillo Islas**  
**Coordinador de Planeación, Evaluación e Información Institucional**  
**Presentes**

SPAC/ 0142 /2012  
09 de Febrero de 2012

**Asunto:** Programa de Trabajo Institucional sexto bimestre

En alcance a mi similar SPAC/0050/2012, mediante el cual se remitió a esa Coordinación a su cargo, los formatos del avance al sexto bimestre del Programa de Trabajo Institucional.

Anexo al presente los formatos debidamente validados y firmados por las áreas responsables de la Dirección de Infraestructura Carretera.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

**Atentamente**

**Ing. Jaime Ezequiel Donlucas Gómez**  
**Subdirector de Programación y Administración de Contratos**

*13:21*  
*09/02/2012*



C.c.p. Ing. Omar Ortiz Ramírez. Director de Infraestructura Carretera.  
Arq. Verónica Inacua Gómez. Gerente de Instalaciones y Maquinaria.  
JEDG/VIG





GOBIERNO FEDERAL

SCT

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos

# Programa de Trabajo Institucional

## 2011

caminos y puentes  
federales

### I. Seguimiento al Sexto Bimestre del Programa de Trabajo Institucional 2011.

Coordinación de Planeación, Evaluación e Información Institucional

Vivir Mejor

Febrero 2012

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
Programa de Trabajo Institucional 2011  
Sexto Bimestre 2011

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo CAPIF 2010-2012 (I)				Actividad	Mds Anual Autorizadas	Mds. Modificadas					Unidad de medida	Programa de actividades												Avance Real vs Mds Anual	Observaciones										
	BU	DI	E	LA			I	II	III	IV	V		VI	En-Pab.	En-Abil.	En-Just.	En-Apog.	En-COL.	En-Dic.	En-Ene.	En-Feb.	En-Mar.	En-Abr.	En-May.			En-Jun.	En-Jul.	En-Ago.	En-Sep.	En-Oct.	En-Nov.	En-Dic.			
RED FNI PROGRAMA 2010																																				
Ejecución Caminos 2010 (Dtos Pábulos)																																				
Estructuración de Carreteras																																				
18	1	1	1	1	1.1.3.1	0.19																											Actividad concluida. Se realiza por 4.00 millones de pesos por 4.00 millones de pesos en el periodo de octubre a diciembre 2010 con 7.7 modificaciones 0.19 en el periodo de octubre.	100%		
Tempas de emergencia																																				
19	1	1	1	1	1.1.3.1	0.20																											Actividad concluida	100%		
Adaptación de tiempo de emergencia																																				
Efectivos y proyectos																																				
20	1	1	1	1	1.1.3.1																												Actividad concluida	100%		
RED FNI PROGRAMA 2011																																				
Regular Carreteras 2011 (Dtos Pábulos)																																				
Barrido y limpieza de Pábulos																																				
21	1	1	1	1	1.1.3.1	8.000																												Actividad programada: Se programó conforme a contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Tijera-Caracas																																				
22	1	1	1	1	1.1.3.1	5.120																												Actividad programada: Se programó de acuerdo al contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Urbano San José del Cabo																																				
23	1	1	1	1	1.1.3.1	4.000																												Actividad programada: Se programó de acuerdo al contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Chamapa - Luchela																																				
24	1	1	1	1	1.1.3.1	13.488																												Actividad programada: Se programó conforme a contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Barrido de Caminos de Cuernavaca																																				
25	1	1	1	1	1.1.3.1	6.400																												Actividad programada: Se programó de acuerdo al contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Mesa-Oriente (Tramo Peñitas Cuernavaca)																																				
26	1	1	1	1	1.1.3.1	6.400																												Actividad programada: Se programó de acuerdo al contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Mesa-Oriente (Tramo Peñitas Cuernavaca)																																				
27	1	1	1	1	1.1.3.1	6.400																												Actividad programada: Se programó de acuerdo al contrato, iniciada el 14 de marzo de 2011		
Mesa-Oriente (Tramo Peñitas Cuernavaca)																																				







**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2011**  
 Sexto Bimestre 2011

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo CAPUR 2007-2013 (D)			Actividad	Mes Actual Autorizado	Meta Modificada												Unidad de medida	Programado Autorizado												Avance Real Programado en el periodo	Avance Real Anual	Descripción de la Meta													
	Es	Q	E			U	I	II	III	IV	V	VI	En-Ene	En-Feb	En-Mar	En-Abr	En-May		En-Jun	En-Jul	En-Ago	En-Sep	En-Oct	En-Nov	En-Dic																					
40	1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Emisión Investigativa	378,777																							378,777																	Actividad programada de programas conexos a conatos, relacionados al proceso de marzo de 2011
49	1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Convenio de apoyo	30,000																							30,000															Actividad programada de programas conexos a conatos, relacionados al mes de marzo de 2011		
81	1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Guatemala - Tiqué	338,000																							338,000															Actividad programada de programas conexos a conatos, relacionados al mes de marzo de 2011		
82	1	1.1	1.1.3	1.1.3.1	Estudio para el inicio de asignación de estándares y condiciones de seguridad																																							Actividad programada de programas conexos a conatos, relacionados al mes de marzo de 2011		
<b>RED FNI PROGRAMA 2009</b>																																														
Conversión Mayor de Autopistas (Rehabilitación del Perimetro CVI)																																														
86	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Las Chigajas - Rayoles - Ocosingo	1.27																							1.27															Actividad programada de programas conexos a conatos, relacionados al mes de marzo de 2011		
<b>RED FNI PROGRAMA 2010</b>																																														
Conversión Mayor de Autopistas (Rehabilitación del Perimetro CVI)																																														
87	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Tijera - Ensenada (TS)	7.82																						7.82															Actividad concluida. La meta global fue de 41.00 finalizada al 2010 por 10.18, congresos 2.82 en el presente ejercicio.			
88	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	La Ruina - Tuxtla (TS)	62.60																							62.60															Actividad programada de programas conexos a conatos, relacionados al mes de marzo de 2011		
89	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Chimapa - Lachela	6.04																							6.04															Actividad concluida. La meta global fue por 10.40 finalizada al 2010 por 10.18, congresos 0.04 en el presente ejercicio.		
90	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Lubianávil Comisaria	3.16																							3.16															Actividad concluida. La meta global fue por 10.50 finalizada al 2010 por 10.18, congresos 3.16 en el presente ejercicio.		
91	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Cuimales - Apulco	2.62																							2.62															Actividad concluida. La meta global fue por 10.25 finalizada al 2010 por 10.18, congresos 2.62 en el presente ejercicio.		

**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
**Programa de Trabajo Institucional 2011**  
**Socio Bimestre 2011**

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo Cadure 2007-2011 (P)				Actividad	Mes Anual Admisión	Mes Modalidad						Unidad de medida	Programa Operativo											Avance Real del Programa en el periodo	Avance Real del Mes Actual	Observaciones del Bimestre				
	Ed.	Cl.	E.	UA			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.		Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.				Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.	Enz-Enz.
92	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Cuicatlan - Oaxaca	0.14																						Actividad concluida. La meta global es por 5.00 toneladas al 2010 sob 4.66 concluyéndose 0.14 en el presente bimestre.	100%		
93	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Las Chepas - Ruzhika - Ocozacoatlán	0.28																						Actividad concluida. La meta global es por 1.00 toneladas al 2010 sob 0.72 concluyéndose 0.28 en el presente bimestre.	100%		
94	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Las Chepas - Ruzhika - Ocozacoatlán	0.50																						Actividad concluida. La meta global es por 0.50 toneladas al 2010 sob 0.00 concluyéndose 0.50 en el presente bimestre.	100%		
Contribución Mayor de Anísquitas 2010:																															
95	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Zona Noia	218.50																						Actividad concluida. La meta global es de 3.00 toneladas al 2010 sob 2.78 concluyéndose 218.50 en el presente bimestre.	100%		
96	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Zona Sur	207.5																						Actividad concluida. La meta global es de 2.00 toneladas al 2010 sob 1.78 concluyéndose 207.5 en el presente bimestre.	100%		
Emergencia Terremoto 2010:																															
97	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Chimarrut - Appalo	2.68																						Actividad concluida.	100%		
98	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Sancho Vepo - Tanco	0.53																						Actividad concluida. La meta global 2010-2011 global es de 2 emergencias 2010 1.47 concluidas 2011 0.53 concluidas	100%		
99	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Itzo - Acayacan	0.85																						Actividad concluida. La meta global 2010-2011 global es de 7 emergencias 2010 6.15 concluidas 2011 0.85 concluidas	100%		
100	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Coahuila - Veracruz	1.19																						Actividad con meta modificada y verificable. La obra es de 0.13, se cubrió a petición del voluntario a partir de la encuesta en proceso de campo y de	100%		
101	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	La Topa - Isla	1.00																						Actividad concluida.	100%		
102	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Las Chepas - Ruzhika - Ocozacoatlán	2.82																						Actividad concluida. La meta global 2010-2011 global es de 1 emergencia 2010 1.90 concluidas 2011 0.92 concluidas	100%		
103	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Matamoras - Reynosa (Emergencia Terremoto México ALCF)	0.49																						Actividad concluida. La meta global 2010-2011 global es de 1 emergencia 2010 0.49 concluidas 2011 0.50	100%		
104	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Puerto de Ito - Iguala	0.60																						Actividad concluida.	100%		
Isla - Acayacan:																															
105	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Ocho de mayo Km. 144-150	0.02																						Actividad concluida. La meta global 2010-2011 global es de 1 emergencia 2010 0.02 concluidas 2011 0.02	100%		
106	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Ocho de mayo km. 144-150	0.19																						Actividad concluida. La meta global 2010-2011 global es de 1 emergencia 2010 0.19 concluidas 2011 0.19	100%		

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos  
Programa de Trabajo Institucional 2011  
Semestre Bimestre 2011

No.	Verificación con el Programa Institucional de Desarrollo CADPE 2007-2011 (2)				Actividad	Módulo Académico	Módulo Multidisciplinario					Unidad de medida	Programa de Trabajo Institucional												Avance Real en el período	Avance Real en el período	Observaciones								
	Ed	Gf	E	LA			I	II	III	IV	V		VI	Enz-Ene	Enz-Feb	Enz-Mar	Enz-Abr	Enz-May	Enz-Jun	Enz-Jul	Enz-Ago	Enz-Sep	Enz-Oct	Enz-Nov				Enz-Dic							
107	1	1.1	1.1.2	1.1.3.3	Obra de arreglo km. 127+050	0.35																										100%	Actividad concluida. La obra global (2010-2011) global es de 1 emergencia por 0.35 conductores		
108	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Estación de carga	5																										100%	Actividad pendiente. Obra dentro del Programa 2010, cuya conclusión es en el año 2011		
109	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Salida Cruz - La Vidriera	3																											100%	Actividad reprogramada. Se reprograma la salida de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011	
110	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Cosques - Vianca	3																											100%	Actividad reprogramada. Se reprograma los trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011	
111	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Huachipa - Nuevo Laredo	1																											100%	Actividad reprogramada. Se reprograma los trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011	
112	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Huachipa - Unión Cárdenas	1																											100%	Actividad reprogramada. Se reprograma los trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011	
113	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	La Tringa - Iba	6																												100%	Actividad reprogramada. Se reprograma los trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011
114	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Iba - Arzacón	1																												100%	Actividad reprogramada. Se reprograma los trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011
115	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	México-Puebla	2																												80%	Actividad reprogramada. Se reprograma los trabajos de acuerdo a lo establecido en el convenio de los servicios mínimos de conductores a 21 de mayo de 2011
116	1	1.1	1.1.3	1.1.3.3	Uruapan-Cuauhtémoc	0.95																												100%	Actividad concluida.
<p>Construcción Mayor de Puentes 2010:</p> <p>Construcción Menor de Puentes (Institucional) Bimestre 2010</p>																																			















**Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos**  
Programa de Trabajo Institucional 2011  
Sexto Bimestre 2011

No.	Vinculación con el Programa Institucional de Desarrollo CAPAS 2007-2012 (I)					Mito Anual Autorizada	Mito Institucional						Unidad de medida	Progreso acumulado						Avance Real Avance Programado en el período	Avance Real Avance Programado vs Mito Anual	Observaciones No. Ejecutor						
	SI	DI	E	LA			I	II	III	IV	V	VI		ENE-PB.	FEB-PB.	MAR-PB.	ABR-PB.	MAY-PB.	JUN-PB.				JUL-PB.	AUG-PB.	SEPT-PB.	OCT-PB.	NOV-PB.	DIC-PB.
183	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2				1										1									100%	Actividad concluida. Ota que se incluyó para atender la emergencia presentada en este bimestre.
184	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2						1														1		100%	Actividad incluida y concluida. Ota que se incluyó para atender la emergencia presentada en este bimestre y se completó en este bimestre.	
Estado y Proyectos 2011																												
185	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2		3																						Actividad con meta modificada y reprogramada. Se incluye proyecto de obras autorizadas - para obras y materiales - para el mes de mayo 2012 y se incluye para el mes de junio 2012 y se incluye para el mes de julio 2012 y se incluye para el mes de agosto 2012.
186	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2					1																		100%	Actividad concluida.
187	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2					1																		100%	Actividad concluida.
188	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2					1																		100%	Actividad concluida.
189	1	1.1	1.1.3	1.1.3.2					1																		100%	Actividad concluida.
209	4	4.1	4.1.6	4.1.6.2		1																					100%	Se incluye para atender la emergencia presentada en este bimestre y se completó en este bimestre.
